



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๕๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

๖๖.๕๖๖

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๖๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๔๒๓.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๔ ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว ๘๓.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๔ งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๗,๗๗๖.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๒ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕๗ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๗๑๐ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรร)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สอช., ผอ.ช.ภค., ทน. ๑-๗ มอ.
และ ผท. นอ. (จ.ม. มอ., พต. มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕

อช.




งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

ภาพรวม
งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

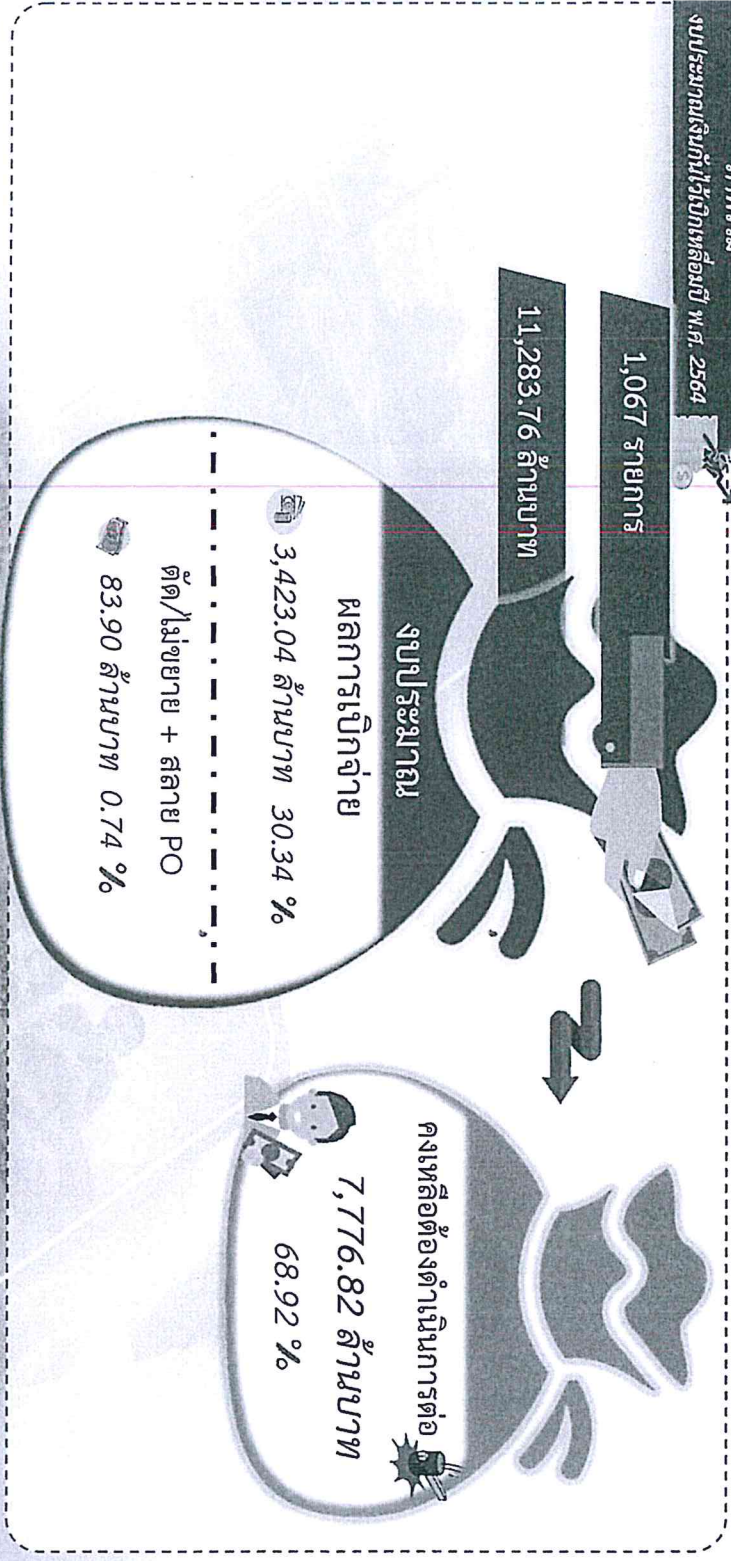

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ	357 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง	710 รายการ



ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

ล้านบาท

ล้านบาท

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	347.53								
ผลต่าง	-	-428.49	-1,221.49	-1,238.71								
ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	
ไตรมาสที่ 1												
ไตรมาสที่ 2												
ไตรมาสที่ 3												
ไตรมาสที่ 4												

เบิกจ่าย 100%

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,067 รายการ งบประมาณ 11,283.76 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,423.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.34 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 83.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 7,776.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.92

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 357 รายการ งบประมาณ 1,287.70 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,127.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.54 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 80.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.28 และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 79.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.18

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 710 รายการ งบประมาณ 9,996.06 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,295.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.97 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 3.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 และต้องดำเนินการต่อ 7,697.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.00

ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 แยกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)				
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,067	11,283.76	3,075.52	30.34	83.90	7,776.82
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	357	1,287.70	1,127.21	87.54	80.85	79.64
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	710	9,996.06	2,295.83	22.97	3.05	7,697.18

2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 31 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณคงเหลือมากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 114 รายการ งบประมาณ 2,976.16 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 569.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.14 และต้องดำเนินการต่อ 2,406.48 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ งบประมาณ 1,800.31 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 598.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.22 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 82.23 ล้านบาท และต้องดำเนินการต่อ 1,119.93 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 54 รายการ งบประมาณ 737.55 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 243.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.02 และต้องดำเนินการต่อ 493.98 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2564 แยกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะการดำเนินงาน		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)				
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,067	357	710	11,283.76	3,075.52	30.34	83.90	7,776.82
สขป. 1	16	2	14	156.74	51.30	32.73	-	105.44
สขป. 2	31	6	25	153.53	19.63	12.79	-	133.90
สขป. 3	28	9	19	175.84	76.96	43.77	-	98.88
สขป. 4	25	3	22	244.79	42.11	17.20	-	202.67
สขป. 5	63	20	43	222.11	48.56	21.86	-	173.54
สขป. 6	38	11	27	259.56	78.42	30.21	-	181.14
สขป. 7	34	26	8	108.90	24.33	22.34	-	84.57
สขป. 8	102	40	62	428.11	139.67	32.62	-	288.44
สขป. 9	36	16	20	362.38	182.77	50.44	-	179.61
สขป. 10	26	7	19	248.16	83.42	33.62	-	164.74
สขป. 11	38	14	24	568.69	254.30	44.72	0.39	314.01
สขป. 12	34	13	21	465.83	187.66	40.29	-	278.17
สขป. 13	28	9	19	141.97	32.13	22.63	-	109.84
สขป. 14	28	5	23	443.32	82.45	18.60	0.48	360.39
สขป. 15	54	22	32	627.19	188.12	29.99	0.42	438.65
สขป. 16	54	18	36	737.55	243.57	33.02	-	493.98
สขป. 17	63	26	37	451.66	224.06	49.61	-	227.60
สบอ.	33	16	17	102.12	31.94	31.28	0.07	70.12
สคก.	13	6	7	67.93	52.25	76.91	0.02	15.66
สพญ.	114	27	87	2,976.16	569.68	19.14	-	2,406.48
กพท.	121	35	86	1,800.31	598.15	33.22	82.23	1,119.93
ศทส.	4	1	3	14.44	0.90	6.21	-	13.54
สมต.	6	1	5	1.96	1.80	91.36	-	0.17
สจต.	5	-	5	54.68	15.63	28.58	-	39.05
สลก.	11	5	6	62.87	23.84	37.92	0.004	39.02
สบก.	30	11	19	173.99	40.21	23.11	0.15	133.63
สวพ.	2	2	-	6.52	6.52	100.00	-	-
สสร.	9	4	5	54.71	34.22	62.56	0.001	20.48
สอส.	5	-	5	64.69	-	-	-	64.69
กสข.	2	1	1	1.19	0.70	58.34	-	0.50
สพช.	1	1	-	0.03	-	-	0.03	-
LUMP SUM	13	-	13	105.82	87.76	82.93	0.09	17.97

3

1

2

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมไปกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
