



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐
ที่ Eจบอ(ปค.)๐๔/๕๐๗/๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๘ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๗ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS Thai ของกองการเงินเรียบร้อยแล้ว

ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ดังนี้

แหล่งที่มาของงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	โอนกลับ ส่วนกลาง (บาท)	คงเหลือได้รับ จัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
รวมทุกแหล่งงบประมาณ	๘๔๓,๑๖๙,๓๓๑	๙,๗๔๙,๗๘๒	๘๓๒,๙๙๙,๔๑๒	๗๐๕,๙๑๗,๐๘๓	๘๔.๗๔
งบ พรบ. ๒๕๖๘	๕๖๒,๔๙๑,๑๐๐	๘,๔๘๖,๙๔๔	๕๕๓,๕๘๔,๐๑๙	๔๗๖,๖๓๑,๖๙๐	๘๖.๑๐
- หน่วยรับงบประมาณ สบอ.	๔๐๒,๑๓๓,๔๔๖	๒,๑๕๘,๘๓๕	๓๙๙,๙๗๔,๖๑๑	๓๓๐,๕๕๕,๒๖๔	๘๒.๖๔
- หน่วยรับงบประมาณ สขป.๑-๑๗	๑๖๐,๓๕๗,๖๕๔	๖,๗๔๘,๒๔๖	๑๕๓,๖๐๙,๔๐๘	๑๔๖,๐๘๖,๔๒๗	๙๕.๑๐
เงินกันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๑๗,๐๐๘,๓๓๑	๑๒๓,๕๙๓	๒๑๖,๘๘๔,๗๓๘	๒๑๖,๘๘๔,๗๓๘	๑๐๐.๐๐
เงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖๓,๖๖๙,๙๐๐	๑,๑๓๙,๒๔๕	๖๒,๕๓๐,๖๕๕	๑๒,๔๐๐,๖๕๕	๑๙.๘๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชวลิต ฉลอม)

ผปบ.บอ.



รายงานผลเบิกจ่ายประจำปี

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

เงิน งบประมาณ
843,169,331 บาท
รวมทั้งสิ้น

=

เงิน งบประมาณ
562,491,100 บาท
งบ พ.ร.บ.68

+

เงิน งบประมาณ
217,008,331 บาท
เงินกันเหลือในปี

+

เงิน งบประมาณ
63,669,900 บาท
เงินทุนหมุนเวียนฯ

ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ก.ย. 68
86.10%



เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายของกรมฯ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	อันวาคม 2567	มีนาคม 2568	มิถุนายน 2568	กันยายน 2568	กันยายน 2568	กันยายน 2568	กันยายน 2568	กันยายน 2568
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
รายจ่ายลงทุน	100	80	39	17	66	35	77	54	100	80
รายจ่ายประจำ	100	98	36	35	58	57	81	80	100	98
รายจ่ายภาพรวม	100	94	37	27	61	53	80	75	100	94

งบ พ.ร.บ.68 งบประมาณ 562,491,100 บาท

- ยกเลิก 3 รายการ 1,250,000 บาท
- คงเหลือ 211 รายการ 561,241,100 บาท
- ได้รับจัดสรรแล้ว 553,584,019 คิดเป็น 98.42% (211 รายการ)
- คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 76,952,328 คิดเป็น 13.90%
 - งานจ้างเหมาทั้งโครงการ 49,312,825 บาท
 - งานจ้างเหมาบางส่วน 19,260,658 บาท
 - งานดำเนินการเอง 8,378,845 บาท
- แผนเบิกจ่ายสะสม เดือน ก.ย. 553,584,019 บาท คิดเป็น 100%

งบกันเหลือในปี 67 งบประมาณ 192,008,361 บาท

- เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ
- แผนเบิกจ่ายสะสม เดือน ก.ย. 216,884,738 บาท คิดเป็น 100%

เงินทุนหมุนเวียนฯ 68 งบประมาณ 63,669,900 บาท

- คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 50,130,000 บาท คิดเป็น 80.17% (ขอขยายเวลาเบิกจ่าย จำนวน 50,130,000 บาท ตามบันทึก สบอ 11597/2568 ลง 28 ส.ค.68)
- แผนเบิกจ่ายสะสม เดือน ก.ย. 62,530,655 บาท คิดเป็น 100%

ผลการเบิกจ่าย	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
	2.03%	7.89%	15.10%	19.65%	25.08%	46.40%	62.10%	68.40%	75.57%	83.37%	87.88%	100%

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

งบประมาณ พ.ร.บ. 2568

งบประมาณ พ.ร.บ. 68

- จำนวน 214 รายการ ยกเลิก 3 รายการ 1,250,000 บาท
- คงเหลือ 211 รายการ 561,241,100 บาท
- โอนกลับส่วนกลางแล้ว (เหลือจ่าย/ส่วนต่างจากการทำ
- ข้อผูกพันงานจ้างเหมา) 7,657,081 บาท
- ได้รับจัดสรร 553,584,019 บาท (211 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 476,631,690 บาท
- คิดเป็น 86.10% (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 53 รายการ)
- คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 76,952,328 คิดเป็น 13.90%

562,491,100 บาท

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2568

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนฯ

- จำนวน 26 รายการ (งานโครงการ 1 รายการ
- ครุภัณฑ์ 25 รายการ)
- โอนกลับส่วนกลางแล้ว 1,139,245 บาท
- ได้รับจัดสรร 62,530,655 บาท (26 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 12,400,655 บาท
- คิดเป็น 19.83% (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 25 รายการ)
- คงเหลือ 50,130,000 บาท คิดเป็น 80.17%

63,669,900 บาท

เงินกันเหลือในปี 2567

งบประมาณ เงินกันเหลือในปี

- จำนวน 49 รายการ
- แจ้งคืนกรมฯ 123,593 บาท
- คงเหลือได้รับจัดสรร 216,884,738 บาท (49 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 216,884,738 บาท
- คิดเป็น % (เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ)

217,008,331 บาท

- หมายเหตุ :- ร้อยละผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบที่ได้รับจัดสรร
- โอนหน่วยรับงบประมาณ สบอ. วงเงิน 399,974,611 บาท
 - ผลเบิกจ่ายจำนวน 330,545,264 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.64
 - โอนหน่วยรับงบประมาณ สขป.1-17 วงเงิน 153,609,408 บาท
 - ผลเบิกจ่ายจำนวน 146,086,427 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.10

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบ พ.ร.บ. 2568

ข้อมูลจากระบบ Cen-Project ณ วันที่ 19 กันยายน 2568

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)							
		1.ยังไม่ดำเนินการ	2.อนุมัติแผน	3.ประกาศ TOR	4.ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	5.เปิดซอง	6.อนุมัติรับ ราคา	7.ทำข้อ ผูกพัน	8.ยกเลิก
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	218	0	0	0	0	0	0	212	6
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	0	0	1	0
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	0	0	0	0	0	0	12	0
ส่วนอุทกวิทยา	27	0	0	0	0	0	0	27	0
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	9	0	0	0	0	0	0	7	2
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	13	0	0	0	0	0	0	12	1
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน และ ทน.1-9	49	0	0	0	0	0	0	46	2
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	36	0	0	0	0	0	0	35	1
ศอช.ภาคกลาง	10	0	0	0	0	0	0	10	0
ศอช.ภาคตะวันตก	8	0	0	0	0	0	0	8	0
ศอช.ภาคตะวันออก	8	0	0	0	0	0	0	8	0
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	0	0	0	0	0	0	7	0
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	12	0	0	0	0	0	0	12	0
ศอช.ภาคใต้	7	0	0	0	0	0	0	7	0
ศอช.ภาคเหนือตอนบน	11	0	0	0	0	0	0	11	0
ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง	8	0	0	0	0	0	0	8	0

หมายเหตุ : ยกเลิก 6 รายการ งบประมาณ 10,139,000 บาท

ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 684,000 บาท.

1. บำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV ลุ่มน้ำเจ้าพระยา พ.ศ.2568 (ตน.บอ.) งบประมาณ 684,000 บาท. (งานดำเนินการเอง) เนื่องจากยกเลิกระบบกล้อง CCTV ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ยกเลิก 2 รายการ งบประมาณ 4,800,000 บาท

1. การศึกษาวิศวกรรมการกำจัดฝักตบขางและวัชพืช ในทางน้ำชลประทาน งบประมาณ 3,000,000 บาท. (งานจ้างเหมา) เนื่องจากแผนงานซ้ำซ้อนกับแผนงานในปี 2566

2. โครงการศึกษาติดตามงานปรับปรุงระบบชลประทาน ประเทหะบะบ่งน้ำ งบประมาณ 1,800,000 บาท. (งานดำเนินการเอง) เนื่องจากได้รับงบประมาณ ปี 2567

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 3,855,000 บาท.

1. บำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานภาพของเขื่อนจากการเข้าถึงข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน พ.ศ. 2568 งบประมาณ 3,855,000 บาท. (งานจ้างเหมา) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า (โครงการระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานภาพของเขื่อน จากการเข้าถึงข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร) ซึ่งจนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2568 ตามสัญญาที่ จ.54/2567/สบอ. ทั้งนี้หากโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2567 ยังไม่แล้วเสร็จจะสามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 ยกเลิก 2 รายการ งบประมาณ 800,000 บาท.

1. ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัยของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 งบประมาณ 250,000 บาท (งานดำเนินการเอง)

2. ซ่อมแซมบ้านพักพนักงานราชการ จำนวน 2 หลัง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 งบประมาณ 550,000 บาท (งานดำเนินการเอง) เนื่องจากได้รับแจ้งจากชลประทานมูลนิธิ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินว่าจะมีการะงับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2568 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ และเป็นการใช้งบประมาณโดยไม่คุ้มค่า

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบ พรบ.68)

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
แผนการเบิกจ่าย สบอ. งบ พรบ. 2568 จำนวน 214 รายการ วงเงิน 562.49 ล้านบาท ยกเลิก 3 รายการ 1.25 ล้านบาท จัดสรรแล้ว 553.58 ล้านบาท 98.42% จำนวน 211 รายการ	66.44 ล้านบาท			254.92 ล้านบาท			414.68 ล้านบาท			553.58 ล้านบาท		
	12 %			46.05 %			74.91 %			100 %		
ผลการเบิกจ่าย งบพรบ. 2568	53.25 ล้านบาท 10.41%			161.36 ล้านบาท 29.33%			378.68 ล้านบาท 68.13%			476.63 ล้านบาท 86.1%		
	44.25 ล้านบาท 7.99 %			106.4 ล้านบาท 19.22 %			340.68 ล้านบาท 61.54 %			461.65 ล้านบาท 83.39 %		
- จ้างเหมาทั้งโครงการ (21 รายการ วงเงิน 171.08 ล้านบาท) จัดสรรแล้ว 169.32 ล้านบาท 98.97% (21/21)	8.82 ล้านบาท 6.61%			45.35 ล้านบาท 27.63%			81.99 ล้านบาท 49.98%			120 ล้านบาท 70.88%		
	13.62 ล้านบาท 8.04 %			24.22 ล้านบาท 14.3 %			73.47 ล้านบาท 43.39 %			117.64 ล้านบาท 69.48 %		
- จ้างเหมา+ดำเนินการเอง (26 รายการ วงเงิน 67.78 ล้านบาท (จ้างเหมา 57.15 ล้านบาท ดำเนินการเอง 10.63)) จัดสรรแล้ว 64.44 ล้านบาท 95.08% (26/26)	1.01 ล้านบาท 1.82%			8.17 ล้านบาท 12.88%			24.20 ล้านบาท 37.55%			45.18 ล้านบาท 70.11%		
	1.02 ล้านบาท 1.58 %			9.31 ล้านบาท 14.44 %			32.84 ล้านบาท 50.95 %			50.71 ล้านบาท 78.69 %		
- ดำเนินการเอง (167 รายการ วงเงิน 323.64 ล้านบาท) จัดสรรแล้ว 319.83 ล้านบาท 98.82% (164/164)	43.42 ล้านบาท 13.45%			107.84 ล้านบาท 33.42%			263.32 ล้านบาท 81.76%			311.45 ล้านบาท 97.38%		
	29.61 ล้านบาท 9.26 %			72.88 ล้านบาท 22.79 %			234.37 ล้านบาท 73.28 %			293.3 ล้านบาท 91.7 %		

หมายเหตุ : - ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 19 ก.ย. 2568

- ร้อยละผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบที่ได้รับจัดสรร
- โอนจัดสรรทุกหน่วยรับงบประมาณ 553,584,019 บาท ผลเบิกจ่ายจำนวน 476,631,690 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.10
- โอนหน่วยรับงบประมาณ สบอ. วงเงิน 399,974,611 บาท ผลเบิกจ่ายจำนวน 330,545,264 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.64
- โอนหน่วยรับงบประมาณ สขป.1-17 วงเงิน 153,609,408 บาท ผลเบิกจ่ายจำนวน 146,086,427 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.10
- ยกเลิก จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 1,250,000 บาท (โอนกลับส่วนกลางแล้ว)
- (1.175) ซ่อมแซมบ้านพักพนักงานราชการ จำนวน 2 หลัง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [178] งบประมาณ 550,000 บาท
- (1.29) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [508] งบประมาณ 250,000 บาท
- (1.53) การศึกษาอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ที่เหมาะสมโดยวิธีหว่านน้ำตมในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดกาฬสินธุ์ - [2079] งบประมาณ 450,000 บาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบเงินกันเหลื่อมปี 67)

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
เงินกันเหลื่อมปี 67 จำนวน 49 รายการ วงเงิน 217.01 ล้านบาท เงินเหลือจ่าย 0.13 ล้านบาท คงเหลือได้รับจัดสรร 216.88 ล้านบาท	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68		
คาดการณ์เบิกจ่าย	78.2 ล้านบาท			156.78 ล้านบาท			187.38 ล้านบาท			216.88 ล้านบาท				
	36.06 %			72.29 %			86.39 %			100 %				
ผลเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 67	65.35 ล้านบาท 34.05%			123.65 ล้านบาท 64.43%			167.59 ล้านบาท 77.26%			216.88 ล้านบาท 100%				
	63.57 ล้านบาท 29.31 %		78.2 ล้านบาท 36.06 %	105.86 ล้านบาท 48.81 %		125.08 ล้านบาท 57.67 %	156.78 ล้านบาท 72.29 %		169.35 ล้านบาท 78.08 %	181.71 ล้านบาท 83.78 %		187.38 ล้านบาท 86.39 %	190.02 ล้านบาท 87.61 %	205.01 ล้านบาท 94.52 %

หมายเหตุ : - จำนวน 49 รายการ งบประมาณ 217,008,331 บาท

- 1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน 30 รายการ งบประมาณ 73,592,509 บาท
- 2. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จำนวน 8 รายการ งบประมาณ 98,242,824 บาท
- 3. ส่วนอุทกวิทยา จำนวน 8 รายการ งบประมาณ 35,618,878 บาท
- 4. ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 9,551,150 บาท
- 5. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 3,000 บาท
- ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 19 ก.ย. 2568
- ร้อยละผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบที่ได้รับจัดสรร

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2568 จำนวน 26 รายการ วงเงิน 63.67 ล้านบาท) เงินเหลือจ่าย 1.14 ล้านบาท ปัจจุบันได้รับจัดสรร 62.53 ล้านบาท	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
คาดการณ์เบิกจ่าย							20.76 ล้านบาท			62.53 ล้านบาท		
							33.19 %			100 %		
ผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2568							6.88 ล้านบาท 11.01%			12.4 ล้านบาท 19.83%		
							5.27 ล้านบาท 8.43 %	12.4 ล้านบาท 19.83 %	20.76 ล้านบาท 33.19 %	31.9 ล้านบาท 51.01 %	31.9 ล้านบาท 51.01 %	62.53 ล้านบาท 100 %

หมายเหตุ : - จำนวน 26 รายการ งบประมาณ 63,669,900 บาท

1. งานโครงการ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 56,000,000 บาท
- โครงการเพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (RID Smart Water Management Platform : RID SWAMP) สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล (ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำ)
2. ครุภัณฑ์ จำนวน 25 รายการ งบประมาณ 7,669,900 บาท (ส่วนบริหารทั่วไป)
- ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบติดตาม CEN-project ณ วันที่ 19 ก.ย. 2568
- ร้อยละผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบที่ได้รับจัดสรร

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 19 กันยายน 2568

รายการงบประมาณ : **งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2568**

โครงการ / หน่วยงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 2568				โอนกลับส่วนกลาง (เหลือจ่าย/ส่วนต่างจากการทำข้อมูลพื้นฐาน จ้างเหมา/ยกเลิก)				ได้รับจัดสรร				ผลการเบิกจ่าย (เทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)				แผนการเบิกจ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน ก.ย.68				คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (จัดสรร-ผลเบิก)				คาดการณ์กับเหลือปี 68					คงเหลือที่จะเบิกภายใน 30 ก.ย.68 (จัดสร-ผลเบิก-กับเหลือ)				ผลต่าง
	จำนวน 214 รายการ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	20,094,400	10,000,000	10,094,400	352,637	350,000	2,637	1.75	12	19,741,763	9,650,000	10,091,763	19,706,713	9,650,000	10,056,713	99.82	19,741,763	9,650,000	10,091,763	100.00	35,050	0	35,050	0.18	0	0	0	0	0.00	35,050	0	35,050	0.18	-0.18
ส่วนประมวณวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	160,913,900	104,315,900	56,598,000	4,250,820	4,199,820	51,000	2.64	35	156,663,080	100,116,080	56,547,000	126,781,234	70,709,851	56,071,383	80.93	156,663,080	100,116,080	56,547,000	100.00	29,881,846	29,406,230	475,617	19.07	29	24,224,728	24,131,052	93,676	15.46	5,657,119	5,275,178	381,941	3.61	-19.07
ส่วนอุทกวิทยา	27	113,695,000	14,575,000	99,120,000	199,489	30,800	168,689	0.18	27	113,495,511	14,544,200	98,951,311	107,125,757	9,085,800	98,039,957	94.39	113,495,511	14,544,200	98,951,311	100.00	6,369,754	5,458,400	911,354	5.61	2	5,626,760	5,109,150	517,610	4.96	742,994	349,250	393,744	0.65	-5.61
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	7	15,100,000	4,900,000	10,200,000	14,165	14,000	165	0.09	7	15,085,835	4,886,000	10,199,835	13,476,523	3,277,385	10,199,138	89.33	15,085,835	4,886,000	10,199,835	100.00	1,609,312	1,608,615	697	10.67	1	500,390	500,390	0	3.32	1,108,922	1,108,225	697	7.35	-10.67
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	12	112,090,000	93,490,000	18,600,000	2,263,170	496,960	1,766,210	2.02	12	109,826,830	92,993,040	16,833,790	77,593,637	61,776,459	15,817,178	70.65	109,826,830	92,993,040	16,833,790	100.00	32,233,193	31,216,581	1,016,612	29.35	7	31,216,581	31,216,581	0	28.42	1,016,612	0	1,016,612	0.93	-29.35
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0.00	1	1,000,000	0	1,000,000	997,200	0	997,200	99.72	1,000,000	0	1,000,000	100.00	2,800	0	2,800	0.28	0	0	0	0	0.00	2,800	0	2,800	0.28	-0.28
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน และ ทน.1-9	49	19,681,900	955,699	18,726,201	1,281,223	702	1,280,520	6.51	46	18,400,657	954,997	17,445,660	17,651,178	954,997	16,696,181	95.93	18,400,657	954,997	17,445,660	100.00	749,479	0	749,479	4.07	0	0	0	0	0.00	749,479	0	749,479	4.07	-4.07
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	11	18,575,400	0	18,575,400	13,900	0	13,900	0.07	11	18,540,970	0	18,540,970	18,445,086	0	18,445,086	99.48	18,540,970	0	18,540,970	100.00	95,884	0	95,884	0.52	0	0	0	0	0.00	95,884	0	95,884	0.52	-0.52
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	15,278,700	0	15,278,700	6,295	0	6,295	0.04	8	15,243,236	0	15,243,236	14,661,659	0	14,661,659	96.18	15,243,236	0	15,243,236	100.00	581,576	0	581,576	3.82	0	0	0	0	0.00	581,576	0	581,576	3.82	-3.82
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	15,308,200	0	15,308,200	0	0	0	0.00	7	15,263,218	0	15,263,218	14,066,205	0	14,066,205	92.16	15,263,218	0	15,263,218	100.00	1,197,013	0	1,197,013	7.84	0	0	0	0	0.00	1,197,013	0	1,197,013	7.84	-7.84
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	12	17,493,000	0	17,493,000	0	0	0	0.00	12	17,480,521	0	17,480,521	16,711,056	0	16,711,056	95.60	17,480,521	0	17,480,521	100.00	769,465	0	769,465	4.40	0	0	0	0	0.00	769,465	0	769,465	4.40	-4.40
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,050,400	0	13,050,400	1,075	0	1,075	0.01	10	13,042,528	0	13,042,528	12,473,180	0	12,473,180	95.63	13,042,528	0	13,042,528	100.00	569,348	0	569,348	4.37	0	0	0	0	0.00	569,348	0	569,348	4.37	-4.37
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	8	12,466,000	0	12,466,000	0	0	0	0.00	8	12,463,539	0	12,463,539	11,230,842	0	11,230,842	90.11	12,463,539	0	12,463,539	100.00	1,232,696	0	1,232,696	9.89	0	0	0	0	0.00	1,232,696	0	1,232,696	9.89	-9.89
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,822,600	0	10,822,600	0	0	0	0.00	8	10,808,559	0	10,808,559	10,060,269	0	10,060,269	93.08	10,808,559	0	10,808,559	100.00	748,290	0	748,290	6.92	0	0	0	0	0.00	748,290	0	748,290	6.92	-6.92
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	7	16,921,600	0	16,921,600	104,170	0	104,170	0.62	7	16,527,773	0	16,527,773	15,651,150	0	15,651,150	94.70	16,527,773	0	16,527,773	100.00	876,623	0	876,623	5.30	0	0	0	0	0.00	876,623	0	876,623	5.30	-5.30
รวมทั้งสิ้น	214	562,491,100	228,236,599	334,254,501	8,486,944	5,092,282	3,394,662	1.51	211	553,584,019	223,144,317	330,439,702	476,631,690	155,454,491	321,177,199	86.10	553,584,019	223,144,317	330,439,702	100.00	76,952,328	67,689,825	9,262,503	13.90	39	61,568,458	60,957,172	611,286	11.12	15,383,870	6,732,653	8,651,217	2.78	-15.94

หมายเหตุ : - ผลเบิกจ่าย และคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย

ร้อยละเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- โอนกลับส่วนกลาง (เหลือจ่าย/ส่วนต่างจาก

การทำข้อมูลพื้นฐานจ้างเหมา/ยกเลิก) และแผนการเบิกจ่าย

ร้อยละเปรียบเทียบกับ งบ พ.ร.บ. 68

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2568

- จำนวน 218 รายการ งบประมาณ 571,830,100 บาท

- ขอยกเลิกก่อนได้รับการโอนจัดสรร จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 9,339,000 บาท

- ขอยกเลิกหลังได้รับการจัดสรร จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 1,250,000 บาท (โอนกลับส่วนกลางแล้ว)

(1.175) ช่อมแซมบ้านพักพนักงานราชการ จำนวน 2 หลัง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา - [178] งบประมาณ 550,000 บาท

(1.29) ช่อมแซมระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [508] งบประมาณ 250,000 บาท

(1.53) การศึกษาอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ที่เหมาะสมโดยวิธีหว่านน้ำถ่มในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [2079] งบประมาณ 450,000 บาท

ความหมายของแต่ละสีที่ไฮไลท์ในคอลัมน์ "เบิกจ่าย (ร้อยละ)"

- สีเขียว หมายถึง เบิกจ่ายเกินแผนคาดการณ์

- สีเหลือง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์ไม่เกิน ร้อยละ 10

- สีแดง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์เกิน ร้อยละ 10

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 19 กันยายน 2568

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2568

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 68			ผลเบิกจ่ายทุกศูนย์ต้นทุน									ผลเบิกจ่ายเฉพาะส่วนกลาง									ผลเบิกจ่ายเฉพาะส่วนภูมิภาค												
					วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย (บาท)			คิดเป็น (ร้อยละ)	ผูกพันคงเหลือ (บาท)			วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย (บาท)			คิดเป็น (ร้อยละ)	ผูกพันคงเหลือ (บาท)			วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย (บาท)			คิดเป็น (ร้อยละ)	ผูกพันคงเหลือ (บาท)			
		รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง		รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง		รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง		รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	212	562,491,100	228,223,600	334,267,500	553,584,019	223,144,317	330,439,702	476,631,690	155,454,491	310,978,061	86.10	67,530,149	67,095,124	435,025	399,974,611	207,887,343	192,087,268	330,545,264	140,197,518	190,347,745	82.64	67,366,660	67,095,124	271,536	153,609,408	15,256,974	138,352,434	146,086,427	15,256,973	130,829,454	95.10	163,489	0	163,489	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	160,913,900	104,315,900	56,598,000	156,663,080	100,116,080	56,547,000	126,781,234	70,709,851	56,071,383	80.93	29,678,066	29,406,530	271,536	156,663,080	100,116,080	56,547,000	126,781,234	70,709,851	56,071,383	80.93	29,678,066	29,406,530	271,536	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0		
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน และ พน.1-9	47	19,681,900	942,700	18,739,200	18,400,657	954,997	17,445,660	17,651,178	954,997	16,696,181	95.93	10,404	0	10,404	1,460,401	0	1,460,401	1,411,550	0	1,411,550	96.65	0	0	0	16,940,256	954,997	15,985,259	16,239,628	954,997	15,284,631	95.86	10,404	0	10,404	
ส่วนควบคุมลัดวงจรเขื่อน	12	112,090,000	93,490,000	18,600,000	109,826,830	92,993,040	16,833,790	77,593,637	61,776,459	15,817,178	70.65	30,621,580	30,621,580	0	85,746,063	78,691,063	7,055,000	54,297,408	47,474,483	6,822,925	63.32	30,621,580	30,621,580	0	24,080,767	14,301,977	9,778,790	23,296,229	14,301,976	8,994,253	96.74	0	0	0	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	20,094,400	10,000,000	10,094,400	19,741,763	9,650,000	10,091,763	19,706,713	9,650,000	10,056,713	99.82	0	0	0	19,500,400	9,650,000	9,850,400	19,465,350	9,650,000	9,815,350	99.82	0	0	0	0	241,363	0	241,363	241,363	0	241,363	100.00	0	0	0
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	7	15,100,000	4,900,000	10,200,000	15,085,835	4,886,000	10,199,835	13,476,523	3,277,385		89.33	1,608,615	1,608,615	0	15,085,835	4,886,000	10,199,835	13,476,523	3,277,385	10,199,138	89.33	1,608,615	1,608,615	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	997,200	99,720	997,200	99.72	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	997,200	0	997,200	99.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
ส่วนอุทกวิทยา	27	113,695,000	14,575,000	99,120,000	113,495,511	14,544,200	98,951,311	107,125,757	9,085,800	98,039,957	94.39	5,458,400	5,458,400	0	113,495,511	14,544,200	98,951,311	107,125,757	9,085,800	98,039,957	94.39	5,458,400	5,458,400	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,050,400	0	13,050,400	13,042,528	0	13,042,528	12,473,180	0	12,473,180	95.63	0	0	0	717,503	0	717,503	717,503	0	717,503	100.00	0	0	0	12,325,025	0	12,325,025	11,755,677	0	11,755,677	95.38	0	0	0	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,822,600	0	10,822,600	10,808,559	0	10,808,559	10,060,269	0	10,060,269	93.08	0	0	0	675,959	0	675,959	675,959	0	675,959	100.00	0	0	0	10,132,600	0	10,132,600	9,384,310	0	9,384,310	92.62	0	0	0	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	8	12,466,000	0	12,466,000	12,463,539	0	12,463,539	11,230,842	0	11,230,842	90.11	150,084	0	150,084	897,539	0	897,539	897,539	0	897,539	100.00	0	0	0	11,566,000	0	11,566,000	10,333,304	0	10,333,304	89.34	150,084	0	150,084	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	15,308,200	0	15,308,200	15,263,218	0	15,263,218	14,066,205	0	14,066,205	92.16	0	0	0	930,018	0	930,018	920,018	0	920,018	98.92	0	0	0	14,333,200	0	14,333,200	13,146,187	0	13,146,187	91.72	0	0	0	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	12	17,493,000	0	17,493,000	17,480,521	0	17,480,521	16,711,056	0	16,711,056	95.60	0	0	0	918,039	0	918,039	918,039	0	918,039	100.00	0	0	0	16,562,482	0	16,562,482	15,793,017	0	15,793,017	95.35	0	0	0	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	7	16,921,600	0	16,921,600	16,527,773	0	16,527,773	15,651,150	0	15,651,150	94.70	0	0	0	997,363	0	997,363	984,283	0	984,283	98.69	0	0	0	15,530,410	0	15,530,410	14,666,867	0	14,666,867	94.44	0	0	0	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	11	18,575,400	0	18,575,400	18,540,970	0	18,540,970	18,445,086	0	18,445,086	99.48	3,000	0	3,000	1,002,070	0	1,002,070	1,002,070	0	1,002,070	100.00	0	0	0	17,538,900	0	17,538,900	17,443,016	0	17,443,016	99.45	3,000	0	3,000	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	15,278,700	0	15,278,700	15,243,236	0	15,243,236	14,661,659	0	14,661,659	96.18	0	0	0	884,831	0	884,831	874,831	0	874,831	98.87	0	0	0	14,358,405	0	14,358,405	13,786,828	0	13,786,828	96.02	0	0	0	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 19 กันยายน 2568

รายการงบประมาณ : เงินกันเหลือปี 2567

หน่วย : บาท

โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2567				งบหมดความจำเป็น/เหลือจ่าย (งานแล้วเสร็จ/ยกเลิก)				คงเหลืองบประมาณ				ผลการเบิกจ่าย (เทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)				แผนการเบิกจ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน ก.ย.68				คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (จัดสรร-ผลเบิก)				ผลต่าง
	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	73,592,479	72,425,384	1,167,095	98,568	25,600	72,968	0.13	73,493,911	72,399,784	1,094,127	99.87	73,493,911	72,399,784	1,094,127	100.00	73,493,911	72,399,784	1,094,127	100.00	0	0	0	0.00	0.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	8	98,242,824	98,242,824	0	25,000	25,000	0	0.03	98,217,824	98,217,824	0	99.97	98,217,824	98,217,824	0	100.00	98,217,824	98,217,824	0	100.00	0	0	0	0.00	0.00
ส่วนอุทกวิทยา	8	35,618,878	35,543,953	74,925	25	0	25	0.00	35,618,853	35,543,953	74,900	100.00	35,618,853	35,543,953	74,900	100.00	35,618,853	35,543,953	74,900	100.00	0	0	0	0.00	0.00
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	2	9,551,150	9,551,150	0	0	0	0	0.00	9,551,150	9,551,150	0	100.00	9,551,150	9,551,150	0	100.00	9,551,150	9,551,150	0	100.00	0	0	0	0.00	0.00
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	1	3,000	0	3,000	0	0	0	0.00	3,000	0	3,000	100.00	3,000	0	3,000	100.00	3,000	0	3,000	100.00	0	0	0	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	49	217,008,331	215,763,311	1,245,020	123,593	50,600	72,993	0.06	216,884,738	215,712,711	1,172,027	99.94	216,884,738	215,712,711	1,172,027	100.00	216,884,738	215,712,711	1,172,027	100.00	0	0	0	0.00	0.00

หมายเหตุ : - เบิกจ่ายร้อยละเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 19 กันยายน 2568

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2568

หน่วย : บาท

โครงการ / หน่วยงาน	เงินทุนฯ พ.ศ. 2568				โอนกลับส่วนกลาง (เพื่อจ่าย/ส่วนต่างจาก การทำข้อผูกพันงานจ้างเหมา/ยกเลิก)				ได้รับจัดสรร					ผลการเบิกจ่าย (เทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)				แผนการเบิกจ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน ก.ย.68				คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (จัดสรร-ผลเบิก)				ขยายเวลาดำเนินการ				คงเหลือที่จะเบิกภายใน 30 ก.ย.68 (จัดสรร-ผลเบิก-ขยายเวลาดำเนินการ)				ผลต่าง
	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	
ส่วนประมวลิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ	1	56,000,000	56,000,000	0	300,000	300,000	0	0.54	1	55,700,000	55,700,000	0	99.46	5,570,000	5,570,000	0	10.00	55,700,000	55,700,000	0	100.00	50,130,000	50,130,000	0	90.00	50,130,000	50,130,000	0	90.00	0	0	0	0.00	-90.00
ส่วนบริหารทั่วไป	25	7,669,900	0	7,669,900	839,245	0	839,245	10.94	25	6,830,655	0	6,830,655	89.06	6,830,655	0	6,830,655	100.00	6,830,655	0	6,830,655	100.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	26	63,669,900	56,000,000	7,669,900	1,139,245	300,000	839,245	1.79	26	62,530,655	55,700,000	6,830,655	98.21	12,400,655	5,570,000	6,830,655	19.83	62,530,655	55,700,000	6,830,655	100.00	50,130,000	50,130,000	0	80.17	50,130,000	50,130,000	0	80.17	0	0	0	0.00	-80.17

- หมายเหตุ :
- ความหมายของแต่ละสีที่ไฮไลท์ในคอลัมน์ "เบิกจ่าย (ร้อยละ)"
- สีเขียว หมายถึง เบิกจ่ายเกินแผนคาดการณ์
 - สีเหลือง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์ไม่เกิน ร้อยละ 10
 - สีแดง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์เกิน ร้อยละ 10

งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2568 (ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการงาน	งบประมาณเงินทุน หมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน (บาท)	สถานะการดำเนินงาน 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน 3. ยกเลิกรายการ (โปรดระบุเหตุผล ที่ยกเลิกในช่องหมายเหตุ)	ระบุสาเหตุ/ปัญหาอุปสรรคที่ยังเบิกจ่ายเงินทุนฯ ไม่แล้วเสร็จ ***โปรดระบุทุกรายการ	คาดว่าจะเบิกจ่าย ทัน/ไม่ทัน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 68 (โปรดระบุ 1 ในช่องใดช่องหนึ่ง)		เดือนที่คาดว่าจะเบิก จ่ายเงินกันแล้วเสร็จ	โปรดระบุงบประมาณที่คาด ว่าจะเบิกจ่าย ไม่ทันภายใน วันที่ 30 ก.ย. 68	หมายเหตุ
						ทันภายในวันที่ 30 ก.ย. 68	ไม่ทันภายในวันที่ 30 ก.ย. 68			
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 1 รายการ	56,000,000.00							
1	ส่วนประมวล วิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ	โครงการเพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (RID Smart Water Management Platform : RID SWAMP) สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล เบิกจ่ายแล้ว 5,570,000 บาท (10%) คงเหลือ 50,130,000 บาท (90%)	56,000,000	2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 50,130,000 บาท ตามบันทึก สบอ 11597/256 ลว 28 ส.ค. 68		1	ภายใน 26 พ.ย. 68	19,495,000	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงานงวดที่ 2 ลงนามสัญญา 31 มี.ค. 68 ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน เริ่มต้นสัญญา 1 เม.ย. 68 สิ้นสัญญา 29 พ.ย. 68 จำนวนงวด 6 งวด



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กองแผนงาน ส่วนบริหารทั่วไป
เลขรับ 12102
วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา 14.01 น.

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารทั่วไป โทร. ๒๓๗๕

ที่ สปอ ๑๑๕๙๗/๒๕๖๘

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการเพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (RID SWAMP) สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล

เรียน ผส.บอ.

ตามหนังสือกองแผนงาน ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กผง๐๕/๙๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนที่ผู้ผูกพัน และเบิกจ่ายจากแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยขอให้หน่วยงานที่คาดการณ์ว่าไม่สามารถดำเนินการก่อนที่ผู้ผูกพัน หรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดเวลา ขอให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นโดยระบุขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและเอกสารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งจัดทำแผนการขอย้ายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่าย นั้น

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (RID SWAMP) สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล โดยกรมชลประทาน ได้ว่าจ้างบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ จ.๔๓/๒๕๖๘ (สพด.) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ วงเงินตามสัญญา ๕๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เริ่มอายุสัญญา ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ครบกำหนดอายุสัญญา ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๑ งวด จำนวนเงิน ๕,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายจำนวน ๕๐,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากการขออนุมัติแก้ไขสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ Hardware และ Software ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ Workstation แบบที่ ๓ พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ ทำให้การส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด และไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา

ในการนี้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จึงขอย้ายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการเพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (RID SWAMP) สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล โดยขอสงวนรายละเอียดในการขอย้ายฯ ดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการฯ สามารถส่งมอบงานตามอายุสัญญาภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามนำเรียน ผอ.ผง. ต่อไป

เรียน ผอ.ผง.

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

(นางสาวประทุมทิพย์ ลุนาวรรณ)

ผบ.ท.บอ.

เรียน ผอ.ผง.

- ☐ เพื่อทราบ.....
☒ เพื่อพิจารณา.....
☐ เพื่อดำเนินการ.....

(นางนิตยา ปานจำ)

ผช.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.


๒๔ ส.ค. ๒๕๖๘

รายละเอียดในการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ				วันที่ได้รับอนุมัติ	บริษัท ห้าง ร้าน	สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง				จำนวนเงินที่ขอขยาย	ระยะเวลาที่ขอขยาย	เหตุผล	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง	ลงนามสัญญา	เริ่มสัญญา	ครบ กำหนด สัญญา				
1	โครงการเพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์ม การบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (RID Smart Water Management Platform : RID SWAMP) สำหรับ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล	1	งาน	55,700,000.00	55,700,000.00	28-มี.ค.-68	บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด	จ.43/2568 (สพด.)	31-มี.ค.-68	1-เม.ย.-68	26-พ.ย.-68	50,130,000.00	26-พ.ย.-68	เนื่องจากการขออนุมัติแก้ไขสัญญา ทำให้การส่งมอบงานแต่ละงวดล่าช้ากว่าที่กำหนด แต่สามารถดำเนินการโครงการภายในอายุสัญญา	
รวมงบประมาณปี 2568 ทั้งสิ้น				55,700,000.00	55,700,000.00							50,130,000.00			

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2568) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 19 กันยายน 2568

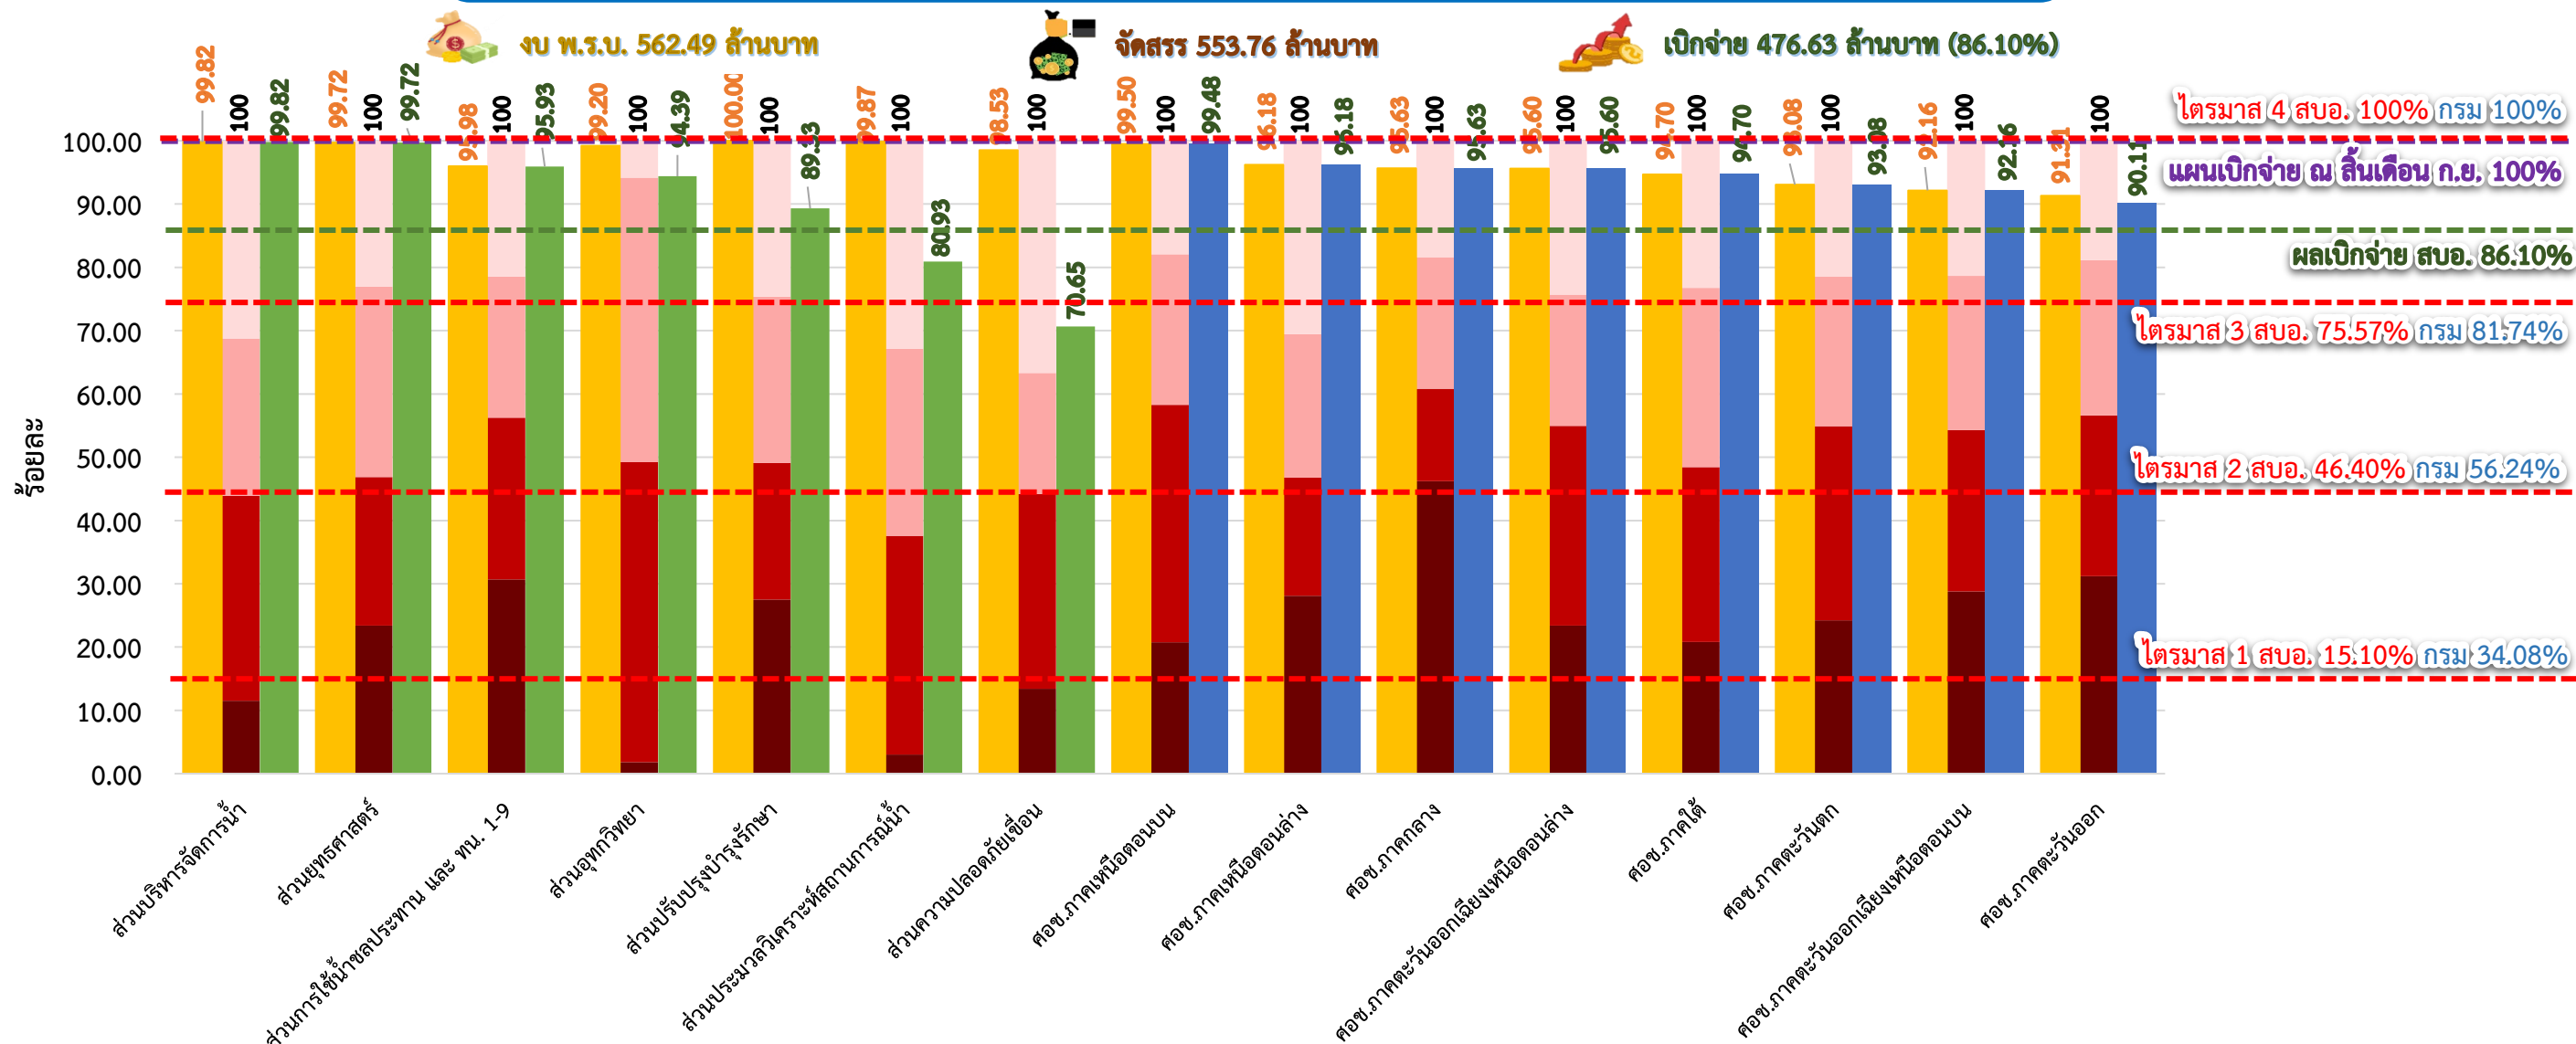


แผนและผลการเบิกจ่าย งบ พ.ร.บ.68 (สะสม) รายเดือน

เดือน	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
แผนสะสม (%)	3.77	7.96	11.95	19.14	24.80	45.90	61.40	67.63	74.85	83.37	87.89	100.00
ผลเบิกจ่าย (%)	2.22	5.69	11.97	16.96	24.86	37.81	50.53	59.60	67.12	73.06	78.97	

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 PO (ผูกพันคงเหลือ+ผลเบิก) ผลเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (กันเหลิ้ม 2567) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 19 กันยายน 2568

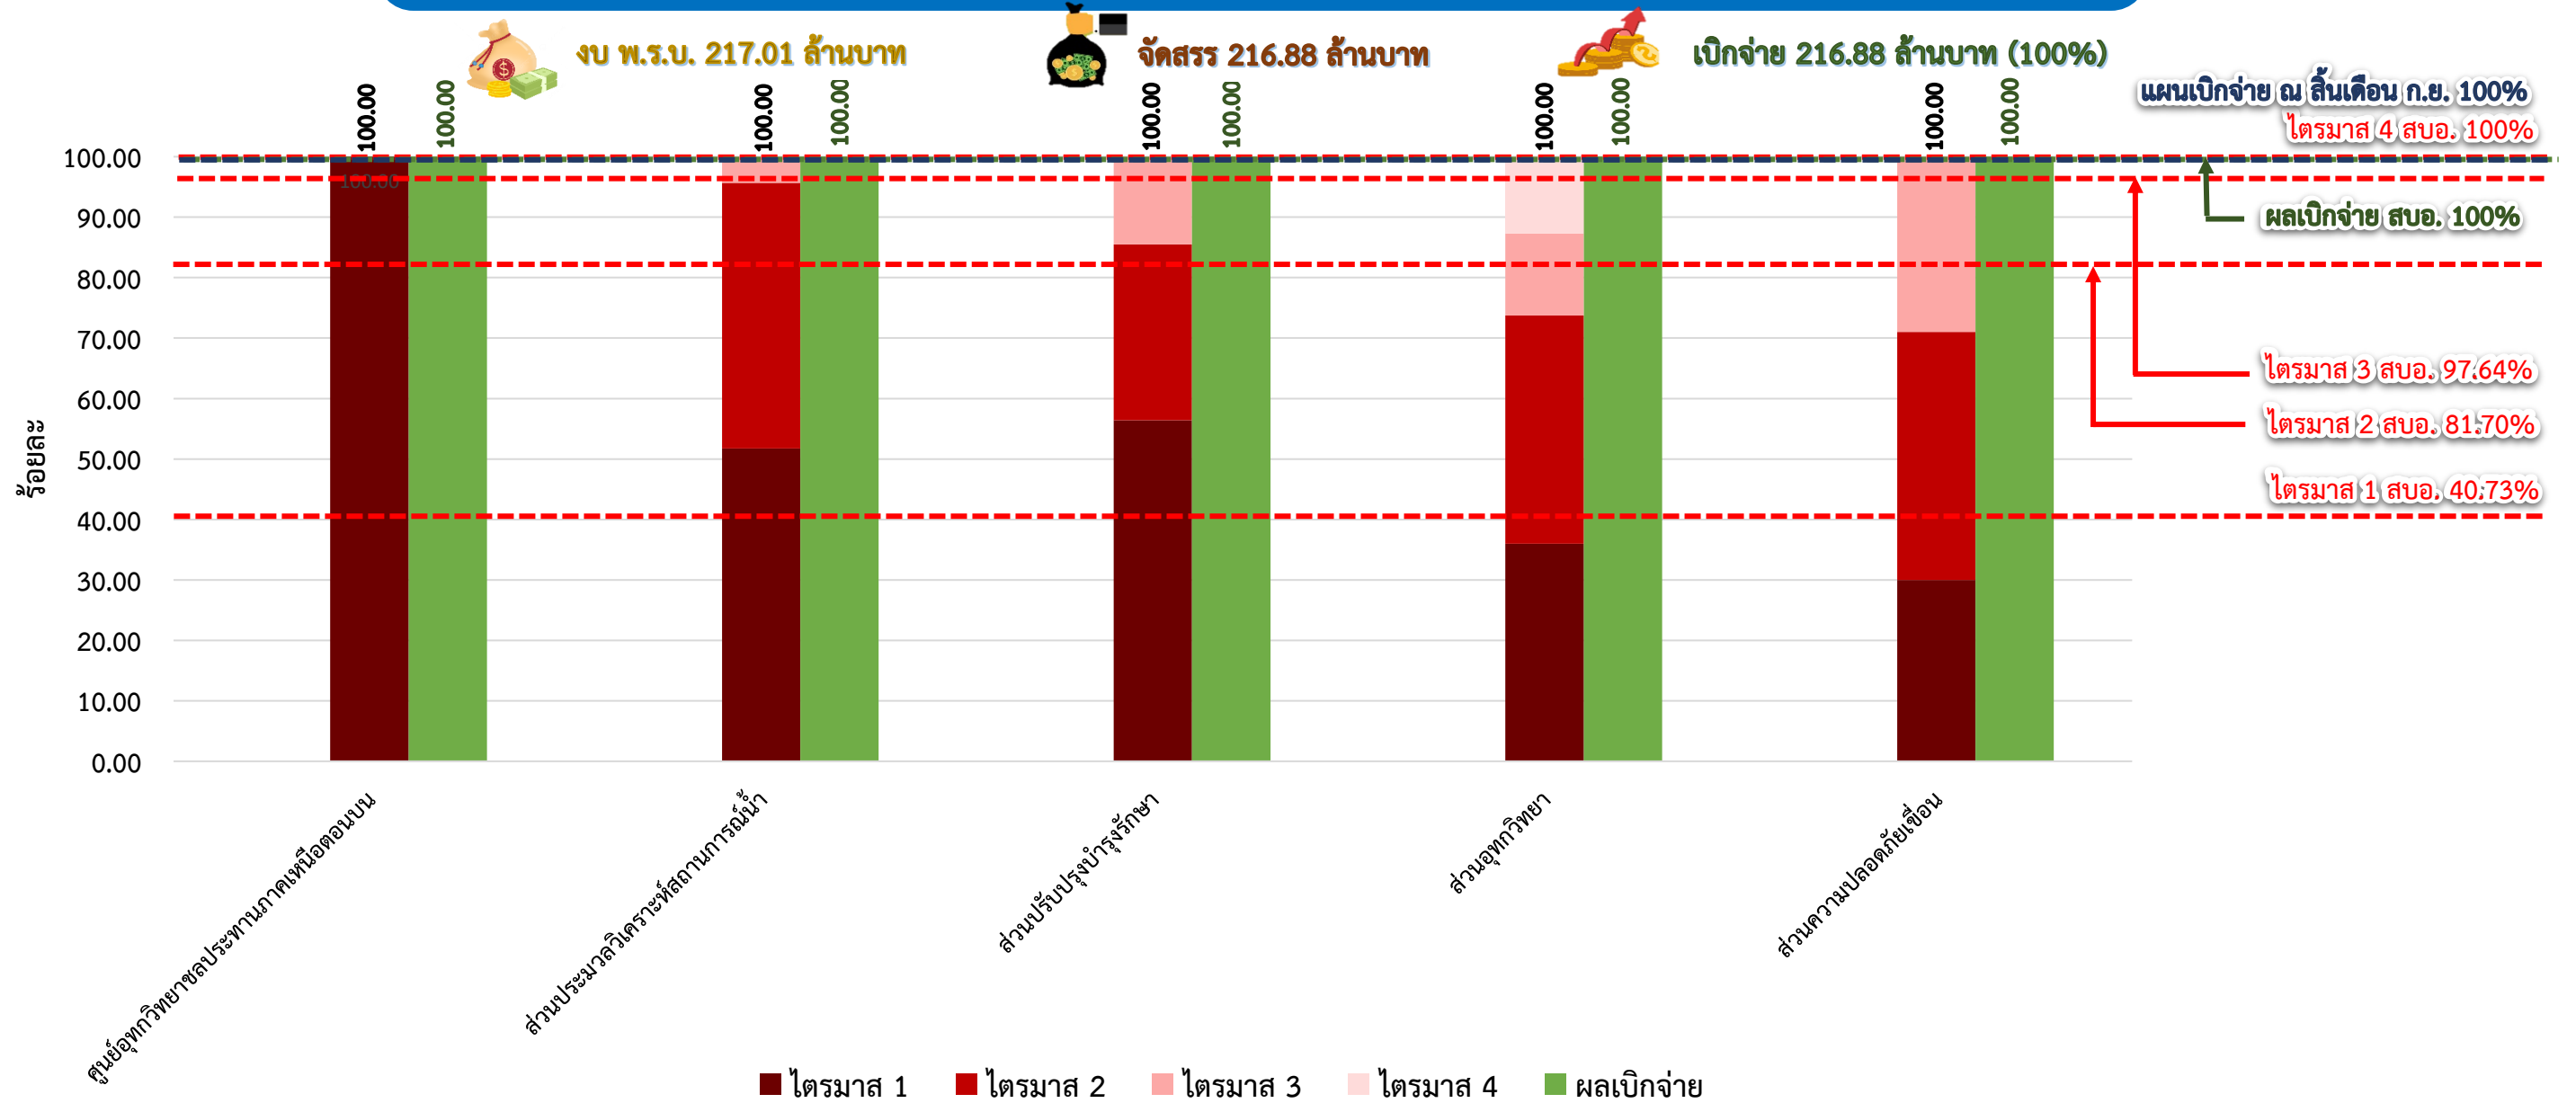

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (เงินทุน 2568) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 19 กันยายน 2568



งบ พ.ร.บ. 63.67 ล้านบาท



จัดสรร 62.53 ล้านบาท



เบิกจ่าย 12.40 ล้านบาท (19.83%)

