



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารทั่วไป (ฝ่ายธุรการ) สำนักงานชลประทานที่ ๑ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๒๔ ๖๔๐๒
ที่ สขบ ๑.๐๑/ ๒๗ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เรียน รอง ผส.ขบ.๑ ผศร. ผอ.ส่วน. ผคป ผคบ. ผคส.๑ ผสญ.๑ ผสก.๑ ผบค.๑ คก. ผจจ.๑ ทน.๑ บอ.
ผอช.ภาคเหนือตอนบน จด.๑/๑ มด. สร.รว.๑ และ ผด.๑ สธ.

ตามที่สำนักงานชลประทานที่ ๑ ได้มีการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานชลประทานที่ ๑ นั้น

บัดนี้ ส่วนบริหารทั่วไป ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้
บรรจุขึ้นเว็บไซต์ สขบ.๑ (www.rid-๑.com) เพื่อให้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะแก้ไขหรือ
เพิ่มเติม กรุณาแจ้งได้ที่ฝ่ายธุรการ ส่วนบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายนิรุตติ์ คำชัยวงศ์)

ผบท.ขบ.๑

ร่าง
 รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานชลประทานที่ ๑

ผู้มาประชุม

๑. นายอัฐวิชัย	นาควัชร	ผส.ชป.๑
๒. นายอภิวัฒน์	ภูมิไธสง	รอง ผส.ชป.๑
๓. นายจักรกฤษณ์	ชมภูบาง	ผผง.ชป.๑
๔. นายจิรัชย์	พัฒนพงษ์	ผจบ.ชป.๑
๕. นายถนอมศักดิ์	แก้วตุลพันธ์	ผคก.ชป.๑
๖. นายนิรุทธิ์	คำชัยวงศ์	ผบท.ชป.๑
๗. นายสุภรณ์วัฒน์	สุรการ	ผคป.ลำพูน
๘. นายปารเมศ	การุณนราพร	ผคป.แม่ฮ่องสอน
๙. นายอำนาจ	อินทร์วงศ์แก้ว	ผคบ.แม่แตง
๑๐. นายเฉลิมเกียรติ	อินทกนก	ผคบ.แม่กวางอุดมธรา
๑๑. นายอธียา	อรรณพเพ็ชร	ผคบ.แม่แฝก-แม่จัน
๑๒. นายสิทธิศักดิ์	เหมือนมี	ผบค.๑ คก.
๑๓. นายอานนท์	อินทรประสาท	ผอช.ภาคเหนือตอนบน
๑๔. นายโยธิน	ภิญโญขวัญ	สร.รว.๑
๑๕. นายกิตติศักดิ์	ศรีวิชัย	วศ.๑ พญ. แทน ผสญ.๑
๑๖. นายอมฤทธิ	สิงห์โยธิน	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน แทน ผสก.๑
๑๗. นางสาวชนิดา	ศิริกุลพิทักษ์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แทน ผวศ.ชป.๑
๑๘. นายธีรศักดิ์	เทวิน	เจ้าพนักงานการเกษตร แทน ทน๑
๑๙. นางสาวธารินี	แก้วศรีงาม	นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ แทน จด.๑/๑ มด.
๒๐. นายอนุสรณ์	ใจคำ	นายช่างสำรวจชำนาญงาน แทน ผด.๑ สธ.
๒๑. ว่าที่ รต.หญิงลลิตา	ฤชัย	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน แทน ผคป.เชียงใหม่
๒๒. นายวีระวิทย์	รงค์ทอง	กส.๓ ชป.๑ แทน ผคส.๑

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายชาญวิธ	เกาวนันทน์	ผจจ.๑	ติตราชากร
--------------	------------	-------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณัฐพล		กันตวิวงศ์	ยศ.ชป.๑
๒. นายชิริวิทย์	กันกา	คพ.ชป.๑	
๓. นายกรกช	วรรณวัชร	ตป.ชป.๑	
๔. นายสันหพจน์	นันทิทรรก	ปป.ชป.๑	
๕. นายชยกร	นันทานอก	สน.ชป.๑	

๖. นายพงศ์สวัสดิ์	มังคละ	ปย.ขป.๑
๗. นายคณาพจน์	มาเทพ	ปส.ขป.๑
๘. นายรัชชัย	ไบโพธิ์	ฟท.ขป.๑
๙. นางกัลยารัตน์	ลิ้มเสรี	บส.ขป.๑
๑๐. นางนภัสวรรณ	คำศรี	งบ.ขป.๑
๑๑. นางสาววารารณ์	กองมูล	ปท.ขป.๑
๑๒. นายโกศล	ถาวรวัตร	วศ.คป.ลำพูน
๑๓. นายสิริภพ	แท่นมณี	วศ.คบ.แม่แตง
๑๔. นายเชษฐพงศ์	นันทิทรภ	จน.คบ.แม่แตง
๑๕. นายธีรพันธ์	เด็ดขาด	วศ.คบ.แม่กวางอุดมธारा
๑๖. นายเกษียร	สฤชติกุล	จน.คบ.แม่กวางอุดมธारा
๑๗. นายธีรรัตน์	พันธุ์ประกิจ	วศ.คบ.แม่แฝก-แม้งัด
๑๘. นายปฏิพล	รอดบุญฤทธิ์	จน.คบ.แม่แฝก-แม้งัด
๑๙. นายณัฐพล	สิทธิการ	วช.ห้วยฮ่องไคร้
๒๐. นายภูศิษฐ์	สุดแดน	สป.ห้วยฮ่องไคร้
๒๑. นายอุเทน	คำแปง	วป.อช.ภาคเหนือตอนบน
๒๒. นายสุรพงศ์	เพ็ญประไพ	ขบ.ขป.๑
๒๓. นายสิทธิวิชัย	โชติธัญรัตน์	ขผ.ห้วยฮ่องไคร้
๒๔. นายปิยะพงศ์	เกื้อเกิน	วิชรชลประทานชำนาญการ
๒๕. นายสิริวิชัย	วงศ์สุวรรณคูหา	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๖. นางสาวณัฐวรา	มาเป็ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ ประธานกล่าวเปิดประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งและแทนตำแหน่งที่ว่างหลายแห่ง และมีการปรับตัวในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในคราวการประชุมนี้ เพื่อเป็นการติดตามงานสำนักงานชลประทานและโครงการในความรับผิดชอบดำเนินการ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สรุปสถานการณ์พื้นที่อุทกภัยปี ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง การกักเก็บน้ำและปริมาณน้ำมีเพียงพอหรือไม่ การบริหารจัดการน้ำและมาตรการในช่วงฤดูแล้ง และเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย รายงานความก้าวหน้าของงาน


ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ สภาพภูมิอากาศ


นายอานนท์ อินทรประสาท ผอช.ภาคเหนือตอนบน รายงานสสสภาพทั่วไป ณ ปัจจุบัน สภาพอากาศคาดการณ์แนวโน้มสภาพทั่วไป ทุกกลุ่มน้ำที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือตอนบน ๖ กลุ่มน้ำ ๘ จังหวัด สถานการณ์น้ำช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีแนวโน้มจะลดลงบ้างเล็กน้อย และขอมอบหมายให้นายอุ เทน คำแปง วป.อช.ภาคเหนือตอนบน เป็นผู้รายงาน



กราฟแสดงปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือน-รายปี (ปีน้ำ 2567)
สถานี P.5 น้ำแม่กวัง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ลำพูน

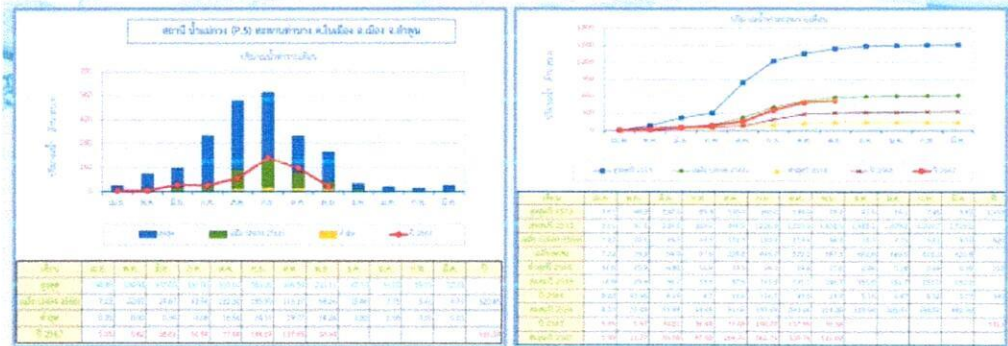

กราฟแสดงปริมาณน้ำสะสมรายเดือน-รายปี (ปีน้ำ 2567)
สถานี Sw.5A น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


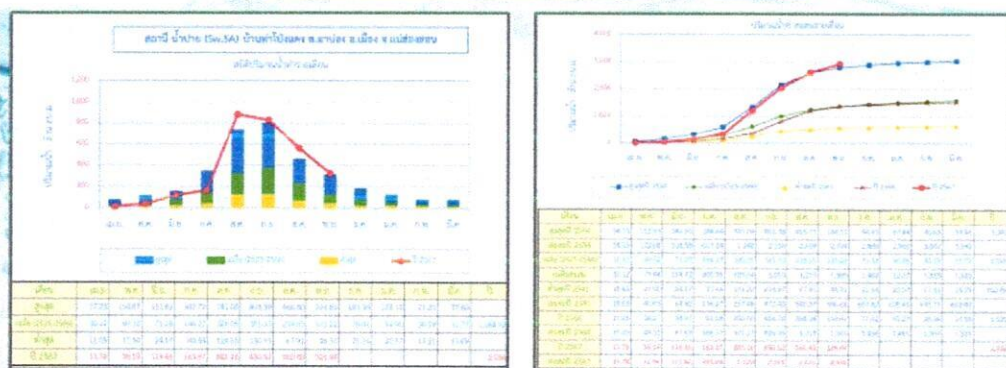


แผนงานแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน ๖ ลุ่มน้ำ จำนวน ๘ โครงการ สถานีสำรวจ
อุทกวิทยา ปีน้ำ ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๘๖ สถานี แผนการตั้งสถานีตรวจวัดทางอุทกวิทยาเพิ่มเติม ลุ่มน้ำสาละวิน
๘ แห่ง ลุ่มน้ำปิง ๗ แห่ง ลุ่มน้ำยม ๖ แห่ง ลุ่มน้ำน่าน ๖ แห่ง ลุ่มน้ำโขงเหนือ ๑๗ แห่ง รวมทั้งหมด ๔๔ สถานี



แผนงานแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย
ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน 6 ลุ่มน้ำ

[illegible]

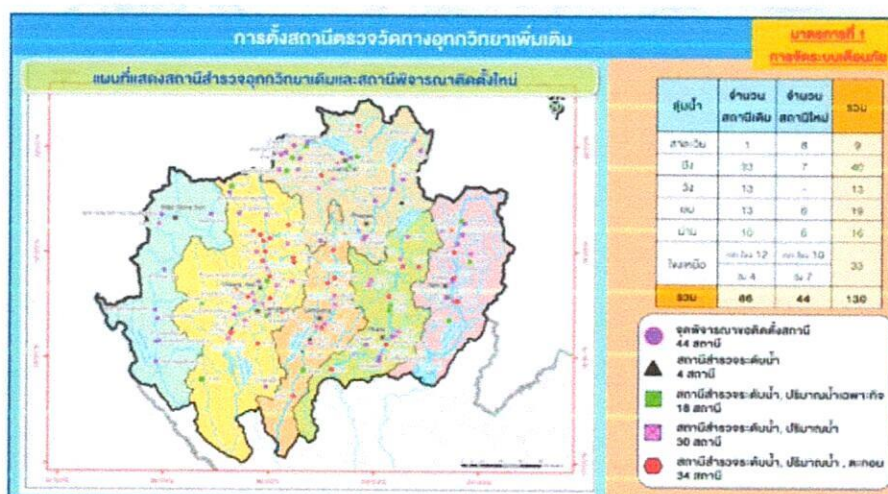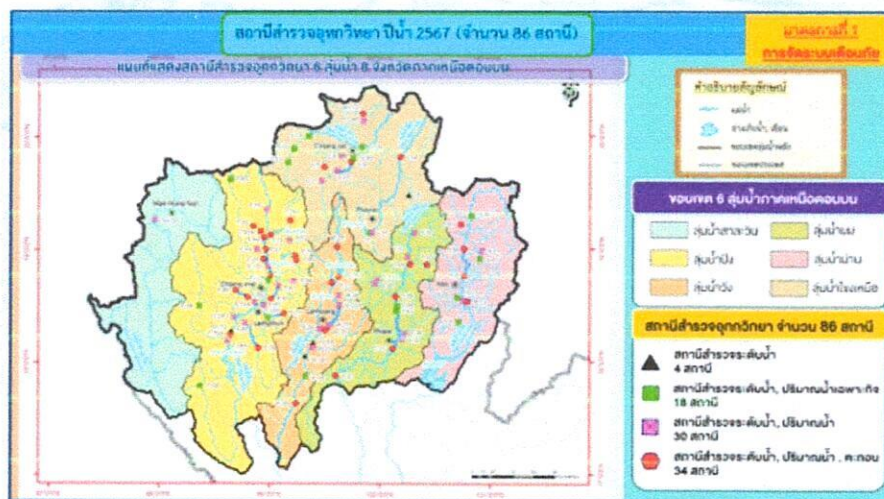

ประธาน จากการถอดบทเรียนอุทกภัย มีการปรับปรุง ๓๑ สถานี สร้างใหม่ ๗ สถานี เชียงใหม่ เดิม ๗ สถานี สร้างใหม่ ๘ สถานี จะดำเนินการแล้วเสร็จทันระยะเวลาช่วงฤดูฝน ปี๒๕๖๘ หรือไม่ สถานี 104A ที่มีปัญหา ดำเนินการอย่างไรหรือต้องรื้อถอนออกหรือไม่

ผอ.ภาคเหนือตอนบน สถานี 104A ปัจจุบันใช้งานได้ปกติ สามารถเข้าดูได้ รับทราบและจะนำข้อมูลหารือกับแผนงาน

๒.๒ สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ

นายจิรัชย์ พัฒนพงศ์ ผจบ.ขป.๑ รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ๒๕๖๗/๒๕๖๘ สถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑ การกักเก็บน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำเก็บกักปัจจุบัน ๒๘๔.๔๘๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๓๕ % น้อยกว่าปี ๒๕๖๖ = ๒.๔๙๔ ล้าน ลบ.ม. (๐.๘๗ %) ปี ๒๕๖๖ มีปริมาณน้ำ ๒๘๖.๙๗๖ ล้าน ลบ.ม.(๑๐๘.๒๙ %) เขื่อนแม่งาว อุดมธารา มีปริมาณน้ำเก็บกักปัจจุบัน ๒๑๘.๔๗๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๗ % มากกว่าปี ๒๕๖๖ = ๘.๙๖๑ ล้าน ลบ.ม. (๔.๒๘ %) ปี ๒๕๖๖ มีปริมาณน้ำ ๒๐๙.๕๐๙ ล้าน ลบ.ม. (๗๙.๖๖ %) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีน้ำกักเก็บ ๕๐๒,๙๕๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๕% อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๑๙ แห่ง ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ๑๖ แห่ง ดีมาก ๓ แห่ง มีน้ำกักเก็บ ๑๒๒.๒๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๘% อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๑๙๐ แห่ง มีน้ำกัก ๙๖.๘๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙%

ประธาน...

การบริหารจัดการน้ำ อุทกภัย และการเตรียมพร้อมรับมือ ปี 2566/67

- จัดสรรน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคในช่วงฤดูแล้ง**
Illustration: Water tap, water bottles, and a person drinking.
- จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทาน**
Illustration: A dam and a person watering plants.
- สำรองน้ำไว้สำหรับภาคการใช้น้ำในช่วงที่ฤดูฝนมีน้ำล้นเกิน**
Illustration: A person holding a bucket, a person watering plants, and a person using a hose.
- จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม**
Illustration: A person watering plants and a person using a hose.
- จัดสรรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม**
Illustration: A factory and a person using a hose.

8 มาตรการรองรับ วิกฤตแล้ง ปี 2567/68

- 1** ลดการใช้น้ำและประหยัดน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
(ประปาส่วนภูมิภาค)
- 2** เพื่อการปลูกพืชไร่และสวนผลไม้ที่ใช้น้ำน้อยและการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
(กรมชลประทาน)
- 3** กำหนดแผนจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
(กรมชลประทาน)
- 4** เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ประหยัดน้ำ และลดการสูญเสียในภาคครัวเรือน
(ประปาส่วนภูมิภาค)
- 5** เลี้ยงวัวและไก่ไข่อุณหภูมิเย็น
(กรมปศุสัตว์)
- 6** เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชน/องค์กรผู้ใช้น้ำ
(กรมชลประทาน)
- 7** สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์
(กรมชลประทาน)
- 8** ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
(กรมชลประทาน)


Source: กรมชลประทาน วันที่ 1 ตุลาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการประเภทฯ/โครงการส่วนฯ	พื้นที่เทศบาลฯ (ไร่)									ผลการดำเนินงาน ที่คาดหวัง
		ข้าวบึง	ทุ่งไผ่	พืชน้ำ	ผืนย	ไม้ผล	ไม้ยืนต้น	ปลูกป่า	ปล่อย	อื่นๆ	
1	โครงการชลประทานบึงแก้ว	25,157	4,192	2,494	-	41,190	555	350	-	73,938	48,78
2	โครงการชลประทานทุ่งกุ่ม	8,500	135	1,638	4	65,096	704	555	-	76,632	57,09
3	โครงการชลประทานบึงสีฐาน	-	9,311	26	-	1,040	170	161	-	10,814	3,67
4	โครงการชลประทานบึงน้ำเต้า	43,264	5,990	2,171	-	19,782	-	405	-	154	71,766
5	โครงการชลประทานบึงน้ำเต้า	50,000	-	-	-	32,064	-	-	-	-	82,066
6	โครงการชลประทานบึงน้ำเต้า	-	1,988	-	-	27,628	-	726	-	30,342	29,26
	รวม	126,921	21,616	6,329	4	186,802	1,429	2,197	-	260	345,558


สรุปพื้นที่การเพาะปลูกในเขตพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ปี 2567/68

การบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่มดสมบูรณ์ชล ฤดูแล้ง ๒๕๖๗/๖๘ ลำดับความสำคัญ ๑. อุปโภค-บริโภค ๒. รักษาระบบนิเวศน์และการท่องเที่ยว ๓. การเกษตร ๔.อุตสาหกรรม ปริมาณน้ำคาดการณ์ ณ ๑ ม.ค.๖๘ ๒๘๐ ล้าน ลบ.ม. (๑๐๖%) ปีที่แล้ว ๒๘๕.๗๓ ล้าน ลบ.ม. (๑๐๘%) โดยส่งน้ำในพื้นที่โครงการแม่แฝก-แม่จัด ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ตลอดลำน้ำปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน ๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับอุปโภค-บริโภค ประปา ๒๕ ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์และเพื่อการเกษตร ๔๙ ล้าน ลบ.ม. และท่องเที่ยว ๑ ล้าน ลบ.ม.


แผนการส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๖๘ ๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มส่งน้ำ ๒ ม.ค. ๖๘ แผนส่งน้ำทั้งหมด ๒๑ รอบเวร ๗๕ ล้าน ลบ.ม.(ปีที่แล้ว ๒๑ รอบเวร ๘๑.๒๒ ล้าน ลบ.ม.) ผลการส่งน้ำ ฝ่าย / ปตร. ทุกแห่ง ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ได้รับน้ำเพียงพอ

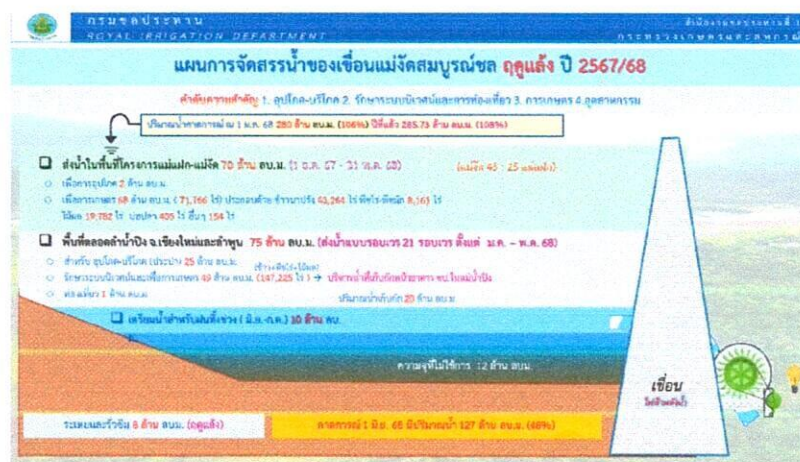

แผนการจัดสรร...

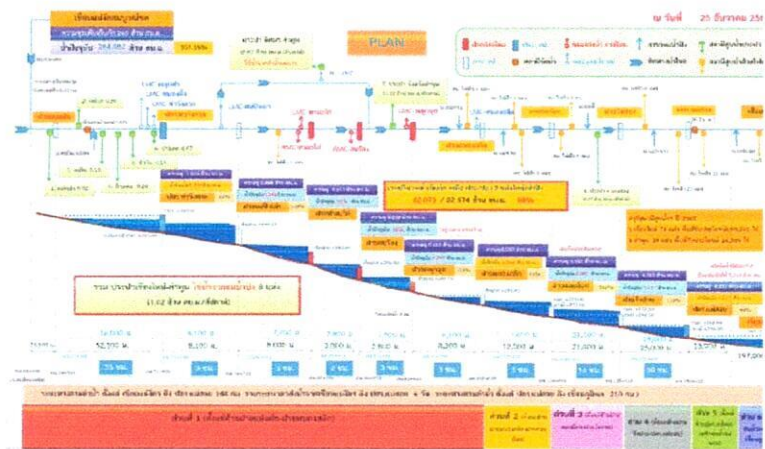

คาดการณ์ปริมาณน้ำในคาดการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดฯ ปี ๒๕๖๘ ปริมาณน้ำเก็บกักสูงสุด ๑๒.๕ MCM ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ม.ค.๖๘ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก ๒๔๔.๓๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คาดการณ์ช่วงเดือน ๑ มิ.ย.๖๘ ๑๒๗ ล้าน คิดเป็นร้อยละ ๔๘%

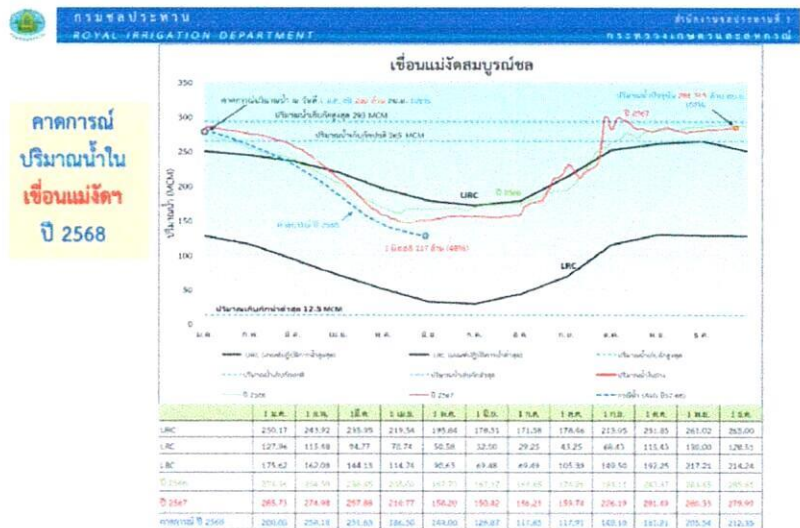


แผน/ผล การบริหารจัดการน้ำ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ฤดูแล้ง ๒๕๖๗/๖๘ การจัดสรรน้ำของเขื่อนแม่งัดฯ ฤดูแล้งปี ๒๕๖๗/๖๘ เริ่มส่งน้ำเริ่มส่ง ๒๐ ธันวาคม สิ้นสุด ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๙ รอบเวรการส่งน้ำ ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๒๐๘.๖๔๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๙.๓๓ % แผนการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ปี ๒๕๖๗/๖๘ ๘๗.๖๒๐ ล้าน ลบ.ม. (๘๒,๐๖๖ ไร่) ข้าวนาปรัง ๕๐,๐๐๐ ไร่ ไม้ผล ๓๒,๐๖๖ ไร่



คาดการณ์...

คาดการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งาวฯ ปี ๒๕๖๘ ปริมาณน้ำเก็บกักสูงสุด ๒๙๕ MCM ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ม.ค.๖๘ ๒๑๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๑% ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก ๒๑๗.๑๘ ล้าน ลบ.ม.

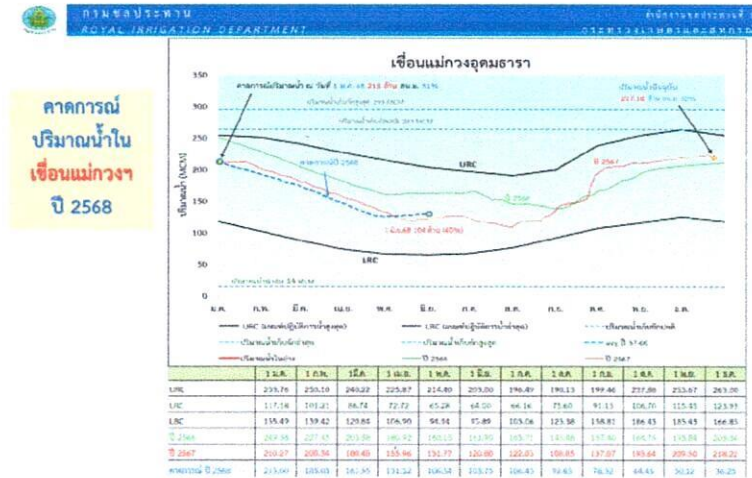

กรมชลประทาน ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่งาวอุทกสงเคราะห์

ประกาศโครงการ เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี พ.ศ.๒๕๖๘

การเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน จำนวน ๖ แห่งจัดเตรียมแผน/ผลการใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและอุปโภค-บริโภค ปี ๒๕๖๗/๖๘ เครื่องสูบน้ำ ๘ - ๑๒ นิ้ว จำนวน ๕๙ เครื่อง รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๕ คัน รถชุดดินตะขบ จำนวน ๘ คัน รถบรรทุก จำนวน ๘ คัน รถบรรทุกพร้อมปั้นจั่น จำนวน ๘ คัน และเครื่องจักรกลสนับสนุนอื่น ๆ ๑๒ หน่วย รวมเครื่องจักร-เครื่องมือ จำนวนทั้งสิ้น ๙๘ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำผ่านช่องทางต่าง ๆ





ประธาน ประเด็นผู้ได้รับผลกระทบโครงการแม่สอยมีมาตรการหรือดำเนินการอย่างไรขอให้ติดตามและเร่งรัดด้วย

ผสภ.๑ เบื้องต้นมีการประสานดำเนินการนัดหมายเข้าตรวจสอบพื้นที่ และจัดทำหนังสือแจ้งเรียบร้อยแล้ว

๒.๓ - ผลการดำเนินการงบประมาณเหลือจ่าย ๒๕๖๗

นายจักรกฤษณ์ ขมภูบาง ผผง.ขป.๑ รายงานสรุปผลการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินกันเหลือปี ๒๕๖๗) เบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานชลประทานที่ ๑ ดำเนินการในส่วนของเงินกันเหลือปีกันไว้ทั้งหมด ๑๕๙ รายการ แยกเป็น งบ พรบ. ๖๖๗ ๓๒๗,๓๖๑,๑๒๙.๔๓ บาท ๗๕ รายการ งบเพิ่มเติม(โอนเปลี่ยนแปลง) ๑๒๘,๗๖๒,๐๐๒.๙๙ บาท ๑๖ รายการ งบกลาง ๒๕๖๗ ๓๕๕,๒๗๕,๘๐๐ บาท ๖๓ รายการ งบกลาง กปร.๒๕๖๗ ๙๙,๗๘๖,๒๕๓.๒๐ บาท ๕ รายการ รวมงบประมาณกันเหลือปี ๙๑๐,๘๙๑,๐๒๕.๗๖ บาท คืนเงินกลับส่วนกลาง ๔,๑๕๗,๘๓๑.๙๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๖,๙๙๑,๑๘๑.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๕% แล้วเสร็จ ๑๖ รายการ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน ๑๔๓ รายการ โดยเป็นงานของโครงการชลประทานเชียงใหม่ ๗๖ รายการ โครงการชลประทานลำพูน ๒๗ รายการ โครงการชลประทาน แม่ฮ่องสอน ๑๓ รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จันดอ รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ๒๓ รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง ๑ รายการ และโครงการก่อสร้าง สขป.๑ ๑๒ รายการ

สรุปผล...

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เงินกันเหลือปี 67)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2567

ที่	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณที่กั้นเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
		พรบ.67		งบเพิ่มปี 67 (งบแก้ไขเพิ่มเติม)		งบกลาง 2567		งบกลาง กท.2567	
		รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)
1	คป.เชื้อโรค	27	95,361,129.43	8	51,349,198.99	37	126,494,600	4	84,906,553.20
2	คป.สำเนา	10	22,713,691.84	6	65,480,761.00	11	61,683,000		
3	คป.แม่ฮ่องสอน	3	3,3389,371.91	2	11,932,043.00	7	62,656,100	1	14,879,700.00
4	คป.แม่ฮ่องสอน	6	12,730,917.75						
5	คป.แม่ฮ่องสอน	22	43,288,407.92			1	93,500		
6	คป.แม่ฮ่องสอน	1	744,460.00						
7	ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้	1	3,850,000.00						
8	โครงการก่อสร้าง สขป.1	5	144,968,990.72			7	104,348,600		
	รวมทั้งสิ้น	75	327,066,969.57	16	128,762,002.99	63	355,275,800	5	99,786,253.20
								159	910,891,025.76

สรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินกันเหลือปี 67)
สำนักงานชลประทานที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2567

โครงการ/แผนงาน	(รายการ)	กันเหลือปี 67 (บาท)	เงินในงบส่วนกลาง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น (%)	แล้วเสร็จ (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)
โครงการชลประทานเชียงใหม่	76	358,111,481.62	1,419,431.00	84,839,923.07	23.79	3	73
โครงการชลประทานลำพูน	27	149,878,452.84	-	94,572,268.18	63.10	7	20
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	13	92,857,214.91	-	31,378,346.80	33.79	2	11
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แม่มัด	6	12,730,917.75	5,182.45	7,318,631.50	57.49	4	2
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แม่มัด	23	43,381,907.92	2,733,218.49	12,773,170.93	31.42	-	23
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แม่มัด	1	744,460.00	-	531,068.45	71.34	-	1
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	1	3,850,000.00	-	-	-	-	1
โครงการก่อสร้าง สขป.1	12	249,337,590.72	-	65,577,773.00	26.30	-	12
รวมทั้งสิ้น	159	910,891,025.76	4,157,851.94	296,991,181.93	32.75	16	143

สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภาพรวมได้รับงบประมาณ ๓๔๓ โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๑,๐๑๗,๕๔๓ บาท (แยกรายการ สขป.๑) จำนวน ๑๑ โครงการ วงเงินงบประมาณได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๘๘,๗๔๘,๓๒๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๙๑๙,๘๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๘% เป้าหมายเบิกจ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ของสำนักงานชลประทานที่ ๒๒.๘๐% ผลงาน ๓%



สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ งบ พ.ร.บ. 68 (แยกรายการ สขป.1)

ประชาสัมพันธ์...

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	โครงการ	พรบ.68		ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น		ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมายเบิกจ่าย สขป.1 เดือน ธ.ค.67	ผลงาน (%)
		จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย พรบ.68		
	สขป.1	11	93,222,430	11	89,748,327	2,919,863	3.25	3.13	22.80	3
1	ส่วนเครื่องจักรกล	1	1,950,000	1	1,950,000	-	0.00	0.00	15.00	0
2	ส่วนบริหารทั่วไป	7	11,550,000	7	11,550,000	-	0.00	0.00	23.00	0
3	ส่วนวิศวกรรม	1	14,520,000	1	13,870,000	383,953	2.77	2.64	20.00	7
4	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	2	33,470,000	2	31,777,897	711,204	2.24	2.12	30.00	2
5	สำนักงานวิชาการ		31,732,430		30,600,430	1,824,706	5.96	5.75	26.00	6

โครงการ...

๑. โครงการชลประทานเชียงใหม่ จำนวน ๗๖ โครงการ แล้วเสร็จ ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๓ โครงการ มีรายการที่ผลการดำเนินงานค่อนข้างน้อยคือ ลำดับที่ ๒๒ ขุดลอกตะกอนหน้าฝายเหมืองใหม่ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กั้นเงินเหลือมอบไว้ ๔๙๑,๗๐๑ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ลำดับที่ ๓๐ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำคลองแม่ข่า ตำบลตอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กั้นเงินเหลือมอบไว้ ๙,๖๙๘,๑๓๐ บาท ลำดับที่ ๔๕ ซ่อมแซมระบบ High pressure gate อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ กั้นเงินเหลือมอบไว้ ๑,๕๑,๙๐๐ บาท

ประธาน ให้โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของทุกโครงการที่คงค้างการเบิกจ่าย และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และรายงานให้เป็นปัจจุบัน

โครงการชลประทานเชียงใหม่ รับทราบ

ลำดับที่	กิจกรรม	เงินที่ได้รับบริจาค	เงินค่าจ้าง	% เงินจ้าง	งบรวม รวม	งบเฉลี่ย	เงินในงบพัฒนาฯ	งบรวมงบฯ	งบเฉลี่ย
		761,871,760.66	294,871,181.93				390,123,914.89	4,137,810.74	
	โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ ด้านรวม 76 โครงการ	390,111,481.62	84,839,923.67				271,855,117.55	1,419,431.50	
1	(1) เชื้อเพลิงรถยนต์สำหรับโครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ 3 แห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 2 แห่งที่ 0.10 กิโลเมตร ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม	2,743,147.51	1,900,585.15	47.30	80.00	84,217.56	-		RU WSL.67
2	(2) เชื้อเพลิงรถยนต์สำหรับโครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ 1 แห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 1 แห่งที่ 0.10 กิโลเมตร ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม	1,428,991.14	1,903,436.30	70.22	85.00	425,467.17	-		RU WSL.67
3	(3) เชื้อเพลิงรถยนต์สำหรับโครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ 1 แห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 1 แห่งที่ 0.10 กิโลเมตร ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม	587,184.28	380,742.15	73.07	73.00	126,442.13	-		RU WSL.67
4	(4) เชื้อเพลิงรถยนต์สำหรับโครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ 1 แห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 1 แห่งที่ 0.10 กิโลเมตร ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม	5,677,422.27	1,414,967.48	25.09	45.00	2,219,561.82	-		RU WSL.67
5	(5) เชื้อเพลิงรถยนต์สำหรับโครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ 1 แห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 1 แห่งที่ 0.10 กิโลเมตร ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม	2,625,925.25	1,458,987.80	80.00	93.00	38,942.45	-		RU WSL.67
6	(6) เชื้อเพลิงรถยนต์สำหรับโครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ 1 แห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 1 แห่งที่ 0.10 กิโลเมตร ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม	2,473,361.22	1,321,147.85	56.90	56.00	1,152,213.37	-		RU WSL.67
7	(7) เชื้อเพลิงรถยนต์สำหรับโครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ 1 แห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 1 แห่งที่ 0.10 กิโลเมตร ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม	3,740,306.37	949,427.55	24.41	40.00	2,975,478.82	-		RU WSL.67
8	(8) เชื้อเพลิงรถยนต์สำหรับโครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ 1 แห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 1 แห่งที่ 0.10 กิโลเมตร ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม	977,256.00	308,434.00	32.31	100.00	70,192.00	270.00	PRU 12/2017.20 SA.67	RU WSL.67
9	(9) เชื้อเพลิงรถยนต์สำหรับโครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ 10 แห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 1 แห่งที่ 0.10 กิโลเมตร ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม	2,593,134.00	1,183,716.40	57.55	84.00	1,285,744.00	-		RU WSL.67
10	(10) เชื้อเพลิงรถยนต์สำหรับโครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ 1 แห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 1 แห่งที่ 0.10 กิโลเมตร ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม	702,838.74	275,935.80	39.24	40.00	426,744.94	-		RU WSL.67
11	(11) เชื้อเพลิงรถยนต์สำหรับโครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ 1 แห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 1 แห่งที่ 0.10 กิโลเมตร ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม ด้านรวมรวม	278,547.30	212,990.55	24.41	70.00	243,374.85	-		RU WSL.67

ลำดับที่	ชื่องาน	เงินที่อนุมัติ/เบิก	ปีงบประมาณ	% อนุมัติ/เบิก	งบการเงิน	รวมแล้ว	ปีงบประมาณก่อนหน้า	หมายเหตุ	งบการเงิน
12	(1.4) ผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 1,507 กิจกรรม จำนวนรวมแล้ว จำนวนเงิน: 3,012,248.80	3,012,248.80	3,012,248.80	100.00	100.00	-	1,668,614.63	งบ เอกสาร 20	งบ งบ.67
13	(1.5) เชื้อเพลิงยานพาหนะที่ใช้ในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยรวมเงินที่อนุมัติจากโครงการฯ ซึ่งใช้ปีงบประมาณ 1,350.16 จำนวนเงิน: 3,177,959.47	1,350,179.47	1,468,704.63	81.75	98.00	3,177,959.47	-	-	งบ งบ.67
14	(1) เชื้อเพลิงยานพาหนะที่ใช้ในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งใช้ปีงบประมาณ 207.16 จำนวนเงิน: 438,462.72	438,462.72	438,462.72	100.00	98.00	-	662.33	งบ เอกสาร 20	งบ งบ.67
15	(5.2) งบค่าเบี้ยเลี้ยงรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งรวมเงินที่อนุมัติจากโครงการฯ จำนวนเงิน: 4,412,218.74	4,412,218.74	1,388,830.00	21.80	62.00	5,223,530.01	-	-	งบ งบ.67
16	(5.3) เชื้อเพลิงยานพาหนะที่ใช้ในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยรวมเงินที่อนุมัติจากโครงการฯจำนวนเงิน: 5,617,171.55	5,617,171.55	1,758,482.75	18.44	35.00	4,418,068.60	-	-	งบ งบ.67
17	(5.4) เชื้อเพลิงยานพาหนะที่ใช้ในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยรวมเงินที่อนุมัติจากโครงการฯจำนวนเงิน: 2,284,789.35	2,284,789.35	995,945.90	44.17	14.00	1,238,811.43	-	-	งบ งบ.67
18	(5.5) ค่าเช่ารถโดยสารประจำทาง (รถโดยสารสาธารณะ) ตามสัญญาเช่ารถโดยสารสาธารณะจำนวนเงิน: 4,860,448.37	4,860,448.37	542,712.35	11.58	87.00	4,407,124.02	-	-	งบ งบ.67
19	(5.6) ผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 1,507 กิจกรรม จำนวนรวมแล้ว จำนวนเงิน: 3,012,248.80	3,012,248.80	3,012,248.80	100.00	100.00	-	-	-	งบ งบ.67
20	(5.7) ผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 1,507 กิจกรรม จำนวนรวมแล้ว จำนวนเงิน: 3,012,248.80	3,012,248.80	3,012,248.80	100.00	100.00	-	-	-	งบ งบ.67
21	(5.8) ผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 1,507 กิจกรรม จำนวนรวมแล้ว จำนวนเงิน: 3,012,248.80	3,012,248.80	3,012,248.80	100.00	100.00	-	-	-	งบ งบ.67
22	(5.9) ผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 1,507 กิจกรรม จำนวนรวมแล้ว จำนวนเงิน: 3,012,248.80	3,012,248.80	3,012,248.80	100.00	100.00	-	-	-	งบ งบ.67
23	(5.10) ผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 1,507 กิจกรรม จำนวนรวมแล้ว จำนวนเงิน: 3,012,248.80	3,012,248.80	3,012,248.80	100.00	100.00	-	-	-	งบ งบ.67
24	(5.11) ผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 1,507 กิจกรรม จำนวนรวมแล้ว จำนวนเงิน: 3,012,248.80	3,012,248.80	3,012,248.80	100.00	100.00	-	-	-	งบ งบ.67

ลำดับที่	ชื่องาน	เงินงบประมาณ	เงินจ่าย	% เงินจ่าย	ผลงาน สัมฤทธิ์	ต้นทุน	ต้นทุนเกิน/ขาด	หมายเหตุ	แหล่งเงิน
25	(1.5713) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 50,000 ลูกบาศก์เมตร ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	1,850,243.80	35,906.30	1.93	3.00	1,799,317.50	-		งบ พรบ.67
26	(2.13) การปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณรอบวัดบ้านท่าอิฐ 2 ด้านโครงการ 1,800 ไร่ ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	33,041,840.36	17,589,310.40	60.49	80.00	15,452,529.96	-		งบ พรบ.67
27	(33) การปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณรอบวัดบ้านท่าอิฐ 2 ด้านโครงการ 1,800 ไร่ ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	8,124,593.83	352,667.13	3.51	-	4,801,372.70	-		งบ พรบ.67
28	(3.5) การปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณรอบวัดบ้านท่าอิฐ 2 ด้านโครงการ 1,800 ไร่ ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	1,383,420.00	1,041,114.43	81.34	77.00	243,434.58	78,810.99	งบ.1224767 20 พรบ.67	โอนเงินอุดหนุน
29	(3.5) การปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณรอบวัดบ้านท่าอิฐ 2 ด้านโครงการ 1,800 ไร่ ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	3,764,321.53	415,440.00	10.99	8.00	3,348,881.53	-		โอนเงินอุดหนุน
30	(3.5) การปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณรอบวัดบ้านท่าอิฐ 2 ด้านโครงการ 1,800 ไร่ ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	9,470,130.00	-	-	-	9,470,130.00	-		โอนเงินอุดหนุน
31	(3.5) การปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณรอบวัดบ้านท่าอิฐ 2 ด้านโครงการ 1,800 ไร่ ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	6,344,472.08	1,074,454.43	17.23	35.00	5,269,917.63	-		โอนเงินอุดหนุน
32	(3.5) การปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณรอบวัดบ้านท่าอิฐ 2 ด้านโครงการ 1,800 ไร่ ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	2,123,071.89	1,473,375.40	78.82	79.00	449,696.49	-		โอนเงินอุดหนุน
33	(3.5) การปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณรอบวัดบ้านท่าอิฐ 2 ด้านโครงการ 1,800 ไร่ ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	8,783,742.18	445,914.60	5.07	7.00	8,337,827.58	-		โอนเงินอุดหนุน
34	(3.5) การปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณรอบวัดบ้านท่าอิฐ 2 ด้านโครงการ 1,800 ไร่ ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	9,783,155.00	665,997.01	6.81	3.00	9,117,157.99	-		โอนเงินอุดหนุน
35	(3.5) การปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณรอบวัดบ้านท่าอิฐ 2 ด้านโครงการ 1,800 ไร่ ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	3,334,553.91	1,822,514.88	54.54	20.00	1,512,039.03	-		โอนเงินอุดหนุน
36	(3.5) การปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณรอบวัดบ้านท่าอิฐ 2 ด้านโครงการ 1,800 ไร่ ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	3,800,700.00	533,090.63	13.94	8.00	3,267,609.37	113,798.35	งบ.1224767 18 พรบ.67	งบกลาง ยุทธวิธี
37	(3.5) การปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณรอบวัดบ้านท่าอิฐ 2 ด้านโครงการ 1,800 ไร่ ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	220,000.00	96,123.50	43.78	20.00	123,876.50	-		งบกลาง ยุทธวิธี
38	(3.5) การปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณรอบวัดบ้านท่าอิฐ 2 ด้านโครงการ 1,800 ไร่ ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	600,000.00	665,417.64	75.62	10.00	214,582.36	-		งบกลาง ยุทธวิธี
39	(3.5) การปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณรอบวัดบ้านท่าอิฐ 2 ด้านโครงการ 1,800 ไร่ ด้านการก่อสร้าง ด้านเงินอุดหนุน จังหวัดลพบุรี	4,500,000.00	1,076,826.35	24.37	8.00	3,423,173.65	-		งบกลาง ยุทธวิธี

ผผ.ชป.๑ ๒. โครงการชลประทานลำพูน จำนวน ๒๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗ โครงการ มีรายการที่ผลการดำเนินงานค่อนข้างน้อยคือ ลำดับที่ ๑ ปรับปรุงอาคารคลังน้ำมันและอาคารประกอบ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กันเงินเหลือปีไว้ ๒,๕๘๖,๐๓๐.๘๓ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ลำดับที่ ๘ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทานลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กันเงินเหลือปีไว้ ๕,๓๑๖,๐๘๙ บาท เบิกจ่าย ๖๔.๔๘% ลำดับที่ ๙ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจำงหามา อ่างเก็บน้ำโอง่าง ตำบลทาปาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กันเงินเหลือปีไว้ ๗๗๕,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ลำดับที่	ชื่องาน	เงินงบประมาณ	เงินจ่าย	% เงินจ่าย	ผลงาน สัมฤทธิ์	ต้นทุน	ต้นทุนเกิน/ขาด	หมายเหตุ	แหล่งเงิน
1	(1.542) ปรับปรุงอาคารคลังน้ำมันและอาคารประกอบ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	145,878,452.84	94,572,246.18	-	-	53,306,184.66	-		งบ พรบ.67
2	(1.7) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ RWC พร้อมอาคารประกอบด้านรับน้ำฝาย ความยาว 1,000 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,344,456.34	357,030.40	26.55	53.00	987,425.94	-		งบ พรบ.67
3	(1.7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำห้วยหิดด ระยะที่ 2 ความยาว 0.457 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	4,445,000.00	4,445,000.00	100.00	100.00	-	-		งบ พรบ.67
4	(1.7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำห้วยหิดด ระยะที่ 3 ความยาว 0.540 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	3,871,400.54	2,041,266.00	55.40	96.00	1,830,134.54	-		งบ พรบ.67
5	(2.43) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 55-4-NC (เหนือฝาย) ระยะที่ 2 ความยาว 0.600 กิโลเมตร ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	854,780.57	778,476.83	91.07	96.00	76,303.74	-		งบ พรบ.67
6	(2.43) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 64-4-NC (เหนือฝาย) ระยะที่ 3 ความยาว 1.000 กิโลเมตร ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,149,804.16	1,733,000.00	81.54	83.00	396,794.16	-		งบ พรบ.67
7	(1.743) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหิดด พร้อมอาคารประกอบด้านรับน้ำฝาย ความยาว 1,000 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	80,000.00	80,000.00	100.00	100.00	-	-		งบ พรบ.67
8	(1.5243) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	5,314,089.00	3,454,389.00	64.95	64.00	1,859,700.00	-		งบ พรบ.67
9	(1.5714) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจำงหามา ด้านรับน้ำฝาย โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	975,000.00	-	-	12.00	975,000.00	-		งบ พรบ.67
10	(1.5715) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจำงหามา ด้านรับน้ำฝาย โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,287,890.00	1,287,890.00	100.00	100.00	-	-		งบ พรบ.67
11	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหิดด พร้อมอาคารประกอบด้านรับน้ำฝาย ความยาว 1,000 กิโลเมตร ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,416,700.00	533,723.08	36.14	30.00	882,976.92	-		โอนเงินอุดหนุน
12	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหิดด พร้อมอาคารประกอบด้านรับน้ำฝาย ความยาว 1,000 กิโลเมตร ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,416,700.00	400,011.00	29.43	1.00	1,016,689.00	-		โอนเงินอุดหนุน
13	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหิดด พร้อมอาคารประกอบด้านรับน้ำฝาย ความยาว 1,000 กิโลเมตร ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,355,537.80	554,078.78	40.90	80.00	801,459.02	-		โอนเงินอุดหนุน

ผคป.ลำพูน โครงการปรับปรุงอาคารคลังน้ำมันและอาคารประกอบ เนื่องจากมีกฎหมายของกรมควบคุมพลังงาน ต้องทำเรื่องขออนุญาตกรมพลังงานและท้องถิ่นด้วย ดำเนินการขออนุญาตท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่าเนื่องจากใบที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ขณะที่โครงการมีใบอนุญาตจากป่าไม้ระบุเป็นก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สารอย่างเดียว ไม่ได้ระบุให้ก่อสร้างคลังน้ำมันได้ ท้องถิ่นจึงไม่อนุมัติให้ก่อสร้างคลังน้ำมันได้ ต้องทำเรื่องขอเพิ่มเติมข้อความใบอนุญาตก่อน จึงจะสามารถดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างตามลำดับต่อไปได้ คาดต้องใช้ระยะเวลานานและต้องทำเรื่องขอเลื่อนขยายเวลาออก ผลงานสะสม ๙๒% คือ มีการดำเนินการปรับพื้นที่และตัวถังน้ำมันพร้อมแล้ว เหลือแค่ขั้นตอนการขออนุญาต ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการขอเพิ่มวัตถุประสงค์เป็นงานจ้างเหมาและงานดำเนินการเอง ซึ่งในส่วนงานดำเนินการเองได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ค้างงานจ้างเหมาที่ต้องรอใบอนุญาต ลำดับที่ ๘ โครงการค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทานลำพูน คาดดำเนินการแล้วเสร็จทันกำหนดระยะเวลา ลำดับที่ ๙ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำโองฮ่าง ตำบลทาปลาดุก อำเภอมะทิง จังหวัดลำพูน เป็นงานจ้างเหมา ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเข้าดำเนินการแล้วและเร่งรัดผู้รับจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา ลำดับที่ ๑๐-๑๓ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เป็นงานของส่วนเครื่องจักรกล กำลังดำเนินการต้องทยอยดำเนินการเนื่องจากเกษตรกรขอใช้น้ำ แผนการดำเนินงาน ๑๕๐ วัน แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ และคาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาทุกโครงการ

ผผง.ขป.๑ ๓. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๓ รายการ แล้วเสร็จ ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ รายการ

ลำดับที่	ชื่อกรม	เงินต้นขอรับ66	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบรวม สะสม	คงเหลือ	คืนเงินกับส่วนกลาง	หมายเหตุ	แหล่งเงิน
	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จำนวน 13 รายการ	92,857,214.91	31,378,346.80			61,478,868.11	-		
1	(1.57) ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำจากสถานีสูบน้ำจากฝายกั้นน้ำลำน้ำปาวไปสู่อ่างเก็บน้ำแม่สาร ตำบลแม่สาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,425,861.41	1,162,730.23	61.41	25.00	741,131.68	-		งบ พรบ.67
2	(1.76) ซ่อมแซมอาคารชลประทานและอาคารประกอบของโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลปาย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	338,000.00	338,000.00	100.00	100.00	-	-		งบ พรบ.67
3	(1.5273) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลปาย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,125,510.00	1,125,510.00	100.00	100.00	-	-		งบ พรบ.67
4	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลปาย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	4,119,210.00	5,411,948.15	34.22	-	3,727,261.85	-		โยนเบียดแม่ฮ่อง
5	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลปาย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	2,742,813.00	358,878.70	12.85	-	2,633,454.30	-		โยนเบียดแม่ฮ่อง
6	ขุดลอกคลองระบายน้ำฝายแม่ฮ่องสอน ปริมาณน้ำ 100,000 ลูกบาศก์เมตร ๕.๕๖ เมตร ๓.๕๖ เมตร ๕.๕๖ เมตร	13,000,000.00	8,562,032.80	22.81	-	11,657,967.20	-		งบกลาง ลูกบาศก์
7	ขุดลอกคลองระบายน้ำฝายแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1 ปริมาณน้ำ 100,000 ลูกบาศก์เมตร	13,000,000.00	6,062,629.55	40.42	-	8,937,370.45	-		งบกลาง ลูกบาศก์
8	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	7,000,000.00	1,362,450.00	19.47	-	5,637,550.00	-		งบกลาง ลูกบาศก์
9	ขุดลอกคลองระบายน้ำฝายแม่ฮ่องสอน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	3,000,000.00	1,030,200.00	34.33	-	1,969,800.00	-		งบกลาง ลูกบาศก์
10	ขุดลอกคลองระบายน้ำฝายแม่ฮ่องสอน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	8,000,000.00	1,030,200.00	12.86	-	6,969,800.00	-		งบกลาง ลูกบาศก์
11	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	8,650,000.00	1,003,840.00	11.61	-	7,646,160.00	-		งบกลาง ลูกบาศก์
12	ขุดลอกคลองระบายน้ำฝายแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	6,000,100.00	610,020.00	10.16	-	5,389,080.00	-		งบกลาง ลูกบาศก์
13	โครงการพัฒนาระบบชลประทานฝายแม่ฮ่องสอนโครงการพัฒนาระบบชลประทานฝายแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาระบบชลประทานฝายแม่ฮ่องสอนโครงการพัฒนาระบบชลประทานฝายแม่ฮ่องสอน) ตำบลปาย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	14,879,700.00	8,449,907.37	57.12	10.00	6,390,792.63	-		งบกลาง พรบ.67

ประธาน รายการลำดับที่ ๔-๑๒ มีการเบิกจ่ายแต่ยังไม่มีผลงานสะสม มีดำเนินการบ้างหรือไม่อยู่ในขั้นตอนไหนเป็นงานจ้างเหมาหรือดำเนินการเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาหรือไม่ ตรวจสอบการลงระบบให้ถูกต้องชัดเจน โครงการจำนวน ๒ รายการที่กันเงินไว้ตั้งปี ๒๕๖๖ ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนคาดว่าจะแล้วเสร็จหรือไม่ให้ดำเนินการติดตามงานด้วย

สรุปรายการ...

วศ.คป.แม่ฮ่องสอน โครงการแม่ฮ่องสอน รายการลำดับที่ ๔-๑๒ เป็นงานดำเนินการโดยส่วนเครื่องจักรกล คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำ เสริมสร้างระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำปาย จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน พล.อ.อรชุน พิบูลนครินทร์ฯ) เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ และมีการประกาศภัยพิบัติ ประกอบกับพื้นที่ค่อนข้างสูงชัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในมีนาคม โดยแผนโครงการวางไว้ถึงมิถุนายน ปัจจุบันมีการเข้าดำเนินการแล้ว

ผผง.ขป.๑ เป็นเงินงบประมาณของ กปร. มีกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาถึงเดือนกันยายน สามารถขยายระยะเวลาได้

วศ.คป.แม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ รายการ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน ๙๐๕ และ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหม้อ คืบเงินไปในปีที่แล้ว เนื่องจากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เป็นงบประมาณ กปร. รับทราบและจะติดตามการดำเนินงาน

ผผง.ขป.๑ ๔. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด จำนวน ๖ โครงการ แล้วเสร็จ ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ

ลำดับที่	ชื่องาน	วันที่ครบสัญญา	มูลค่า	% ค้ำประกัน	งบฯ งบฯ	คงเหลือ	คืนในงบปีงบการเงิน	หมายเหตุ	แหล่งเงิน
	โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 รายการ	12,730,917.75	7,316,632.50		งบฯ งบฯ	5,407,083.80	5,182.43		
1	(1.58) ปรับปรุงโครงการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบ งานด้านบริหารงาน จัดทำโดยบริษัท	6,775,107.41	6,096,630.30	72.47	99.00	2,256,677.11	-		งบฯ งบฯ 67
2	(1.55) 1) ขุดลอกคลองชลประทาน ด้านนิคมการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม (ด้านระบบ 5.5-6.5 กม.) โครงการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบงานด้านบริหารงาน จัดทำโดยบริษัท	69,950.20	67,550.00	100.00	100.00	-	2,630.20	งบฯ 1/22789/7-20 งบฯ 67	งบฯ งบฯ 67
3	(1.55) 2) ขุดลอกคลองชลประทาน ด้านนิคมการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม ด้านระบบงานด้านบริหารงาน จัดทำโดยบริษัท	65,265.00	65,218.00	100.00	100.00	-	65.00	งบฯ 1/22789/7-20 งบฯ 67	งบฯ งบฯ 67
4	(1.55) 1) ขุดลอกคลองชลประทาน ด้านนิคมการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม ด้านระบบงานด้านบริหารงาน จัดทำโดยบริษัท	61,691.40	61,145.00	100.00	100.00	-	2,195.40	งบฯ 1/22789/7-20 งบฯ 67	งบฯ งบฯ 67
5	(1.55) 2) ขุดลอกคลองชลประทาน ด้านนิคมการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม ด้านระบบงานด้านบริหารงาน จัดทำโดยบริษัท	65,221.45	65,200.00	100.00	100.00	-	21.45	งบฯ 1/22789/7-20 งบฯ 67	งบฯ งบฯ 67
6	(1.55) 3) ขุดลอกคลองชลประทาน ด้านนิคมการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม ด้านระบบงานด้านบริหารงาน จัดทำโดยบริษัท	4,214,681.49	1,964,667.20	28.13	99.00	5,170,626.69	-		งบฯ งบฯ 67

ผศบ.แม่แฝก-แม่จัดสมบูรณ์ชล จำนวน ๖ รายการ มีการคืนเงินกลับ ๔ รายการ และสามารถเบิกจ่ายครบ
ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนด

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน (เงินกันไว้เบิกเหลือปี 2567)							
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2567							
ลำดับ ที่	รายการ	รายการ	เงินประจำงวด	เบิกจ่าย	ข้อผูกพัน	คงเหลือ	เปอร์เซ็นต์ การเบิกจ่าย
	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2568 (เงินกันไว้เบิกเหลือปี 2567)	7	12,770,117.75	7,357,831.50	3,478,745.99	1,933,540.26	57.62%
	งบลงทุน	6	12,730,917.75	7,318,631.50	3,478,745.99	1,933,540.26	57.49%
	- แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1	4,234,683.89	1,064,057.20	2,704,587.99	466,038.70	25.13%
	- แผนงาน อุตสาหกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5	8,496,233.86	6,254,574.30	774,158.00	1,467,501.56	73.62%
	งบดำเนินงาน	1	39,200.00	39,200.00	-	-	100.00%
	- แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1	39,200.00	39,200.00	-	-	100.00%

การเบิกจ่าย...

ลำดับ ที่	รายการ	เงินประจำงวด	เบิกจ่าย	ข้อมูลเกิน	คงเหลือ	เปอร์เซ็นต์ การเบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน	ความพอ แล้วเสร็จ
	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2568 (เงินที่ได้รับอนุมัติปี 2567)	12,770,117.75	7,357,831.50	3,478,745.99	1,933,540.26	57.62%		
	งบลงทุน	12,730,917.75	7,318,631.50	3,478,745.99	1,933,540.26	57.49%		
	- แผนงาน บูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำ	4,234,683.89	1,064,057.20	2,704,587.99	466,036.70	25.13%		
1	งบประมาณ ขยายโครงการพัฒนาระบบชลประทานภาคใต้	4,234,683.89	1,064,057.20	2,704,587.99	466,036.70	25.13%	99	ไม่ครบ
	- แผนงาน บูรณาการโครงการจัดการทรัพยากรน้ำ	8,496,233.86	6,254,574.30	774,158.00	1,467,501.56	73.62%		
1	บริหารโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานภาคใต้	8,275,107.41	6,036,663.81	774,158.00	1,467,519.11	72.97%	99	ไม่ครบ
2	บูรณาการโครงการพัฒนาระบบชลประทานภาคใต้และโครงการพัฒนาระบบชลประทานภาคใต้	69,999.20	61,330.00	-	8,669.20	96.25%	100	ครบ
3	บูรณาการโครงการพัฒนาระบบชลประทานภาคใต้และโครงการพัฒนาระบบชลประทานภาคใต้	65,345.00	65,218.00	-	46.00	99.92%	100	ครบ
4	บูรณาการโครงการพัฒนาระบบชลประทานภาคใต้และโครงการพัฒนาระบบชลประทานภาคใต้	41,631.80	41,156.00	-	475.80	96.20%	100	ครบ
5	บูรณาการโครงการพัฒนาระบบชลประทานภาคใต้และโครงการพัฒนาระบบชลประทานภาคใต้	44,221.40	44,200.00	-	21.40	99.95%	100	ครบ
	งบดำเนินงาน	39,200.00	39,200.00	-	-	100.00%		
	- แผนงาน บูรณาการโครงการจัดการทรัพยากรน้ำ	39,200.00	39,200.00	-	-	100.00%		
1	ค่าตอบแทนโครงการพัฒนาระบบชลประทานภาคใต้	39,200.00	39,200.00	-	-	100.00%	100	ครบ

ลำดับ ที่	รายการ	รายการ	เงินประจำงวด	เบิกจ่าย	ข้อผูกพัน	คงเหลือ	เปอร์เซ็นต์ การเบิกจ่าย
	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2568	60	176,437,927.40	60,053,670.70	31,868,431.45	84,515,825.25	34.04%
	งบลงทุน	57	176,151,927.40	59,998,717.70	31,750,831.45	84,402,378.25	34.06%
	- แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2	45,569,311.64	5,627,087.38	9,412,247.51	33,529,976.75	11.59%
	- แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	46	117,024,315.76	45,647,820.44	22,338,583.94	49,037,911.38	39.01%
	- แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	9	10,558,300.00	8,723,899.88	-	1,834,490.12	82.63%
	งบดำเนินงาน	3	286,000.00	54,953.00	117,600.00	113,447.00	19.21%
	- แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	3	286,000.00	54,953.00	117,600.00	113,447.00	19.21%
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						

ผผง.ขป.๑ ๕. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จำนวน ๒๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ โครงการ รายการที่ผลการดำเนินงานค่อนข้างน้อยคือ ลำดับที่ ๒๓ โครงการกำจัดวัชพืชเหมืองแม่ข่าน้อย ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กันเงินเหลือมอบไว้ ๙๓,๕๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผศบ.แม่แตง งานทั้งหมด ๒๑ โครงการ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา รายการที่ ๒๒ ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสายใหญ่ กม.๑๖+๗๒๐ฯ กันเงินเหลือปี ๒,๒๙๖,๘๖๒.๙๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๕,๙๕๖.๕๐ บาท ผลงาน ๔.๘๗% คืนเงินกลับส่วนกลาง ๑๐ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๓๓,๒๑๘.๔๙ บาท โครงการกำจัดวัชพืชลำเหมืองแม่ข่าน้อย โดยเรือชุด เกิดปัญหาในส่วนของการกำจัดวัชพืช ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของส่วนเครื่องจักรกล

	โครงการฟื้นฟูและบำรุงรักษามลพิษ จำนวน 23 รายการ	43,381,997.92	12,773,170.93			27,875,518.50	2,733,218.69	
1	(1.11) ปรับปรุงจุดลงน้ำบริเวณหน้าสาย 2 ความยาว 0.112 กิโลเมตร โครงการฟื้นฟูและบำรุงรักษามลพิษ ด้านน้ำผิวดิน ส่วนต่อเติมถัง จักจั่นบริเวณนี้	976,157.51	593,097.85	41.63	50.92	551,157.11	51,882.67	งบ พ.ร.บ. 67
	(1.112) ปรับปรุงจุดลงน้ำ 18 x 7.5 - PVC เพื่อเพิ่มการประกอบ ระยะที่ 2 ความยาว 0.000 กิโลเมตร โครงการฟื้นฟูและบำรุงรักษามลพิษ ด้านน้ำผิวดิน	1,545,540.28	1,006,120.00	67.09	50.08	919,366.29	965,995.94	งบ พ.ร.บ. 67
3	(1.5) ปรับปรุงอาคารบำบัดน้ำเสียของตำบล กอ. 69-70 (ระยะที่ 1) โครงการ ฟื้นฟูและบำรุงรักษามลพิษ ด้านน้ำผิวดิน ด้านต่อเติมถัง จักจั่นบริเวณนี้	1,098,458.45	612,882.81	73.11	51.87	325,170.18	367,788.87	งบ พ.ร.บ. 67
4	(2.5) ปรับปรุงจุดลงน้ำ 21L-60C เพื่อเพิ่มการประกอบ (ระยะที่ 1) ความยาว 2.000 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวบริเวณนี้ มีงบในชุด โครงการ	22,029,055.41	6,267,017.30	28.47	14.04	15,764,870.23	237,130.88	งบ พ.ร.บ. 67

สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ จบ พ.ร.บ. 68										
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2567										
ลำดับที่	โครงการ	พ.ร.บ.68		ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น		ผลการเบิกจ่าย			เบิกจ่ายตาม อปบ.1 เดือน ธ.ค.67	งบฯรวม (%)
		จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	(บาท)	โดยงบบริหาร ท้องถิ่น	งบเสริม งบ.68		
	แยกแยะโครงการ	344	1,557,854,000	338	1,489,517,543	197,429,991	13.25	12.67	34	13
1	ควบคุมและกำกับ-แม่โขง	56	153,015,500	56	151,595,027	53,797,783	35.40	35.16	35.00	39
2	ควบคุมและป้องกัน	22	89,427,500	22	85,082,768	29,304,507	34.44	32.77	35.00	10
3	ควบคุมและ	77	124,756,170	77	123,960,211	38,091,094	30.73	30.53	35.00	27
4	ห้ามและป้องกัน	18	97,898,000	18	94,807,543	20,565,278	21.69	21.04	46.00	12
5	ควบคุมและ	34	101,404,400	33	95,253,402	10,931,324	11.48	10.78	34.00	12
6	ควบคุมและ	54	185,136,100	52	183,779,800	11,343,471	6.17	6.13	58.00	6
7	ควบคุมและใหม่	60	361,865,500	57	315,878,460	18,597,091	5.89	5.14	30.00	4
8	งบเสริม อบบ.1	12	95,128,300	12	349,412,024	11,873,580	3.40	3.38	35.00	2
9	อบบ.1	11	93,222,430	11	89,748,327	2,919,863	3.23	3.13	22.80	5

เบิกจ่ายตามงบฯ	ธ.ค.67	ม.ค.68	มี.ค.68 ไตรมาส 2	เม.ย.68	พ.ค.68	มี.ค.68 ไตรมาส 3	ก.ย.68 ไตรมาส 4
เบิกจ่าย ครมฯ	17.00	23.00	35.00	45.00	49.00	54.00	80.00
เบิกจ่าย ลำดับที่	34.00	45.00	64.00	73.00	79.00	85.00	100.00

สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ งบ พ.ร.บ. 68 (แนกรายการ สขป.1)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2567

ลำดับที่	โครงการ	พ.ร.บ.68		ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น		ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย เบิกจ่าย สขป.1 เมื่อ ณ.ร.ค.67	ผลรวม (%)
		จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	(บาท)	ร้อยละเพื่อบริการ จัดสรร	ร้อยละเพื่อบริการ พ.ร.บ.68		
	สขป.1	11	93,222,430	11	89,748,327	2,919,863	3.25	3.13	22.80	3
1	ส่วนเครื่องจักรกล	1	1,950,000	1	1,950,000	-	0.00	0.00	15.00	0
2	ส่วนบริหารทั่วไป	7	11,550,000	7	11,550,000	-	0.00	0.00	23.00	0
3	ส่วนวิศวกรรม	1	14,520,000	1	13,870,000	383,953	2.77	2.64	20.00	7
4	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	2	33,470,000	2	31,777,897	711,204	2.24	2.12	30.00	2
5	ค่าดำเนินการ		31,732,430		30,600,430	1,824,706	5.96	5.75	26.00	6

ประธาน สั่งการให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน กรอกข้อมูลแต่ละ
รายการให้เป็นปัจจุบัน

ตป.ขป.๑ ชี้แจงการลงข้อมูลผลการเบิกจ่ายซึ่งอ้างอิงมาจาก GF จากรายงานการเบิกจ่ายการเงินของ
สำนัก ผลการดำเนินงานอ้างอิงมากจากระบบ Cenproject

สรุปรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สขป.๑)

ลำดับที่	ชื่องาน	16/5/2564กร	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	ผลงาน ตาม	คงเหลือ	หมายเหตุ
		89,748,527.00	2,919,863.30	3.25		86,828,663.70	
	ส่วนเครื่องจักรกล จำนวน 1 รายการ	1,950,000.00	-			1,950,000.00	
1	ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์น้ำมันรายการ จำนวน 1 คัน	1,950,000.00		-	-	1,950,000.00	
	ส่วนบริการทั่วไป จำนวน 7 รายการ	11,550,000.00	-			11,550,000.00	
1	(1.101) ซ่อมและบำรุงรักษาอาคาร (โครงสร้าง) เลขที่ 27/19 สำนักงาน ชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง จำนวนวัสดุ จำนวนเฉลี่ยเล็กน้อย (จากรับ ซื้อใหม่)	2,500,000.00		-	-	2,500,000.00	
2	(1.104) ซ่อมและบำรุงรักษาอาคาร (โครงสร้าง) เลขที่ 27/20 สำนักงาน ชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง จำนวนวัสดุ จำนวนเฉลี่ยเล็กน้อย (จากรับ ซื้อใหม่)	2,500,000.00		-	-	2,500,000.00	
3	(1.105) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการบริเวณใต้ที่ดินรวมในเขตรักษาพันธุ์ สัตว์วนชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง จำนวนวัสดุ จำนวนเฉลี่ยเล็กน้อย (จากรับซื้อใหม่)	1,600,000.00		-	-	1,600,000.00	
4	(1.102) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการบริเวณใต้ที่ดิน รวม 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง จำนวนวัสดุ จำนวนเฉลี่ยเล็กน้อย (จากรับซื้อใหม่)	1,500,000.00		-	-	1,500,000.00	
5	(1.103) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการบริเวณใต้ที่ดิน รวม 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง จำนวนวัสดุ จำนวนเฉลี่ยเล็กน้อย (จากรับซื้อใหม่)	1,200,000.00		-	-	1,200,000.00	
6	(1.104) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการบริเวณใต้ที่ดินรวม 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง จำนวนวัสดุ จำนวนเฉลี่ยเล็กน้อย (จากรับซื้อใหม่)	650,000.00		-	-	650,000.00	
7	(1.105) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการบริเวณใต้ที่ดินรวม 3 สำนักงานชลประทาน ชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง จำนวนวัสดุ จำนวนเฉลี่ยเล็กน้อย (จากรับ ซื้อใหม่)	1,600,000.00		-	-	1,600,000.00	
	ส่วนวิศวกรรม จำนวน 1 รายการ	13,870,000.00	363,993.00			13,486,007.00	
1	(22) ค่าศึกษา 11118 2000000 การขยายโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 1	13,870,000.00	363,993.00	2.77	7.00	13,486,007.00	

ส่วนบริหารจัดการน้ำ...

ลำดับที่	ชื่องาน	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	ผลงาน สืบค้น	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ส่วนบริหารจัดการน้ำ จำนวน 2 รายการ	31,777,897.00	711,204.00			31,066,693.00	
1	(1.1619) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดโคก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,500,000.00	109,999.00	7.33	3.00	1,390,001.00	
2	(1.9) บริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	30,277,897.00	601,205.00	1.99	2.00	29,676,692.00	
	สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 รายการ	30,600,430.00	1,824,706.30			28,775,723.70	
1	สำนักงานชล.ตป.1	30,600,430.00	1,824,706.30	5.96	6.00	28,775,723.70	

สรุปผลการจ้างแรงงาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนการจ้างแรงงาน ของสำนักงานชลประทานที่ ๑ รายการที่ทำการจ้างแรงงาน(สะสมรายปี) จำนวน ๒๘ รายการ งบประมาณ ๓๗,๑๔๑,๕๐๐ แผนการจ้างแรงงาน จำนวน ๕,๐๔๒คน ค่าจ้าง ๓๔๒,๑๘๙,๖๓๙ บาท ผลการจ้างแรงงาน จำนวน ๑,๙๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๙% ค่าจ้าง ๒๙,๗๑๗,๙๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๘ %



สรุปผลการจ้างแรงงาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567

ลำดับที่	โครงการ	รายการที่มีการจ้างแรงงาน (สะสมรายปี)		แผนการจ้างแรงงาน (สะสมรายปี)		ผลการจ้างแรงงาน (สะสมรายปี)		ร้อยละผลการจ้างแรงงาน (สะสมรายปี)	
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (คน)	ค่าจ้าง (บาท)	จำนวน (คน)	ค่าจ้าง (บาท)	จำนวนแรงงาน (%)	ค่าจ้างแรงงาน (%)
	รวม สขป.1 ทั้งหมด	316	1,318,043,190	5,042	342,189,693	1,966	29,717,960	38.99%	8.68%
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	50	281,412,300	1,004	64,105,900	167	1,418,240	16.63%	2.21%
2	โครงการชลประทานลำพูน	33	91,402,264	207	16,059,057	89	1,301,021	43.00%	8.10%
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	19	91,194,000	418	22,567,000	165	2,615,364	39.47%	11.59%
4	โครงการ แม่ฮ่องสอน	56	116,322,300	626	56,507,238	455	9,517,240	72.68%	16.84%
5	โครงการ แม่ฮ่องสอน	77	124,756,170	1,395	40,987,932	368	5,053,201	26.38%	12.33%
6	โครงการ แม่ฮ่องสอน	49	117,819,000	628	58,667,319	308	5,135,819	49.04%	8.75%
7	โครงการก่อสร้าง สขป.1	12	349,433,259	477	62,951,469	166	2,609,712	34.80%	4.15%
8	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	18	102,671,000	222	8,190,443	213	1,789,643	95.95%	21.85%
9	สขป.1	2	43,032,897	65	12,153,335	35	277,720	53.85%	2.29%

ที่ประชุม

รับทราบ

๒.๔ การเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๘


นางสาวชนิตา ศิริกุลพิทักษ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แทน ผวศ.ขป.๑ รายงานการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปแผนงานงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนการดำเนินงานค่าเตรียมความพร้อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านศึกษา สสำรวจ ออกแบบ ค่าศึกษาความเหมาะสม จำนวน ๑๕๐ โครงการ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ค่าดำเนินการออกแบบ จำนวน ๘๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๗๐,๐๐๐ บาท ค่าสำรวจภูมิประเทศ จำนวน ๓๔๒ โครงการ งบประมาณ ๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๗๔ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๕๑๐,๐๐๐ บาท ด้านสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓,๗๔๐,๓๐๐ บาท

ส่วนวิศวกรรม จัดทำแผนการดำเนินงานค่าเตรียมความพร้อมปีงบประมาณ 2568 รายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
1. ศึกษา สสำรวจ ออกแบบ		
- ค่าศึกษาความเหมาะสม	150	3,000,000.00
- ค่าดำเนินการออกแบบ	82	3,670,000.00
- ค่าสำรวจภูมิประเทศ	42	7,840,000.00
รวม	274	14,510,000.00
2. สำรวจธรณีและปฐพีวิทยา		
- ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา	3	3,740,300.00

งบประมาณ...

งบประมาณค่าเตรียมความพร้อมตามกรอบวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๑) แผนเตรียมความพร้อมค่าศึกษา สํารวจภูมิประเทศ ออกแบบ วงเงินงบประมาณ ๑๔,๕๑๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ๑๓,๘๗๐,๐๐๐ บาท รอกการจัดสรร ๖๔๐,๐๐๐ บาท ๒) แผนเตรียมความพร้อมค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา วงเงินงบประมาณ ๓,๗๔๐,๓๐๐ บาท จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ๓,๗๔๐,๓๐๐ บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ค่าเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๘ งบประมาณตามค่าขอตั้ง ค่าศึกษา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท คงค้าง ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าสำรวจภูมิประเทศ ๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท ได้รับการจัดสรร ๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท ค่าออกแบบ ๓,๖๗๐,๐๐๐ บาท ได้รับการจัดสรร ๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท คงค้าง ๖๒๐,๐๐๐ บาท ค่าสำรวจธรณีฯ ๓,๗๔๐,๓๐๐ บาท ได้รับการจัดสรร ๓,๗๔๐,๓๐๐ บาท



งบประมาณค่าเตรียมความพร้อม ตามกรอบวงเงินปี 2568

ลำดับ	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	วงเงินคงเหลือ (รอกการจัดสรร) (บาท)
1	แผนการเตรียมความพร้อม (ค่าศึกษา สํารวจภูมิประเทศ ออกแบบ)	14,510,000.00	13,870,000.00	640,000.00
2	แผนการเตรียมความพร้อม (ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา)	3,740,300.00	3,740,300.00	-



งบประมาณค่าเตรียมความพร้อม ตามกรอบวงเงินปี 2568

รายการ	ค่าศึกษา	ค่าสำรวจภูมิประเทศ	ค่าออกแบบ	ค่าสำรวจธรณีฯ
งบประมาณตามค่าขอตั้ง	3,000,000.00	7,840,000.00	3,670,000.00	3,740,300.00
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,980,000.00	7,840,000.00	3,050,000.00	3,740,300.00
คงค้าง	20,000.00	-	620,000.00	-
หมายเหตุ	วงเงินที่อนุมัติ ได้รับตามงบประมาณตามค่าขอตั้ง			

ผลการเบิกจ่ายค่าเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๗ ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๓,๘๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๘๓,๙๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๗% ค่าสำรวจธรณีฯ ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๓,๗๔๐,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๘๒,๓๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๒%



ผลการเบิกจ่ายค่าเตรียมความพร้อม

ลำดับ	รายการ	กรอบวงเงินงบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	% เบิกจ่าย (%)
1	ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ	14,510,000.00	13,870,000.00	383,953.00	2.77
2	ค่าสำรวจธรณีฯ	3,740,300.00	3,740,300.00	382,357.00	10.22
หมายเหตุ		จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเท่ากับกรอบวงเงินงบประมาณ			

ที่ประชุม

รับทราบ

๒.๕ รายงานความก้าวหน้างาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายกิตติศักดิ์ ศรีวิชัย วศ.๑ พญ. ๑ รายงานผลการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่วงอุดมธารา อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จิด สัญญาที่ ๑ ระยะทาง ๑๓,๖๐๐ เมตร การขุดเจาะอุโมงค์แล้วเสร็จ ผลงาน ๑๐๐ % สัญญาที่ ๒ ระยะทาง ๑๒,๒๐๔ เมตร ดำเนินการแล้ว ๕,๗๖๓.๕๓๒ เมตร ผลงาน ๕๑.๐๕๐ % ความก้าวหน้าทั้ง ๒ โครงการ แผนงานก่อสร้างสะสม ๙๕.๔๑๑% ผลงานสะสม ๘๐.๒๘๕% ผลงานสะสมช้ากว่าแผนงาน ๑๕.๑๒๖% อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จิด ผลงาน ๗๘.๑๖๐% อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จิด - แม่กวง สัญญาที่ ๑ ผลงาน ๖๘.๙๔๑% ระยะทางทั้งหมด ๑๒,๕๐๐ เมตร ดำเนินการแล้ว ๙,๙๔๒.๒๐๗ เมตร อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จิด - แม่กวง สัญญาที่ ๒ ผลงาน ๑๐๐% ระยะทางทั้งหมด ๑๐,๔๗๕ เมตร การขุดเจาะอุโมงค์ดำเนินการแล้วเสร็จ อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จิด-แม่กวง ผลงาน ๘๒.๗๙๙% ระบบท่อส่งน้ำแม่จิด - แม่แตง ระยะทางทั้งหมด ๒๑,๓๕๕ ม. โดยแบ่งออกเป็นงบดำเนินการเอง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระยะทาง ๙,๕๖๒ ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ งานจ้างก่อสร้าง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙) ระยะทาง ๑๑,๗๙๓ ม. ดำเนินการแล้ว ๑๐,๒๖๐.๘๓๐ ม. ผลงาน ๘๖.๖๗% ความก้าวหน้ารวมทั้งโครงการ แผนงานก่อสร้างสะสม ๙๕.๔๑๑% ผลงานสะสม ๘๐.๒๘๕% แผนงานสะสมช้ากว่าแผน ๑๕.๑๒๖%




๒.๖ รายงานความก้าวหน้างาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายอมฤทธิ์ สิงห์โยธิน นายช่างชลประทาน แทน ผสภ.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการในความผิดชอบ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๔ โครงการ เป็นงานดำเนินการเอง ๑) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑.๙๒ ล้าน ลบ.ม.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน วงเงินงบประมาณฯ ๑๙,๗๗๖,๕๙๑.๕๔ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๔ % ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๐% ๒) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน งบประมาณฯ ๕,๘๘๕,๗๓๙.๒๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๘ % ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๔% ๓) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายฝายดอยน้อย (บ้านวังขามป้อม) อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณฯ ๖,๙๓๙,๖๓๙.๗๙- บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๐% ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๑% ๔) อาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายประตูระบายน้ำ แม่สอย อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณฯ ๑๓,๖๗๖,๗๓๔.๔๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๑ % ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๕% รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๖,๒๗๘,๗๐๔.๙๓ บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๒.๔๔ % คงเหลือ ๑๗,๓๘๒,๖๓๓.๕๙ บาท

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2567

ลำดับที่	โครงการ	วันเิน	ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			จำนวน (บาท)	ร้อยละ		แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	
1	ดำเนินกิจกรรมและสหภาพประชาชน ความรู้ 192 ตำบล ชม. โครงการดำเนินไป ด้วยดีจาก จังหวัดน่านจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน	19,776,591.54	15,829,600.29	80.04	3,946,991.25	100.00	92.10	
2	ค่าก่อสร้างสวนชุมชนเป็นโครงการดำเนินไปด้วยดีจาก เงินบริจาคจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน	5,085,739.20	2,571,183.75	43.68	3,314,555.45	100.00	86.74	
3	ระบบส่งเสริมสุขภาพประชาชน โครงการแม่สอดน้อย (บ้านวิไลงามใหม่) ตำบลบ่อหลวง อำเภอละลวย จังหวัดน่าน	6,939,639.79	5,857,156.80	84.40	1,082,482.99	100.00	78.21	
4	อาคารนิทรรศการที่เกาะช้างบ้านห้วยปรือชุมชนบ้านแม่ต๋อย ตำบลแม่ต๋อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	13,676,784.40	4,638,180.50	33.91	9,038,603.90	100.00	22.75	
		46,278,704.93	26,896,071.34	62.44	17,382,633.59			

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เบิกจ่ายทั้งหมด ๖ รายการ เป็นงานจ้างเหมา ๑ โครงการ ดำเนินการเอง ๓ โครงการ และ ค่าควบคุมงาน ๑ โครงการ งานจ้างเหมาวงเงินงบประมาณฯ ตาม พรบ.ปี ๖๘ ทั้งสิ้น ๓๕๙.๒๙๑๙ ล้านบาท ได้รับการจัดสรร ๓๕๖.๙๗๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๙.๓๖๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๓๑๗.๖๑๖๐ ล้านบาท ส่งคืน ๐.๖๕%

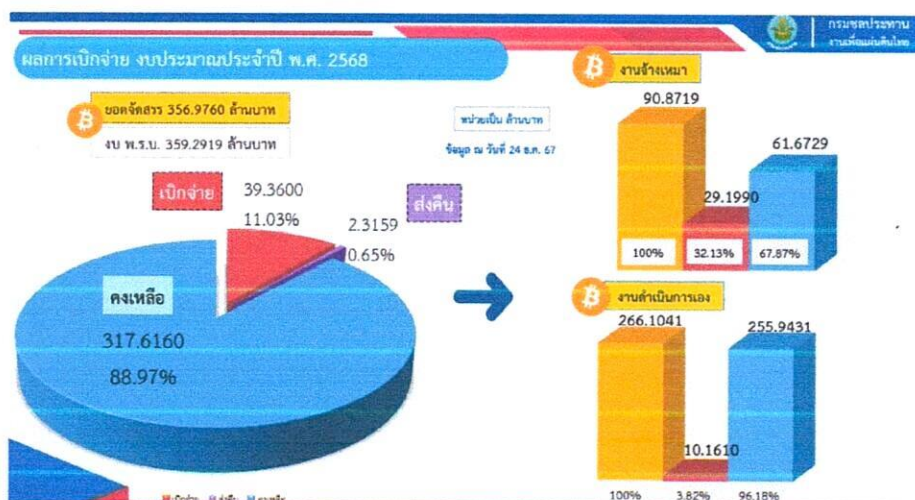

ปีงบประมาณ...



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๖๘	งบประมาณเดิมที่ส่งไปพิจารณา			งบปี ๖๘ ปีที่ ๒๔ ธันวาคม 2567				งบรวม	งบรวม
			งบปี ๖๘	งบปี ๖๘	งบปี ๖๘	งบปี ๖๘	งบปี ๖๘	งบปี ๖๘	งบปี ๖๘		
1	ดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี	90,871,900	90,871,900		90,871,900	61,672,941.49	29,198,958.51	32.13	32.13		
2	ดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี	40,000,000	40,000,000		40,000,000.00	15,411,979.68	2,608,785.85	6.52	6.52	21,919,238.27	
3	ดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี	27,420,000	27,420,000		27,420,000.00	2,163,075.90	49,991.10	0.18	0.18	25,206,933.00	
4	ดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี	35,000,000	35,000,000	2,315,877.91	32,684,122.09	13,162,510.34	5,792,157.66	16.55	17.72	13,729,434.29	
5	ดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี	66,000,000	66,000,000		66,000,000.00	2,331,752.21	625,271.45	0.95	0.95	63,042,976.34	
6	ดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี	100,000,000	100,000,000		100,000,000.00	32,541,076.87	2,192,303.25	2.39	2.39	65,066,619.88	
		359,291,900	359,291,900	2,315,877.91	356,976,022.09	127,343,332.64	60,687,487.62	11.32	11.39	188,965,221.78	

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผจบ.ขป.๑ การคัดเลือกฝ่ายส่งน้ำฯ ดีเด่น การคัดเลือกผู้เข้าประกวดระดับภาค
เสนอแนวทางก่อนคัดเลือกขอให้ สบ.ทุกท่านนำเสนอ ดังนี้

๑. อาคารประกอบ
๒. การวางแผนจัดการน้ำ
๓. บริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกัน อุทกภัย (ข้อมูลฝั่งน้ำ ๓ ปี)

โครงการดำเนินการ

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
๒. ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการส่งน้ำของโครงการ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
๔. สนับสนุนนโยบายของกรม

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1

การนำเสนอข้อมูล/การบริหารจัดการน้ำของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกฝ่ายส่งน้ำฯ ดีเด่น

1. อาคารชลประทาน และพื้นที่ชลประทาน ในความรับผิดชอบ
2. การวางแผนจัดการน้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบ (ฉบับจังหวัด ยกตัวอย่างโครงการขนาดกลางที่สำคัญ 1 แห่ง)
(ข้อมูลทางอุทก-อุทกวิทยา, กิจกรรมการให้น้ำและความต้องการใช้น้ำ, ปริมาณน้ำต้นทุน, แผน/ผล การเพาะปลูก, กระบวนการส่งน้ำ, ประสิทธิภาพการชลประทาน, ผลผลิตต่อพื้นที่จากการบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ)
3. การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันบรรเทา อุทกภัย

หมายเหตุ 1. ให้นำเสนอและดำเนินการ เสร็จสิ้นก่อนวัน
2. ข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอ ต้อง 3 ปี



ที่ประชุม รับทราบ

ผผง.ขป.๑ โครงการที่ได้รับงบประมาณฟื้นฟูทุกภัยขอให้เร่งรัดงบประมาณการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างไว้อ

ผบท.ขป.๑ แจ้งที่ประชุมทราบ สขป.๑ มีการกักเก็บน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่

ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวณัฐวรา มาเป็ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดรายงานการประชุม
