



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E ฉบอ(ปค.)๐๔/๑๐๐/๒๕๖๘ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๘ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๗ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS Thai ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับทุกแหล่งงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น ๘๑๘,๑๖๙,๓๖๑ บาท โอนกลับส่วนกลางแล้ว ๖,๐๘๘,๘๖๗ บาท ได้รับจัดสรร ๗๔๒,๒๓๙,๓๑๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔๖,๓๐๖,๓๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๘ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๘ วงเงินทั้งสิ้น ๕๖๒,๔๙๑,๑๐๐ บาท โอนกลับส่วนกลางแล้ว ๖,๐๐๘,๓๑๑ บาท ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๒๓๕,๘๘๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๖,๗๖๓,๒๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๖ (เบิกจ่ายหน่วยรับงบประมาณ สบอ. ยอดจัดสรร ๓๙๖,๐๔๓,๖๑๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๔,๔๙๐,๐๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๘) เงินกันเหลือปี ๒๕๖๗ วงเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๐๘,๓๖๑ บาท แจกคืนเงินเหลือจ่ายแล้ว ๘๐,๕๕๖ บาท คงเหลือได้รับจัดสรร ๑๙๑,๙๒๗,๗๗๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๙,๕๔๓,๑๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๘ และ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๘ วงเงินทั้งสิ้น ๖๓,๖๖๙,๙๐๐ บาท ได้รับจัดสรร ๗๕.๖๔๙ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายชวลิต นลอม)

ผบบ.บอ.



รายงานผลเบิกจ่ายประจำสัปดาห์

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 14 มี.ค. 68
24.86%

ค.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
2.03%	7.89%	15.10%	19.65%	25.08%	46.40%	62.07%	68.37%	75.69%	84.23%	88.75%	100%

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

งบประมาณ พ.ร.บ. 2568

งบประมาณ พ.ร.บ. 68

- จำนวน 214 รายการ ยกเลิก 2 รายการ 800,000 บาท
- คงเหลือ 212 รายการ 561,691,100 บาท
- โอนกลับส่วนกลางแล้ว (เหลือจ่าย/ส่วนต่างจากการทำ
- ข้อมูลพันงานจ้างเหมา) 5,208,311 บาท
- ได้รับจัดสรร 550,235,889 บาท (210 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 136,763,243 บาท
- คิดเป็น 24.86% (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 7 รายการ)
- คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 413,472,646 คิดเป็น 75.14%

562,491,100
บาท

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2568

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน

- จำนวน 26 รายการ (งานโครงการ 1 รายการ
- ครุภัณฑ์ 25 รายการ)
- โอนกลับส่วนกลางแล้ว 0 บาท
- ได้รับจัดสรร 75,649 บาท (2 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 0 บาท คิดเป็น 0 %
- คงเหลือ 63,669,900 บาท คิดเป็น 100%

63,669,900
บาท

เงินกันเหลือปี 2567

งบประมาณ เงินกันเหลือปี

- จำนวน 48 รายการ
- แจ้งคืนกรมฯ 80,556 บาท
- คงเหลือได้รับจัดสรร 191,927,775 บาท
- (48 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 109,543,153 บาท
- คิดเป็น 57.08% (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 30 รายการ)
- คงเหลือ 82,384,622 คิดเป็น 42.92%

192,008,361
บาท

หมายเหตุ : - ร้อยละผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบที่ได้รับจัดสรร

- โอนหน่วยรับงบประมาณ สบอ. วงเงิน 396,043,610 บาท
- ผลเบิกจ่ายจำนวน 64,490,023 คิดเป็นร้อยละ 16.28
- โอนหน่วยรับงบประมาณ สขป.1-17 วงเงิน 154,192,279 บาท
- ผลเบิกจ่ายจำนวน 72,273,220 คิดเป็นร้อยละ 46.87

เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายของกรมฯ



รายการ	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	จำนวน 2567	มีนาคม 2568	มีนาคม 2568	มิถุนายน 2568	กันยายน 2568	กันยายน 2568	กันยายน 2568	กันยายน 2568
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
รายจ่ายลงทุน	100	80	39	17	66	35	77	54	100	80
รายจ่ายประจำ	100	98	36	35	58	57	81	80	100	98
รายจ่ายภาพรวม	100	94	37	27	61	53	80	75	100	94

งบ พ.ร.บ.68 งบประมาณ 562,491,100 บาท

- ยกเลิก 2 รายการ 800,000 บาท
- คงเหลือ 212 รายการ 561,691,100 บาท
- ได้รับจัดสรรแล้ว 550,235,889 คิดเป็น 97.82% (210 รายการ)
- คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 413,472,646 คิดเป็น 75.14%
 - งานจ้างเหมาทั้งโครงการ 121,585,324 บาท
 - งานจ้างเหมาบางส่วน 59,062,216 บาท
 - งานดำเนินการเอง 232,825,106 บาท
- แผนเบิกจ่ายสะสม เดือน มี.ค. 255,319,359 บาท คิดเป็น 46.40%

งบกันเหลือปี 67 งบประมาณ 192,008,361 บาท

- คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 82,384,622 คิดเป็น 42.92%
- แผนเบิกจ่ายสะสม เดือน ก.พ. 125,098,454 บาท คิดเป็น 65.18%

เงินทุนหมุนเวียนฯ 68 งบประมาณ 63,669,900 บาท

- คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 63,669,900 บาท คิดเป็น 100%
- แผนเบิกจ่ายสะสม เดือน มี.ค. 75,649 บาท คิดเป็น 100%

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบ พ.ร.บ. 2568

ข้อมูลจากระบบ Cen-Project ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)							
		1.ยังไม่ดำเนินการ	2.อนุมัติแผน	3.ประกาศ TOR	4.ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	5.เปิดซอง	6.อนุมัติรับ ราคา	7.ทำข้อ ผูกพัน	8.ยกเลิก
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	218	0	1	1	0	0	0	210	6
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	0	0	1	0
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	0	0	0	0	0	0	12	0
ส่วนอุทกวิทยา	27	0	0	0	0	0	0	27	0
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	9	0	0	0	0	0	0	7	2
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	13	0	0	0	0	0	0	12	1
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน และ ทน.1-9	49	0	0	1	0	0	0	46	2
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	36	0	0	0	0	0	0	35	1
ศอช.ภาคกลาง	10	0	0	0	0	0	0	10	0
ศอช.ภาคตะวันตก	8	0	0	0	0	0	0	8	0
ศอช.ภาคตะวันออก	8	0	0	0	0	0	0	8	0
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	0	0	0	0	0	0	7	0
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	12	0	0	0	0	0	0	12	0
ศอช.ภาคใต้	7	0	1	0	0	0	0	6	0
ศอช.ภาคเหนือตอนบน	11	0	0	0	0	0	0	11	0
ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง	8	0	0	0	0	0	0	8	0

หมายเหตุ : ยกเลิก 6 รายการ งบประมาณ 10,139,000 บาท

ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 684,000 บาท.

1. บำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV ลุ่มน้ำเจ้าพระยา พ.ศ.2568 (ตน.บอ.) งบประมาณ 684,000 บาท. (งานดำเนินการเอง) เนื่องจากยกเลิกระบบกล้อง CCTV ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ยกเลิก 2 รายการ งบประมาณ 4,800,000 บาท

1. การศึกษาวัดผลกระทบการจัดฝักตบขนาและวัชพืช ในทางน้ำชลประทาน งบประมาณ 3,000,000 บาท. (งานจ้างเหมา) เนื่องจากแผนงานซ้ำซ้อนกับแผนงานในปี 2566

2. โครงการศึกษาติดตามงานปรับปรุงระบบชลประทาน ประเทภะบสงน้ำ งบประมาณ 1,800,000 บาท. (งานดำเนินการเอง) เนื่องจากได้รับงบประมาณ ปี 2567

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 3,855,000 บาท.

1. บำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานภาพของเขื่อนจากการเข้าถึงข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน พ.ศ. 2568 งบประมาณ 3,855,000 บาท. (งานจ้างเหมา) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า (โครงการระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานภาพของเขื่อน จากการเข้าถึงข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร) ซึ่งจบแล้วเสร็จในเดือน

มิถุนายน 2568 ตามสัญญาที่ จ.54/2567/สบอ. ทั้งนี้หากโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2567 ยังไม่แล้วเสร็จจะไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 ยกเลิก 2 รายการ งบประมาณ 800,000 บาท.

1. ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัยของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 งบประมาณ 250,000 บาท (งานดำเนินการเอง)

2. ซ่อมแซมบ้านพักพนักงานราชการ จำนวน 2 หลัง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 งบประมาณ 550,000 บาท (งานดำเนินการเอง) เนื่องจากได้รับแจ้งจากชลประทานมูลนิธิ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินว่าจะมีการระงับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2568 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ และเป็นการใช้งบประมาณโดยไม่คุ้มค่า

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานปีเดียวที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

								กรอกข้อมูล วันที่ 14 มี.ค. 68		
ที่	สำนัก/กอง	หน่วยงาน ดำเนินการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 68 (บาท)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	ประเภทงาน	ขั้นตอนปัจจุบัน 1.ยังไม่ ดำเนินการ 2.อนุมัติแผน 3. ประกาศ TOR 4.ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง 5.เปิดซอง 6. อนุมัติรับราคา 7.ทำข้อผูกพัน 8.ยกเลิก	ปัญหา-อุปสรรค	คาดการณ์วันก่อหนี้
			จำนวน 6 รายการ		7,090,900	7,090,900				
302	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ทน.7 บอ.	(1.303) ซ่อมแซมถนนลาดยาง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) พ.ศ.2568 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [306]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	971,700	971,700	จ้างเหมา	3.ประกาศ TOR	ประกาศผ่านในระบบ 10 มี.ค.อยู่ ระหว่างจัดทำราคากลางและจัดทำTOR	31-มี.ค.-68
305	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ตน.บอ.	(1.38) โครงการระบบโทรมาตรเตือนภัยน้ำท่วมชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [2269]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	5,275,200	5,275,200	จ้างเหมา	ไม่ผ่านการจัดซื้อ	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อ ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่โดน พับและดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายใน ระบบ NEW GFMS ของกรมบัญชีกลาง ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน	31-มี.ค.-68
535	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ศอช.ภาคใต้	(1.3971) ค่าซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ พ.ศ.2568 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [6202]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	844,000	844,000	ดำเนินการเอง	2.อนุมัติแผน	อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มี.ค.-68

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบ พรบ.68)

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68
แผนการเบิกจ่าย สบอ. งบ พรบ. 2568 จำนวน 214 รายการ วงเงิน 562.49 ล้านบาท ยกเลิก 2 รายการ 0.8 ล้านบาท จัดสรรแล้ว 550.24 ล้านบาท 97.82% จำนวน 210 รายการ	66.48 ล้านบาท			255.32 ล้านบาท			416.45 ล้านบาท			550.24 ล้านบาท		
	12.08 %			46.4 %			75.69 %			100 %		
ผลการเบิกจ่าย งบพรบ. 2568	53.25 ล้านบาท 10.41%			136.76 ล้านบาท 24.86%								
	44.29 ล้านบาท 8.05 %			66.48 ล้านบาท 12.08 %			106.55 ล้านบาท 19.36 %			138 ล้านบาท 25.08 %		
- จ้างเหมาทั้งโครงการ (21 รายการ วงเงิน 171.08 ล้านบาท) จัดสรรแล้ว 164.14 ล้านบาท 95.95% (20/21)	8.82 ล้านบาท 6.61%			42.56 ล้านบาท 25.93%								
	13.62 ล้านบาท 8.3 %			16.33 ล้านบาท 9.95 %			24.22 ล้านบาท 14.75 %			35.85 ล้านบาท 21.84 %		
- จ้างเหมา+ดำเนินการเอง (26 รายการ วงเงิน 67.78 ล้านบาท (จ้างเหมา 57.15 ล้านบาท ดำเนินการเอง 10.63)) จัดสรรแล้ว 63.47 ล้านบาท 93.65% (25/26)	1.01 ล้านบาท 1.82%			4.41 ล้านบาท 6.95%								
	1.02 ล้านบาท 1.6 %			1.86 ล้านบาท 2.93 %			9.31 ล้านบาท 14.66 %			11.94 ล้านบาท 18.81 %		
- ดำเนินการเอง (167 รายการ วงเงิน 323.64 ล้านบาท) จัดสรรแล้ว 322.62 ล้านบาท 99.68% (165/165)	43.42 ล้านบาท 13.45%			89.8 ล้านบาท 27.83%								
	29.65 ล้านบาท 9.19 %			48.28 ล้านบาท 14.97 %			73.02 ล้านบาท 22.63 %			90.21 ล้านบาท 27.96 %		

หมายเหตุ : - ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568

- ร้อยละผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบที่ได้รับจัดสรร
- โอนจัดสรรทุกหน่วยรับงบประมาณ 550,235,889 บาท ผลเบิกจ่ายจำนวน 136,763,243 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.86
- โอนหน่วยรับงบประมาณ สบอ. วงเงิน 396,043,610 บาท ผลเบิกจ่ายจำนวน 64,490,023 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.28
- โอนหน่วยรับงบประมาณ สขป.1-17 วงเงิน 154,192,279 บาท ผลเบิกจ่ายจำนวน 72,273,220 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.87
- ยกเลิก จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 800,000 บาท (โอนกลับส่วนกลางแล้ว)
- (1.175) ซ่อมแซมบ้านพักพนักงานราชการ จำนวน 2 หลัง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [178] งบประมาณ 550,000 บาท
- (1.29) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568
- ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [508] งบประมาณ 250,000 บาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบเงินกันเหลื่อมปี 67)

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
เงินกันเหลื่อมปี 67 จำนวน 48 รายการ วงเงิน 192.01 ล้านบาท เงิน เหลือจ่าย 0.08 ล้านบาท คงเหลือ ได้รับจัดสรร 191.93 ล้านบาท	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68
คาดการณ์เบิกจ่าย	78.2 ล้านบาท			156.8 ล้านบาท			187.4 ล้านบาท			191.93 ล้านบาท		
	40.74 %			81.7 %			97.64 %			100 %		
ผลเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 67	65.35 ล้านบาท 34.05%			109.54 ล้านบาท 57.08%								
	63.57 ล้านบาท 33.12 %	78.2 ล้านบาท 40.74 %		105.88 ล้านบาท 55.17 %	125.1 ล้านบาท 65.18 %	156.8 ล้านบาท 81.7 %	169.37 ล้านบาท 88.25 %	181.72 ล้านบาท 94.68 %	187.4 ล้านบาท 97.64 %	190.04 ล้านบาท 99.02 %	190.04 ล้านบาท 99.02 %	191.93 ล้านบาท 100 %

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2568

โครงการ / หน่วยงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 2568				โอนกลับส่วนกลาง (เหลือจ่าย/ส่วนต่างจากการทำข้อมูลพันธงาน จ้างเหมา/ยกเลิก)				ได้รับจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)				เบิกจ่ายแล้วเสร็จ				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร				แผนการเบิกจ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน มี.ค.68				คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (จัดสรร-ผลเบิก)				ผลต่าง
	จำนวน 214 รายการ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	20,094,400	10,000,000	10,094,400	350,000	350,000	0	1.74	12	19,744,400	9,650,000	10,094,400	7,122,017	3,860,000	3,262,017	36.07	0	0	0	0	0	0	0	0	8,666,205	3,860,000	4,806,205	43.89	12,622,383	5,790,000	6,832,383	63.93	-7.82
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	160,913,900	104,315,900	56,598,000	4,250,765	4,199,765	51,000	2.64	34	151,387,935	94,840,935	56,547,000	17,161,650	9,949,540	7,212,110	11.34	0	0	0	0	1	5,275,200	5,275,200	0	58,902,316	28,387,916	30,514,400	38.91	134,226,285	84,891,395	49,334,890	88.66	-27.57
ส่วนอุทกวิทยา	27	113,695,000	14,575,000	99,120,000	199,489	30,800	168,689	0.18	27	113,495,511	14,544,200	98,951,311	7,559,836	0	7,554,836	6.66	1	3,947,765	0	3,947,765	0	0	0	0	55,866,484	1,200,000	54,666,484	49.22	105,940,675	14,544,200	91,396,475	93.34	-42.57
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	7	15,100,000	4,900,000	10,200,000	14,000	14,000	0	0.09	7	15,086,000	4,886,000	10,200,000	6,644,566	1,670,315	4,974,251	44.04	0	0	0	0	0	0	0	0	7,403,578	1,789,115	5,614,463	49.08	8,441,434	3,215,685	5,225,749	55.96	-5.03
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	12	112,090,000	93,490,000	18,600,000	393,937	393,937	0	0.35	12	111,696,063	93,096,063	18,600,000	34,783,480	28,511,153	6,272,327	31.14	0	0	0	0	0	0	0	0	48,683,953	36,963,953	11,720,000	43.59	76,912,583	64,584,910	12,327,673	68.86	-12.44
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0.00	1	1,000,000	0	1,000,000	310,307	0	310,307	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0	468,500	0	468,500	46.85	689,693	0	689,693	68.97	-15.62
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน และ ทน 1-9	49	19,681,900	942,700	18,739,200	800,000	0	800,000	4.06	46	17,910,200	0	17,910,200	8,421,058	0	8,421,058	47.02	0	0	0	0	1	971,700	942,700	29,000	10,465,307	0	10,465,307	58.43	9,489,142	0	9,489,142	52.98	-11.41
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	11	18,575,400	0	18,575,400	0	0	0	0.00	11	18,575,400	0	18,575,400	9,653,871	0	9,653,871	51.97	3	840,600	0	840,600	0	0	0	0	10,804,400	0	10,804,400	58.17	8,921,529	0	8,921,529	48.03	-6.19
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	15,278,700	0	15,278,700	0	0	0	0.00	8	15,278,700	0	15,278,700	7,178,712	0	7,178,712	46.99	2	1,510,993	0	1,510,993	0	0	0	0	7,128,200	0	7,128,200	46.65	8,099,988	0	8,099,988	53.01	0.33
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	15,308,200	0	15,308,200	0	0	0	0.00	7	15,308,200	0	15,308,200	6,197,243	0	6,197,243	40.48	0	0	0	0	0	0	0	0	8,288,600	0	8,288,600	54.14	9,110,957	0	9,110,957	59.52	-13.66
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	12	17,493,000	0	17,493,000	0	0	0	0.00	12	17,493,000	0	17,493,000	7,879,929	0	7,879,929	45.05	0	0	0	0	0	0	0	0	9,608,700	0	9,608,700	54.93	9,613,071	0	9,613,071	54.95	-9.88
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,050,400	0	13,050,400	120	0	120	0.00	10	13,050,280	0	13,050,280	7,563,899	0	7,563,899	57.96	1	114,880	0	114,880	0	0	0	0	7,933,597	0	7,933,597	60.79	5,486,381	0	5,486,381	42.04	-2.83
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	8	12,466,000	0	12,466,000	0	0	0	0.00	8	12,466,000	0	12,466,000	5,754,204	0	5,754,204	46.16	0	0	0	0	0	0	0	0	7,056,000	0	7,056,000	56.60	6,711,796	0	6,711,796	53.84	-10.44
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,822,600	0	10,822,600	0	0	0	0.00	8	10,822,600	0	10,822,600	4,462,520	0	4,462,520	41.23	0	0	0	0	0	0	0	0	5,931,519	0	5,931,519	54.81	6,360,080	0	6,360,080	58.77	-13.57
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	7	16,921,600	0	16,921,600	0	0	0	0.00	7	16,921,600	0	16,921,600	6,074,951	0	6,074,951	35.90	0	0	0	0	0	0	0	0	8,112,000	0	8,112,000	47.94	10,846,649	0	10,846,649	64.10	-12.04
รวมทั้งสิ้น	214	562,491,100	228,223,600	334,267,500	6,008,311	4,988,502	1,019,809	1.07	210	550,235,889	217,017,198	333,218,691	136,763,243	43,991,008	92,772,236	24.86	7	6,414,238	0	6,414,238	2	6,246,900	6,217,900	29,000	255,319,359	72,200,984	183,118,376	46.40	413,472,646	173,026,190	240,446,455	75.14	-21.55

หมายเหตุ: - ผลเบิกจ่าย และคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย

ร้อยละเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- โอนกลับส่วนกลาง (เหลือจ่าย/ส่วนต่างจาก
การทำข้อมูลพันธงานจ้างเหมา/ยกเลิก) และแผนการเบิกจ่าย
ร้อยละเปรียบเทียบ กับ งบ พ.ร.บ. 68

ความหมายของแต่ละสีที่ไอไลน์ในคอลัมน์ "เบิกจ่าย (ร้อยละ)"
- สีเขียว หมายถึง เบิกจ่ายเกินแผนคาดการณ์
- สีเหลือง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์ไม่เกิน ร้อยละ 10
- สีแดง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์เกิน ร้อยละ 10

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2568
- จำนวน 218 รายการ งบประมาณ 571,830,100 บาท
- ขอยกเลิกก่อนได้รับการโอนจัดสรรจ จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 9,339,000 บาท
- ขอยกเลิกหลังได้รับการจัดสรร จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 800,000 บาท (โอนกลับส่วนกลางแล้ว)
(1.175) ซ่อมแซมบ้านพักพนักงานราชการ จำนวน 2 หลัง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [178] งบประมาณ 550,000 บาท
(1.29) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและแตรกระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [508] งบประมาณ 250,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2568

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 68			ผลเบิกจ่ายทุกศูนย์ต้นทุน								ผลเบิกจ่ายเฉพาะส่วนกลาง										ผลเบิกจ่ายเฉพาะส่วนภูมิภาค											
					วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย (บาท)			คิดเป็น (ร้อยละ)	ผูกพันคงเหลือ (บาท)			วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย (บาท)			คิดเป็น (ร้อยละ)	ผูกพันคงเหลือ (บาท)			วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย (บาท)			คิดเป็น (ร้อยละ)	ผูกพันคงเหลือ (บาท)		
		รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	212	562,491,100	228,223,600	334,267,500	550,235,889	217,017,198	333,218,691	136,763,243	43,991,008	87,797,984	24.86	285,313,132	161,314,125	123,999,007	396,043,610	202,017,198	194,026,412	64,490,023	35,694,032	28,795,992	16.28	281,160,532	157,645,125	123,515,407	154,192,279	15,000,000	139,192,279	72,273,220	8,296,976	63,976,244	46.87	4,152,600	3,669,000	483,600
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	160,913,900	104,315,900	56,598,000	151,387,935	94,840,935	56,547,000	17,161,650	9,949,540	7,212,110	11.34	121,369,354	84,213,354	37,156,000	151,387,935	94,840,935	56,547,000	17,161,650	9,949,540	7,212,110	11.34	121,369,354	84,213,354	37,156,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน และ พน.1-9	47	19,681,900	942,700	18,739,200	17,910,200	0	17,910,200	8,421,058	0	8,421,058	47.02	13,370	0	13,370	1,460,401	0	1,460,401	687,299	0	687,299	47.06	0	0	0	16,449,799	0	16,449,799	7,733,758	0	7,733,758	47.01	13,370	0	13,370
ส่วนควบคุมลัดขังเขื่อน	12	112,090,000	93,490,000	18,600,000	111,696,063	93,096,063	18,600,000	34,783,480	28,511,153	6,272,327	31.14	61,819,879	61,550,886	268,993	86,916,063	78,096,063	8,820,000	22,744,590	20,214,177	2,530,413	26.17	57,956,886	57,881,886	75,000	24,780,000	15,000,000	9,780,000	12,038,890	8,296,976	3,741,914	48.58	3,862,993	3,669,000	193,993
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	20,094,400	10,000,000	10,094,400	19,744,400	9,650,000	10,094,400	7,122,017	3,860,000	3,262,017	36.07	6,324,831	5,790,000	534,831	19,500,400	9,650,000	9,850,400	7,041,047	3,860,000	3,181,047	36.11	6,324,831	5,790,000	534,831	244,000	0	244,000	80,970	0	80,970	33.18	0	0	0
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	7	15,100,000	4,900,000	10,200,000	15,086,000	4,886,000	10,200,000	6,644,566	1,670,315	0	44.04	3,215,685	3,215,685	0	15,086,000	4,886,000	10,200,000	6,644,566	1,670,315	4,974,251	44.04	3,215,685	3,215,685	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	310,307	0	310,307	31.03	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	310,307	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
ส่วนอุทกวิทยา	27	113,695,000	14,575,000	99,120,000	113,495,511	14,544,200	98,951,311	7,554,836	0	7,554,836	6.66	92,293,776	6,544,200	85,749,576	113,495,511	14,544,200	98,951,311	7,554,836	0	7,554,836	6.66	92,293,776	6,544,200	85,749,576	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,050,400	0	13,050,400	13,050,280	0	13,050,280	7,563,899	0	7,563,899	57.96	0	0	0	724,300	0	724,300	262,750	0	262,750	36.28	0	0	0	12,325,980	0	12,325,980	7,301,149	0	7,301,149	59.23	0	0	0
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,822,600	0	10,822,600	10,822,600	0	10,822,600	4,462,520	0	4,462,520	41.23	0	0	0	690,000	0	690,000	165,765	0	165,765	24.02	0	0	0	10,132,600	0	10,132,600	4,296,755	0	4,296,755	42.41	0	0	0
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	8	12,466,000	0	12,466,000	12,466,000	0	12,466,000	5,754,204	0	5,754,204	46.16	0	0	0	900,000	0	900,000	248,795	0	248,795	27.64	0	0	0	11,566,000	0	11,566,000	5,505,409	0	5,505,409	47.60	0	0	0
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	15,308,200	0	15,308,200	15,308,200	0	15,308,200	6,197,243	0	6,197,243	40.48	80,290	0	80,290	975,000	0	975,000	438,555	0	438,555	44.98	0	0	0	14,333,200	0	14,333,200	5,758,688	0	5,758,688	40.18	80,290	0	80,290
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	12	17,493,000	0	17,493,000	17,493,000	0	17,493,000	7,879,929	0	7,879,929	45.05	0	0	0	920,000	0	920,000	317,966	0	317,966	34.56	0	0	0	16,573,000	0	16,573,000	7,561,963	0	7,561,963	45.63	0	0	0
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	7	16,921,600	0	16,921,600	16,921,600	0	16,921,600	6,074,951	0	6,074,951	35.90	50,085	0	50,085	1,053,000	0	1,053,000	345,095	0	345,095	32.77	0	0	0	15,868,600	0	15,868,600	5,729,855	0	5,729,855	36.11	50,085	0	50,085
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	11	18,575,400	0	18,575,400	18,575,400	0	18,575,400	9,653,871	0	9,653,871	51.97	6,000	0	6,000	1,021,000	0	1,021,000	352,296	0	352,296	34.51	0	0	0	17,554,400	0	17,554,400	9,301,575	0	9,301,575	52.99	6,000	0	6,000
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	15,278,700	0	15,278,700	15,278,700	0	15,278,700	7,178,712	0	7,178,712	46.99	139,861	0	139,861	914,000	0	914,000	214,505	0	214,505	23.47	0	0	0	14,364,700	0	14,364,700	6,964,207	0	6,964,207	48.48	139,861	0	139,861

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายการงบประมาณ : **เงินกันเหลื่อมปี 2567**

โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2567				งบทดความจำเป็น/เหลือจ่าย (งานแล้วเสร็จ/ยกเลิก)				คงเหลืองบประมาณ (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (เทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)				เบิกจ่ายแล้วเสร็จ				แผนการเบิกจ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน มี.ค.68				คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (จัดสรร-ผลเบิก)				ผลต่าง
	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	73,592,479	72,425,384	1,167,095	80,556	25,600	54,956	0.11	73,511,923	72,399,784	1,112,139	99.89	57,890,844	56,819,251	1,071,593	78.66	26	35,817,645	34,866,571	951,074	70,329,753	69,316,679	1,013,074	81.54	15,621,079	15,580,533.00	40,545.80	21.25	-2.88
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	7	73,242,824	73,242,824	0	0	0	0	0.00	73,242,824	73,242,824	0	100.00	35,966,428	35,966,428	0	49.11	0	0	0	0	52,017,349	52,017,349	0	37.83	37,276,396	37,276,396.43	0.00	50.89	11.28
ส่วนอุทกวิทยา	8	35,618,878	35,543,953	74,925	0	0	0	0.00	35,618,878	35,543,953	74,925	100.00	13,415,181	13,357,261	57,920	37.66	2	3,672,400	3,672,400	0	26,296,890	26,259,428	37,463	36.05	22,203,697	22,186,691.50	17,005.00	62.34	1.61
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	2	9,551,150	9,551,150	0	0	0	0	0.00	9,551,150	9,551,150	0	100.00	2,267,700	2,267,700	0	23.74	1	297,750	297,750	0	8,163,140	8,163,140	0	56.40	7,283,450	7,283,450.00	0.00	76.26	-32.66
ศูนย์อุทกวิทยาสะพานภาคเหนือตอนบน	1	3,000	0	3,000	0	0	0	0.00	3,000	0	3,000	100.00	3,000	0	3,000	100.00	1	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	48	192,008,331	190,763,311	1,245,020	80,556	25,600	54,956	0.04	191,927,775	190,737,711	1,190,064	99.96	109,543,153	108,410,640	1,132,513	57.08	30	39,790,795	38,836,721	954,074	156,810,132	155,756,595	1,053,537	81.70	82,384,622	82,327,071	57,551	42.92	-24.63

หมายเหตุ : เบิกจ่ายร้อยละเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

รายการที่ดินเงินแล้ว จำนวน 19 รายการ งบประมาณ 80,556 บาท

- (1.6822) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำโขง พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9150] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 2,160 บาท
- (1.6823) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชี พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9151] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 692 บาท
- (1.6824) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำมูล พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9152] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 3,666 บาท
- (1.6825) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำโดนเลาข พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9153] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 48 บาท
- (1.6826) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำสาละวิน พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9154] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 7,610 บาท
- (1.6828) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปิง พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9156] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 1,076 บาท
- (1.6830) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำวัง พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9158] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 1,430 บาท
- (1.6831) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำยม พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9159] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 2,023 บาท
- (1.6832) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9160] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 7,426 บาท
- (1.6833) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9161] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 1,040 บาท
- (1.6834) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9162] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 8,136 บาท
- (1.6835) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9163] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 3,458 บาท
- (1.6836) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9164] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 4,200 บาท
- (1.6840) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9168] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 248 บาท
- (1.6841) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9169] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 1,140 บาท
- (1.6842) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9170] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 1,990 บาท
- (1.6843) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำคาปิ พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9171] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 28,405 บาท
- (1.6844) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9172] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 760 บาท
- (1.6845) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปัตตานี พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9173] ดินเงินเหลือจ่ายจำนวน 5,048 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายการงบประมาณ : **เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2568**

โครงการ / หน่วยงาน	เงินทุนฯ พ.ศ. 2568				โอนกลับส่วนกลาง (เหลือจ่าย/ส่วนต่างจากการทำข้อผูกพันงานจ้างเหมา/ยกเลิก)				ได้รับจัดสรร (บาท)					ผลการเบิกจ่าย (เทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร				แผนการเบิกจ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน มี.ค.68				คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (จัดสรร-ผลเบิก)				ผลต่าง
	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1	56,000,000	56,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	56,000,000	56,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ส่วนบริหารทั่วไป	25	7,669,900	0	7,669,900	151	0	151	0.00	2	75,649	0	75,649	0.99	0	0	0	0.00	23	7,594,251	0	7,594,251	75,649	0	75,649	100.00	75,649	0	75,649	100.00	-100.00
รวมทั้งสิ้น	26	63,669,900	56,000,000	7,669,900	151	0	151	0.00	2	75,649	0	75,649	0.12	0	0	0	0.00	24.00	63,594,251	56,000,000	7,594,251	75,649	0	75,649	100.00	75,649	0	75,649	100.00	-100.00

- หมายเหตุ :
- ความหมายของแต่ละสีที่ไฮไลท์ในคอลัมน์ "เบิกจ่าย (ร้อยละ)"
- สีเขียว หมายถึง เบิกจ่ายเกินแผนคาดการณ์
 - สีเหลือง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์ไม่เกิน ร้อยละ 10
 - สีแดง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์เกิน ร้อยละ 10

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2568) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568




งบ พ.ร.บ. 562.49 ล้านบาท



จัดสรร 550.24 ล้านบาท



เบิกจ่าย 136.76 ล้านบาท (24.86%)

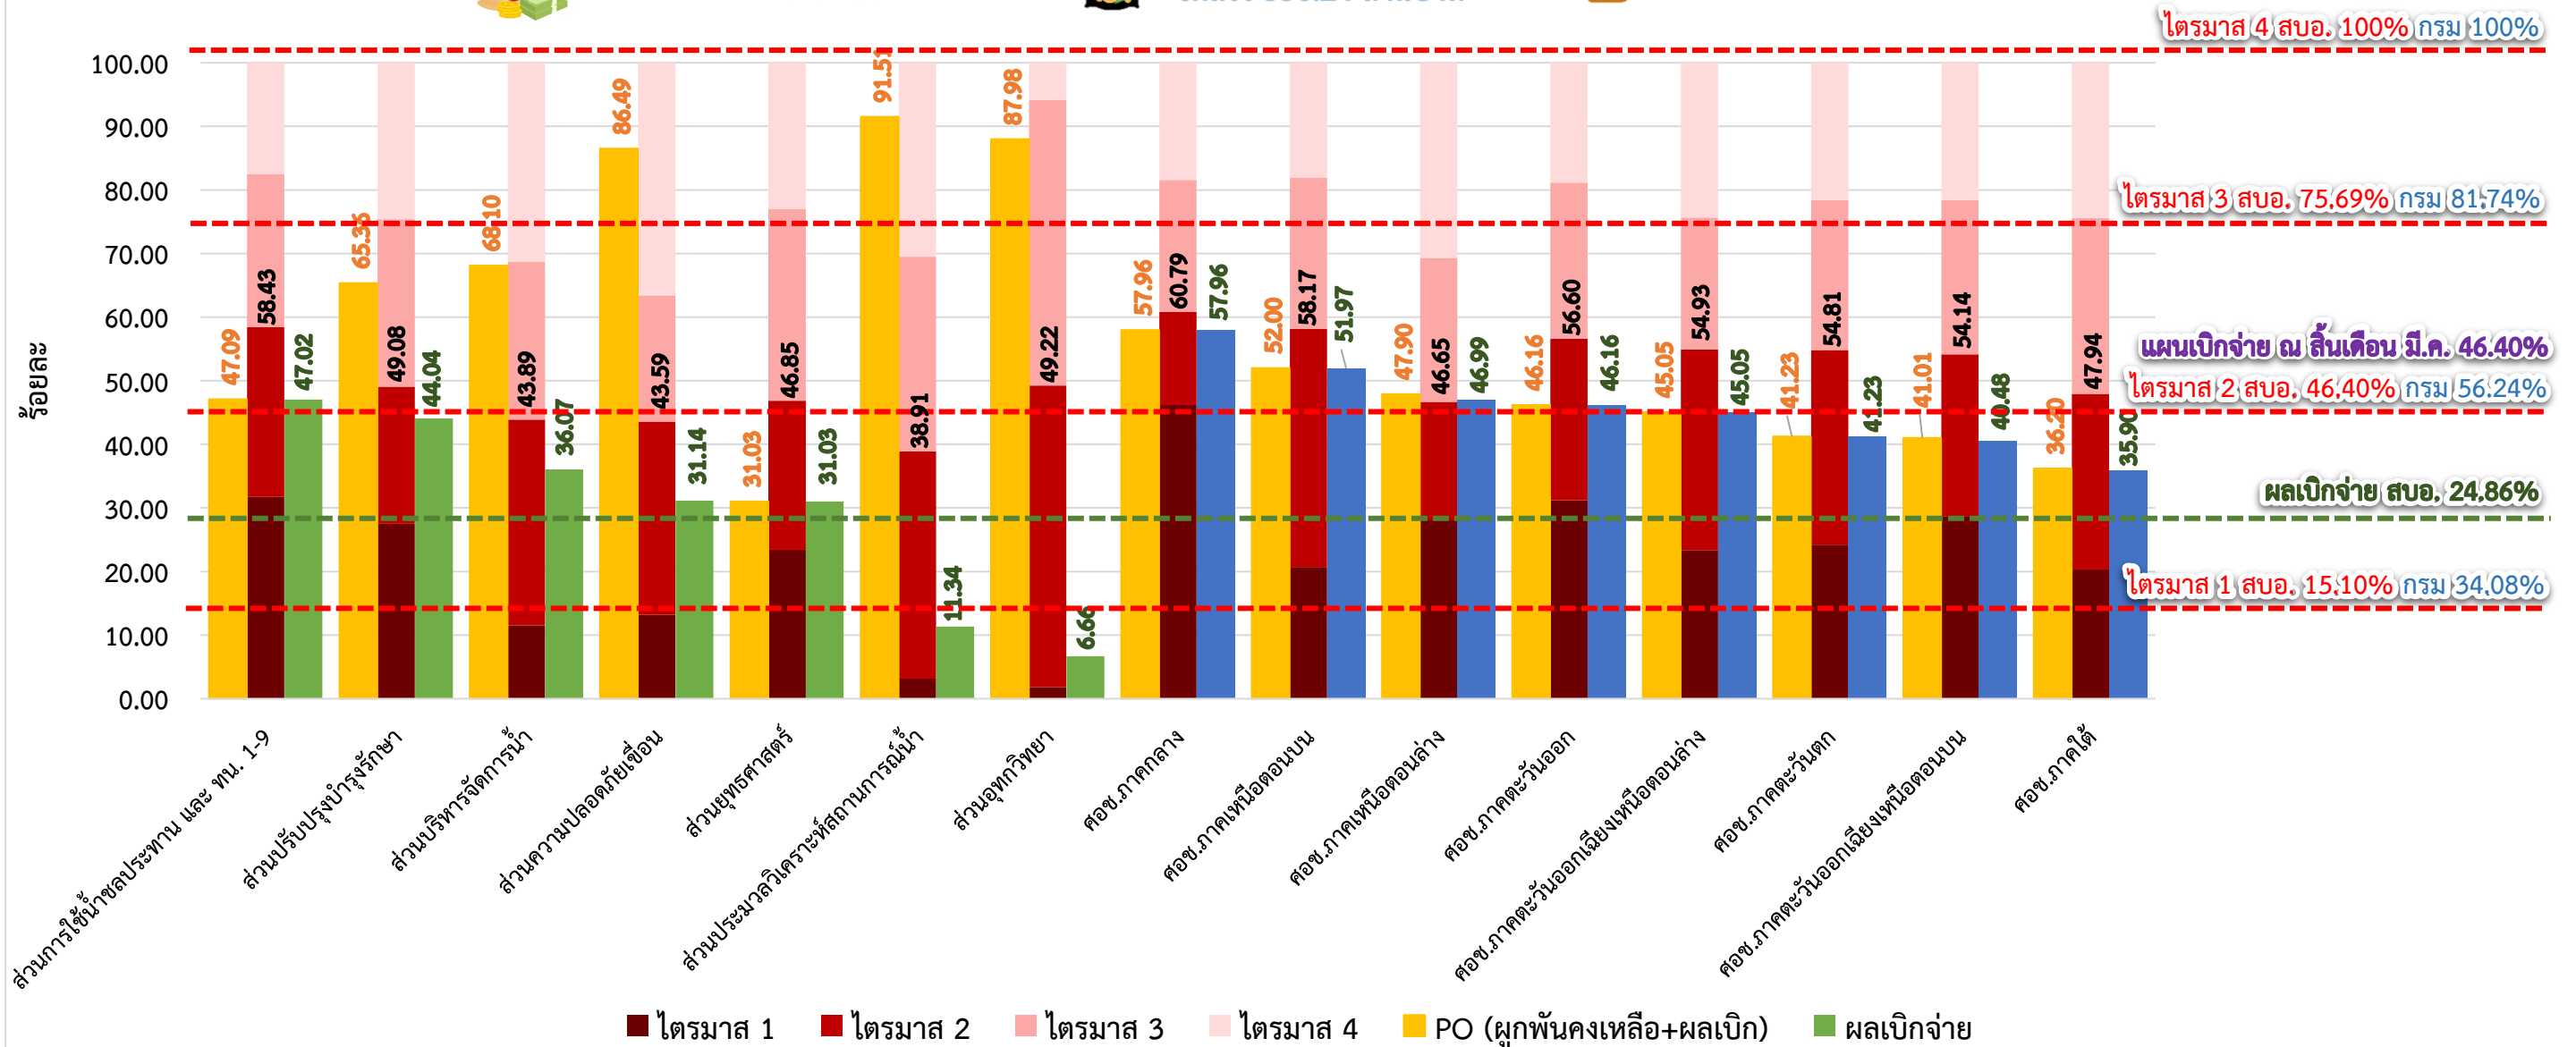

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (กันเหลื่อม 2567) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568

