



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ๕สบอ(ปค.)๐๔/๓๒๓/๒๕๖๘

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๘ เงินกู้ยืมปี ๒๕๖๗ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS Thai ของกองการเงินเรียบร้อยแล้ว

ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ดังนี้

แหล่งที่มาของงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	โอนกลับ ส่วนกลาง (บาท)	คงเหลือได้รับ จัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
รวมทุกแหล่งงบประมาณ	๘๔๓,๑๖๙,๓๓๑	๗,๙๐๕,๔๖๙	๘๓๕,๒๖๓,๘๖๒	๕๕๙,๓๔๕,๒๐๒	๖๖.๙๗
งบ พรบ. ๒๕๖๘	๕๖๒,๔๙๑,๑๐๐	๖,๖๖๗,๖๓๑	๕๕๕,๘๒๓,๔๖๙	๓๗๘,๖๘๓,๑๔๙	๖๘.๑๓
- หน่วยรับงบประมาณ สบอ.	๔๐๒,๑๓๓,๔๔๖	๒๑๙,๖๙๑	๔๐๑,๙๑๓,๗๕๕	๒๖๐,๒๗๒,๖๔๕	๖๔.๗๖
- หน่วยรับงบประมาณ สขป.๑-๑๗	๑๖๐,๓๕๗,๖๕๔	๖,๔๔๗,๙๔๐	๑๕๓,๙๐๙,๗๑๔	๑๑๘,๔๑๐,๕๐๔	๗๖.๙๔
เงินกู้ยืมปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๑๗,๐๐๘,๓๓๑	๙๘,๕๙๓	๒๑๖,๙๐๙,๗๓๘	๑๗๓,๗๗๙,๓๑๘	๘๐.๑๒
เงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖๓,๖๖๙,๙๐๐	๑,๑๓๙,๒๔๕	๖๒,๕๓๐,๖๕๕	๖,๘๘๒,๗๓๕	๑๑.๐๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายชวลิต ญลอม)

ผปบ.บอ.



รายงานผลเบิกจ่ายประจำปี

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 9 ก.ค. 68
68.13%

ค.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
2.03%	7.89%	15.10%	19.65%	25.08%	46.40%	62.10%	68.40%	75.57%	83.37%	87.89%	100%

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

งบประมาณ พ.ร.บ. 2568

งบประมาณ พ.ร.บ. 68

- จำนวน 214 รายการ ยกเลิก 2 รายการ 800,000 บาท
- คงเหลือ 212 รายการ 561,691,100 บาท
- โอนกลับส่วนกลางแล้ว (เหลือจ่าย/ส่วนต่างจากการทำ
- ข้อมูลพันงานจ้างเหมา) 5,867,631 บาท
- ได้รับจัดสรร 555,823,469 บาท (212 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 378,683,149 บาท
- คิดเป็น 68.13% (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 34 รายการ)
- คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 176,169,322 คิดเป็น 31.70%

562,491,100
บาท

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2568

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน

- จำนวน 26 รายการ (งานโครงการ 1 รายการ
- ครุภัณฑ์ 25 รายการ)
- โอนกลับส่วนกลางแล้ว 1,139,245 บาท
- ได้รับจัดสรร 62,530,655 บาท (26 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 6,882,735 บาท
- คิดเป็น 11.01%
- คงเหลือ 55,647,920 บาท คิดเป็น 88.99%

63,669,900
บาท

เงินกันเหลือมปี 2567

งบประมาณ เงินกันเหลือมปี

- จำนวน 49 รายการ
- แจ้งคืนกรมฯ 98,593 บาท
- คงเหลือได้รับจัดสรร 216,909,738 บาท
- (49 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 173,779,318 บาท
- คิดเป็น 80.12% (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 40 รายการ)
- คงเหลือ 43,130,419 บาท คิดเป็น 19.88%

217,008,331
บาท

หมายเหตุ : - ร้อยละผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบที่ได้รับจัดสรร

- โอนหน่วยรับงบประมาณ สบอ. วงเงิน 401,913,755 บาท
- ผลเบิกจ่ายจำนวน 260,272,645 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.76
- โอนหน่วยรับงบประมาณ สขป.1-17 วงเงิน 153,909,714 บาท
- ผลเบิกจ่ายจำนวน 118,410,504 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.94

เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายของกรมฯ



รายการ	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
รายจ่ายลงทุน	100	80	39	17	66	35	77	54	100	80
รายจ่ายประจำ	100	98	36	35	58	57	81	80	100	98
รายจ่ายภาพรวม	100	94	37	27	61	53	80	75	100	94

งบ พ.ร.บ.68 งบประมาณ 562,491,100 บาท

- ยกเลิก 2 รายการ 800,000 บาท
- คงเหลือ 212 รายการ 561,691,100 บาท
- ได้รับจัดสรรแล้ว 555,823,469 คิดเป็น 98.81% (212 รายการ)
- คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 176,169,322 คิดเป็น 31.70%
 - งานจ้างเหมาทั้งโครงการ 84,870,628 บาท
 - งานจ้างเหมาบางส่วน 38,929,365 บาท
 - งานดำเนินการเอง 52,369,329 บาท
- แผนเบิกจ่ายสะสม เดือน ก.ค. 463,382,529 บาท คิดเป็น 83.37%

งบกันเหลือมปี 67 งบประมาณ 192,008,361 บาท

- คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 43,130,419 บาท คิดเป็น 19.88%
- แผนเบิกจ่ายสะสม เดือน ก.ค. 190,021,238 บาท คิดเป็น 99.02%

เงินทุนหมุนเวียน 68 งบประมาณ 63,669,900 บาท

- คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 55,647,920 บาท คิดเป็น 88.99%
- แผนเบิกจ่ายสะสม เดือน ก.ค. 31,895,655 บาท คิดเป็น 51.01%

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบ พ.ร.บ. 2568

ข้อมูลจากระบบ Cen-Project ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)							
		1.ยังไม่ดำเนินการ	2.อนุมัติแผน	3.ประกาศ TOR	4.ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	5.เปิดซอง	6.อนุมัติรับ ราคา	7.ทำข้อ ผูกพัน	8.ยกเลิก
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	218	0	0	0	0	0	0	212	6
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	0	0	1	0
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	0	0	0	0	0	0	12	0
ส่วนอุทกวิทยา	27	0	0	0	0	0	0	27	0
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	9	0	0	0	0	0	0	7	2
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	13	0	0	0	0	0	0	12	1
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน และ ทน.1-9	49	0	0	0	0	0	0	46	2
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	36	0	0	0	0	0	0	35	1
ศอช.ภาคกลาง	10	0	0	0	0	0	0	10	0
ศอช.ภาคตะวันตก	8	0	0	0	0	0	0	8	0
ศอช.ภาคตะวันออก	8	0	0	0	0	0	0	8	0
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	0	0	0	0	0	0	7	0
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	12	0	0	0	0	0	0	12	0
ศอช.ภาคใต้	7	0	0	0	0	0	0	7	0
ศอช.ภาคเหนือตอนบน	11	0	0	0	0	0	0	11	0
ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง	8	0	0	0	0	0	0	8	0

หมายเหตุ : ยกเลิก 6 รายการ งบประมาณ 10,139,000 บาท

ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 684,000 บาท.

1. บำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV ลุ่มน้ำเจ้าพระยา พ.ศ.2568 (ตน.บอ.) งบประมาณ 684,000 บาท. (งานดำเนินการเอง) เนื่องจากยกเลิกระบบกล้อง CCTV ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ยกเลิก 2 รายการ งบประมาณ 4,800,000 บาท

1. การศึกษาวิศวกรรมการศึกษาจัดฝักตบขนาและวัชพืช ในทางน้ำชลประทาน งบประมาณ 3,000,000 บาท. (งานจ้างเหมา) เนื่องจากแผนงานซ้ำซ้อนกับแผนงานในปี 2566

2. โครงการศึกษาติดตามงานปรับปรุงระบบชลประทาน ประเทภะบะบสงน้ำ งบประมาณ 1,800,000 บาท. (งานดำเนินการเอง) เนื่องจากได้รับงบประมาณ ปี 2567

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 3,855,000 บาท.

1. บำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานภาพของเขื่อนจากการเข้าถึงข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน พ.ศ. 2568 งบประมาณ 3,855,000 บาท. (งานจ้างเหมา) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า (โครงการระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานภาพของเขื่อน จากการเข้าถึงข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร) ซึ่งจนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2568 ตามสัญญาที่ จ.54/2567/สบอ. ทั้งนี้หากโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2567 ยังไม่แล้วเสร็จจะสามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 ยกเลิก 2 รายการ งบประมาณ 800,000 บาท.

1. ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัยของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 งบประมาณ 250,000 บาท (งานดำเนินการเอง)

2. ซ่อมแซมบ้านพักพนักงานราชการ จำนวน 2 หลัง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 งบประมาณ 550,000 บาท (งานดำเนินการเอง) เนื่องจากได้รับแจ้งจากชลประทานมูลนิธิ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินว่าจะมีการะงับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2568 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ และเป็นการใช้งบประมาณโดยไม่คุ้มค่า

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบ พ.ร.บ. 2568

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)							
		1.ยังไม่ดำเนินการ	2.อนุมัติแผน	3.ประกาศ TOR	4.ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	5.เปิดซอง	6.อนุมัติรับ ราคา	7.ทำข้อ ผูกพัน	8.ยกเลิก
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	218	0	0	0	0	0	0	212	6
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	0	0	1	0
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	0	0	0	0	0	0	12	0
ส่วนอุทกวิทยา	27	0	0	0	0	0	0	27	0
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	9	0	0	0	0	0	0	7	2
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	13	0	0	0	0	0	0	12	1
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน และ ทน.1-9	49	0	0	0	0	0	0	46	2
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	36	0	0	0	0	0	0	35	1
ศอช.ภาคกลาง	10	0	0	0	0	0	0	10	0
ศอช.ภาคตะวันตก	8	0	0	0	0	0	0	8	0
ศอช.ภาคตะวันออก	8	0	0	0	0	0	0	8	0
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	0	0	0	0	0	0	7	0
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	12	0	0	0	0	0	0	12	0
ศอช.ภาคใต้	7	0	0	0	0	0	0	7	0
ศอช.ภาคเหนือตอนบน	11	0	0	0	0	0	0	11	0
ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง	8	0	0	0	0	0	0	8	0

2. ขอมแซมบ้านที่พักพนักงานราชการ จำนวน 2 หลัง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 งบประมาณ 550,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) เนื่องจากได้รับแจ้งจากชลประทานมูลนิธิ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินว่าจะมีการจัดการต่อสัญญาเช่าที่ดินปี 2568 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ และเป็นการใช้งบประมาณโดยไม่คุ้มค่า

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบ พรบ.68)

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
แผนการเบิกจ่าย สบอ. งบ พรบ. 2568 จำนวน 214 รายการ วงเงิน 562.49 ล้านบาท ยกเลิก 3 รายการ 1.25 ล้านบาท จัดสรรแล้ว 555.82 ล้านบาท 98.81% จำนวน 211 รายการ	66.44 ล้านบาท			255.1 ล้านบาท			416.06 ล้านบาท			555.82 ล้านบาท		
	11.95 %			45.9 %			74.86 %			100 %		
ผลการเบิกจ่าย งบพรบ. 2568	53.25 ล้านบาท 10.41%			161.36 ล้านบาท 29.33%			378.68 ล้านบาท 68.13%			378.68 ล้านบาท 68.13%		
	44.25 ล้านบาท 7.96 %			66.44 ล้านบาท 11.95 %			106.4 ล้านบาท 19.14 %			137.84 ล้านบาท 24.8 %		
- จ้างเหมาทั้งโครงการ (21 รายการ วงเงิน 171.08 ล้านบาท) จัดสรรแล้ว 169.32 ล้านบาท 98.97% (21/21)	8.82 ล้านบาท 6.61%			45.35 ล้านบาท 27.63%			81.99 ล้านบาท 49.98%			84.45 ล้านบาท 49.87%		
	13.62 ล้านบาท 8.04 %			16.33 ล้านบาท 9.65 %			24.22 ล้านบาท 14.3 %			35.85 ล้านบาท 21.17 %		
- จ้างเหมา+ดำเนินการเอง (26 รายการ วงเงิน 67.78 ล้านบาท (จ้างเหมา 57.15 ล้านบาท ดำเนินการเอง 10.63)) จัดสรรแล้ว 64.44 ล้านบาท 95.08% (26/26)	1.01 ล้านบาท 1.82%			8.17 ล้านบาท 12.88%			24.20 ล้านบาท 37.55%			24.54 ล้านบาท 38.08%		
	1.02 ล้านบาท 1.58 %			1.86 ล้านบาท 2.88 %			9.31 ล้านบาท 14.44 %			11.94 ล้านบาท 18.53 %		
- ดำเนินการเอง (167 รายการ วงเงิน 323.64 ล้านบาท) จัดสรรแล้ว 322.07 ล้านบาท 99.51% (164/164)	43.42 ล้านบาท 13.45%			107.84 ล้านบาท 33.42%			263.32 ล้านบาท 81.76%			269.7 ล้านบาท 83.74%		
	29.61 ล้านบาท 9.19 %			48.24 ล้านบาท 14.98 %			72.88 ล้านบาท 22.63 %			90.05 ล้านบาท 27.96 %		

หมายเหตุ : - ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 9 ก.ค. 2568

- ร้อยละผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบที่ได้รับจัดสรร
- โอนจัดสรรทุกหน่วยรับงบประมาณ 555,823,469 บาท ผลเบิกจ่ายจำนวน 378,683,149 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.13
- โอนหน่วยรับงบประมาณ สบอ. วงเงิน 401,913,755 บาท ผลเบิกจ่ายจำนวน 260,272,645 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.76
- โอนหน่วยรับงบประมาณ สขป.1-17 วงเงิน 153,909,714 บาท ผลเบิกจ่ายจำนวน 118,410,504 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.94
- ยกเลิก จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 1,250,000 บาท (โอนกลับส่วนกลางแล้ว)
- (1.175) ซ่อมแซมบ้านพักพนักงานราชการ จำนวน 2 หลัง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [178] งบประมาณ 550,000 บาท
- (1.29) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [508] งบประมาณ 250,000 บาท
- (1.53) การศึกษาอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ที่เหมาะสมโดยวิธีหว่านน้ำตมในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดกาฬสินธุ์ - [2079] งบประมาณ 450,000 บาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบเงินกันเหลื่อมปี 67)

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
เงินกันเหลื่อมปี 67 จำนวน 49 รายการ วงเงิน 217.01 ล้านบาท เงินเหลือจ่าย 0.21 ล้านบาท คงเหลือได้รับจัดสรร 191.91 ล้านบาท	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
คาดการณ์เบิกจ่าย	78.2 ล้านบาท			156.78 ล้านบาท			187.38 ล้านบาท			216.91 ล้านบาท		
	36.05 %			72.28 %			86.38 %			100 %		
ผลเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 67	65.35 ล้านบาท 34.05%			123.65 ล้านบาท 64.43%			167.59 ล้านบาท 77.26%			173.78 ล้านบาท 80.12%		
	63.57 ล้านบาท 29.31 %		78.2 ล้านบาท 36.05 %	105.86 ล้านบาท 48.8 %		125.08 ล้านบาท 57.67 %	156.78 ล้านบาท 72.28 %		169.35 ล้านบาท 78.07 %	181.71 ล้านบาท 83.77 %		187.38 ล้านบาท 86.38 %

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2568 จำนวน 26 รายการ วงเงิน 63.67 ล้านบาท) เงินเหลือจ่าย 1.14 ล้านบาท ปัจจุบันได้รับจัดสรร 62.53 ล้านบาท	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
คาดการณ์เบิกจ่าย							20.76 ล้านบาท			62.53 ล้านบาท		
							33.19 %			100 %		
ผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2568							6.88 ล้านบาท 11.01%			6.88 ล้านบาท 11.01%		
							5.27 ล้านบาท 8.43 %	12.4 ล้านบาท 19.83 %	20.76 ล้านบาท 33.19 %	31.9 ล้านบาท 51.01 %	31.9 ล้านบาท 51.01 %	62.53 ล้านบาท 100 %

หมายเหตุ : - จำนวน 26 รายการ งบประมาณ 63,669,900 บาท

1. งานโครงการ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 56,000,000 บาท
- โครงการเพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (RID Smart Water Management Platform : RID SWAMP) สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล (ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำ)
2. ครุภัณฑ์ จำนวน 25 รายการ งบประมาณ 7,669,900 บาท (ส่วนบริหารทั่วไป)
- ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบติดตาม CEN-project ณ วันที่ 9 ก.ค. 2568
- ร้อยละผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบที่ได้รับจัดสรร

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2568

โครงการ / หน่วยงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 2568				โอนกลับส่วนกลาง (เพื่อจ่าย/ส่วนต่างจากการทำข้อมูลพันธงาน จ้างเหมา/ยกเลิก)				ได้รับจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)				เบิกจ่ายแล้วเสร็จ				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร				แผนการเบิกจ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน ก.ค.68				คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (จัดสรร-ผลเบิก)				ผลต่าง
	จำนวน 214 รายการ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	20,094,400	10,000,000	10,094,400	350,000	350,000	0	1.74	12	19,744,400	9,650,000	10,094,400	14,897,431	7,720,000	7,177,431	75.45	0	0	0	0	0	0	0	0	18,256,063	9,650,000	8,606,063	92.46	4,846,969	1,930,000	2,916,969	24.55	-17.01
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	160,913,900	104,315,900	56,598,000	4,250,820	4,199,820	51,000	2.64	35	156,663,080	100,116,080	56,547,000	86,478,030	36,333,788	50,144,242	55.20	1	36,949,000	0	36,949,000	0	0	0	0	125,678,522	73,969,856	51,708,667	80.22	70,185,050	63,782,292	6,402,758	44.80	-25.02
ส่วนอุทกวิทยา	27	113,695,000	14,575,000	99,120,000	199,489	30,800	168,689	0.18	27	113,495,511	14,544,200	98,951,311	100,039,932	4,213,025	95,826,907	88.14	16	75,166,811	991,000	74,175,811	0	0	0	0	107,619,701	10,167,600	97,452,101	94.82	13,455,579	10,331,175	3,124,404	11.86	-6.68
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	7	15,100,000	4,900,000	10,200,000	14,000	14,000	0	0.09	7	15,086,000	4,886,000	10,200,000	9,921,895	1,947,515	7,974,380	65.77	1	396,000	396,000	0	0	0	0	0	13,237,073	4,385,610	8,851,463	87.74	5,164,105	2,938,485	2,225,620	34.23	-21.98
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	12	112,090,000	93,490,000	18,600,000	496,960	496,960	0	0.44	12	111,593,040	92,993,040	18,600,000	64,052,326	52,648,789	11,403,537	57.40	0	0	0	0	0	0	0	0	80,068,663	62,768,663	17,300,000	71.75	47,540,714	40,344,251	7,196,463	42.60	-14.35
ส่วนอุทกศาสตร์	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0.00	1	1,000,000	0	1,000,000	733,509	0	733,509	73.35	0	0	0	0	0	0	0	0	851,100	0	851,100	85.11	266,491	0	266,491	26.65	-11.76
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน และ พท.1-9	49	19,681,900	955,699	18,726,201	1,250,702	702	1,250,000	6.35	46	18,431,198	954,997	17,476,201	13,769,421	0	13,769,421	74.71	0	0	0	0	0	0	0	0	15,848,704	310,000	15,538,704	85.99	3,690,779	0	3,690,779	20.02	-11.28
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	11	18,575,400	0	18,575,400	0	0	0	0.00	11	18,575,400	0	18,575,400	14,290,683	0	14,290,683	76.93	6	2,217,400	0	2,217,400	0	0	0	0	16,610,500	0	16,610,500	89.42	4,284,717	0	4,284,717	23.07	-12.49
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	15,278,700	0	15,278,700	415	0	415	0.00	8	15,278,285	0	15,278,285	12,128,149	0	12,128,149	79.38	4	3,003,445	0	3,003,445	0	0	0	0	11,731,325	0	11,731,325	76.78	3,150,136	0	3,150,136	20.62	-2.60
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	15,308,200	0	15,308,200	0	0	0	0.00	7	15,308,200	0	15,308,200	10,343,629	0	10,343,629	67.57	0	0	0	0	0	0	0	0	13,105,200	0	13,105,200	85.61	4,964,571	0	4,964,571	32.43	-18.04
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	12	17,493,000	0	17,493,000	0	0	0	0.00	12	17,493,000	0	17,493,000	12,883,974	0	12,883,974	73.65	0	0	0	0	0	0	0	0	14,535,900	0	14,535,900	83.10	4,609,026	0	4,609,026	26.35	-9.44
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,050,400	0	13,050,400	1,075	0	1,075	0.01	10	13,049,325	0	13,049,325	10,626,309	0	10,626,309	81.43	5	2,841,885	0	2,841,885	0	0	0	0	11,545,597	0	11,545,597	88.48	2,423,016	0	2,423,016	18.57	-7.04
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	8	12,466,000	0	12,466,000	0	0	0	0.00	8	12,466,000	0	12,466,000	8,780,250	0	8,780,250	70.43	0	0	0	0	0	0	0	0	10,968,000	0	10,968,000	87.98	3,685,750	0	3,685,750	29.57	-17.55
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,822,600	0	10,822,600	0	0	0	0.00	8	10,822,600	0	10,822,600	7,965,946	0	7,965,946	73.60	0	0	0	0	0	0	0	0	9,302,351	0	9,302,351	85.95	2,856,654	0	2,856,654	26.40	-12.35
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	7	16,921,600	0	16,921,600	104,170	0	104,170	0.62	7	16,817,430	0	16,817,430	11,771,664	0	11,771,664	70.00	1	345,830	0	345,830	0	0	0	0	14,023,830	0	14,023,830	83.39	5,045,766	0	5,045,766	30.00	-13.39
รวมทั้งสิ้น	214	562,491,100	228,236,599	334,254,501	6,667,631	5,092,282	1,575,349	1.19	211	555,823,469	223,144,317	332,679,152	378,683,149	102,863,117	275,820,032	68.13	34	120,920,371	1,387,000	119,533,371	0	0	0	0	463,382,529	161,251,729	302,130,801	83.37	176,169,322	119,326,203	56,843,119	31.70	-15.24

หมายเหตุ : - ผลเบิกจ่าย และคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย

ร้อยละเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- โอนกลับส่วนกลาง (เหลือจ่าย/ส่วนต่างจาก

การทำข้อมูลพันธงานจ้างเหมา/ยกเลิก) และแผนการเบิกจ่าย

ร้อยละเปรียบเทียบกับ งบ พ.ร.บ. 68

ความหมายของแต่ละสีที่ไฮไลท์ในคอลัมน์ "เบิกจ่าย (ร้อยละ)"

- สีเขียว หมายถึง เบิกจ่ายเกินแผนคาดการณ์

- สีเหลือง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์ไม่เกิน ร้อยละ 10

- สีแดง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์เกิน ร้อยละ 10

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2568

- จำนวน 218 รายการ งบประมาณ 571,830,100 บาท

- ขอยกเลิกก่อนได้รับการโอนจัดสรรจ จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 9,339,000 บาท

- ขอยกเลิกหลังได้รับการจัดสรร จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 1,250,000 บาท (โอนกลับส่วนกลางแล้ว)

(1.175) ซ่อมแซมบ้านพักพนักงานราชการ จำนวน 2 หลัง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [178] งบประมาณ 550,000 บาท

(1.29) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2568 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [508] งบประมาณ 250,000 บาท

(1.53) การศึกษาอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ที่เหมาะสมโดยวิธีหว่านน้ำตมในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี - [2079] งบประมาณ 450,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2568

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 68			ผลเบิกจ่ายทุกศูนย์ต้นทุน									ผลเบิกจ่ายเฉพาะส่วนกลาง									ผลเบิกจ่ายเฉพาะส่วนภูมิภาค												
					วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย (บาท)			คิดเป็น (ร้อยละ)	ผูกพันคงเหลือ (บาท)			วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย (บาท)			คิดเป็น (ร้อยละ)	ผูกพันคงเหลือ (บาท)			วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย (บาท)			คิดเป็น (ร้อยละ)	ผูกพันคงเหลือ (บาท)			
		รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง		รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง		รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง		รวม	จำแนก	ดำเนินการเอง	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	212	562,491,100	228,223,600	334,267,500	555,823,469	223,144,317	332,679,152	378,683,149	102,863,117	267,845,652	68.13	115,234,642	114,411,055	823,587	401,913,755	207,887,343	194,026,412	260,272,645	88,561,140	171,711,504	64.76	113,795,151	113,456,057	339,094	153,909,714	15,256,974	138,652,740	118,410,504	14,301,976	104,108,528	76.94	1,439,490	954,997	484,493	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	160,913,900	104,315,900	56,598,000	156,663,080	100,116,080	56,547,000	86,478,030	36,333,788	50,144,242	55.20	58,507,147	58,507,147	0	156,663,080	100,116,080	56,547,000	86,478,030	36,333,788	50,144,242	55.20	58,507,147	58,507,147	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน และ พน.1-9	47	19,681,900	942,700	18,739,200	18,431,198	954,997	17,476,201	13,769,421	0	13,769,421	74.71	1,024,949	954,997	69,952	1,460,401	0	1,460,401	970,071	0	970,071	66.42	0	0	0	16,970,797	954,997	16,015,800	12,799,351	0	12,799,351	75.42	1,024,949	954,997	69,952	
ส่วนควบคุมลวดดักขยะ	12	112,090,000	93,490,000	18,600,000	111,593,040	92,993,040	18,600,000	64,052,326	52,648,789	11,403,537	57.40	40,043,612	39,749,250	294,362	87,511,063	78,691,063	8,820,000	43,124,329	38,346,812	4,777,517	49.28	39,849,240	39,749,250	99,990	24,081,977	14,301,977	9,780,000	20,927,997	14,301,976	6,626,021	86.90	194,372	0	194,372	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	20,094,400	10,000,000	10,094,400	19,744,400	9,650,000	10,094,400	14,897,431	7,720,000	7,177,431	75.45	2,179,503	1,930,000	249,503	19,500,400	9,650,000	9,850,400	14,816,461	7,720,000	7,096,461	75.98	2,019,110	1,930,000	89,110	244,000	0	244,000	80,970	0	80,970	33.18	160,393	0	160,393	
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	7	15,100,000	4,900,000	10,200,000	15,086,000	4,886,000	10,200,000	9,921,895	1,947,515	0	65.77	2,988,479	2,938,485	49,994	15,086,000	4,886,000	10,200,000	9,921,895	1,947,515	7,974,380	65.77	2,988,479	2,938,485	49,994	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	733,509	0	733,509	73.35	0	0	0	1,000,000	733,509	733,509	0	733,509	73.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
ส่วนอุทกวิทยา	27	113,695,000	14,575,000	99,120,000	113,495,511	14,544,200	98,951,311	100,039,932	4,213,025	95,826,907	88.14	10,331,175	10,331,175	0	113,495,511	14,544,200	98,951,311	100,039,932	4,213,025	95,826,907	88.14	10,331,175	10,331,175	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,050,400	0	13,050,400	13,049,325	0	13,049,325	10,626,309	0	10,626,309	81.43	0	0	0	724,300	0	724,300	475,155	0	475,155	65.60	0	0	0	12,325,025	0	12,325,025	10,151,154	0	10,151,154	82.36	0	0	0	0
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,822,600	0	10,822,600	10,822,600	0	10,822,600	7,965,946	0	7,965,946	73.60	0	0	0	690,000	0	690,000	327,956	0	327,956	47.53	0	0	0	10,132,600	0	10,132,600	7,637,990	0	7,637,990	75.38	0	0	0	0
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	8	12,466,000	0	12,466,000	12,466,000	0	12,466,000	8,780,250	0	8,780,250	70.43	0	0	0	900,000	0	900,000	460,189	0	460,189	51.13	0	0	0	11,566,000	0	11,566,000	8,320,061	0	8,320,061	71.94	0	0	0	0
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	15,308,200	0	15,308,200	15,308,200	0	15,308,200	10,343,629	0	10,343,629	67.57	0	0	0	975,000	0	975,000	655,570	0	655,570	67.24	0	0	0	14,333,200	0	14,333,200	9,688,059	0	9,688,059	67.59	0	0	0	0
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	12	17,493,000	0	17,493,000	17,493,000	0	17,493,000	12,883,974	0	12,883,974	73.65	0	0	0	920,000	0	920,000	634,174	0	634,174	68.93	0	0	0	16,573,000	0	16,573,000	12,249,800	0	12,249,800	73.91	0	0	0	0
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	7	16,921,600	0	16,921,600	16,817,430	0	16,817,430	11,771,664	0	11,771,664	70.00	0	0	0	1,053,000	0	1,053,000	662,295	0	662,295	62.90	0	0	0	15,764,430	0	15,764,430	11,109,370	0	11,109,370	70.47	0	0	0	0
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	11	18,575,400	0	18,575,400	18,575,400	0	18,575,400	14,290,683	0	14,290,683	76.93	14,706	0	14,706	1,021,000	0	1,021,000	661,566	0	661,566	64.80	0	0	0	17,554,400	0	17,554,400	13,629,117	0	13,629,117	77.64	14,706	0	14,706	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	15,278,700	0	15,278,700	15,278,285	0	15,278,285	12,128,149	0	12,128,149	79.38	145,070	0	145,070	914,000	0	914,000	311,513	0	311,513	34.08	100,000	0	100,000	14,364,285	0	14,364,285	11,816,636	0	11,816,636	82.26	45,070	0	45,070	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

รายการงบประมาณ : **เงินกันเหลื่อมปี 2567**

โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2567				งบหมดความจำเป็น/เหลือจ่าย (งานแล้วเสร็จ/ยกเลิก)				คงเหลืองบประมาณ (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (เทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)				เบิกจ่ายแล้วเสร็จ				แผนการเบิกจ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน ก.ค.68				คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (จัดสรร-ผลเบิก)				ผลต่าง
	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	
ส่วนประมวศิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	73,592,479	72,425,384	1,167,095	98,568	25,600	72,968	0.13	73,493,911	72,399,784	1,094,127	99.87	73,493,911	72,399,784	1,094,127	99.87	30	73,493,911	72,399,784	1,094,127	73,493,911	72,399,784	1,094,127	81.54	0	0	0	0.00	18.33
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	8	98,242,824	98,242,824	0	115,000	115,000	0	0.12	98,242,824	98,242,824	0	100.00	67,853,359	67,853,359	0	69.07	4	37,709,397	37,709,397	0	73,242,824	73,242,824	0	28.20	30,389,465	30,389,465	0	30.93	40.87
ส่วนอุทกวิทยา	8	35,618,878	35,543,953	74,925	25	0	25	0.00	35,618,853	35,543,953	74,900	100.00	27,797,409	27,722,509	74,900	78.04	4	17,769,653	17,694,753	74,900	33,730,353	33,655,453	74,900	36.05	7,821,444	7,821,444	0	21.96	41.99
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	2	9,551,150	9,551,150	0	0	0	0	0.00	9,551,150	9,551,150	0	100.00	4,631,640	4,631,640	0	48.49	1	297,750	297,750	0	9,551,150	9,551,150	0	56.40	4,919,510	4,919,510	0	51.51	-7.91
ศูนย์อุทกวิทยาส่งรายงานภาคเหนือตอนบน	1	3,000	0	3,000	0	0	0	0.00	3,000	0	3,000	100.00	3,000	0	3,000	100.00	1	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	100.00	0	0	0	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	49	217,008,331	215,763,311	1,245,020	213,593	140,600	72,993	0.10	216,909,738	215,737,711	1,172,027	99.95	173,779,318	172,607,291	1,172,027	80.12	40	129,273,711	128,101,684	1,172,027	190,021,238	188,849,211	1,172,027	87.60	43,130,419	43,130,419	0	19.88	-7.49

หมายเหตุ : - เบิกจ่ายร้อยละเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร 1 รายการ งบประมาณ 25,000,000 บาท (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กั้นไว้เบิกเหลือปี (ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณเงินกัน หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) (1)	สถานะการดำเนินงาน 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน 3. ยกเลิกรายการ (โปรดระบุเหตุผล ที่ยกเลิกในช่องหมายเหตุ)	ระบุสาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค ที่ยังเบิกจ่ายเงินกันไม่แล้ว เสร็จ ***โปรดระบุทุกรายการ	คาดว่าจะเบิกจ่าย ทัน/ไม่ทัน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 68 (โปรดระบุ 1 ในช่องใดช่องหนึ่ง)		โปรดระบุเดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินกัน แล้วเสร็จ	โปรดระบุงบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่าย ไม่ทัน ภายใน วันที่ 30 ก.ย. 68	การดำเนินงานปัจจุบัน	หมายเหตุ
							ทันภายในวันที่ 30 ก.ย. 68	ไม่ทันภายในวันที่ 30 ก.ย. 68				
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 9 รายการ		62,636,027.02								
1	ส่วนอุทกวิทยา (ตค.บอ.)	โครงการประเมินผลกระทบต่อกอนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดทำแผนการจัดการตะกอนอย่างยั่งยืนในหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ส่วนอุทกวิทยา - [2153]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,779,000.00	2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกตามงวดงาน	1		เดือน ส.ค. 68		- งวดที่ 3 ประชุมตรวจรับงานวันที่ 23 มิ.ย.68 คาดว่าเบิกจ่าย ก.ค.68 - งวดที่ 4 ครบส่งมอบงานวันที่ 9 ส.ค. 68 (4 งวด) เนื่องจากปรับแก้ ราคากลาง ทำให้แผนงานล่าช้ากว่ากำหนด	ลงนามสัญญา 13 ก.ย. 67 เริ่มต้นสัญญา 14 ก.ย. 67 สิ้นสุดสัญญา 9 ส.ค. 68 (4 งวด) เนื่องจากปรับแก้ ราคากลาง ทำให้แผนงานล่าช้ากว่ากำหนด
2	ส่วนอุทกวิทยา (ตค.บอ.)	โครงการประเมินผลกระทบต่อกอนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดทำแผนการจัดการตะกอนอย่างยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ส่วนอุทกวิทยา - [2154]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,775,000.00	2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกตามงวดงาน	1		เดือน ส.ค. 68		- งวดที่ 3 ประชุมตรวจรับงานวันที่ 23 มิ.ย.68 ส่งพัสดุเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 68 คาดว่าเบิกจ่าย ก.ค.68 - งวดที่ 4 ครบส่งมอบงานวันที่ 9 ส.ค. 68 (4 งวด) เนื่องจากปรับแก้ ราคากลาง ทำให้แผนงานล่าช้ากว่ากำหนด	ลงนามสัญญา 13 ก.ย. 67 เริ่มต้นสัญญา 14 ก.ย. 67 สิ้นสุดสัญญา 9 ส.ค. 68 (4 งวด) เนื่องจากปรับแก้ ราคากลาง ทำให้แผนงานล่าช้ากว่ากำหนด
3	ส่วนอุทกวิทยา (ตค.บอ.)	(31) โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในทางน้ำชลประทานตามมาตรา 5 และ มาตรา 8 ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2267]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	4,898,600.00	2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกตามงวดงาน	1		เดือน ก.ค. 68		- งวดที่ 3 อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานจากผู้รับจ้าง ส่งเอกสารให้พัสดุเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 68 (งวดสุดท้าย)	เริ่มต้นสัญญา 28 มิ.ย. 67 สิ้นสุดสัญญา 23 พ.ค. 68 (3 งวด) เนื่องจากปรับแก้ ราคากลาง ทำให้แผนงานล่าช้ากว่ากำหนด
4	ส่วนอุทกวิทยา (ตค.บอ.)	(32) โครงการเฝ้าระวังตะกอนในทางน้ำชลประทานตามมาตรา 5 และ มาตรา 8 ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2268]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	5,396,600.00	2.อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกตามงวดงาน	1		เดือน ก.ค. 68		- งวดที่ 3 อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานจากผู้รับจ้าง ส่งเอกสารให้พัสดุเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 68 (งวดสุดท้าย)	เริ่มต้นสัญญา 28 มิ.ย. 67 สิ้นสุดสัญญา 23 พ.ค. 68 (3 งวด) เนื่องจากปรับแก้ ราคากลาง ทำให้แผนงานล่าช้ากว่ากำหนด
5	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.18) โครงการจ้างศึกษาการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารชลประทานที่สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2160]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,716,400.00	2.อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ประชุมตรวจรับงานงวดสุดท้ายเดือนกรกฎาคม	1		เดือน ส.ค. 68		- งวดที่ 3 เบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 15 ก.ค. 68 - งวดที่ 4 คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 29 ส.ค. 68 งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)	ลงนามสัญญา 25 มิ.ย. 67 เริ่มต้นสัญญา 26 มิ.ย. 67 สิ้นสุดสัญญา 21 มิ.ย. 68 (4 งวด)
6	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(40) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีอุทกเณิน (EAP) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี - [2276]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	20,056,348.59	1.ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างเบิกเงินจ่ายงวดสุดท้าย	1		เดือน ก.ค. 68			เริ่มต้นสัญญา 31 พ.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 26 พ.ค. 68 (8 งวด)
7	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(41) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีอุทกเณิน (EAP) เขื่อนลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา - [2277]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	13,760,678.43	1.ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างเบิกเงินจ่ายงวดสุดท้าย	1		เดือน ก.ค. 68			เริ่มต้นสัญญา 31 พ.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 26 พ.ค. 68 (8 งวด)
8	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเกณฑ์การใช้ประโยชน์อ่างเก็บน้ำหลากวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของกรมชลประทาน	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	9,253,400.00	2.อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ตรวจรับล่าช้าเนื่องจากงานมีความละเอียดและซับซ้อน	1		เดือน ก.ค. 68		- งวดที่ 3 และ 4 ตรวจรับเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 68 ส่งเอกสารให้พัสดุ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 68 รอเบิกจ่าย	เริ่มต้นสัญญา 1 ต.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 29 มี.ค. 68
9	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	โครงการพัฒนาศูนย์กำกับติดตามและควบคุมสั่งการพร้อมระบบบริหารจัดการน้ำด้วยข้อมูลสารสนเทศ		25,000,000.00	2.อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายตามงวด	1		เดือน ก.ย. 68		ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าลงนาม 11 ก.ค.68	สัญญาที่ ข.24/2568/สบอ. วันเริ่มสัญญา 16 ก.ค. 68 สิ้นสุดสัญญา 13 ก.ย. 68 อายุสัญญา 60 วัน ระยะเวลาเบิกงวดที่ 1 30 วัน งบประมาณเบิกงวด 1 จำนวน 14,985,000 บาท ระยะเวลาเบิกงวดที่ 2 60 วัน งบประมาณเบิกงวด 1 จำนวน 9,990,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2568

โครงการ / หน่วยงาน	เงินทุนฯ พ.ศ. 2568				โอนกลับส่วนกลาง (เหลือจ่าย/ส่วนต่างจาก การทำข้อผูกพันงานจ้างเหมา/ยกเลิก)				ได้รับจัดสรร (บาท)					ผลการเบิกจ่าย (เทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร				แผนการเบิกจ่าย (สะสม) ณ สิ้นเดือน ก.ค.68				คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (จัดสรร-ผลเบิก)				ผลต่าง
	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ	
ส่วนประมวลวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ	1	56,000,000	56,000,000	0	300,000	300,000	0	0.54	1	55,700,000	55,700,000	0	99.46	5,570,000	5,570,000	0	10.00	0	0	0	0	25,065,000	25,065,000	0	45.00	50,130,000	50,130,000	0	90.00	-35.00
ส่วนบริหารทั่วไป	25	7,669,900	0	7,669,900	839,245	0	839,245	10.94	25	6,830,655	0	6,830,655	89.06	1,312,735	0	1,312,735	19.22	0	0	0	0	6,830,655	0	6,830,655	100.00	5,517,920	0	5,517,920	80.78	-80.78
รวมทั้งสิ้น	26	63,669,900	56,000,000	7,669,900	1,139,245	300,000	839,245	1.79	26	62,530,655	55,700,000	6,830,655	98.21	6,882,735	5,570,000	1,312,735	11.01	0	0	0	0	31,895,655	25,065,000	6,830,655	51.01	55,647,920	50,130,000	5,517,920	88.99	-40.00


- หมายเหตุ :
- ความหมายของแต่ละสีที่ไฮไลทในคอลัมน์ "เบิกจ่าย (ร้อยละ)"
- สีเขียว หมายถึง เบิกจ่ายเกินแผนคาดการณ์
 - สีเหลือง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์ไม่เกิน ร้อยละ 10
 - สีแดง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์เกิน ร้อยละ 10

งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2568 (ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการงาน	งบประมาณเงินทุน หมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน (บาท)	สถานการณ์ดำเนินงาน 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน 3. ยกเลิกรายการ (โปรดระบุเหตุผล ที่ยกเลิกในช่องหมายเหตุ)	ระบุสาเหตุ/ปัญหาอุปสรรคที่ยังเบิกจ่ายเงินทุนฯ ไม่แล้วเสร็จ ***โปรดระบุทุกรายการ	คาดว่าจะเบิกจ่าย ทัน/ไม่ทัน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 68 (โปรดระบุ 1 ในช่องใดช่องหนึ่ง)		เดือนที่คาดว่าจะเบิก จ่ายเงินกันแล้วเสร็จ	โปรดระบุงบประมาณที่คาด ว่าจะเบิกจ่าย ไม่ทันภายใน วันที่ 30 ก.ย. 68	หมายเหตุ
						ทันภายในวันที่ 30 ก.ย. 68	ไม่ทันภายในวันที่ 30 ก.ย. 68			
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 7 รายการ	61,920,000.00							
1	ส่วนบริหารทั่วไป	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น - (97)	1,055,000	2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ขั้นตอนการประสานงานและดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และมีเอกสารที่ต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้ดำเนินการล่าช้า	1		ภายใน ก.ค. 68		อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
2	ส่วนบริหารทั่วไป	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น - (93)	1,055,000	2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ขั้นตอนการประสานงานและดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และมีเอกสารที่ต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้ดำเนินการล่าช้า	1		ภายใน ก.ค. 68		อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
3	ส่วนบริหารทั่วไป	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น - (92)	850,000	2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ขั้นตอนการประสานงานและดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และมีเอกสารที่ต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้ดำเนินการล่าช้า	1		ภายใน ก.ค. 68		อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
4	ส่วนบริหารทั่วไป	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น - (91)	1,055,000	2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ขั้นตอนการประสานงานและดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และมีเอกสารที่ต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้ดำเนินการล่าช้า	1		ภายใน ก.ค. 68		อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
5	ส่วนบริหารทั่วไป	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น - (90)	850,000	2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ขั้นตอนการประสานงานและดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และมีเอกสารที่ต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้ดำเนินการล่าช้า	1		ภายใน ก.ค. 68		อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
6	ส่วนบริหารทั่วไป	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น - (88)	1,055,000	2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ขั้นตอนการประสานงานและดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และมีเอกสารที่ต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้ดำเนินการล่าช้า	1		ภายใน ก.ค. 68		อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
7	ส่วนประมวล วิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ	โครงการเพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (RID Smart Water Management Platform : RID SWAMP) สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล	56,000,000	2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายตามงวด		1	ภายใน 26 พ.ย. 68	19,495,000	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงานงวดที่ 2 ลงนามสัญญา 31 มี.ค. 68 ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน เริ่มต้นสัญญา 1 เม.ย. 68 สิ้นสัญญา 29 พ.ย. 68 จำนวนงวด 6 งวด

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2568) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

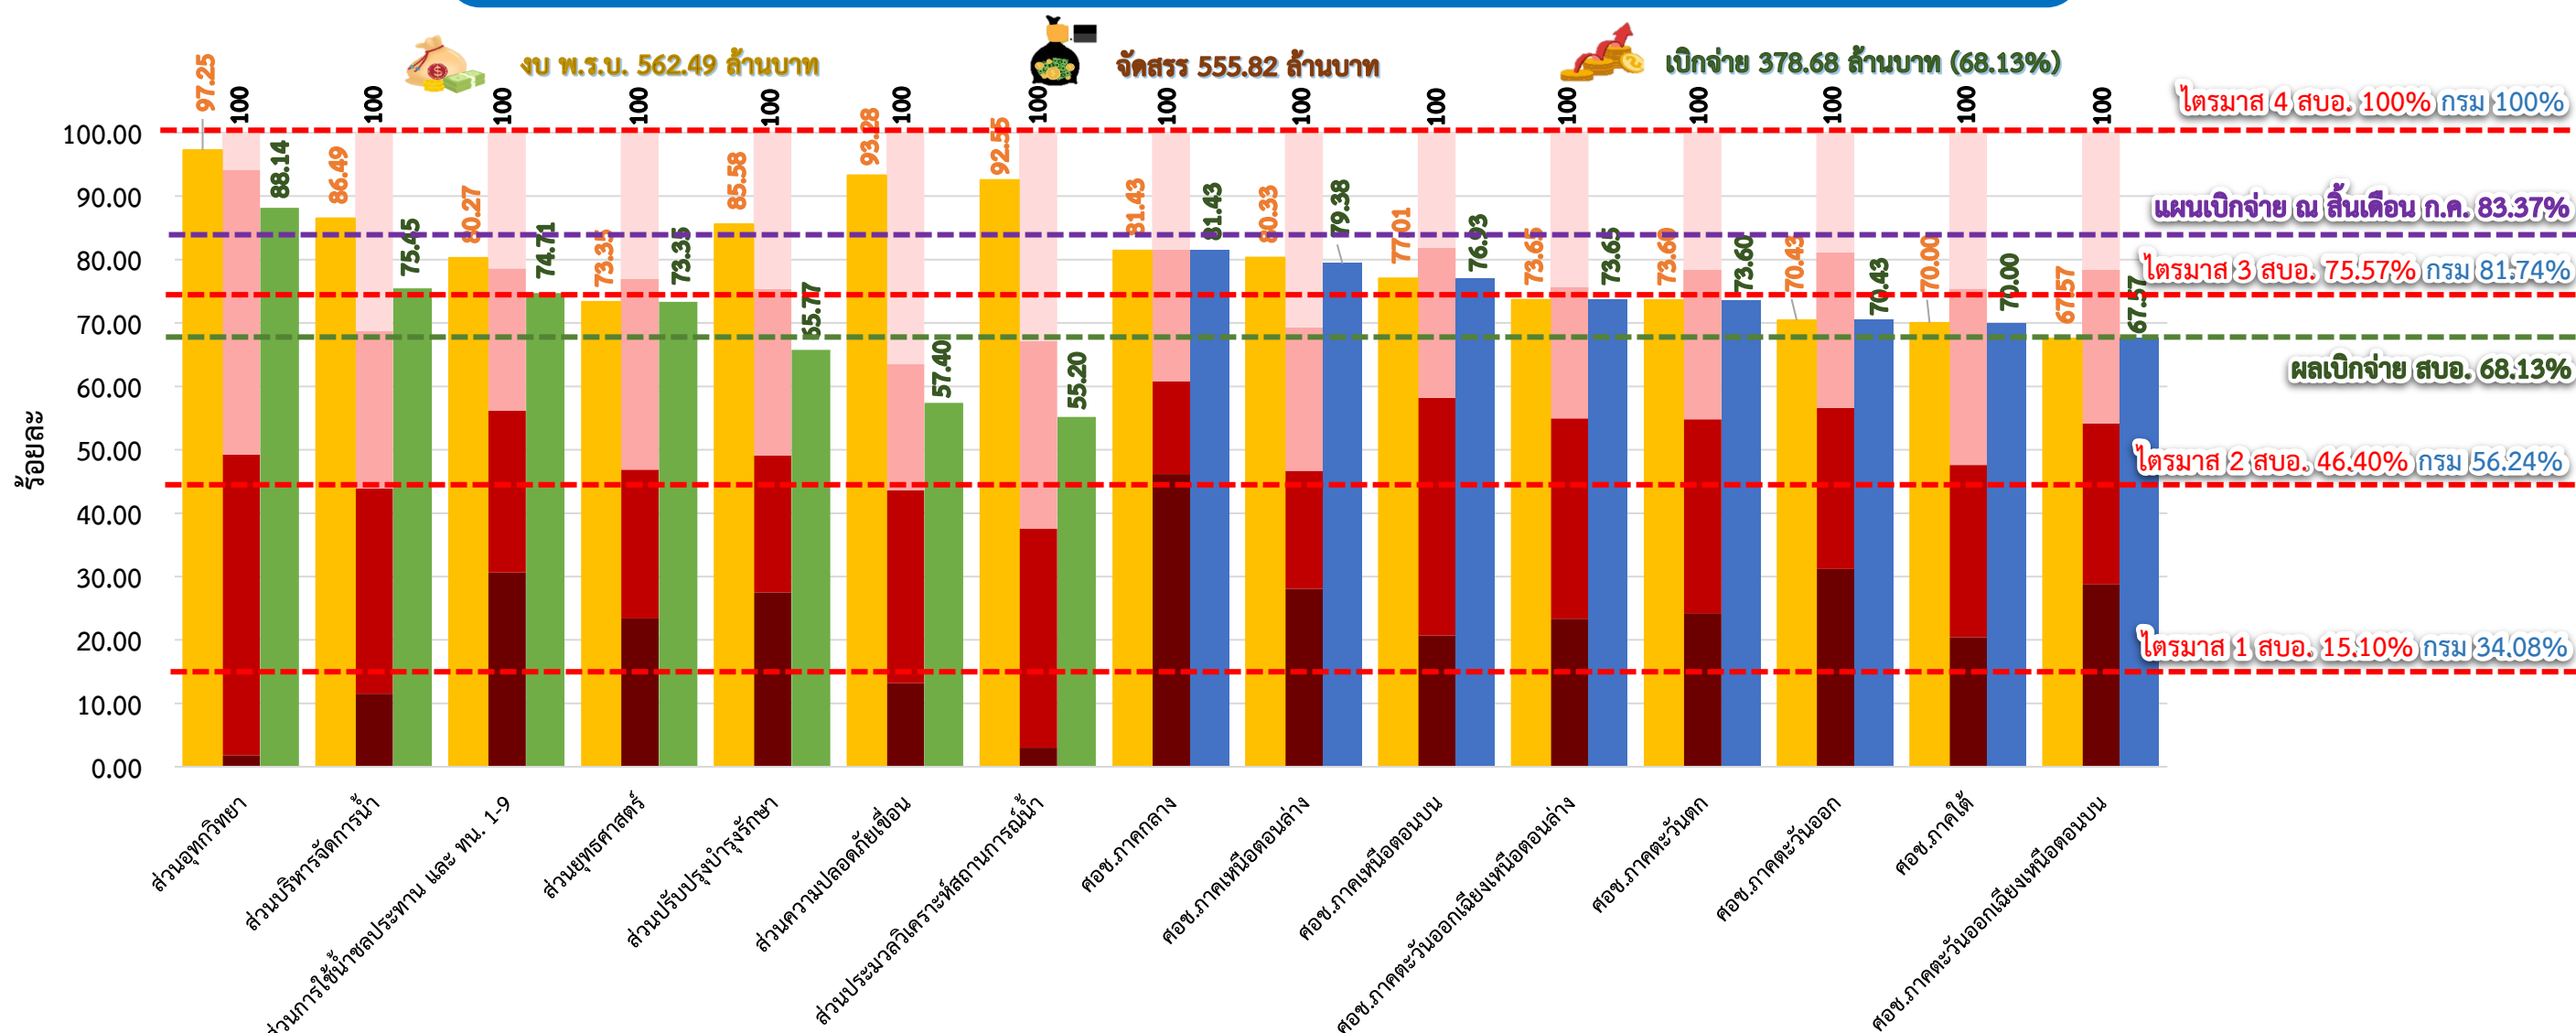


แผนและผลการเบิกจ่าย งบ พ.ร.บ.68 (สะสม) รายเดือน

เดือน	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
แผนสะสม (%)	2.03	7.89	15.10	19.65	25.08	46.40	62.10	68.40	75.57	84.17	88.73	100.00
ผลเบิกจ่าย (%)	2.22	5.69	11.97	16.96	24.86	37.81	50.53	59.60	67.12			

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 PO (ผูกพันคงเหลือ+ผลเบิก) ผลเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (กันเหล้ม 2567) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

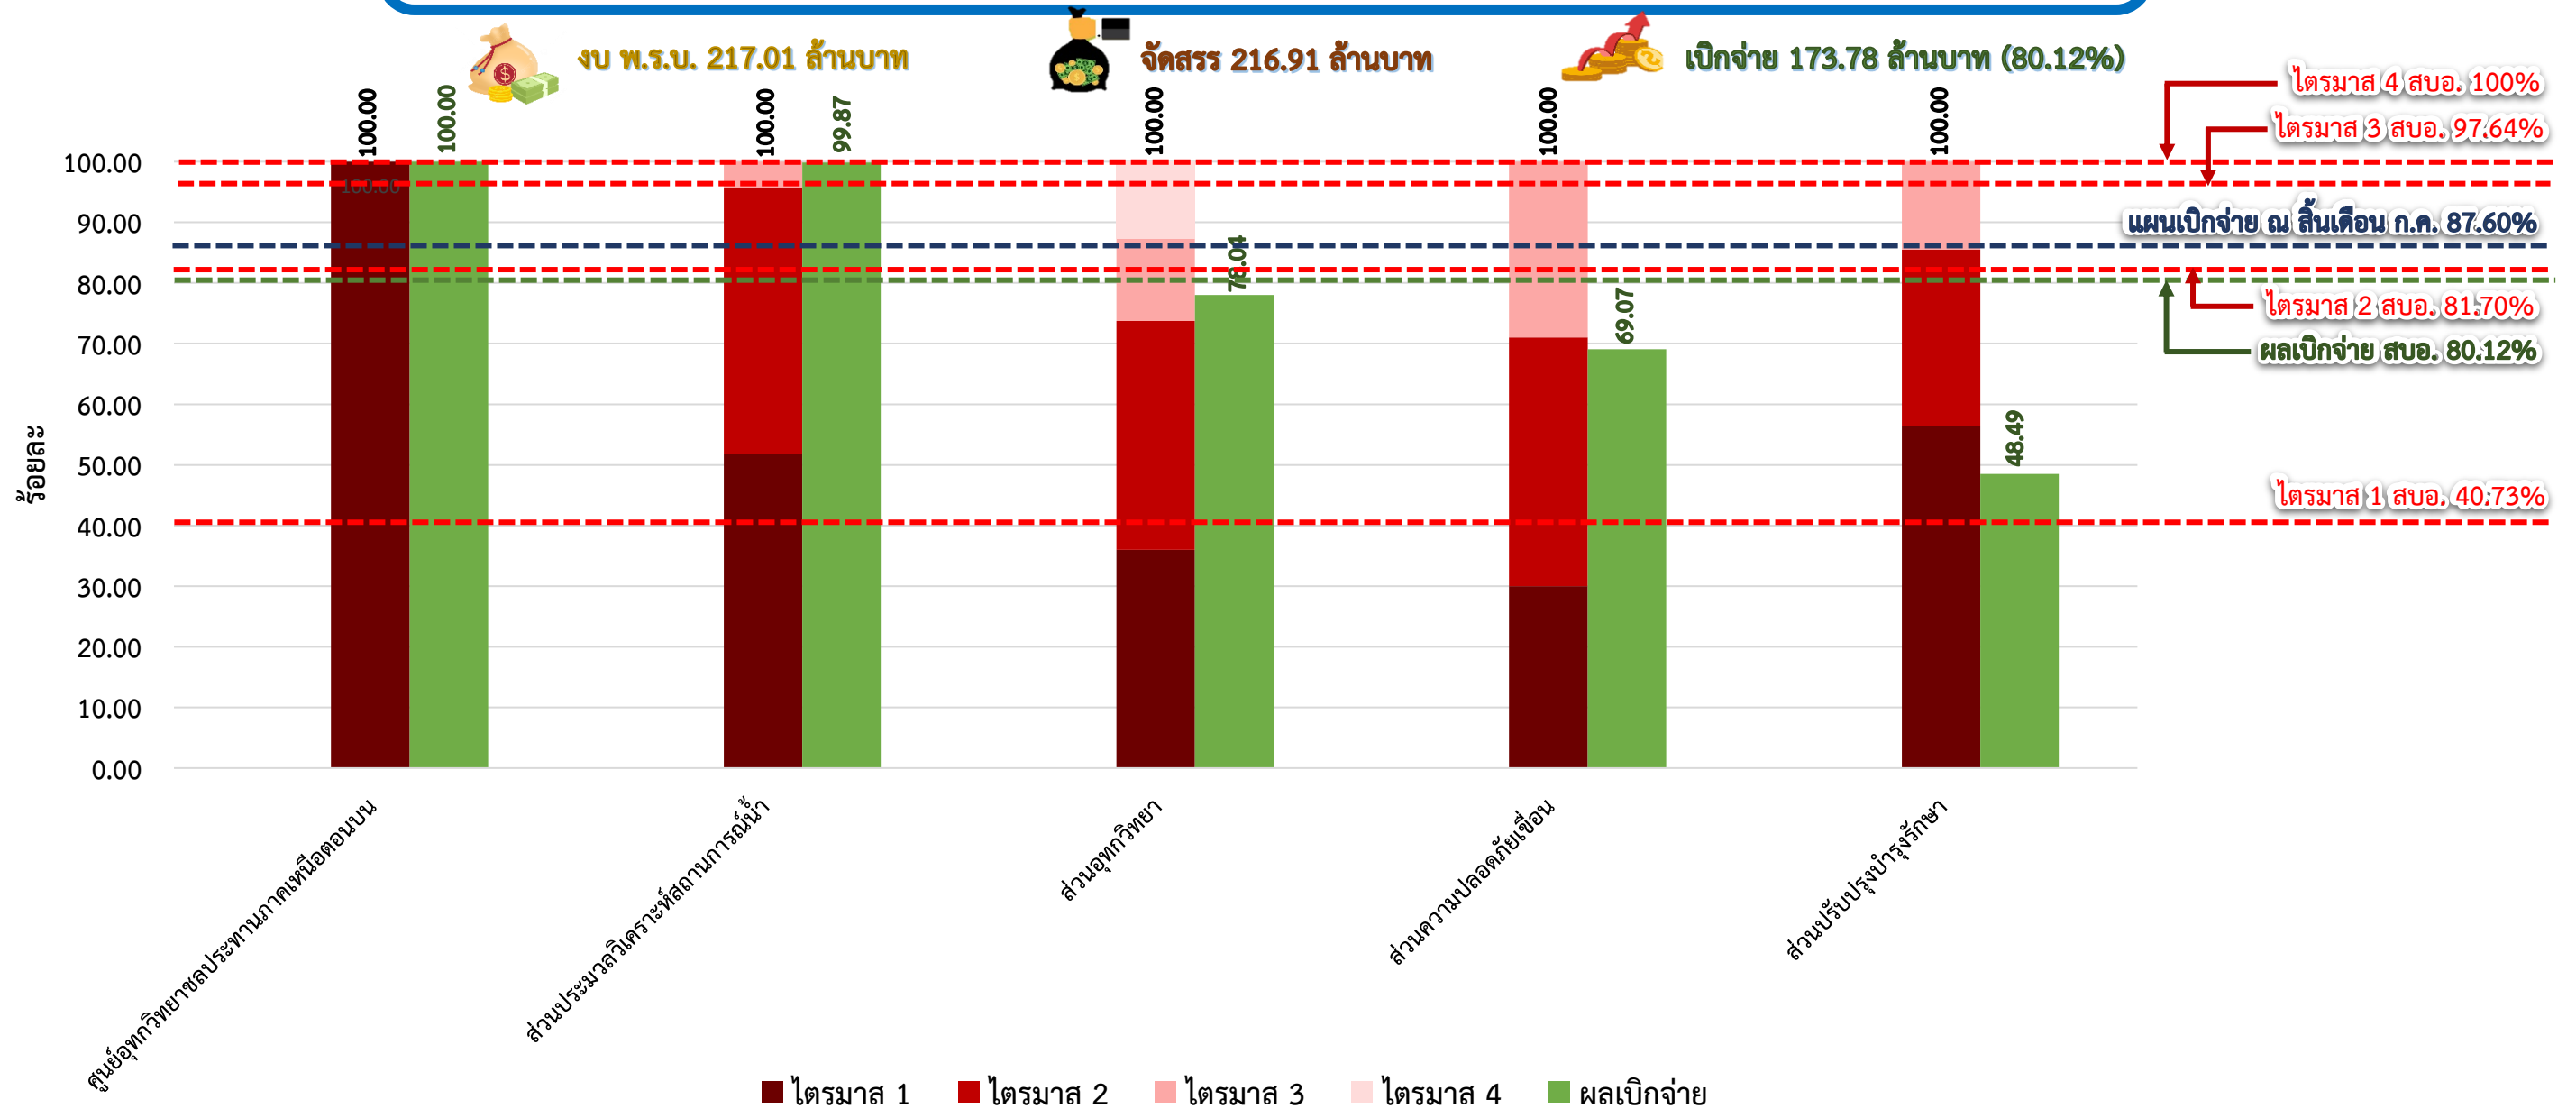

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (เงินทุน 2568) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

งบ พ.ร.บ. 63.67 ล้านบาท

จัดสรร 62.53 ล้านบาท

เบิกจ่าย 6.88 ล้านบาท (11.01%)

