



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๕๓๒/๒๕๖๖ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๒๒๖ ๑๑๓๑/๑๗๕.๖๖

เรื่อง สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ๖๒๒๔๕๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทานได้กั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗๔๔ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๘๙ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕๕๕ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปีทั้งสิ้น จำนวน ๗,๔๗๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๙๗.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๗ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน ๖,๖๘๑.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ ออช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิทธิพิญช์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน ออช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผว.ผง.
เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๘ พ.ย. ๒๕๖๖

- ทราบ

- ชัยพร ๑๑.๑๑๓๑, ผอ.ธ.ภาค, ทท.๑๑.๑-๕๓๑.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)


ผส.บอ.

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือเงินปี

ภาพรวม

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือเงินปี

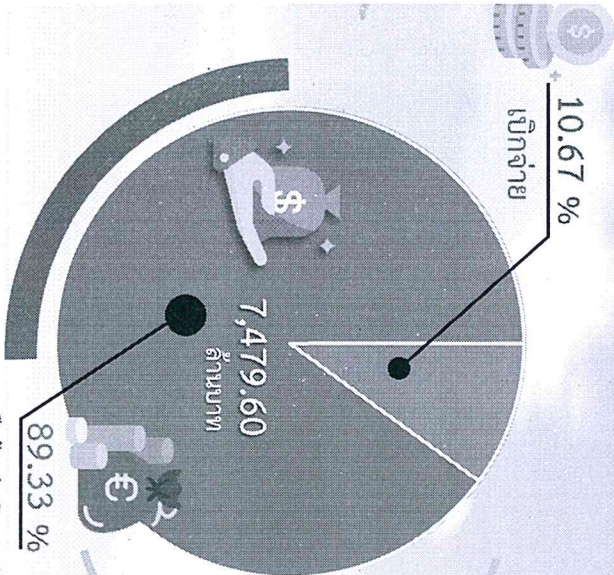

แผน/ผลกาสรเบิกจ่าย (รายเดือน)

เดือน	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	รวม
แผน	797.71	2,033.71	1,248.99	796.57	765.38	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.58	132.23	40,42
ผล	797.71												100%

สถานการณ์ดำเนินงาน 7/44 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ **189** รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง **555** รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. เกือบแบบ เกษตัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่ไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้พื้นที่ขุดในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยว ผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือมปี
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 744 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 189 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 555 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 7,479.60 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 797.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.67 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 6,681.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.33**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 189 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 382.43 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 102.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.85 **และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 279.75 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 555 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 7,097.17 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 695.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.79 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 6,402.14 ล้านบาท**

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)			
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2566	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	744	7,479.60	797.71	10.67	6,681.89
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	189	382.43	102.68	26.85	279.75
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	555	7,097.17	695.03	9.79	6,402.14

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 34 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 94 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 82 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,518.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 160.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.59 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,357.79 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 82 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 31 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 51 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,200.12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 73.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.11 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,126.80 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 40 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 563.85 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 65.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.57 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 498.61 ล้านบาท**

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินการ		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)			
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2566	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	744	189	555	7,479.60	797.71	10.67	6,681.89
สขป. 1	29	4	25	76.01	3.04	4.00	72.98
สขป. 2	18	9	9	35.90	9.32	25.97	26.58
สขป. 3	22	5	17	127.16	6.10	4.80	121.06
สขป. 4	10	1	9	168.04	7.16	4.26	160.88
สขป. 5	22	4	18	100.00	3.03	3.03	96.97
สขป. 6	19	3	16	176.54	2.84	1.61	173.70
สขป. 7	31	1	30	407.57	27.89	6.84	379.68
สขป. 8	72	21	51	520.80	77.88	14.95	442.92
สขป. 9	35	7	28	394.12	20.43	5.18	373.69
สขป. 10	11	2	9	100.63	18.15	18.04	82.47
สขป. 11	15	1	14	253.77	26.74	10.54	227.03
สขป. 12	9	3	6	111.98	7.65	6.83	104.33
สขป. 13	19		19	340.89	2.36	0.69	338.53
สขป. 14	50	14	36	337.26	31.69	9.40	305.56
สขป. 15	27	18	9	110.87	10.53	9.50	100.34
3 สขป. 16	40	15	25	563.85	65.23	11.57	498.61
สขป. 17	24	3	21	233.12	31.92	13.69	201.20
สบอ.	42	24	18	115.39	22.48	19.48	92.91
กพท.	82	31	51	1,200.12	73.33	6.11	1,126.80
กพด.	1		1	3.97			3.97
กสช.	1		1	0.15			0.15
สพช.	2		2	3.61			3.61
สมต.	10	1	9	147.34	136.30	92.51	11.04
2 สคค.	10	3	7	17.01	1.66	9.78	15.34
สจค.	8	1	7	31.60			31.60
สลค.	3		3	54.82			54.82
สบก.	21	3	18	162.71	2.40	1.47	160.31
1 สพญ.	94	12	82	1,518.62	160.83	10.59	1,357.79
สวพ.	1	1		0.19	0.19	99.38	
สสร.	2	2		0.03			0.03
สอศ.	4		4	56.69			56.69
กพร.	1		1	2.15	1.07	50.00	1.07
กผง.	1		1	3.96			3.96
Lump Sum	8		8	102.73	47.48	46.22	55.25

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

4. เนื่องจากที่ผ่านมามีอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
4. เร่งรัดดำเนินงานหลังจากเกษตรกรเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ
