



**สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ**  
**ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 7 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 102,434.96 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 71,875.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.17 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 15,055 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 413 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.74 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 114 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.76 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5,878 รายการ คิดเป็นร้อยละ 39.04 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8,475 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.30 และยกเลิก จำนวน 175 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.16 จำแนกได้ดังนี้

**1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.)** งบประมาณ จำนวน 77,142.88 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 53,390.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.21 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,441.38 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 6,072.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.61 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 69,701.50 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 47,317.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.89 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,695 รายการ (รายการ พ.ร.บ. 65 จำนวน 9,554 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 141 รายการ) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรายการผูกพันใหม่ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5,053 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.12 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4,472 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.13 และยกเลิก จำนวน 162 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.67 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น

หมายเหตุ : กรมได้รับงบ พ.ร.บ. พ.ศ. 2565 จำนวน 77,143.43 ล้านบาท โอนงบประมาณ ให้ สททช. จำนวน 0.56 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 35 (3) ระเบียบ ว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว103 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 ชักข้อความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คงเหลืองบประมาณที่กรมได้รับจำนวน 77,142.88 ล้านบาท

**2. งบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564** งบประมาณ จำนวน 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 8,786.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.87 งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 1,099.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.75 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 846.60 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 24.88 ล้านบาท และเบิกไม่ทันตามกำหนด 228.32 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,397.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.38 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,068 รายการ (รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 1,067 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 184 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.23 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 879 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.30 และยกเลิก จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.47 เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดิน โดยราษฎรบางรายเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ และเกิดข้อพิพาทเรื่อง มรดก เนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่ดินได้

**3. งบกลาง พ.ศ. 2564** งบประมาณ จำนวน 4,605.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,495.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.91 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,188 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 61 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.13 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,125 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.70 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 เนื่องจากมีการแก้ไขสถานที่ดำเนินการจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

**4. งบกลาง พ.ศ. 2565** งบประมาณ จำนวน 3,339.12 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 797.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.89 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,078 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ จำนวน 413 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.31 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.93 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 526 รายการ คิดเป็นร้อยละ 48.79 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 127 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.78 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.19 เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

**5. เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564** งบประมาณ จำนวน 4,224.82 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,977.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.14 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 384 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ซึ่งถูกพับงบประมาณ คือ งานขุดลอก อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ดำเนินการโดย สขบ.15 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 380 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.96 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

**6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** งบประมาณ จำนวน 904.24 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 646.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.44 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,542 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 96 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.23 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.19 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,443 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.58

**7. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 781.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.62 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 100 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 49 รายการ คิดเป็นร้อยละ 49.00 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.00 คือ รายการ จัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ระยะที่ 2 เนื่องจากการก่อสร้างจะมีผลกระทบกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร

\*\*\*\*\*



# ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



จัดทำโดย  
ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน  
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

# รายละเอียดข้อมูล



1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

3 งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1

## สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	102,434.96	71,875.40	70.17	15,055	413	114	5,878	8,475	ยกเลิก 175 รายการ
<b>1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (กรมบัญชีกลาง)</b>	<b>77,142.88</b>	<b>53,390.56</b>	<b>69.21</b>	<b>9,695</b>		<b>8</b>	<b>5,053</b>	<b>4,472</b>	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,441.38	6,072.71	81.61						
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	69,701.50	47,317.85	67.89	9,695		8	5,053	4,472	ยกเลิก 162 รายการ
<b>2. งบเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563</b>	<b>11,283.76</b>	<b>8,786.40</b>	<b>77.87</b>	<b>1,068</b>			<b>184</b>	<b>879</b>	- ยกเลิก 5 รายการ - ตัดไม่ขยาย/สลาย PO/เบิกไม่ทัน จำนวน 1,099.80 ล้านบาท - คงเหลือต้องดำเนินการต่อ จำนวน 1,397.56 ล้านบาท
<b>3. งบกลาง พ.ศ. 2564</b>	<b>4,605.14</b>	<b>3,495.82</b>	<b>75.91</b>	<b>1,188</b>			<b>61</b>	<b>1,125</b>	
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	3,419.87	2,437.28	71.27	1,117			49	1,066	
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	426.47			24			24		
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183.31	758.79	64.12	44			22	22	
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564	1,562.30	1,534.23	98.20	1,046				1,044	ยกเลิก 2 รายการ
- โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	94.70	20.12	21.25	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	83.09	74.42	89.57	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	70.00	49.72	71.03	1			1		
<b>3.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี พ.ศ. 2564</b>	<b>1,185.27</b>	<b>1,058.54</b>	<b>89.31</b>	<b>71</b>			<b>12</b>	<b>59</b>	
<b>4. งบกลาง พ.ศ. 2565</b>	<b>3,339.12</b>	<b>797.70</b>	<b>23.89</b>	<b>1,078</b>	<b>413</b>	<b>10</b>	<b>526</b>	<b>127</b>	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565	1,126.19	547.71	48.63	620	1	2	488	127	ยกเลิก 2 รายการ
- จัดหารถปั้นจั่นลอยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกขับไปตามกฎหมาย	97.92			1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566	1,149.57			410	410				
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565	965.44	249.99	25.89	47	2	8	37		
<b>5. เงินกู้ ประจำปี พ.ศ. 2564</b>	<b>4,224.82</b>	<b>3,977.08</b>	<b>94.14</b>	<b>384</b>			<b>1</b>	<b>380</b>	ยกเลิก 3 รายการ
<b>6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565</b>	<b>904.24</b>	<b>646.02</b>	<b>71.44</b>	<b>1,542</b>		<b>96</b>	<b>3</b>	<b>1,443</b>	
<b>7. จัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565</b>	<b>935.00</b>	<b>781.82</b>	<b>83.62</b>	<b>100</b>			<b>50</b>	<b>49</b>	ยกเลิก 1 รายการ



2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ข้อมูลจาก ระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565





# 2.2

## สรุปผลการก่อกั้นผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

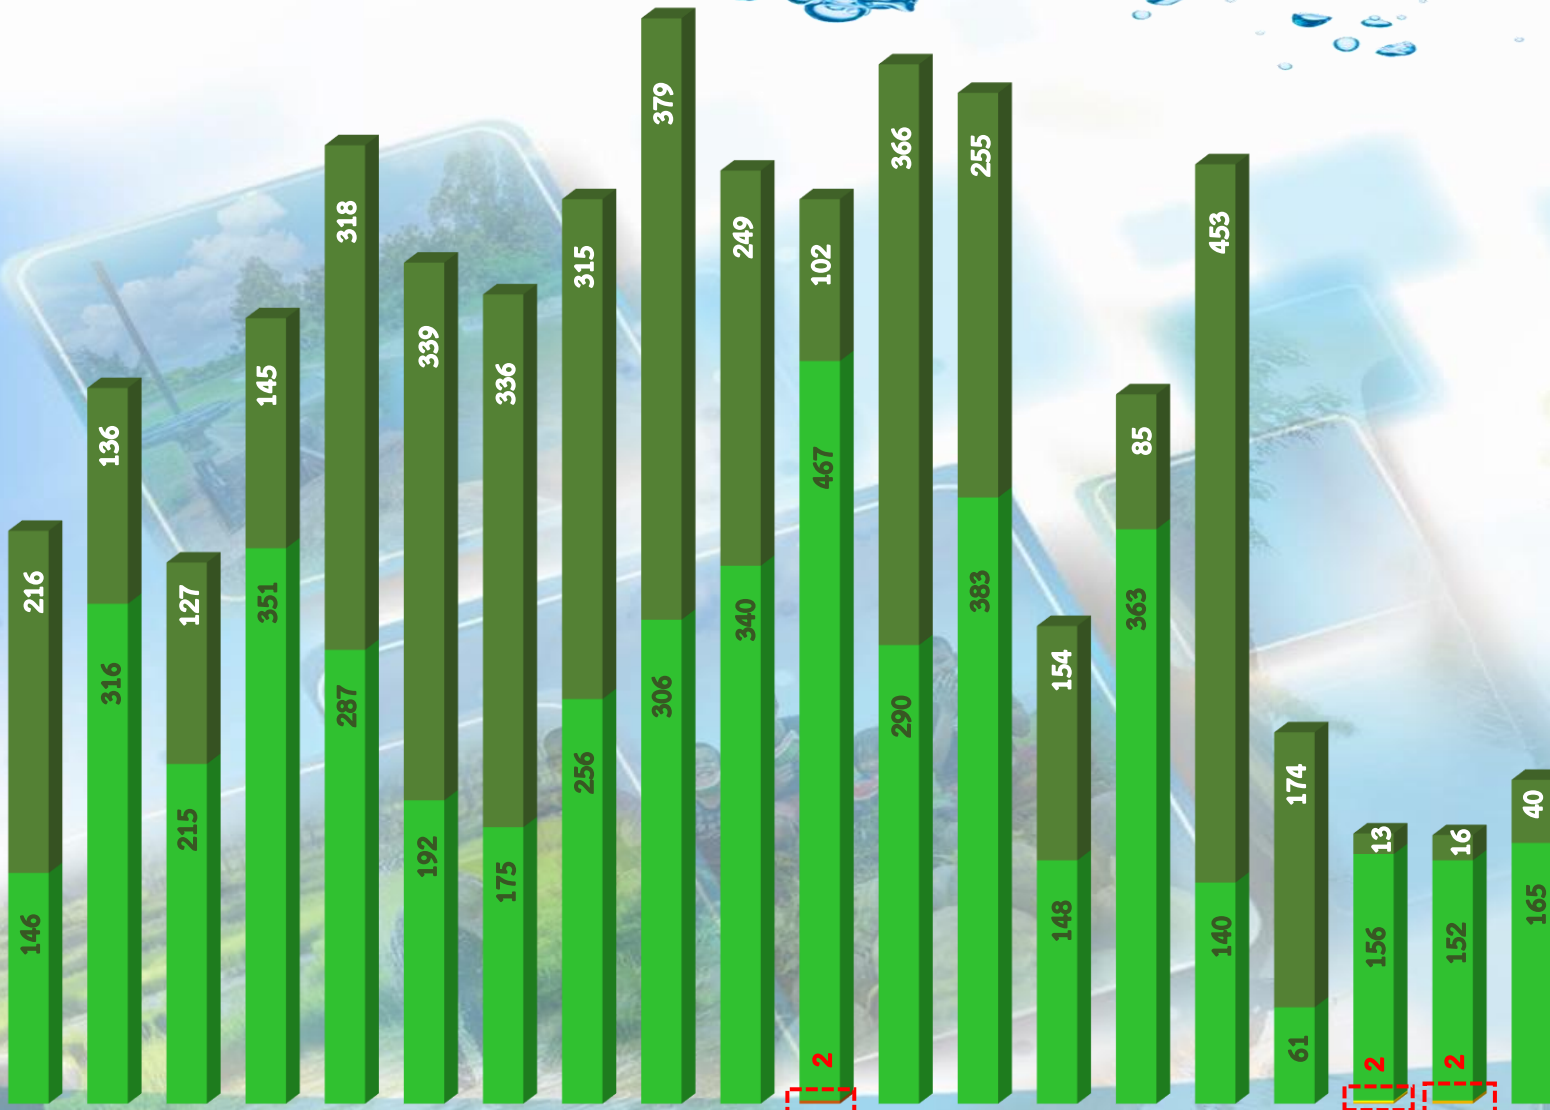

หน่วยงาน	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ก่อกั้นผูกพัน		รวม	
	จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง
สขป. 1			362	1,567.01	362	1,567.01
สขป. 2			452	1,886.81	452	1,886.81
สขป. 3			342	2,036.49	342	2,036.49
สขป. 4			496	1,106.89	496	1,106.89
สขป. 5			605	2,893.25	605	2,893.25
สขป. 6			531	2,789.29	531	2,789.29
สขป. 7			511	2,395.35	511	2,395.35
สขป. 8			571	4,144.91	571	4,144.91
สขป. 9			685	2,387.92	685	2,387.92
สขป. 10			589	1,313.35	589	1,313.35
สขป. 11	2	36.27	569	1,396.55	571	1,432.82
สขป. 12			656	2,417.05	656	2,417.05
สขป. 13			638	2,128.64	638	2,128.64
สขป. 14			302	3,279.58	302	3,279.58
สขป. 15			448	1,776.51	448	1,776.51
สขป. 16			593	3,008.80	593	3,008.80
สขป. 17			235	699.13	235	699.13
กพท.	2	275.15	169	11,427.76	171	11,702.91
สพญ.	2	904.20	168	11,177.79	170	12,081.99
สบอ.			205	689.17	205	689.17
สคก.			210	734.08	210	734.08
สสธ.			43	528.41	43	528.41
สบก.			34	562.92	34	562.92
สอศ.	1	40.00	11	356.49	12	396.49
สจต.			40	153.14	40	153.14
สลก.	1	46.74	5	45.49	6	92.24
สวพ.			3	4.71	3	4.71
สมต.			46	3,636.12	46	3,636.12
กผง.			1	0.06	1	0.06
ศทส.			1	8.50	1	8.50
สพข.			1	0.42	1	0.42
Lump Sum			3	249.00	3	249.00
รวมทั้งสิ้น	8	1,302.36	9,525	66,801.56	9,533	68,103.92

■ แล้วเสร็จ 4,472 รายการ  
■ ก่อกั้นผูกพัน 5,053 รายการ  
■ อนุมัติรับราคา 1 รายการ  
■ เปิดซอง 5 รายการ  
■ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ

ยังไม่ก่อกั้นผูกพัน 8 รายการ





## 2.3

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนรายการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อผูกพัน							
						จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
										0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,285.14	68,103.92	46,294.13	67.98	9,533	8	1,302.36	9,525	66,801.56	1,241	338	423	679	2,372	4,472
สขป. 1	1,604.88	1,567.01	1,271.95	81.17	362			362	1,567.01	3	2	3	23	115	216
สขป. 2	1,890.25	1,886.81	1,537.49	81.49	452			452	1,886.81	88	16	12	18	182	136
สขป. 3	2,334.81	2,036.49	1,498.02	73.56	342			342	2,036.49	30	13	21	35	116	127
สขป. 4	1,074.89	1,106.89	895.01	80.86	496			496	1,106.89	127	48	57	35	84	145
สขป. 5	2,640.61	2,893.25	2,169.62	74.99	605			605	2,893.25	20	16	26	38	187	318
สขป. 6	2,646.30	2,789.29	2,154.05	77.23	531			531	2,789.29	7	3	13	26	143	339
สขป. 7	2,349.87	2,395.35	2,259.57	94.33	511			511	2,395.35	9	13	33	17	103	336
สขป. 8	4,016.81	4,144.91	2,332.13	56.26	571			571	4,144.91	49	29	26	43	109	315
สขป. 9	2,437.91	2,387.92	1,627.07	68.14	685			685	2,387.92	16	31	30	73	156	379
สขป. 10	1,336.82	1,313.35	823.95	62.74	589			589	1,313.35	100	13	10	29	188	249
สขป. 11	1,507.05	1,432.82	685.83	47.87	571	2	36.27	569	1,396.55	292	13	12	27	123	102
สขป. 12	2,416.48	2,417.05	1,662.56	68.78	656			656	2,417.05	16	37	27	58	152	366
สขป. 13	2,130.01	2,128.64	1,473.52	69.22	638			638	2,128.64	26	17	28	39	273	255
สขป. 14	3,273.65	3,279.58	2,187.94	66.71	302			302	3,279.58	13	18	21	37	65	148
สขป. 15	1,886.21	1,776.51	908.85	51.16	448			448	1,776.51	194	20	26	43	80	85
สขป. 16	3,057.93	3,008.80	1,538.85	51.15	593			593	3,008.80	13	8	26	40	53	453
สขป. 17	682.65	699.13	526.29	75.28	235			235	699.13	3	1	6	13	38	174
กพก.	12,113.82	11,702.91	8,698.41	74.33	171	2	275.15	169	11,427.76	91	5	9	25	26	13
สพญ.	11,985.44	12,081.99	6,698.52	55.44	170	2	904.20	168	11,177.79	76	16	22	18	20	16
สบอ.	695.81	689.17	303.27	44.01	205			205	689.17	9	11	2	33	110	40
สคก.	742.05	734.08	628.19	85.58	210			210	734.08	3	5	5	3	16	178
สสธ.	531.51	528.41	447.45	84.68	43			43	528.41	5				8	30
สบก.	549.48	562.92	258.60	45.94	34			34	562.92	34					
สอส.	376.65	396.49	261.41	65.93	12	1	40.00	11	356.49	4	2	1	1	1	2
สจค.	138.22	153.14	136.02	88.82	40			40	153.14			3	1	9	27
สลก.	82.68	92.24	1.71	1.85	6	1	46.74	5	45.49	4					1
สวพ.	4.71	4.71	4.48	95.19	3			3	4.71	3					
สมค.	3,528.61	3,636.12	3,242.93	89.19	46			46	3,636.12	2	1	4	4	15	20
กผง.	0.00	0.06	0.06	100.00	1			1	0.06						1
ศทส.	0.00	8.50			1			1	8.50	1					
สพช.	0.00	0.42	0.42	100.00	1			1	0.42						1
Lump Sum	249.00	249.00	59.93	24.07	3			3	249.00	3					

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 162 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,850.48 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น  
 2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 141 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,429.79 ล้านบาท



หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน รายการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อผูกพัน							
						จำนวน รายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
										0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,285.14	68,103.92	46,294.13	67.98	9,533	8	1,302.36	9,525	66,801.56	1,241	338	423	679	2,372	4,472
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตต์	809.00	789.57	544.99	69.02	10			10	789.57	2	2	2	3	1	
โครงการคลองระบายน้ำทลางบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,561.63	2,763.14	1,618.39	58.57	14	1	676.20	13	2,086.94	8	1	1		1	2
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	27,289.02	27,272.84	19,573.78	71.77	632	2	177.55	630	27,095.29	153	32	56	83	201	105
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	419.96	339.57	265.78	78.27	8			8	339.57	7					1
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	505.89	811.89	278.31	34.28	12			12	811.89	6	2	4			
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่2) จังหวัดสงขลา	141.06	141.06			1			1	141.06					1	
โครงการประตุระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	99.56	69.39	67.20	96.85	4			4	69.39	1		1		1	1
โครงการประตุระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	312.00	312.00	138.99	44.55	4			4	312.00	2		1	1		
โครงการประตุระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย	72.00	91.19	45.17	49.53	4			4	91.19		1	2			1
โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย	275.66	119.66	18.30	15.29	6			6	119.66	4		1	1		
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,308.96	6,361.94	3,793.90	59.63	383			383	6,361.94	63	26	34	47	115	98
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	10,895.81	10,794.42	6,103.81	56.55	301	3	173.87	298	10,620.55	68	21	31	50	88	40
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	1,033.27	1,061.23	408.86	38.53	14	1	228.00	13	833.23	8	2		1	2	
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	1,298.06	862.30	718.74	83.35	12			12	862.30	4	2	2	2		2
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,193.40	2,169.86	1,618.25	74.58	749			749	2,169.86	85	27	29	24	156	428
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,507.83	10,474.91	8,571.79	81.83	6,777			6,777	10,474.91	745	199	232	426	1,680	3,495
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	167.77	237.64	56.05	23.59	5			5	237.64	2	1		1	1	
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	108.00	108.00	100.74	93.28	2			2	108.00	1					1
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	104.14	123.85	82.16	66.34	6			6	123.85	5		1			
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	348.02	348.02	67.94	19.52	7			7	348.02	5		1		1	
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำซันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	637.62	637.62	589.10	92.39	5			5	637.62	2		1		1	1
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	388.00	388.00	283.16	72.98	3			3	388.00	3					
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเทียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	525.00	404.98	345.59	85.33	3			3	404.98			1	1		1
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตต์	313.78	422.03	383.62	90.90	6			6	422.03					3	3
ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	969.71	998.83	619.50	62.02	565	1	46.74	564	952.09	67	22	23	39	120	293

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 162 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,850.48 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น

2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 141 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,429.79 ล้านบาท






2.5

# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

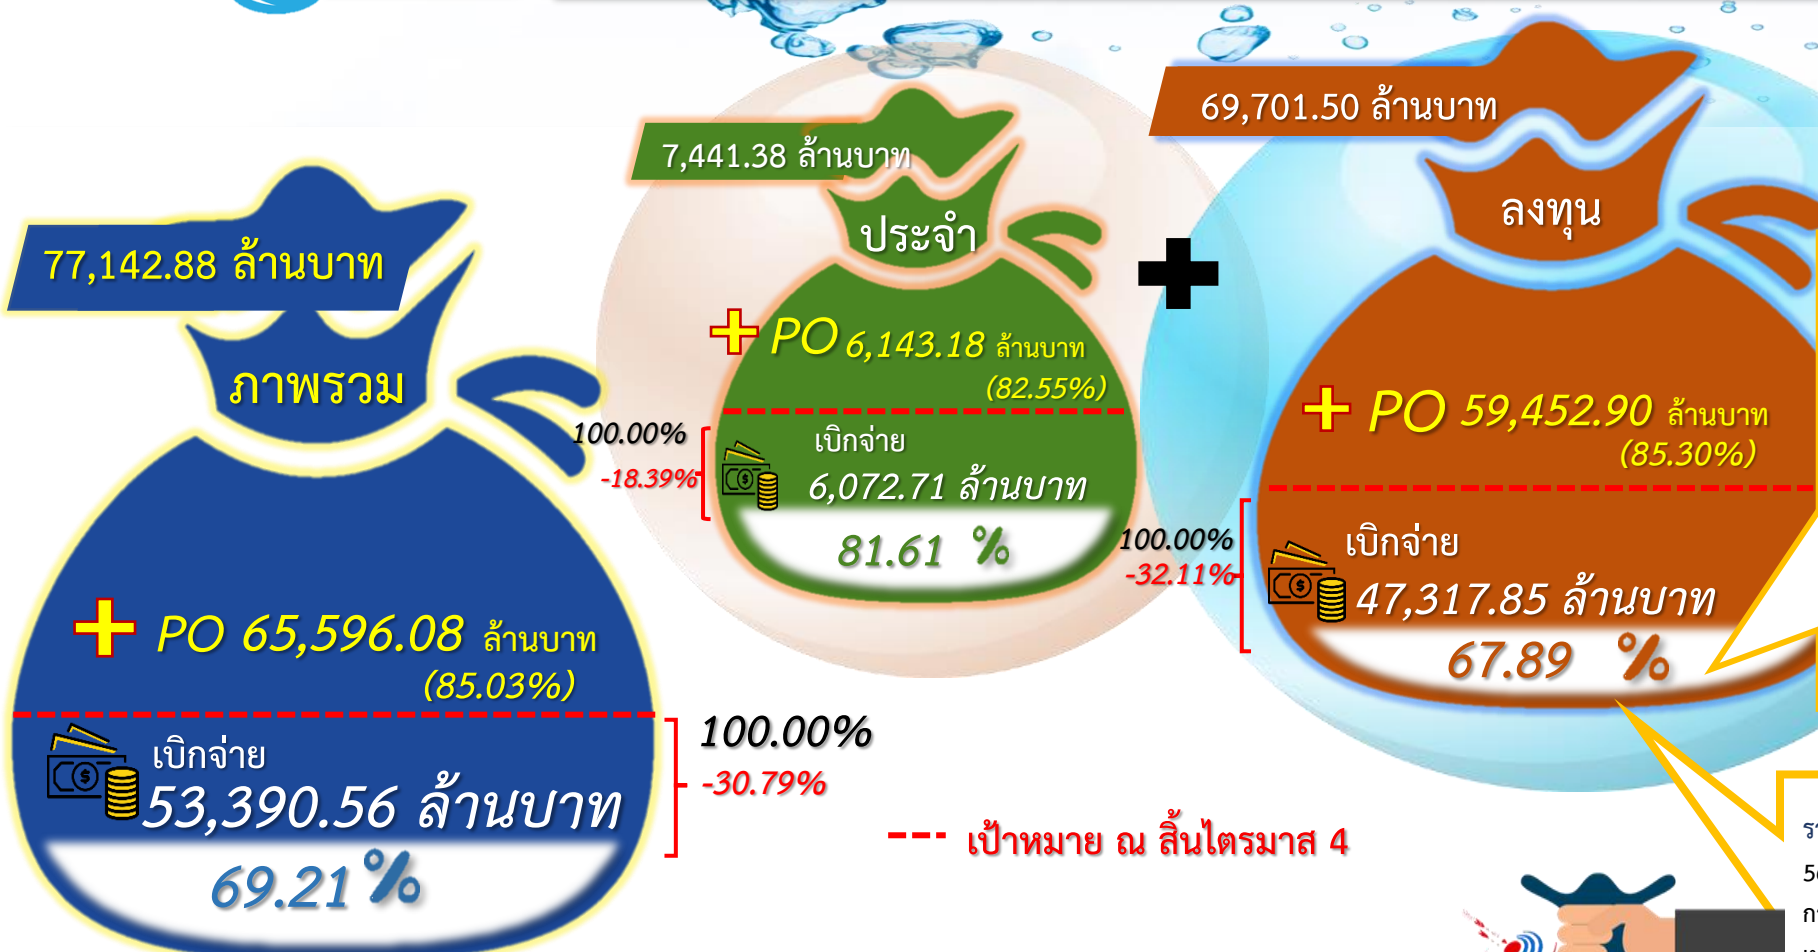

**รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ**

- ผูกพันเดิม จำนวนทั้งสิ้น 108 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 10,761.98 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,117.36 ล้านบาท (66.13%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 90 รายการ (83.33%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 8,502.20 ล้านบาท (79.00%) แล้วเสร็จ จำนวน 18 รายการ (16.67%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,259.78 ล้านบาท (21.00%)
- ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,178.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 489.29 ล้านบาท (22.46%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ (76.00%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 911.98 ล้านบาท (41.87%) และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 รายการ (24.00%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,266.09 ล้านบาท (58.13%)

**รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 9,400 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 56,761.45 ล้านบาท เบิกจ่าย 39,711.20 ล้านบาท (69.96%) โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ (0.02%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 36.27 ล้านบาท (0.06%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 4,944 รายการ (52.60%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 45,250.76 ล้านบาท (79.72%) และแล้วเสร็จ จำนวน 4,454 รายการ (47.38%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 11,474.42 ล้านบาท (20.22%)**

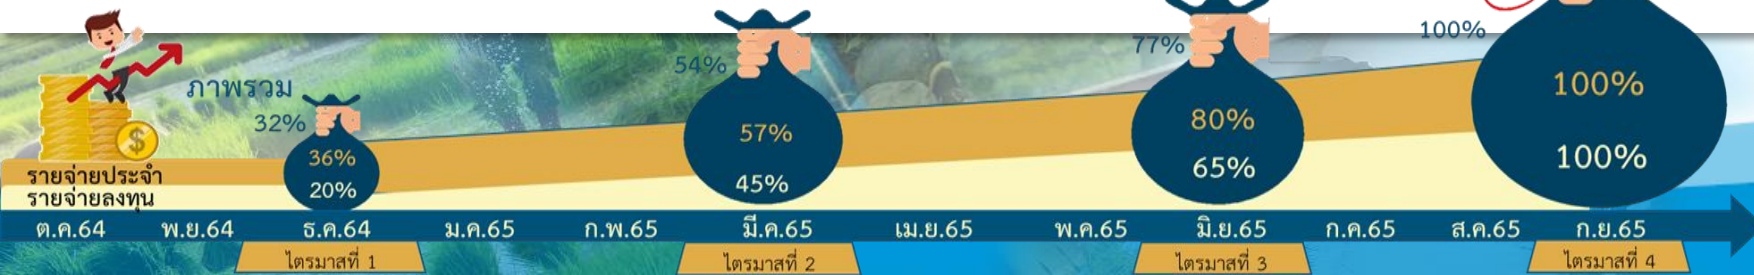

2.6

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ **ภาพรวม** ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565


77,142.88 ล้านบาท

ภาพรวม

เบิกจ่าย

53,390.56 ล้านบาท

69.21 %

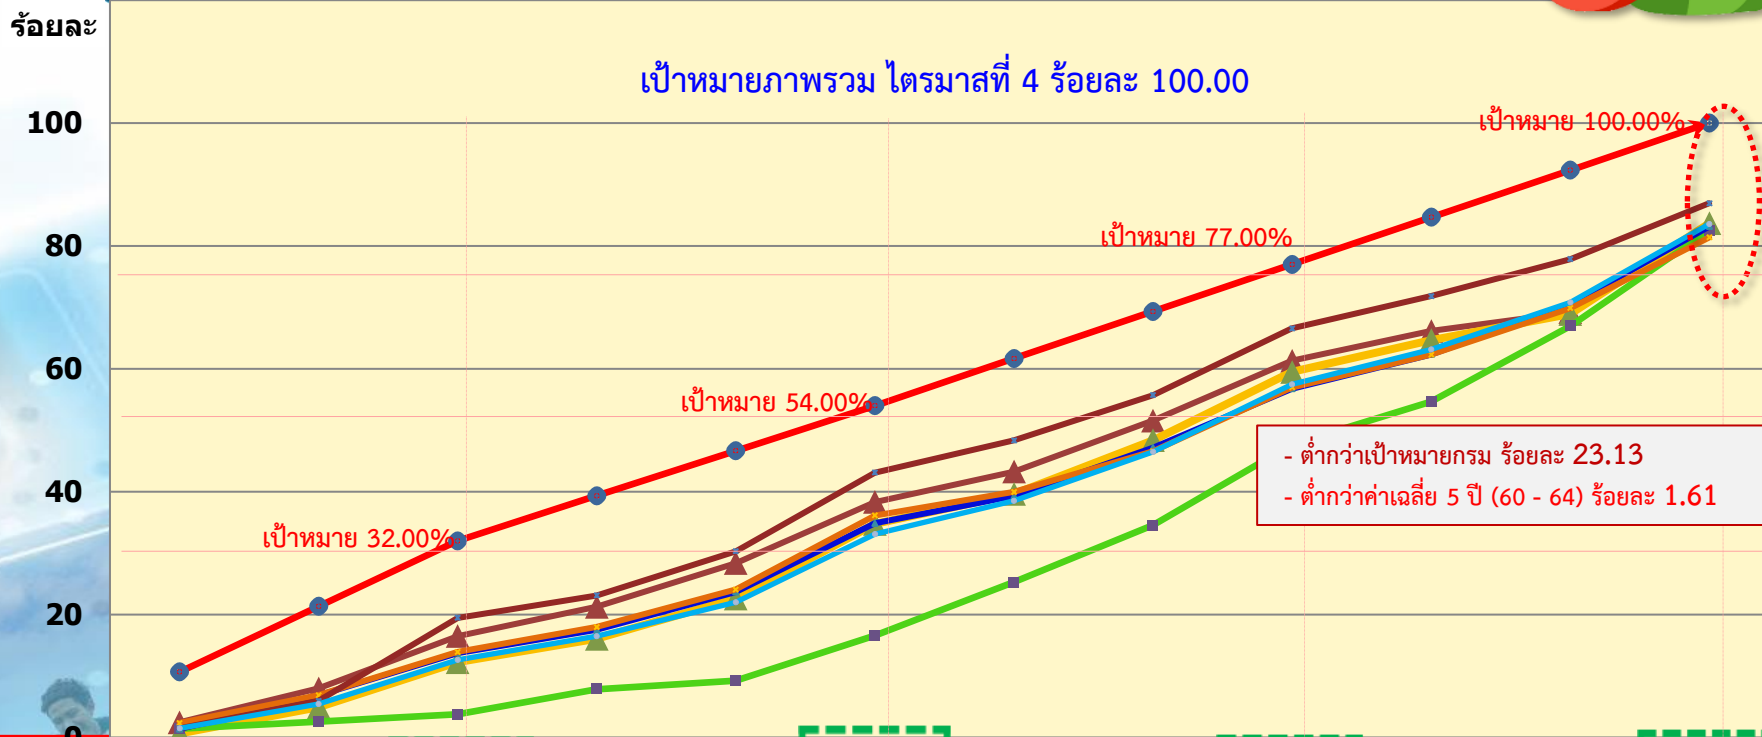

- ต่ำกว่าเป้าหมายกรม ร้อยละ 23.13  
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (60 - 64) ร้อยละ 1.61

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
▶ เป้าหมายกรม ปี 65	10.67	21.34	32.00	39.33	46.66	54.00	61.67	69.34	77.00	84.67	92.34	100.00
▲ ผลปี 65 (77,143.43)	2.45	7.97	16.49	21.25	28.37	38.31	43.27	51.57	61.30	66.15	69.21	
▲ ผลปี 64 (74,106.98)	0.66	4.91	12.24	16.05	22.61	34.76	39.61	48.38	59.48	64.67	68.91	83.67
■ ผลปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	7.84	9.23	16.56	25.26	34.54	47.70	54.68	66.97	82.54
■ ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	83.17
■ ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
■ ผลปี 60 (47,004.27)	1.50	5.94	19.46	23.11	30.30	43.12	48.35	55.72	66.56	71.83	77.86	86.95
■ เฉลี่ย 5 ปี (60-64)	1.46	5.43	12.62	16.50	21.98	33.08	38.50	46.47	57.49	63.16	70.82	83.54



2.7


# สถิติการเบิกจ่าย งบรายจ่ายลงทุน ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

ร้อยละ


เป้าหมายงบรายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

100  
80  
60  
40  
20  
0

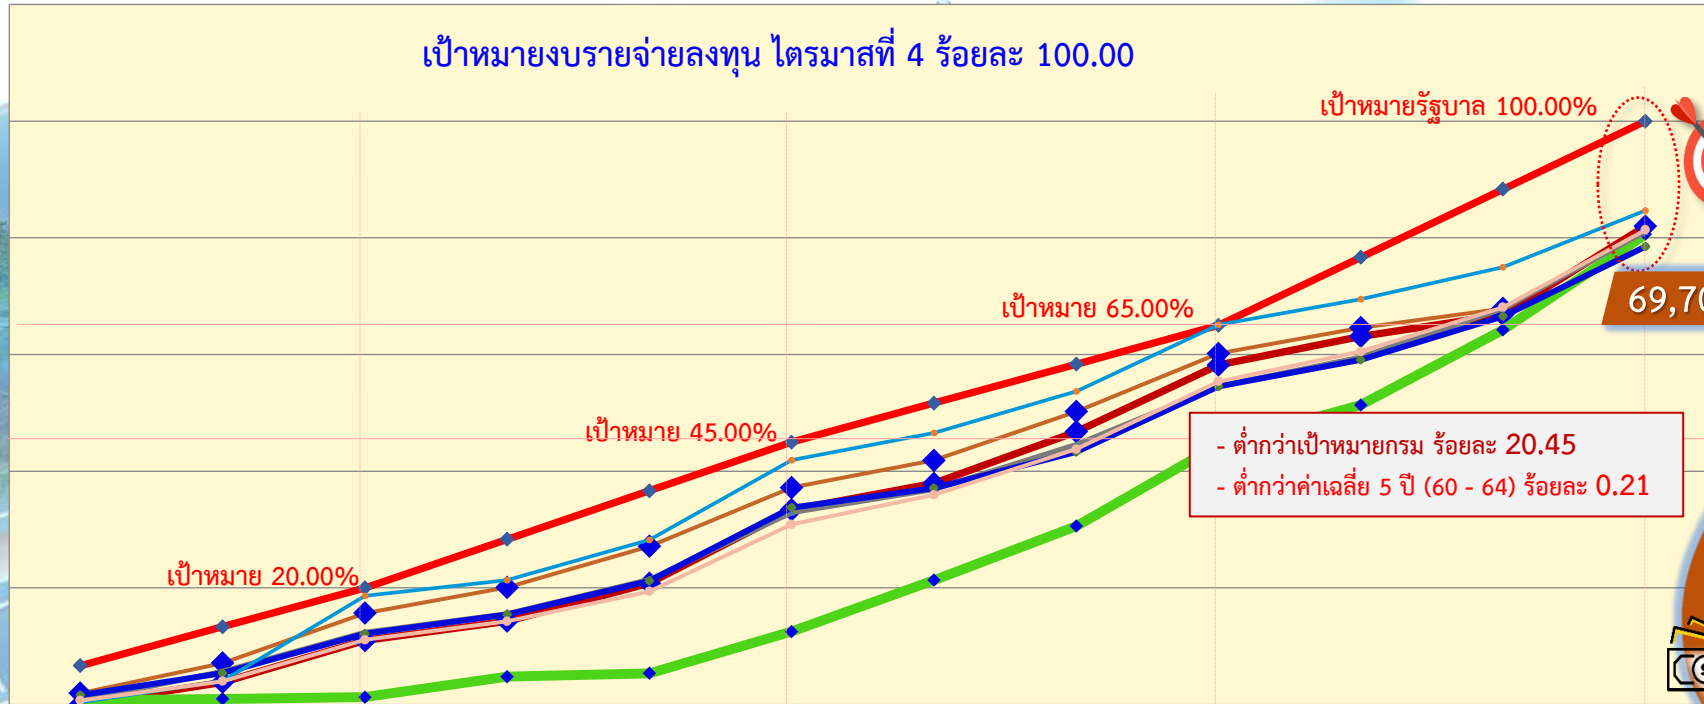

- เป้าหมายกรม ปี 65
- ผลปี 65 (70,135.62)
- ผลปี 64 (66,423.87)
- ผลปี 63 (60,320.89)
- ผลปี 62 (58,536.19)
- ผลปี 61 (47,566.20)
- ผลปี 60 (38,118.10)
- เฉลี่ย 5 ปี (60 - 64)

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายกรม ปี 65	6.67	13.34	20.00	28.33	36.66	45.00	51.67	58.34	65.00	76.67	88.34	100.00
ผลปี 65 (70,135.62)	1.94	7.11	15.67	20.09	27.12	37.20	41.86	50.22	60.17	64.59	67.89	
ผลปี 64 (66,423.87)	0.003	3.81	10.97	14.29	20.79	33.39	37.90	46.78	58.21	63.11	66.85	82.02
ผลปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	4.77	5.36	12.51	21.31	30.59	44.54	51.34	64.24	80.61
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
ผลปี 61 (47,566.20)	1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
ผลปี 60 (38,118.10)	0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69
เฉลี่ย 5 ปี (60 - 64)	0.68	3.98	11.07	14.27	19.39	30.90	35.95	43.78	55.38	60.52	68.10	81.38

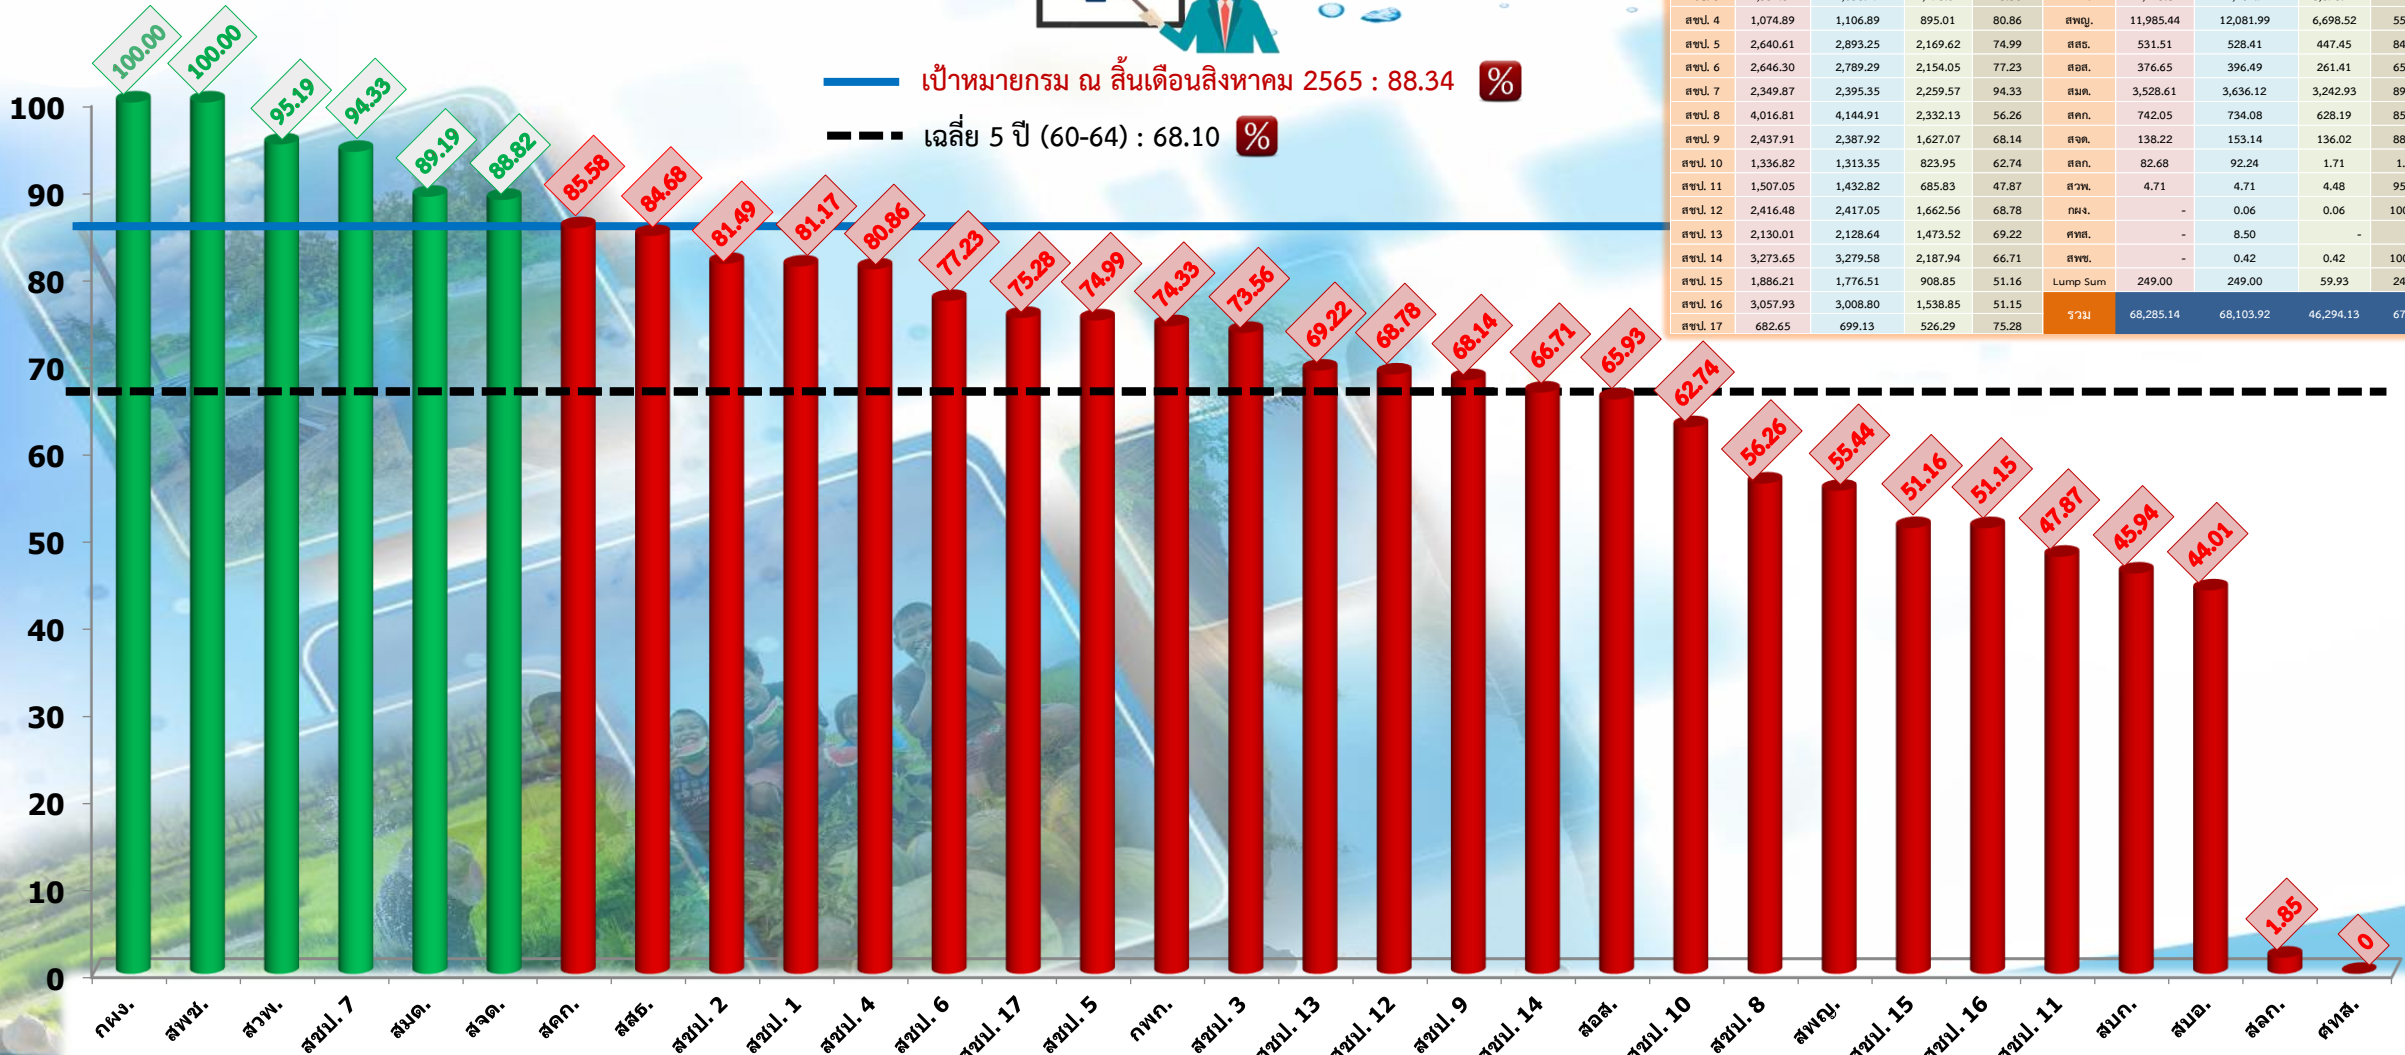

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 162 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,850.48 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น  
2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 141 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,429.79 ล้านบาท

■ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายรัฐบาล  
■ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

# 2.9

## ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
<b>ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)</b>								
1	กระทรวงคมนาคม	160,835.47	114,672.91	71.30	177,193.81	114,980.51	64.89	6.41
2	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	75,013.17	50,494.89	67.31	72,062.20	48,339.99	67.08	0.23
3	กระทรวงมหาดไทย	75,702.45	35,916.11	47.44	80,551.45	35,874.86	44.54	2.90
<b>ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)</b>								
1	กรมพัฒนาที่ดิน	1,851.16	1,595.11	86.17	2,101.89	1,838.40	87.46	-1.29
2	กรมชลประทาน	69,701.50	47,317.85	67.89	66,053.60	44,127.57	66.81	1.08
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,272.68	259.75	20.41	1,163.01	599.11	51.51	-31.10
<b>ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)</b>								
1	กรมทางหลวงชนบท	44,164.91	33,089.71	74.92	47,150.39	31,929.03	67.72	7.20
2	กรมทางหลวง	107,494.58	77,173.85	71.79	119,966.85	79,129.20	65.96	5.83
3	กรมชลประทาน	69,701.50	47,317.85	67.89	66,053.60	44,127.57	66.81	1.08
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	29,841.10	11,085.76	37.15	27,511.54	13,174.58	47.89	-10.74

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 61.49%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (45 หน่วยงาน) เฉลี่ย 61.06%





ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,068 รายการ  
(เงินกัน 1,067 รายการ โอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ 879 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 184 รายการ

ยกเลิกรายการ 5 รายการ

หมายเหตุ: รายการโอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ภาพรวม  
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

1,068 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

8,786.40 ล้านบาท 77.87 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

846.60 ล้านบาท 7.50 %

เหลือจ่าย/ยกเลิก

24.88 ล้านบาท 0.22 %

เบิกจ่ายไม่ทัน แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ

228.32 ล้านบาท 2.03 %

งบประมาณที่หมดความจำเป็น/  
เบิกจ่ายไม่ทัน  
สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้  
รวม 1,099.80 ล้านบาท 9.75 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

1,397.56 ล้านบาท

12.38 %

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และ การทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

## แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

	ล้านบาท												รวม
แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95	11,283.76
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	839.80	1,330.56	866.19	879.60	463.75	671.17	304.54	355.28	789.95	8,786.40
ผลต่าง	-	- 428.49	- 1,221.49	- 746.44	- 3.28	- 580.67	351.53	139.47	327.54	217.24	237.19	-	2,497.36
	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	
	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				

เบิกจ่าย 100%





# ผลการดำเนินงาน

# งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



## การดำเนินงาน

มีมติ คร.ม./คำสั่งนายก ออนุมัติงบกลาง 64

รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ

งบประมาณ 4,605.14 ล้านบาท

เบิก 3,459.82 ล้านบาท 75.91 %



### ผลการดำเนินงาน



แล้วเสร็จ

1,125 รายการ 94.70 %



ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ

61 รายการ 5.13 %



ยกเลิก

2 รายการ 0.17 %

### ตัวชี้วัดของโครงการ



พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่



พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 860,965 ไร่ 86.76 %



ปริมาณน้ำ 16.74 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์ = 11.28 ล้าน ลบ.ม. 67.38 %



ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 126,203 ครัวเรือน 89.47 %

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project  
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565



มติ ครม.  
8 มิ.ย. 64  
ครุภัณฑ์

มติ ครม.  
15 มิ.ย. 64

มติ ครม.  
14 ก.ย. 64

คำสั่งนายก  
29 ก.ย. 64

คำสั่งนายก  
29 ก.ย. 64

คำสั่งนายก  
29 ก.ย. 64

กปร.  
ปี 2564

**24 รายการ**

426.47 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจ  
รับครุภัณฑ์  
24 รายการ

0 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาลูกข่ายและภัยแล้ง

**44 รายการ**

1,183.31 ล้านบาท

เบิกจ่าย 758.79 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 64.12

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง  
22 รายการ

57.69 %

• แล้วเสร็จ 22 รายการ

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่  
ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม.  
พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาลูกข่ายปี 2563/2564

**1,046 รายการ**

1,562.30 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,534.23 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 98.20

• แล้วเสร็จ 1,044 รายการ

98.70 %

• ยกเลิก 2 รายการ

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64

ปริมาณน้ำ 1.26 ล้าน ลบ.ม.  
พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง ปี 2564

**1 รายการ**

94.70 ล้านบาท

เบิกจ่าย 20.12 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 21.25

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

55.00 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

**1 รายการ**

83.09 ล้านบาท

เบิกจ่าย 74.42 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 89.56

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

90.00 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

**1 รายการ**

70.00 ล้านบาท

เบิกจ่าย 49.72 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 71.03

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

85.00 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำท้ายแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

**71 รายการ**

1,185.27 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,058.54 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 89.31

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง  
12 รายการ

86.78 %

• แล้วเสร็จ 59 รายการ

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564



# ผลการดำเนินงาน

# งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



## การดำเนินงาน


มีมติ คร.ม./คำสั่งนายก อนุมัติงบกลาง 65

รวม 4 ครั้ง จำนวน 1,078 รายการ


งบประมาณ 3,339.12 ล้านบาท

เบิก 797.70 ล้านบาท 23.89 %



## ผลการดำเนินงาน



## ตัวชี้วัดของโครงการ




ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565



- แล้วเสร็จ 127 รายการ
  - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 488 รายการ
  - จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 รายการ
  - เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ
  - ยกเลิก 2 รายการ
- 45.58 %

- ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่
- คราวเรือนรับประโยชน์ 130,088 คราวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565



- อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ - %

ดำเนินการจัดหารถปั้นจั่น เพื่อการเตรียมความพร้อม แก๊วและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุน นโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


จัดหารถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกไปไปตามกฎหมาย



- เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 410 รายการ
- \*อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

- พื้นที่รับประโยชน์ 592,517 ไร่
- คราวเรือนรับประโยชน์ 69,855 คราวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566



- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 37 รายการ
  - จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 รายการ
  - เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ
- 18.52 %

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565





# เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



**UP** ภาพรวมโครงการเงินกู้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



การเบิกจ่ายงบประมาณ **4,224.82** ล้านบาท



เบิกจ่าย **3,977.08** ล้านบาท **94.14%**



เหลือจ่าย **212.63** ล้านบาท **5.03%**



ถูกพับ **35.11** ล้านบาท **0.83%**



สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง **1** รายการ = 0.26%    แล้วเสร็จ **380** รายการ ยกเลิก **3** รายการ = 0.78%



ตัวชี้วัดของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ :

- ซ่อมแซม/ปรับปรุง **207** รายการ
- อาคารบังคับน้ำ **12** รายการ
- ระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรกรรม **30** รายการ
- ขุดลอก **61** รายการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ)
- แก้มลิง **40** รายการ
- อื่น ๆ เช่น ประตุน้ำทำนบหัวดิน **3** รายการ
- ฝาย **21** รายการ
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า **10** รายการ


ผลลัพธ์ของโครงการ :

- พท.ขป. **19,667** ไร่ = 19,667 ไร่ 100%
- ปริมาณน้ำ **26.98** ล้าน ลบ.ม. = 26.98 ล้าน ลบ.ม. 100%
- พท.รับประโยชน์ **209,653** ไร่ = 208,783 ไร่ 99.59%
- ครัวเรือนรับประโยชน์ **64,952** ครัวเรือน = 64,552 ครัวเรือน 99.38%
- การจ้างแรงงาน **9,716** คน = 10,918 คน 112.37%




ผลการดำเนินงานจำแนกตามสำนัก/กอง มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

จำนวนรายการ

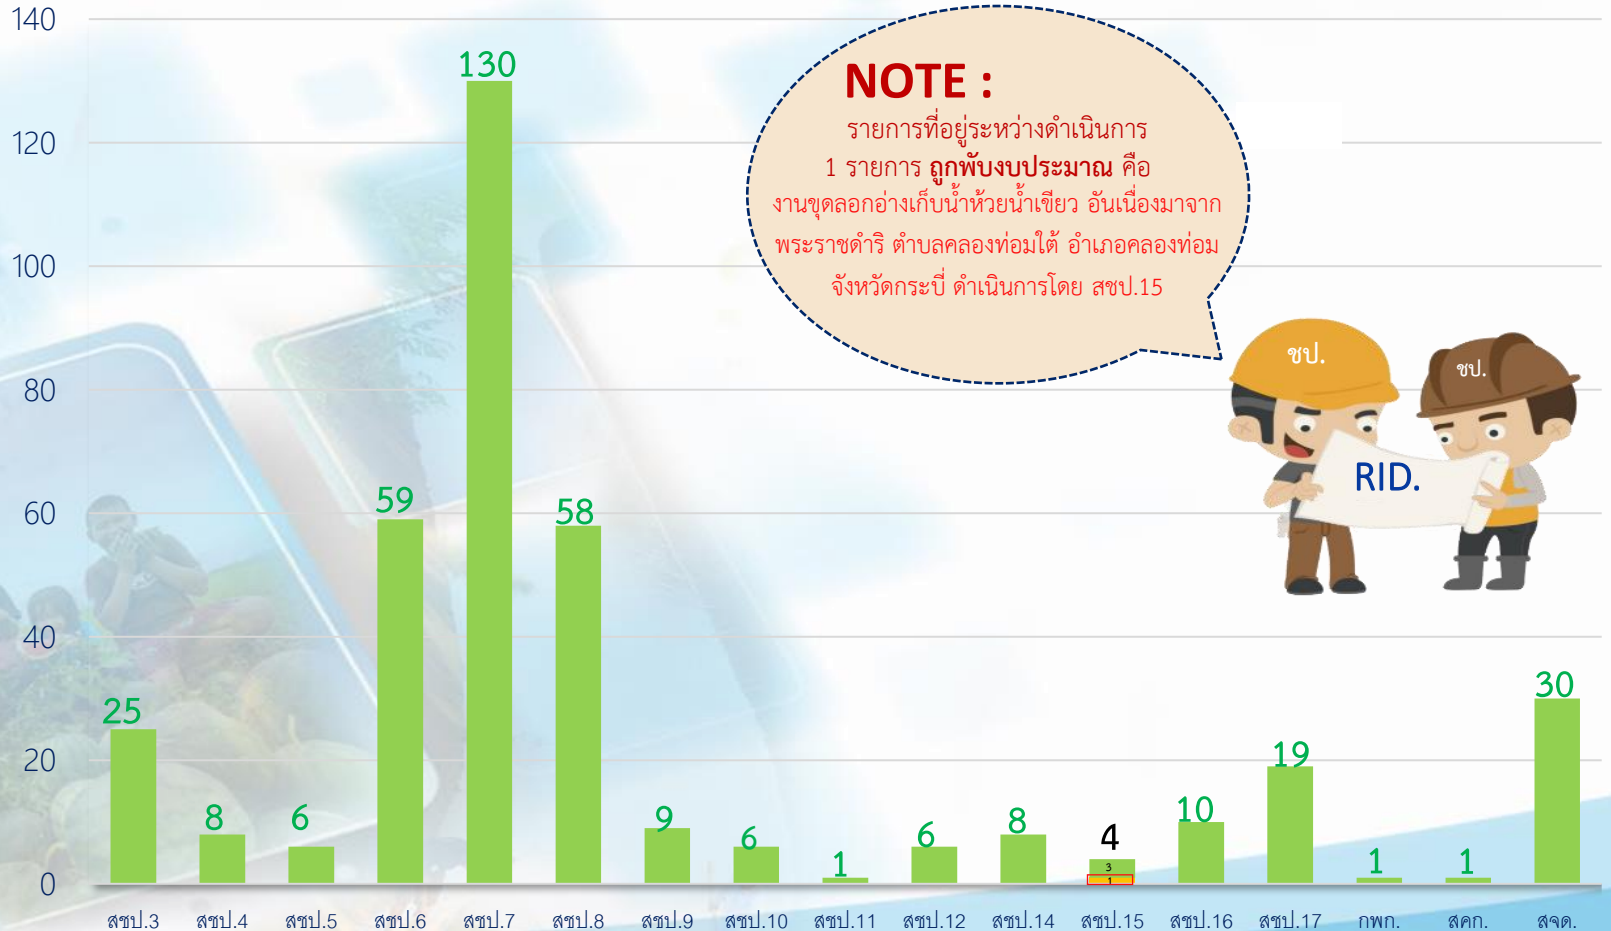

**NOTE :**

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ ถูกพับงบประมาณ คือ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ดำเนินการโดย สขป.15





6

# ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



## รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)

### งานกองทุน จัดรูปที่ดิน

#### จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- งบประมาณ 220.30 ล้านบาท = เบิกจ่าย 168.67 ล้านบาท 76.56 %
- ผลการดำเนินงาน
 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10 รายการ
แล้วเสร็จ	23 รายการ
รวมทั้งสิ้นจำนวน 33 รายการ	
- ผลสัมฤทธิ์
  - พื้นที่เกษตรกรรม 26,235 ไร่ = 8,620 ไร่
  - ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,627 ครัวเรือน = 877 ครัวเรือน

#### จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร

- งบประมาณ 714.70 ล้านบาท = เบิกจ่าย 613.15 ล้านบาท 85.79%
- ผลการดำเนินงาน
 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง	40 รายการ
แล้วเสร็จ	26 รายการ
ยกเลิก	1 รายการ
รวมทั้งสิ้นจำนวน 67 รายการ	
- ผลสัมฤทธิ์
  - พื้นที่เกษตรกรรม 62,756 ไร่ = 16,390 ไร่
  - ครัวเรือนรับประโยชน์ 5,603 ครัวเรือน = 1,546 ครัวเรือน



#### ภาพรวม

งบประมาณ 935.00 ล้านบาท  
= เบิกจ่าย 781.82 ล้านบาท  
83.62 %

ผลการดำเนินงาน : 100 รายการ  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 50 รายการ  
แล้วเสร็จ 49 รายการ  
ยกเลิก 1 รายการ  
เนื่องจากการก่อสร้างจะมีผลกระทบกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร

ผลสัมฤทธิ์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

- พื้นที่เกษตรกรรม 88,991 ไร่ = 25,010 ไร่
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 7,230 ครัวเรือน = 2,423 ครัวเรือน

### เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน

#### ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ 904.24 ล้านบาท  
= เบิกจ่าย 646.02 ล้านบาท  
71.44 %

#### ผลการดำเนินงาน : 1,542 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 96 รายการ  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 รายการ  
ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,443 รายการ



## รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2565 (บาท)	งบประมาณเหลือโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	สถานะดำเนินการ	ประเภท
		<b>รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 รายการ</b>			<b>1,266,092,000</b>	<b>1,302,362,000</b>		
1	กพท.	(230) ประชูประบายน้ำที่วังงานและอาคารประกอบโครงการประสูตระบายน้ำคลองกลายบ้านนาگون ตำบลสระแก้วอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 9490 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานผูกพันใหม่	137,600,000	137,600,000	6.อนุมัติรับราคา	พรบ.
2	กพท.	(367) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา - [ 9013 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	137,550,000	137,550,000	5.เปิดซอง	พรบ.
3	สลก.	(10) อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [ 557 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานผูกพันใหม่	46,742,000	46,742,000	5.เปิดซอง	พรบ.
4	สพญ.	(8) งานชุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 - [ 9528 ]	โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานผูกพันใหม่	676,200,000	676,200,000	5.เปิดซอง	พรบ.
5	สพญ.	(6) ประสูตระบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง - [ 9514 ]	โครงการพัฒนาสูบน้ำที่วิทยาลัยทอनोंล่าง จังหวัดหนองคาย	งานผูกพันใหม่	228,000,000	228,000,000	5.เปิดซอง	พรบ.
6	สอศ.	(29) ค่าจ้างสำรวจออกแบบโครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 9045 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	40,000,000	40,000,000	5.เปิดซอง	พรบ.
7	สขป. 11	ประสูตระบายน้ำที่ถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [ 9723 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว		21,270,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	โอนเปลี่ยนแปลง
8	สขป. 11	ประสูตระบายน้ำที่ถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [ 9724 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว		15,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	โอนเปลี่ยนแปลง
