



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๒๓๗/๒๕๖๔ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒๓๗๔๘๘

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๗๔ รายการ (รายการตาม พ.ร.บ. ที่ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๗ รายการ) งบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๖๔๑.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๓ และงบประมาณที่ถูกพับ ๕๖๘.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๗ (งบประมาณที่ถูกพับจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๔.๖๖ ล้านบาท และงบประมาณที่ถูกพับจากงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๕๐๓.๔๑ ล้านบาท) ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๕๒๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๔๖ รายการ และยกเลิก จำนวน ๕ รายการ ทั้งนี้ รายการงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๔๖ รายการ มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อ ๙๘๘.๙๒ ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณที่ถูกพับ จำนวน ๕๐๓.๔๑ ล้านบาท และงบประมาณที่สำนัก/กอง แจกคืนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ซึ่งกรมนำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว จำนวน ๔๘๕.๕๑ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ ออช. เพื่อทราบต่อไป



(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธ)

ผตป.ผง.

เรียน ออช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ



(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.กท., ทน. ๑-๙ มอ.

และ ผมท.มอ. (ผ.มอ., ผด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ



(นายสุรชาติ มาลาศรี)

ผส.บก. รักษาการแทน ผส.บอ.

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔



สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11,209.80 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 10,641.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.93 และงบประมาณที่ถูกพับ 568.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 (งบประมาณที่ถูกพับจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 64.66 ล้านบาท และงบประมาณที่ถูกพับจากงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 503.41 ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน มีจำนวนงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 1,574 รายการ (รายการตาม พ.ร.บ. ที่ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1,557 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 17 รายการ) โดยเป็นรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,523 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.76 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.92 และยกเลิก จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.32 (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)				
		งบประมาณเงินกัน	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ/หลังโอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ถูกพับ
รวมทั้งสิ้น	1,574	11,209.80	11,209.80	10,641.73	94.93	568.07
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	1,523	9,655.40	10,160.92	10,096.26	99.36	64.66
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	46	1,499.90	1,048.73	545.33	52.00	503.41
3. ยกเลิกรายการ	5	54.50	0.15	0.14	99.50	0.0007

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,523 รายการ งบประมาณ 7,046.1388 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 10,160.92 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 10,096.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.36 และงบประมาณที่ถูกพับ 64.66 ล้านบาท

2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ งบประมาณ 1,499.90 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,048.73 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 545.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.00 และงบประมาณที่ถูกพับ 503.41 ล้านบาท (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงรายการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)				
		งบประมาณเงินกัน	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ/ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ถูกพับ
รวมทั้งสิ้น	46	1,499.90	1,048.73	545.33	52.00	503.41
สำนักงานชลประทานที่ 5	4	44.64	19.48	1.16	5.96	18.32
สำนักงานชลประทานที่ 6	1	27.52	26.58	3.11	11.69	23.48
สำนักงานชลประทานที่ 8	1	34.13	34.13	20.14	59.00	14.00
สำนักงานชลประทานที่ 9	5	248.80	142.18	120.84	84.99	21.33
สำนักงานชลประทานที่ 11	3	369.91	97.43	44.33	45.50	53.10
สำนักงานชลประทานที่ 14	1	84.94	51.80	47.73	92.14	4.07
สำนักงานชลประทานที่ 15	3	86.65	86.65	50.45	58.23	36.19
สำนักบริหารโครงการ	5	48.46	26.16	26.16	100.00	0.001
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	9	241.15	241.15	106.78	44.28	134.37
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	12	306.71	283.34	93.05	32.84	190.28
สำนักกฎหมายและที่ดิน	2	7.00	39.84	31.58	79.27	8.26

โดยสำนัก/กอง มีงบประมาณที่ถูกพับ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ

2.1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 12 รายการ งบประมาณที่ถูกพับ 190.28 ล้านบาท

2.2 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 9 รายการ งบประมาณที่ถูกพับ 134.37 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 3 รายการ งบประมาณที่ถูกพับ 53.10 ล้านบาท

3. ยกเลิก จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 54.50 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 0.15 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.50 และงบประมาณที่ถูกพับ 0.0007 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายการงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ มีความจำเป็นต้องใช้ งบประมาณต่อ 988.92 ล้านบาท จำแนกได้ดังนี้ (ดังตารางที่ 3)

1. รายการงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง มีงบประมาณถูกพับไป จำนวน 503.41 ล้านบาท

2. รายการงานที่สำนัก/กอง แจกคืนงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน และกรมนำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว จำนวน 485.51 ล้านบาท

ตารางที่ 3 แสดงรายการงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อ

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)						งบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ต่อ
		งบประมาณเงินกัน	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ/หลังโอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ถูกพับ	นำไปโอนเปลี่ยนแปลง	
รวมทั้งสิ้น	46	1,499.90	1,048.73	545.33	52.00	503.41	485.51	988.92
สำนักงานชลประทานที่ 5	4	44.64	19.48	1.16	5.96	18.32	25.15	43.48
สำนักงานชลประทานที่ 6	1	27.52	26.58	3.11	11.69	23.48	0.94	24.41
สำนักงานชลประทานที่ 8	1	34.13	34.13	20.14	59.00	14.00	0.00	14.00
สำนักงานชลประทานที่ 9	5	248.80	142.18	120.84	84.99	21.33	106.63	127.96
สำนักงานชลประทานที่ 11	3	369.91	97.43	44.33	45.50	53.10	272.48	325.58
สำนักงานชลประทานที่ 14	1	84.94	51.80	47.73	92.14	4.07	33.14	37.21
สำนักงานชลประทานที่ 15	3	86.65	86.65	50.45	58.23	36.19	-	36.19
สำนักบริหารโครงการ	5	48.46	26.159	26.158	100.00	0.001	22.30	22.30
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	9	241.15	241.15	106.78	44.28	134.37	-	134.37
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	12	306.71	283.34	93.05	32.84	190.28	23.37	213.65
สำนักกฎหมายและที่ดิน	2	7.00	39.84	31.58	79.27	8.26	1.50	9.76

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ


แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่ เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมกำกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ติดตามการดำเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ หากได้รับอนุญาตแล้วเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ควรมีการเตรียมความพร้อม ศึกษาศึกษา และเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการดำเนินงานขออนุญาตการขอใช้พื้นที่ อีกทั้งควรนำข้อผิดพลาดในการดำเนินงานดังกล่าวมาปรับปรุง แก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีต่อ ๆ ไป

\*\*\*\*\*



# งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเทลอมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

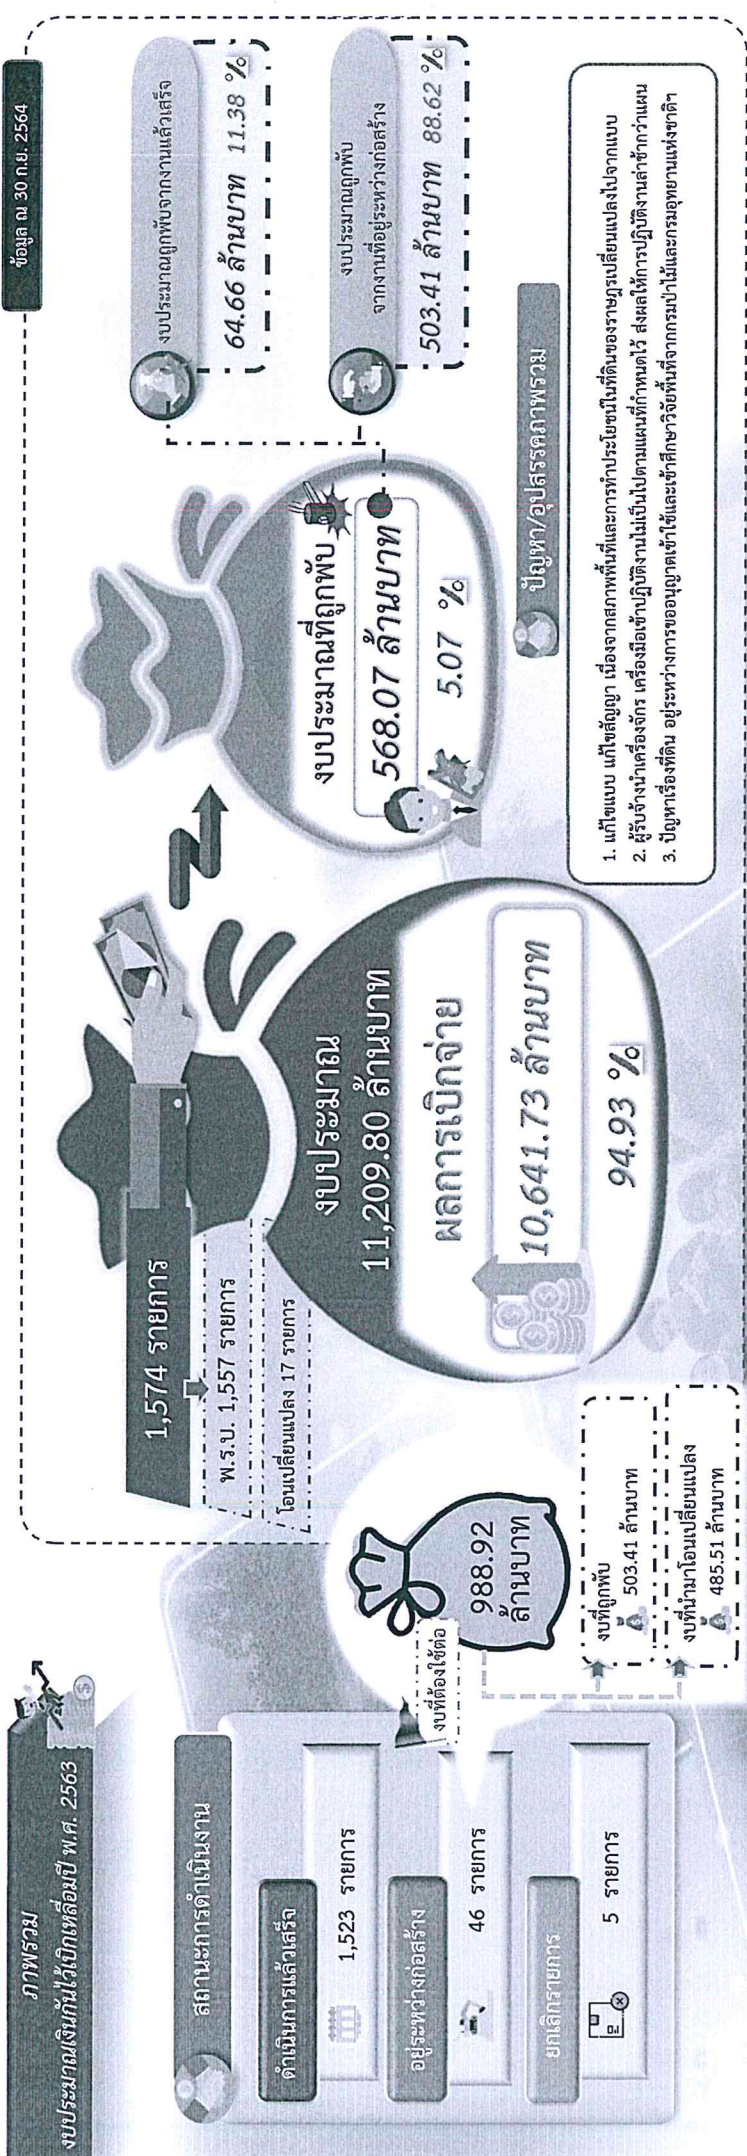

**แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเทลอมปี พ.ศ. 2563**

ไตรมาส	พ.ย.63	ธ.ค.63	ก.พ.64	มี.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
รวม	991.29	1,863.30	2,360.42	1,717.71	1,307.88	1,236.59	444.95
ผล	991.29	1,636.07	1,956.40	929.49	796.62	988.60	535.38
ผลต่าง	-	-227.23	-404.02	-788.22	-511.26	-247.99	90.43
งบที่ถูกต้อง				1,717.71	1,307.88	1,236.59	444.95
งบที่นำมาโอนเปลี่ยนแปลง				929.49	796.62	988.60	535.38
งบที่ถูกพับ				-788.22	-511.26	-247.99	90.43
งบที่ถูกต้อง				271.98	282.29	117.58	97.23
งบที่นำมาโอนเปลี่ยนแปลง				461.61	461.61	204.46	332.72
งบที่ถูกพับ				179.32	179.32	86.88	235.49
งบประมณที่ถูกต้อง				518.57	518.57	117.58	97.23
งบประมณที่ถูกพับ				1,489.04	1,489.04	204.46	332.72
งบที่นำมาโอนเปลี่ยนแปลง				970.47	970.47	86.88	235.49

**งบประมณเงินกู้ไว้เบิกเทลอมปี พ.ศ. 2563**

ไตรมาสที่ 1: 518.57 ล้านบาท (51.86%)  
ไตรมาสที่ 2: 518.57 ล้านบาท (51.86%)  
ไตรมาสที่ 3: 117.58 ล้านบาท (11.76%)  
ไตรมาสที่ 4: 97.23 ล้านบาท (9.72%)

**รวม: 1,053.95 ล้านบาท (105.39%)**

