



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๒๒๘๖
ที่ กพง ๐๖/๕๕๐/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ JM. ๑๓๙๒
เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR จำนวน ๑,๖๖๘ รายการ งบประมาณ ๙,๔๖๕.๘๒๓๕ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๐๑ รายการ งบประมาณ ๔,๑๐๒.๐๑๓๘ ล้านบาท เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา จำนวน ๑,๔๖๙ รายการ งบประมาณ ๘,๖๐๘.๕๘๓๒ ล้านบาท ทำข้อผูกพัน จำนวน ๖,๕๕๑ รายการ งบประมาณ ๔๗,๙๑๕.๐๓๐๐ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๗๓ รายการ งบประมาณ ๓๖๗.๖๑๒๔ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

- ทราบ

๖ โยธ พอ.สน., พอ.ทต., ทน. ๑-๙ มอ.

๑๑๗ พมท.มอ. (งม.มอ., พต.มอ.)

เพื่อโปรดทราบและ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นายชเนศร์ สมบูรณ์)
ผส.บอ.

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.



รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 - ส่วนกลาง



ภาพรวม

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการภายในวันที่ 14 ต.ค. 2565

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,989	70,091.45	1,668	9,465.82	301	4,102.01	1,469	8,608.58	6,551	47,915.03
กพท.	158	13,162.81	20	695.76	6	789.47	8	894.78	124	10,782.81
สพญ.	181	11,182.31	24	799.02	28	1,823.95	16	562.04	113	7,997.30
สคก.	367	1,421.19	13	135.57			66	780.61	288	505.01
สบอ.	228	706.59	78	278.71	2	20.48	41	192.13	107	215.26
สบก.	32	598.70					12	94.87	20	503.83
สจด.	49	272.55	7	57.27	1	9.80	17	71.81	24	133.67
สลก.	4	99.97	2	3.21			1	47.68	1	49.08
สสร.	39	513.24	17	192.72	8	68.09	8	65.04	6	187.39
สอส.	13	331.04			5	74.00	2	50.00	6	207.04
ศทส.	1	3.00	1	3.00						
สมต.	50	5,544.79					25	1,455.94	25	4,088.84

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 14 พ.ย. 65

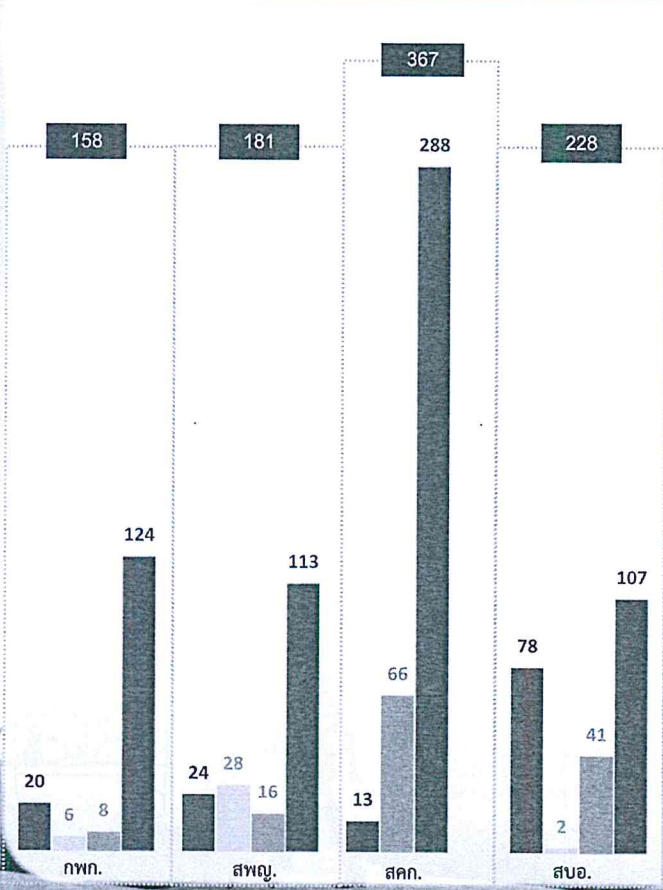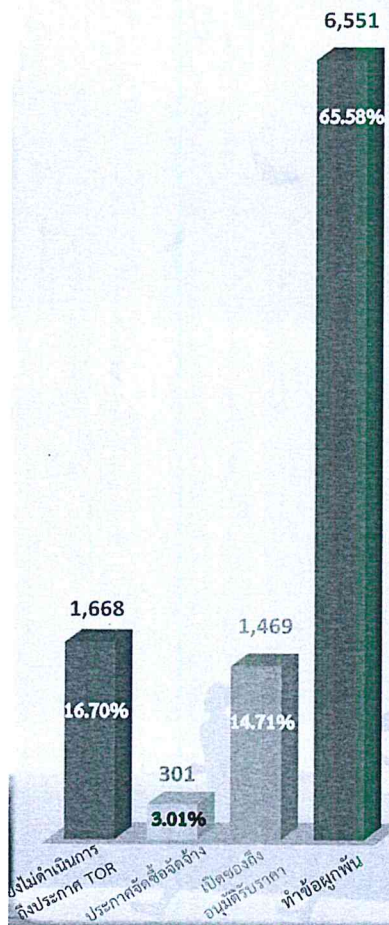

หมายเหตุ
ไม่รวมรายการ จำนวน 76 รายการ งบประมาณ 596.61 ล้านบาท ดังนี้
- ยกเลิก จำนวน 73 รายการ งบประมาณ 367.61 ล้านบาท
- รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

- ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา
- ทำข้อผูกพัน

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566

- ส่วนภูมิภาค

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน		สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ				จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	419	1,522.66	14	45.06	5	5.50	38	180.46	362	1,291.65	สขป. 10	611	1,047.28	321	489.98	6	8.72	109	203.12	175	345.46
สขป. 2	405	1,293.45	45	52.72	5	55.00	53	101.96	302	1,083.78	สขป. 11	582	1,575.14	47	621.72	73	57.56	149	130.02	313	765.84
สขป. 3	360	2,212.09	46	347.72	19	98.68	23	84.97	272	1,680.73	สขป. 12	675	1,476.89	267	419.46	27	136.92	114	377.29	267	543.22
สขป. 4	534	1,571.89	12	81.87	16	250.94	14	214.35	492	1,024.73	สขป. 13	612	1,321.78	93	454.13	2	20.50	60	161.59	457	685.56
สขป. 5	494	2,660.15	49	388.61			53	148.35	392	2,123.19	สขป. 14	360	3,058.43	49	648.51	1	0.50	75	517.12	235	1,892.31
สขป. 6	500	2,834.39	48	235.03	7	50.26	39	291.17	406	2,257.94	สขป. 15	503	1,217.34	183	407.84	3	79.00	69	247.23	248	483.27
สขป. 7	654	5,051.26	6	197.50	8	41.40	26	65.68	614	4,746.68	สขป. 16	521	3,212.46	118	1,777.29	7	139.56	176	704.00	220	591.60
สขป. 8	627	3,427.40	55	622.74	18	222.38	43	227.11	511	2,355.18	สขป. 17	265	1,082.67	19	132.87	8	58.90	103	611.51	135	279.39
สขป. 9	745	1,689.98	134	377.53	46	90.43	129	127.78	436	1,094.24											

หมายเหตุ
 ไม่รวมรายการ จำนวน 76 รายการ งบประมาณ 596.61 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 73 รายการ งบประมาณ 367.61 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 14 พ.ย. 65

