



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘  
ที่ กพง ๐๖/๓๐๘/๒๕๖๔ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ง๒๘/๗๗  
เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑,๐๖๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖๑๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๔๐.๕๖๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๘ งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๖๔๓.๑๙๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๒ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗๐ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๘๙๗ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)  
ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)  
ผอ.ผง.

๕ พ.ย. ๒๕๖๔

ไปณ ผอ.ส่วน, ผอ.ธ.ภาค, ทน.๑-๙ มอ.  
และ ผมท.มอ. (จ.ม.มอ., พ.ด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.  
๕ พ.ย. ๒๕๖๔

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,067 รายการ งบประมาณ 11,283.7615 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 640.5623 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.68 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 10,643.1993 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.32

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 170 รายการ งบประมาณ 389.1407 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 154.8005 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.78 และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 234.3403 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.22

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 897 รายการ งบประมาณ 10,894.6208 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 485.7618 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.46 และต้องดำเนินการต่อ 10,408.8590 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.54

ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 แยกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,067	11,283.7615	640.5623	5.68	10,643.1993
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	170	389.1407	154.8005	39.78	234.3403
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	897	10,894.6208	485.7618	4.46	10,408.8590

2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 31 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณคงเหลือมากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 114 รายการ งบประมาณ 2,976.1557 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 105.1820 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.53 และต้องดำเนินการต่อ 2,870.9737 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ งบประมาณ 1,800.3141 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 60.3962 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.35 และต้องดำเนินการต่อ 1,739.9180 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 54 รายการ งบประมาณ 737.5469 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 57.3854 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.78 และต้องดำเนินการต่อ 680.1615 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2563 แยกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะการดำเนินงาน		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)			
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,067	170	897	11,283.7615	640.5623	5.68	10,643.1993
สขป. 1	16	1	15	156.7403	5.8370	3.72	150.9033
สขป. 2	31	6	25	153.5308	0.6029	0.39	152.9280
สขป. 3	28	7	21	175.8409	9.9763	5.67	165.8646
สขป. 4	25		25	244.7879	1.5647	0.64	243.2232
สขป. 5	63	3	60	222.1057	8.9851	4.05	213.1206
สขป. 6	38	5	33	259.5580	13.3665	5.15	246.1914
สขป. 7	34	18	16	108.8960	0.5802	0.53	108.3158
สขป. 8	102	24	78	428.1111	27.4400	6.41	400.6711
สขป. 9	36	9	27	362.3819	29.8368	8.23	332.5450
สขป. 10	26	4	22	248.1583	1.6905	0.68	246.4678
สขป. 11	38	3	35	568.6943	30.6329	5.39	538.0614
สขป. 12	34	8	26	465.8331	52.8367	11.34	412.994
สขป. 13	28	3	25	141.9655	1.3561	0.96	140.6095
สขป. 14	28	2	26	443.3242	23.2864	5.25	420.0378
สขป. 15	54	19	35	627.1931	43.5867	6.95	583.6064
สขป. 16	54	6	48	737.5469	57.3854	7.78	680.1615
สขป. 17	63	16	47	451.6648	70.1603	15.53	381.5045
สบอ.	33	9	24	102.1225	1.4500	1.42	100.6726
สคก.	13	3	10	67.9304	14.0888	20.74	53.8415
สพญ.	114	4	110	2,976.1557	105.1820	3.53	2,870.9737
กพก.	121	12	109	1,800.3141	60.3962	3.35	1,739.9180
ศทส.	4		4	14.4390			14.4390
สมต.	6		6	1.9649	0.5212	26.52	1.4437
สจต.	5		5	54.6834			54.6834
สลก.	11		11	62.8680	5.0949	8.10	57.7731
สบก.	30	6	24	173.9936	14.0008	8.05	159.9928
สวพ.	2		2	6.5163	3.5629	54.68	2.9534
สสร.	9	2	7	54.7092			54.7092
สอส.	5		5	64.6867			64.6867
กสข.	2		2	1.1941			1.1941
สพข.	1		1	0.0300			0.0300
LUMP SUM	13		13	105.8210	57.1411	54.00	48.6799

### **ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน**

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

### **แนวทางการแก้ไข**

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมกำกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าปฏิบัติงานภายหลังระดับน้ำลดลง

\*\*\*\*\*




# งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

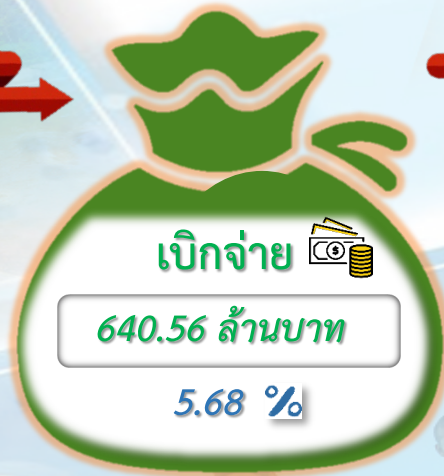

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ



170 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง



897 รายการ



ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก๊ซแบบ แก๊ซสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ล้านบาท



แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95
ผล	640.56											
ผลต่าง	-											
	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
	กองแผนงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		



เบิกจ่าย 100%
