



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖ สงข ๑๔๓๑/ว. ก.พ. ๖๕

ที่ กพง ๐๖/๑๕๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

เรียน ผอ.ผง. สำนัก ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๙ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๒,๐๕๐.๓๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๘๒๑.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๗๑๖.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๔ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๒,๐๖๘.๐๕ ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา ๒,๖๒๘.๐๑ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๒๗.๐๘ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙๗ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ และยกเลิก จำนวน ๙ รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๑ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๗๕๐.๘๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๘๕.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๗ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๘๙๘.๐๔ ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา ๑๐๔.๔๔ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๓ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๑ รายการ (สขป.๙ จำนวน ๑ รายการ สขป.๑๔ จำนวน ๙ รายการ และสขป.๑๕ จำนวน ๑ รายการ) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๗ รายการ (อนุมัติแผน จำนวน ๒๑ รายการ เปิดซอง จำนวน ๖ รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน ๑๐ รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๗๔ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ รายการ และยกเลิก จำนวน ๕ รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานที่ยังไม่ดำเนินการมาด้วยแล้ว

(นางสาวรากรณ์ ทัดพงษ์ศรีธ)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำนักเรียน รธบ. รธส. รธร. รธว. และผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕

ศัญชว. นอ. กำน. นอธ. ทาค. และ ทท. ๑-๙ นอ.

เพื่อทราบ

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565

กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565





การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ร.บ. 2564

ประเภท	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,821.06	219	2,068.05
ผล	1,716.09 (94.24%)	197	2,628.01 (127.08%)

Para Asphalt Concrete

ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,332.78	161	795.88
ผล	1,323.58 (99.31%)	150	1,287.59 (161.78%)

Para Soil Cement

ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	153.95	29	1,210.72
ผล	140.99 (91.58%)	27	1,286.18 (106.23%)

รายการโอนเปลี่ยนแปลง

ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	251.48	28	61.44
ผล	168.67 (67.07%)	19	54.24 (88.28%)

Para. - Log Boom-I

ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)
แผน	82.85	1
ผล	82.85 (100%)	1




หมายเหตุ : ยกเลิกจำนวน 9 รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด





การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

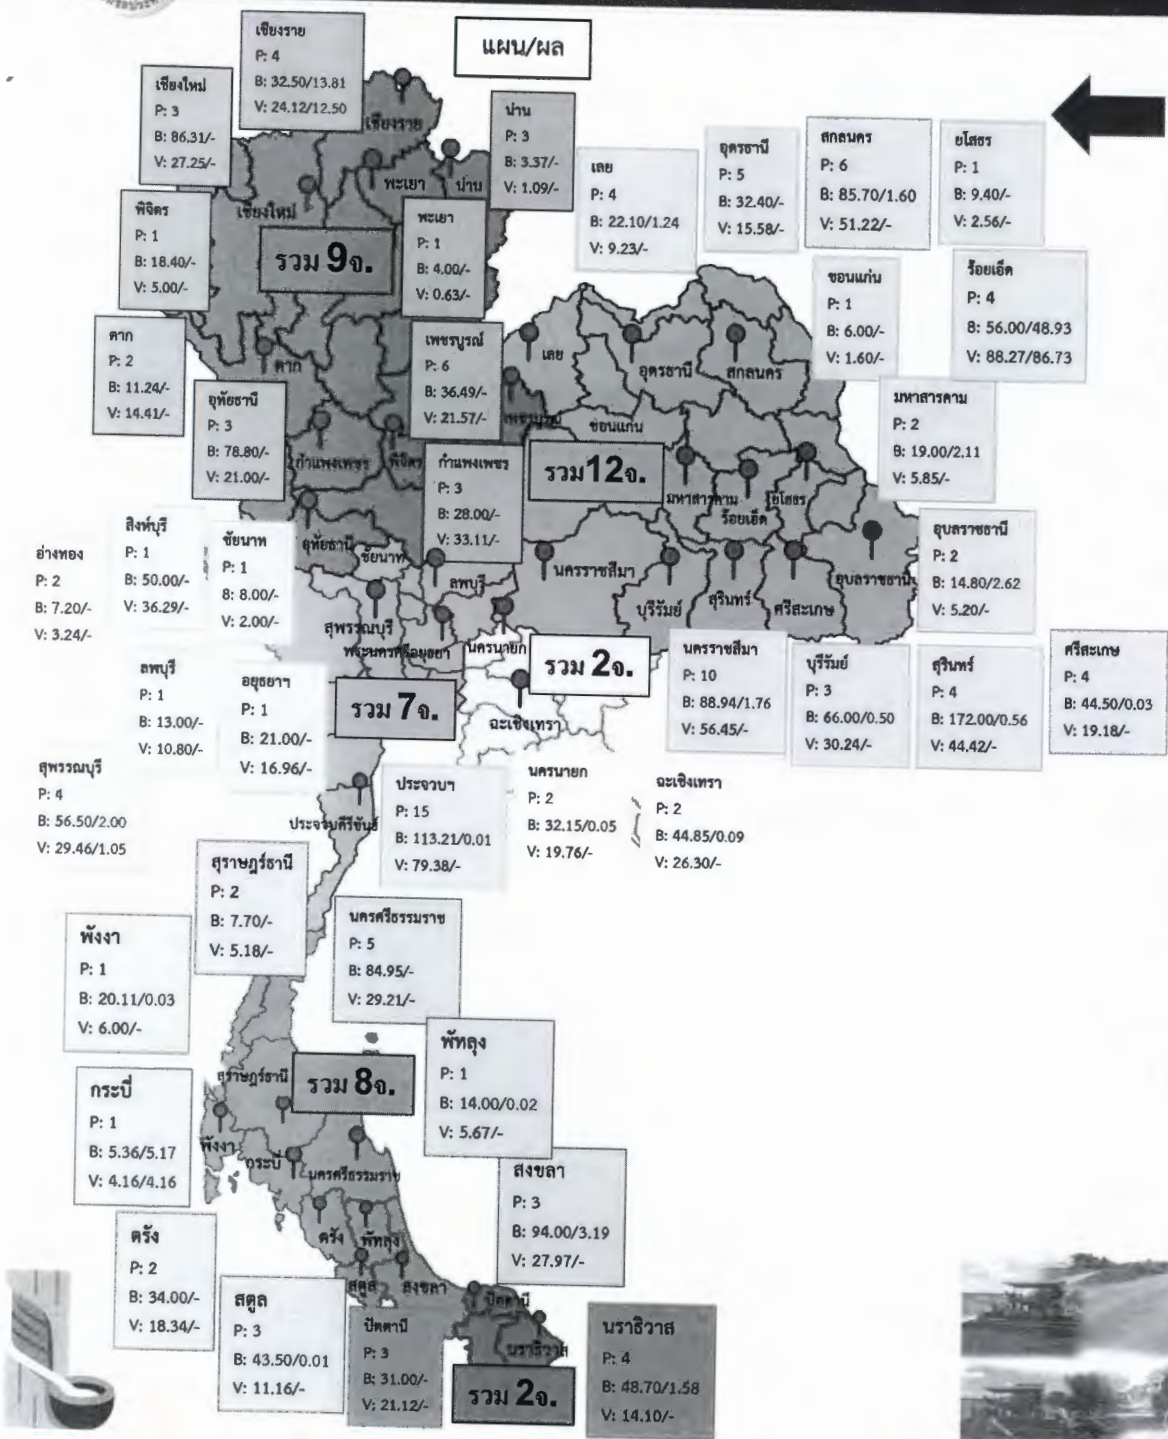

แผนการดำเนินงาน P (PA-PS) B V

ภาค/จังหวัด	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	น้ำยางชั้น (ตัน)
รวม 40 จ.	131	1,836.68	898.04
เหนือ	26 (26)	299.11	148.17
ตะวันออกเฉียงเหนือ	46 (43-3)	616.84	329.80
กลาง	25 (25)	268.91	178.13
ตะวันออก	4 (4)	77.00	46.06
ใต้	23 (22-1)	495.12	160.65
ใต้ชายแดน	7 (7)	79.70	35.22

หมายเหตุ

- PA : Para Asphalt Concrete - PS : Para Soil Cement

ผลการดำเนินงานภาพรวม

ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,836.68	1,750.84	131	898.04
ผล	85.30 (4.64%)	85.30 (4.87%)	4	104.44 (11.63%)

1. PA

PA : Para Asphalt Concrete

ประเภท	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,802.41	1,716.75	127	792.54
ผล	63.97 (3.55%)	63.97 (3.73%)	2	30.28 (3.82%)

ยังไม่ดำเนินการ 11 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 37 รายการ (อนุมัติแผน 21 รายการ เปิดซอง 6 รายการ อนุมัติรับราคา 10 รายการ) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 72 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ และยกเลิก 5 รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

2. PS

PS : Para Soil Cement

ประเภท	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	34.26	34.09	4	105.50
ผล	21.33 (62.24%)	21.33 (62.56%)	2	74.16 (70.29%)

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ



รายละเอียดรายการงานโครงการส่งเสริมการใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่ยังไม่ดำเนินการ)

ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	ประเภทยางพารา	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผนปริมาณการใช้ ยางพารา (ตัน)
	รวมทั้งสิ้น จำนวน 11 รายการ			137,150,000	215.40
1	(28) ซ่อมสร้างผิวทางเข้าหัวงานโครงการ ระยะทาง 2.74 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [2157]	สำนักงานชลประทานที่ 9	Para Asphalt Concrete	24,000,000	14.99
2	(43) ปรับปรุงถนนลาดยางรอบอ่างเก็บน้ำคลองจระเข้ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [2172]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	45,000,000	8.20
3	(1.56) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 60ซ้าย และ 61ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.370 กม. - [2117]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	1,860,000	5.18
4	(1.55) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 44ซ้าย-4ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.520 กม. - [2116]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,100,000	5.75
5	(1.54) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 41ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.655 กม. - [2115]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,270,000	6.27
6	(1.53) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 34 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. - [2114]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,080,000	5.67
7	(1.52) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 22ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.120 กม. - [2113]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	1,950,000	4.23
8	(1.51) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย-1ซ้าย-5ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.480 กม. - [2112]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,500,000	5.59
9	(1.50) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย-1ซ้าย-4ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. - [2111]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,540,000	5.67
10	(1.49) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย-1ซ้าย-2ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.700 กม. - [2110]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,850,000	6.43
11	(45) ปรับปรุงผิวจราจรถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย RMC ฝ่ายคลองไม้เสียระยะทาง 9.165 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพื้งบน ตำบลเกาะขันธุ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [2174]	สำนักงานชลประทานที่ 15	Para Asphalt Concrete	50,000,000	16.50



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๕๕/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕) ๓๓๕ ๕๑๘ ๒๖๖๕


เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้


๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๙ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๒,๐๕๐.๓๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๘๒๑.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๖๕.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๙ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๒,๐๖๘.๐๕ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๒,๕๙๐.๓๓ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๒๕.๒๕ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ และยกเลิก จำนวน ๙ รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๑ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๗๙๓.๓๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๔.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๘๙๘.๐๔ ตัน ผลการดำเนินงานในภาพรวม ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๓ รายการ (สขป.๑ จำนวน ๒ รายการ สขป.๙ จำนวน ๑ รายการ สขป.๑๔ จำนวน ๙ รายการ และสขป.๑๕ จำนวน ๑ รายการ) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕๖ รายการ (อนุมัติแผน จำนวน ๓๔ รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ เปิดซอง จำนวน ๔ รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน ๑๕ รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕๙ รายการ และยกเลิก จำนวน ๓ รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานที่ยังไม่ดำเนินการมาด้วยแล้ว



(นางสาวราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)
ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รธบ. รธส. รธร. รธว. และผู้อำนวยการสำนัก/กอง เพื่อโปรดทราบ


(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕

ณ ผอ.ผง. ผอ.ทก. พาหนะ 1-9
พ.ท.ผง.


(นายนนต์ สมบูรณ์)
ผส.บอ
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕
