



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐.  
ที่ Eศนค(งค.) ๐๔/๑๑๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เงินกันเหลือเมื่อปี ๒๕๖๔ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)  
ปค.บอ.

ผ่าน

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)  
ผปบ.บอ.

# ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

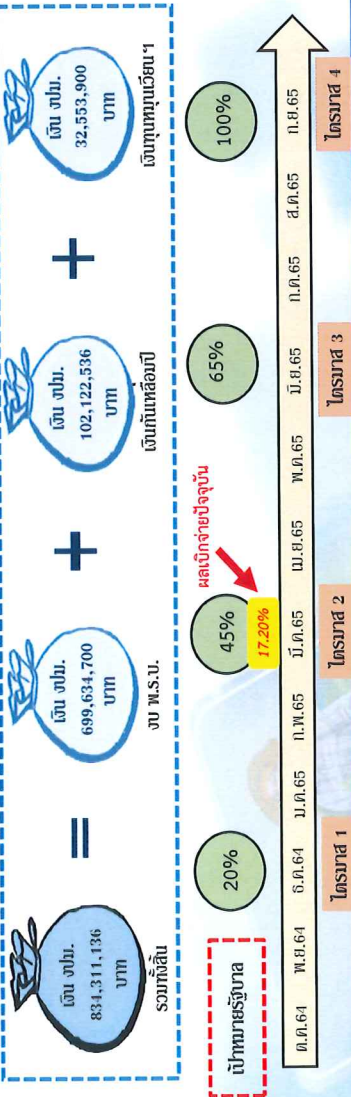

### งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (พ.ร.บ.)

- จำนวน 207 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 379,133,230 บาท (จำนวน 202 รายการ)
- ผลการจ่ายปัจจุบัน 76,862,329 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.99
- เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 2 ร้อยละ 45

**699,634,700 บาท**

### เงินก้นหลอมปี 2564

- จำนวน 33 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 66,417,051 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.07
- คาดว่าจะเบิกแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2 จำนวน 30 รายการ
- คาดว่าจะเบิกแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 จำนวน 3 รายการ

**102,122,536 บาท**

### เงินหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ 2565 และ 2564

**32,553,900 บาท**

- จำนวน 67 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 32,290,251 บาท (จำนวน 66 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 230,094 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.73

### รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2565

จำนวน 208 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 699,829,700 บาท

แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 207 รายการ (699,634,700 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเชื้อ)

**ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ขบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565 (งบลงทุน)**

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)				การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)				ทำข้อตกลง งบผูกพัน (สัญญา)
	อู่ระหว่าง	อนุมัติแผน	ประกาศ TOR	เปิดซอง	อนุมัติ	รับราคา	สัญญา	สัญญา	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	207	1	2	0	4	32	166	1	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	0	0	1	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	0	0	0	0	0	10	10	
ส่วนอุทกวิทยา	24	0	0	0	0	6	18	18	
ส่วนปรับปรุงรังสิต	5	0	0	0	0	1	4	4	
ส่วนควบคุมและตรวจสอบ	8	0	0	0	0	3	5	5	
ส่วนการให้บริการ	41	0	0	0	0	9	32	32	
ส่วนประมวลผลสารสนเทศ	40	1	2	0	4	0	32	32	
หอภาคกลาง	13	0	0	0	0	0	13	13	
หอภาคตะวันตก	10	0	0	0	0	10	0	0	
หอภาคตะวันออก	7	0	0	0	0	0	7	7	
หอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6	0	0	0	0	2	4	4	
ตอนบน	13	0	0	0	0	0	13	13	
ตอนล่าง	9	0	0	0	0	0	9	9	
หอภาคใต้	12	0	0	0	0	1	10	10	
หอภาคเหนือตอนบน	8	0	0	0	0	0	8	8	

**หมายเหตุ :** 1. ศูนย์ประมวลผลสารสนเทศนี้ ยกเลิก 1 รายการ  
2. หอภาคเหนือตอนบน ยกเลิก 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชัยบุรีระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 307 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	รวม	จ้างเหมา		ทำเอง
ฝ่ายบริหารทั่วไป	67	32,555,900	32,290,251	0	32,290,251	21	1,510,306	0	230,094	0	230,094	0.71
สำนักบริหารจัดการน้ำ	11	7,811,400	7,811,400	249,000	7,562,400	0	0	0	3,409,550	249,000	3,160,550	43.65
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	52	452,007,670	142,040,283	88,181,576	53,858,707	10	305,446,843	305,446,843	46,177,995	39,370,885	6,807,110	10.22
สำนักอุทกวิทยา	39	69,981,000	69,766,950	10,174,600	59,592,350	3	90,000	0	2,780,190	160,000	2,620,190	3.97
สำนักปรับปรุงน้ำจืดรักษา	5	9,200,000	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	3,155,496	0	3,155,496	34.30
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	11	129,509,606	122,469,924	116,524,924	5,945,000	0	0	0	27,415,235	25,528,907	1,886,328	21.17
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	42	15,716,660	15,284,160	567,860	14,716,300	2	432,500	432,500	8,281,721	461,060	7,820,662	52.69
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมความมั่นคงเขื่อนตอนบน	12	17,677,000	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	8,621,809	0	8,621,809	48.77
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมความมั่นคงเขื่อนตอนล่าง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	7,379,046	0	7,379,046	49.90
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมความมั่นคงเขื่อนภาคกลาง	7	14,610,700	14,610,700	1,123,500	13,487,200	0	0	0	6,160,153	1,123,500	5,036,653	42.16
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมความมั่นคงเขื่อนภาคใต้	13	16,765,600	16,765,600	0	16,765,600	0	0	0	5,712,172	0	5,712,172	34.07
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมความมั่นคงเขื่อนภาคเหนือ	13	13,787,900	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	7,698,214	0	7,698,214	55.83
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมความมั่นคงเขื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7	11,360,400	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	5,374,941	0	5,374,941	47.31
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมความมั่นคงเขื่อนภาคตะวันออก	10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	3,514,621	0	3,514,621	35.26
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมความมั่นคงเขื่อนภาคใต้	9	17,576,600	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	7,238,577	0	7,238,577	41.18
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	389,663	0	389,663	38.97
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>307</b>	<b>834,311,136</b>	<b>513,846,017</b>	<b>218,808,009</b>	<b>295,038,008</b>	<b>36</b>	<b>307,479,649</b>	<b>305,879,343</b>	<b>143,539,474</b>	<b>66,893,351</b>	<b>76,646,123</b>	<b>17.20</b>

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

(19) ค่าศึกษา สักราง ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 2055 ] วงเงิน 12,447,400 บาท

อยู่ในความรับผิดชอบของ สชบ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สชป.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน.พ.ม. 2565

ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำป่า ผ่านติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงนนทบุรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2894 ] วงเงิน 1,285,400 บาท

5. เบิกจ่ายร้อยละ เปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมความมั่นคงเขื่อนตอนบน

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมความมั่นคงเขื่อนตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 2866 ] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2565		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น 207 รายการ		จำนวน	รวม	จำนวน	ทำเอง	จำนวน	รวม	จำนวน	ทำเอง	จำนวน	รวม	จำนวน	ทำเอง	
	วงเงิน	วงเงิน													
ส่วนผู้ชดเชย	1	1,000,000	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1	389,663	0	389,663	38.97
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	7,562,400	10	7,562,400	0	7,562,400	0	0	0	0	10	3,160,550	0	3,160,550	41.79
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	40	406,161,700	36	96,194,313	42,335,606	53,858,707	10	305,446,843	305,446,843	0	17	7,004,210	197,100	6,807,110	1.72
ส่วนอุทกวิทยา	24	66,951,000	24	66,736,950	7,144,600	59,592,350	3	90,000	0	90,000	9	2,620,190	0	2,620,190	3.91
ส่วนปรับปรุงน้ำรักษา	5	9,200,000	5	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	0	4	3,155,496	0	3,155,496	34.30
ส่วนความปลอดภัยเชิง	8	77,847,400	8	70,807,717	64,862,717	5,945,000	0	0	0	0	5	1,866,328	0	1,866,328	2.42
ส่วนการใช้น้ำประพรม	41	15,504,800	41	15,072,500	356,000	14,716,500	2	432,500	432,500	0	40	8,069,862	249,200	7,820,662	52.05
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	11	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	0	10	8,621,809	0	8,621,809	48.77
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	8	7,379,046	0	7,379,046	49.90
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	6	13,487,200	6	13,487,200	0	13,487,200	0	0	0	0	6	5,036,653	0	5,036,653	37.34
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	16,763,600	13	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	0	13	5,712,172	0	5,712,172	34.07
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	13	13,787,900	13	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	13	7,698,214	0	7,698,214	55.83
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	7	11,360,400	7	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	7	5,374,941	0	5,374,941	47.31
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	10	9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	9	3,514,621	0	3,514,621	35.26
รวมทั้งสิ้น	207	699,634,700	202	379,433,230	116,685,473	262,747,757	15	305,969,343	305,879,343	90,000	161	76,862,329	446,300	76,416,029	10.99

หมายเหตุ: เบิกจ่ายร้อยละเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ. 65

ส่วนความผิดปกติอื่น

(19) ค่าที่ขาด สำหรับ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเชิงอื่น สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 2055 ] วงเงิน 12,447,400 บาท  
อยู่ในความรับผิดชอบของ สปอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สปบ.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

- มีรายการรับเงินเป็นงานจ้างพัฒนาส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของงานดำเนินการแล้ว 7 รายการ วงเงิน 11,630,457 บาท  
- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บัณฑิตศึกษาในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2894 ] วงเงิน 1,285,400 บาท

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) ทำนบกึ่งรักษาสถานีโทรมาตรขนาดหลัก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ด้านสภาพของ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 2868 ] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565  
 รายการงบประมาณ : เงินก้อนเพื่อปี 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 33 รายการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา		ทำเอง
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	12	45,845,970	45,845,970	45,845,970	0	0	0	0	0	0	39,173,785	39,173,785	0	85.45
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	1,123,500	1,123,500	1,123,500	0	0	0	0	0	0	1,123,500	1,123,500	0	100.00
ส่วนควบคุมลวดลึงเขื่อน	3	51,662,207	51,662,207	51,662,207	0	0	0	0	0	0	25,528,907	25,528,907	0	49.42
ส่วนอุทกวิทยา	15	3,030,000	3,030,000	3,030,000	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	0	5.28
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	211,860	211,860	211,860	0	0	0	0	0	0	211,860	211,860	0	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	249,000	249,000	249,000	0	0	0	0	0	0	249,000	249,000	0	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33</b>	<b>102,122,536</b>	<b>102,122,536</b>	<b>102,122,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,447,051</b>	<b>66,447,051</b>	<b>0</b>	<b>65.07</b>

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565  
 รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการชดเชย 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 65 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	65	31,473,900	64	0	31,210,251	1	0	263,649	230,094	0	230,094	0.73
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65</b>	<b>31,473,900</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>31,210,251</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>263,649</b>	<b>230,094</b>	<b>0</b>	<b>230,094</b>	<b>0.73</b>

6	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	2	1,080,000	2	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2</b>	<b>1,080,000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

รายการที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ชื่องาน / งบประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 3 รายการ	26,136,300	26,136,300	0
	<b>ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ</b>	26,136,300	26,136,300	0
1	(52) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แควงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8492 ]	16,585,300	16,585,300	0
2	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แควงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8250 ]	3,000,000	3,000,000	0
3	(1.1.46) ปรับปรุงสถานีหลักระบบโทรมาตร ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แควงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 714 ]	6,551,000	6,551,000	0

รายการที่อยู่ระหว่างเตรียมการ

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	160,193,000	158,693,000	1,500,000
	<b>ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ</b>	<b>160,193,000</b>	<b>158,693,000</b>	<b>1,500,000</b>
1	(54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8494 ]	160,193,000	158,693,000	1,500,000



รายการที่อยู่ในขั้นตอนอนุมัติแผน

ลำดับที่	ชื่องาน / งบประมาณ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ	30,000,000	3,000,000	27,000,000
	<b>ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ</b>	30,000,000	3,000,000	27,000,000
1	(4) ค่าเช่าใส่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 ลุ่มน้ำ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8444 ]	27,000,000	0	27,000,000
2	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8250 ]	3,000,000	3,000,000	0

**หมายเหตุ**

**ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ**

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบ้าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2894 ] วงเงิน 1,285,400 บาท

**ศูนย์อุทกวิทยาสืบเสาะหาสาเหตุพื้นที่ลุ่มน้ำ**

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาสืบเสาะหาสาเหตุพื้นที่ลุ่มน้ำ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 2868 ] วงเงิน 2,354,400 บาท

# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2565) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

## ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 65) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565

