



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ศสผด(ปก) ๐๔/๑๗๖/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เงินกู้ยืมปี ๒๕๖๔ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)


ปก.บอ.

- อ.ร.ว.

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

ผปบ.บอ.

# ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

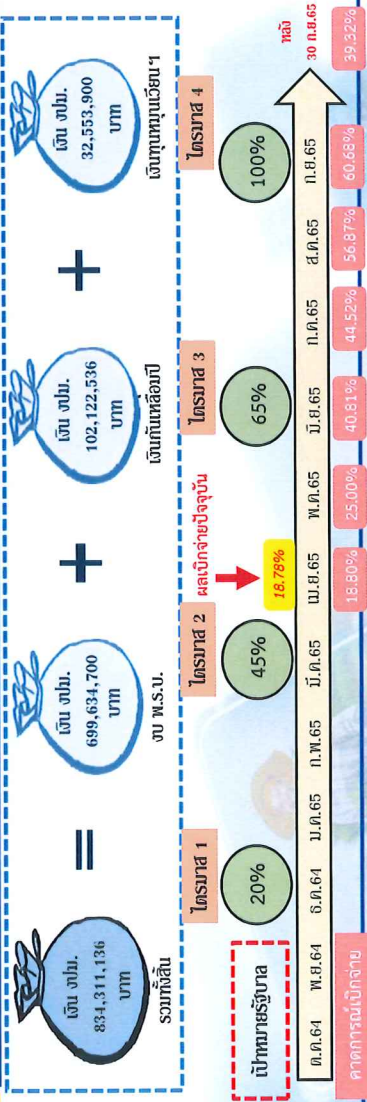

### งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (พ.ร.บ.)

**งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน**

- จำนวน 207 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 443,581,230 บาท (จำนวน 202 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 87,990,454 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 12.58
- เป้าหมายรัฐวิสาหกิจ 3 ร้อยละ: 65

**699,634,700 บาท**

### เงินหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ 2565 และ 2564

**งบประมาณ เงินหมุนเวียนฯ**

- จำนวน 67 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 32,553,900 บาท (จำนวน 67 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 799,976 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 2.54

**32,553,900 บาท**

### เงินกู้ยืม 2564

**งบประมาณ เงินกู้ยืม**

- จำนวน 33 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 67,921,111 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 16.51
- ค่าความเปลี่ยนแปลง ภาครัฐไตรมาส 2 จำนวน 30 รายการ
- ค่าความเปลี่ยนแปลง ภาครัฐไตรมาส 3 จำนวน 3 รายการ

**102,122,536 บาท**

### รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2565

**จำนวน 208 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 699,829,700 บาท**

**แบ่งเป็น**

1. งบลงทุน จำนวน 207 รายการ (699,634,700 บาท)
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดหนี้)

### ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบประมาณ พ.ร.บ. 2565 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	อยู่ระหว่าง อนุมัติแผน งบประมาณ	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	อนุมัติ เป็นของ รัฐบาล (สัญญา)	ทำอยู่ขั้น รัฐบาล (สัญญา)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	207	0	2	0	2
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	0	0	0	0
ส่วนอุทกวิทยา	24	0	0	0	0
ส่วนปรับปรุงรังสิต	5	0	0	0	0
ส่วนความปลอดภัย	8	0	0	0	0
ส่วนการที่น้ำประปา	41	0	0	0	0
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	40	0	2	0	2
หอภาคกลาง	13	0	0	0	0
หอภาคตะวันตก	10	0	0	0	0
หอภาคตะวันออก	7	0	0	0	0
หอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6	0	0	0	0
ตอนบน	13	0	0	0	0
หอภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	0	0	0	0
หอภาคใต้	12	0	0	0	0
หอภาคเหนือตอนบน	8	0	0	0	0
หอภาคเหนือตอนล่าง	8	0	0	0	0

**หมายเหตุ :** 1. ดูประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ งบปี 1 รายการ  
2. หอภาคเหนือตอนบน งบปี 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 20 เมษายน 2565  
 รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 307 รายการ		ได้รับงบอุดหนุน (บาท)			งบอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	ทำเอง	จ้างเหมา	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	67	32,553,900	32,308,976	0	32,308,976	0	0	0	799,976	0	799,976	2.46
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	7,811,400	7,811,400	249,000	7,562,400	0	0	0	3,700,688	249,000	3,451,688	47.38
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	52	452,007,670	205,648,283	143,579,576	62,068,707	8	241,521,300	241,521,300	47,187,789	39,370,885	7,816,904	10.44
ส่วนอุทกวิทยา	39	69,981,000	70,306,950	10,174,600	60,132,350	0	0	0	3,408,498	160,000	3,248,498	4.87
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	9,200,000	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	3,468,054	0	3,468,054	37.70
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	11	129,509,606	122,469,924	116,524,924	5,945,000	0	0	0	29,137,258	27,002,966	2,134,291	22.50
ส่วนการใช้หลักประกัน	42	15,716,660	15,284,160	567,860	14,716,300	2	432,500	432,500	9,240,900	467,622	8,773,278	58.80
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	9,893,442	0	9,893,442	55.97
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	8,811,076	0	8,811,076	59.59
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	14,610,700	14,610,700	1,123,500	13,487,200	0	0	0	7,092,327	1,123,500	5,968,827	48.54
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	16,763,600	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	7,713,203	0	7,713,203	46.01
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคกลาง	13	13,787,900	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	8,160,067	0	8,160,067	59.18
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออก	7	11,360,400	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	5,941,154	0	5,941,154	52.30
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันตก	10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	4,184,489	0	4,184,489	41.98
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคใต้	9	17,576,600	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	7,549,910	0	7,549,910	42.95
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	422,712	0	422,712	42.27
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>307</b>	<b>834,311,136</b>	<b>578,012,742</b>	<b>274,206,009</b>	<b>303,806,733</b>	<b>10</b>	<b>241,953,800</b>	<b>241,953,800</b>	<b>156,711,541</b>	<b>68,373,973</b>	<b>88,337,568</b>	<b>18.78</b>

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565
  - เงินกู้ที่เหลือปี 2564
  - เงินหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ 2565
  - เงินหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ 2564
  - เบิกจ่ายร้อยละ เป็นไปเรียบร้อยและ เบื้องต้นเชื่อมโยงกับจำนวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ส่วนความปลอดหนี้เงิน  
 (19) ค่าศึกษา สัรรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 2055 ] วงเงิน 12,447,400 บาท  
 อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สทป.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท
- งบช่วยเหลือประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565  
 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  
 - ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2894 ] วงเงิน 1,285,400 บาท  
 - (54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8494 ] วงเงิน 160,193,000 บาท  
 อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 119,061,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สทป.9 (โครงการลุ่มน้ำและบำรุงรักษาประแสร์) วงเงิน 41,132,000 บาท
- ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนบน  
 - ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็กลำ 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 2868 ] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2565

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2565		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	รวมทั้งสิ้น 207 รายการ	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา		ทำเอง
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1	422,712	0	422,712	42.27
สำนักบริหารจัดการน้ำ	10	7,562,400	10	7,562,400	0	7,562,400	0	0	0	0	10	3,451,688	0	3,451,688	45.64
ศูนย์ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	40	406,161,700	36	159,802,313	97,733,606	62,068,707	8	241,521,300	241,521,300	0	20	8,014,004	197,100	7,816,904	1.97
ส่วนอุทกวิทยา	24	66,951,000	24	67,216,950	7,144,600	60,132,350	0	0	0	0	9	3,248,498	0	3,248,498	4.85
ส่วนปฏิบัติการบำรุงรักษา	5	9,200,000	5	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	0	4	3,468,054	0	3,468,054	37.70
ส่วนความปลอดภัยกั้นเขื่อน	8	77,847,400	8	70,807,717	64,862,717	5,945,000	0	0	0	0	5	2,134,291	0	2,134,291	2.74
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	41	15,504,800	41	15,072,300	356,000	14,716,300	2	432,500	432,500	0	40	9,029,040	255,762	8,773,278	58.23
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	11	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	0	11	9,893,442	0	9,893,442	55.97
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	8	8,811,076	0	8,811,076	59.59
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	6	13,487,200	6	13,487,200	0	13,487,200	0	0	0	0	6	5,968,827	0	5,968,827	44.26
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	16,763,600	13	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	0	13	7,713,203	0	7,713,203	46.01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	13	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	13	8,160,067	0	8,160,067	59.18
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	7	11,360,400	7	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	7	5,941,154	0	5,941,154	52.30
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	9	4,184,489	0	4,184,489	41.98
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	9	17,576,600	9	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	0	9	7,549,910	0	7,549,910	42.95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>207</b>	<b>699,634,700</b>	<b>202</b>	<b>443,581,230</b>	<b>172,083,473</b>	<b>271,497,757</b>	<b>10</b>	<b>241,953,800</b>	<b>241,953,800</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>87,990,454</b>	<b>452,862</b>	<b>87,537,592</b>	<b>12.58</b>

หมายเหตุ: เบิกจ่ายร้อยละเปรียบเทียบกับประมาณการ พ.ร.บ. 65

ส่วนความเปลี่ยนแปลงอื่น

(19) ค่าศึกษา สักรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 2055 ] วงเงิน 12,447,400 บาท

อยู่ในความรับผิดชอบของ สช. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สปบ.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บัณฑิตตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2894 ] วงเงิน 1,285,400 บาท

- (54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8494 ] วงเงิน 160,193,000

อยู่ในความรับผิดชอบของ สช. วงเงิน 119,061,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สปบ.9 (โครงการร่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์) วงเงิน 41,132,000 บาท

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 2668 ] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 20 เมษายน 2565  
 รายการงบประมาณ : เงินก้อนที่ลือมีปี 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 33 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	12	45,845,970	45,845,970	45,845,970	0	0	0	0	39,173,785	39,173,785	0	85.45
ศูนย์อุทกวิทยาสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน	1	1,123,500	1,123,500	1,123,500	0	0	0	0	1,123,500	1,123,500	0	100.00
ส่วนควบคุมและกักเก็บน้ำ	3	51,662,207	51,662,207	51,662,207	0	0	0	0	27,002,966	27,002,966	0	52.27
ส่วนอุทกวิทยา	15	3,030,000	3,030,000	3,030,000	0	0	0	0	160,000	160,000	0	5.28
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	211,860	211,860	211,860	0	0	0	0	211,860	211,860	0	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	249,000	249,000	249,000	0	0	0	0	249,000	249,000	0	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33</b>	<b>102,122,536</b>	<b>102,122,536</b>	<b>102,122,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,921,111</b>	<b>67,921,111</b>	<b>0</b>	<b>66.51</b>

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 20 เมษายน 2565  
 รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 65 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	ค้างหนา	จำนวน	รวม	ค้างหนา	จำนวน	รวม	ค้างหนา		
ค่าบริหารทั่วไป	65	31,473,900	65	31,228,976	0	0	31,228,976	0	8	799,976	0	799,976	2.54
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65</b>	<b>31,473,900</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,228,976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>799,976</b>	<b>0</b>	<b>799,976</b>	<b>2.54</b>

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	ค้างหนา	จำนวน	รวม	ค้างหนา	จำนวน	รวม	ค้างหนา		
ค่าบริหารทั่วไป	2	1,080,000	2	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2</b>	<b>1,080,000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

รายการที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 3 รายการ	26,136,300	26,136,300	0
	<b>ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ</b>	26,136,300	26,136,300	0
1	(52) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร - [ 8492 ]	16,585,300	16,585,300	0
2	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8250 ]	3,000,000	3,000,000	0
3	(1.146) ปรับปรุงสถานีโทรมาตร ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร - [ 714 ]	6,551,000	6,551,000	0

รายการที่อยู่ในขั้นตอนอนุมัติแผน

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ	
		รวม	จำเป็นการเอง
	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ	163,193,000	2,710,000
	<b>ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ</b>	<b>163,193,000</b>	<b>2,710,000</b>
1	(54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8494 ]	160,193,000	150,483,000
2	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8250 ]	3,000,000	3,000,000

**หมายเหตุ**

**ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ**

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2894 ] วงเงิน 1,285,400 บาท

**ศูนย์อุทกวิทยายศาสตร์พัฒนาภาคเหนือตอนบน**

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยายศาสตร์พัฒนาภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 2868 ] วงเงิน 2,354,400 บาท



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 2565) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

