



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๓๑๙/๒๕๖๗

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๕๒๐ ๕๒๓/๑๑๒ ๖๘

เรื่อง สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี

งย ๕๑๕

(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗)

พ.ร.๖๖. 4830

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยกรมชลประทานได้กั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗๔๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๕๗ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๔๘ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปีทั้งสิ้น จำนวน ๗,๔๗๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๙๘๓.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙๙ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน ๑,๔๙๖.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลลิตทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผวง.ผง.

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

-ทราบ

โดย ผอ.สวท., ผอ.ส.ทค., ทน.๑-๓ ผอ.

เพื่อโปรดทราบ/แจ้งผู้อำนวยการ

(นายชนสรรค์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567

กรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือปี
จำนวน 745 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 597 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
148 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 7,479.60 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 5,983.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.99 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,496.40
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.01

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2566 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 597 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 4,256.65
ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,340.42 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,189.73 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 96.53 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 150.69 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 148 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี
3,222.95 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 3,139.18 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,793.47 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 57.13 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
1,345.71 ล้านบาท

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)				
		งบประมาณเงิน กันไว้เบิกเหลือ ปี 2566	งบประมาณ เงินกันหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	745	7,479.60	7,479.60	5,983.20	79.99	1,496.40
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	597	4,256.65	4,340.42	4,189.73	96.53	150.69
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	148	3,222.95	3,139.18	1,793.47	57.13	1,345.71

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 34 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
ไว้เบิกเหลือปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 95 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 75 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 1,518.62 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,514.26 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 1,071.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.78 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณ
ที่ต้องดำเนินการต่อ 442.54 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 82 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 66 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 1,200.12 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,176.54 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 932.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.26 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณ
ที่ต้องดำเนินการต่อ 243.98 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 14 จำนวน 50 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 33 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 337.26 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 333.29 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 177.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.19 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 156.00 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินการ		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)				
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2566	งบประมาณเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	745	597	148	7,479.60	7,479.60	5,983.20	79.99	1,496.40
สขป. 1	29	23	6	77.41	76.76	66.43	86.54	10.33
สขป. 2	18	18		35.90	35.83	34.95	97.54	0.88
สขป. 3	22	19	3	127.16	122.78	118.02	96.12	4.76
สขป. 4	10	6	4	168.04	167.43	74.10	44.26	93.33
สขป. 5	22	18	4	100.00	99.00	89.97	90.88	9.03
สขป. 6	19	14	5	176.54	170.58	146.15	85.68	24.43
สขป. 7	31	31		407.57	403.61	399.37	98.95	4.24
สขป. 8	72	58	14	520.80	518.48	436.73	84.23	81.75
สขป. 9	35	30	5	394.12	384.22	343.26	89.34	40.96
สขป. 10	11	5	6	100.63	99.37	83.52	84.05	15.85
สขป. 11	15	13	2	253.77	250.09	223.88	89.52	26.21
สขป. 12	9	9		111.98	111.98	111.98	100.00	
สขป. 13	19	13	6	340.89	340.88	251.09	73.66	89.79
3 สขป. 14	50	33	17	337.26	333.29	177.29	53.19	156.00
สขป. 15	27	26	1	110.87	110.18	103.97	94.36	6.21
สขป. 16	40	32	8	563.85	563.75	496.94	88.15	66.81
สขป. 17	24	21	3	233.12	233.06	194.31	83.37	38.75
สบอ.	42	42		115.39	115.28	115.28	100.00	
2 กพก.	82	66	16	1,200.12	1,176.54	932.56	79.26	243.98
กพด.	1		1	3.97	3.97	2.98	75.06	0.99
กสช.	1	1		0.15	0.15	0.15	100.00	
สพช.	2		2	3.61	3.61	3.07	85.03	0.54
สมด.	10	6	4	147.34	147.34	138.43	93.95	8.91
สคก.	10	10		15.61	15.58	15.50	99.50	0.08
สจด.	8	5	3	31.60	31.60	30.19	95.55	1.41
สลก.	3	2	1	54.82	54.68	53.36	97.58	1.32
สบก.	21	10	11	162.71	162.71	62.35	38.32	100.36
1 สพญ.	95	75	20	1,518.62	1,514.26	1,071.72	70.78	442.54
สวพ.	1	1		0.19	0.19	0.19	100.00	
สสธ.	2	2		0.03				
สอส.	4	3	1	56.69	56.69	37.78	66.65	18.91
กพร.	1	1		2.15	2.15	2.15	100.00	
กผง.	1		1	3.96	3.96	2.97	75.00	0.99
Lump Sum	8	4	4	102.73	169.60	162.56	95.85	7.04

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข


1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
4. เร่งรัดดำเนินงานหลังจากเกษตรกรเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทัศนวิสัยเบิกเหลื่อมปี

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567



ภาพรวม งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทัศนวิสัยเบิกเหลื่อมปี

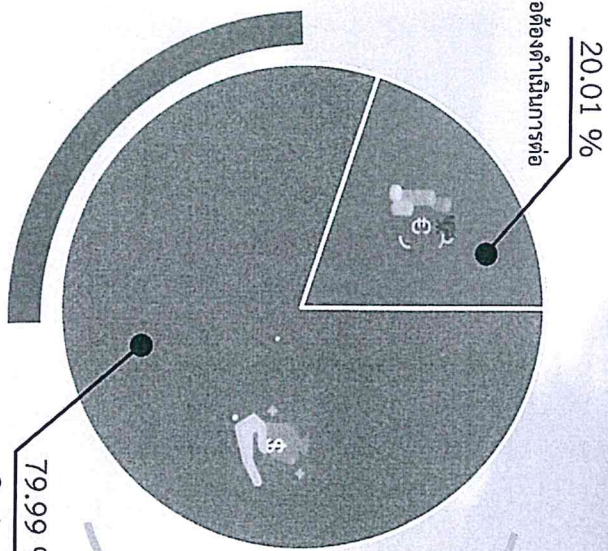


79.99 %
เบิกจ่าย

แผน/ผลกาสรเบิกจ่าย (รายเดือน)

แผน	รวม	ค.ก. 66 - ม.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
รวม	7,479.60	5,332.25	584.47	480.70	479.45	215.22	139.30	248.21
ผล	5,983.20	5,332.25	341.88	309.07				
ผลต่าง	-1,496.40	-	-242.59	-171.63				

สถานะการดำเนินงาน 745 รายการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ 597 รายการ



อยู่ระหว่างก่อสร้าง 148 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

- 1** แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
- 2** ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 3** เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- 4** เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเกี่ยวเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

หน่วย : ล้านบาท
