



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ **ศษนอ.ปค. ๐๔/๒๘๓/๒๕๖๖** วันที่ **๙** สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๖ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๖ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับทุกแหล่งงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐,๘๗๑,๓๓๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๒๗,๕๗๐,๓๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๒ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ๖๙๕,๐๖๓,๐๒๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๙๖,๖๕๘,๖๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๗ (เบิกจ่ายหน่วยรับงบประมาณ สบอ.ยอดจัดสรร ๔๕๑,๗๖๘,๕๐๒ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๗๘,๙๓๖,๖๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๔) เงินกันเหลือปี ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๓๑๑,๗๓๖,๔๐๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๙,๑๒๖,๕๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๘ และ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๔๔,๐๗๑,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑,๗๘๕,๑๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๓ รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชวลิต ฉลอม)

ผปบ.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการถนนและอุทกวิทยา

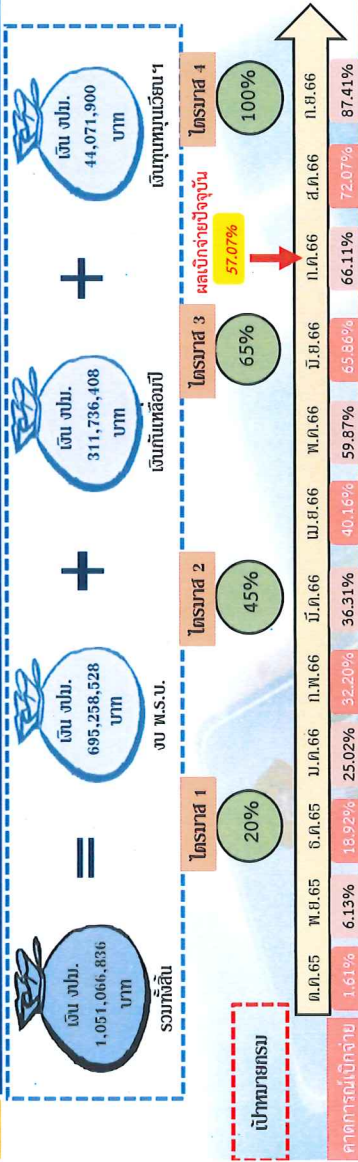

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (พ.ร.บ.)

695,063,028 บาท

- จำนวน 234 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 597,408,496 บาท (จำนวน 228 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 396,658,623 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.07
- เป้าหมายรวม ไตรมาส 4 ร้อยละ 100

เงินกู้หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2566

44,071,900 บาท

- จำนวน 60 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 43,474,766 บาท (จำนวน 60 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 21,785,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.43

งบประมาณ เงินกู้เอกชน

311,736,409 บาท

- จำนวน 17 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 209,126,587 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.08

งบประมาณ เงินกู้หมุนเวียน

44,071,900 บาท

- จำนวน 235 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 695,258,528 บาท แบ่งเป็น
- งบลงทุน จำนวน 234 รายการ (695,063,028 บาท)
- งบดำเนินงาน (ส่วนควบปลอดภาษีเงินได้)

หมายเหตุ : โอนจัดสรรจากหน่วยงานอื่นงบประมาณ 597,408,496 บาท
โอนมาช่วยงบประมาณ สอ. วงเงิน 451,768,502 บาท
ผลเบิกจ่ายจำนวน 278,936,623 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.74
โอนมาช่วยงบประมาณ สป.1-17 วงเงิน 145,689,995 บาท
ผลเบิกจ่ายจำนวน 117,722,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.83

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	อนุมัติ แผน	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)		อนุมัติ งบอุดหนุน (รายการ)	ทำสัญญาทำ งบอุดหนุน (สัญญา)
			ประเภท TOR	เปิดของ งบอุดหนุน		
สำนักบริหารการเจ้าหน้าที่และอุทกวิทยา	234	0	0	0	0	228
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	1
ส่วนบริหารการเจ้าหน้าที่	11	0	0	0	0	11
ส่วนอุทกวิทยา	28	0	0	0	0	28
ส่วนโรงประปาทุ่งรังสิต	5	0	0	0	0	5
ส่วนควบคุมและอำนวยการ	7	0	0	0	0	7
ส่วนการเจ้าหน้าที่และประมง	63	0	0	0	0	63
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	39	0	0	0	0	35
หอมาตรหลวง	13	0	0	0	0	11
หอมาตรวัดน้ำตก	10	0	0	0	0	10
หอมาตรวัดน้ำออก	10	0	0	0	0	10
หอมาตรวัดน้ำออกเขื่อนศรีนครินทร์	4	0	0	0	0	4
หอมาตรวัดน้ำออกเขื่อนศรีนครินทร์	13	0	0	0	0	13
หอมาตรวัด	8	0	0	0	0	8
หอมาตรวัดหนองบอน	14	0	0	0	0	14
หอมาตรวัดหนองบัว	8	0	0	0	0	8

หมายเหตุ : 1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยกเลิก 4 รายการ
2. หอมาตรหลวง ยกเลิก 2 รายการ

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบ พ.ร.บ.66)

รายการ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		เงินเหลือจ่ายโอนกลับ ส่วนกลางแล้ว	หมายเหตุ
	ต.ค.65	พ.ย.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	ส.ค.66		
คาดการณ์การเบิกจ่าย สบอ. (695.06 ล้านบาท) งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	133.99 ล้านบาท 19.27 %		256.9 ล้านบาท 36.96 %		466.24 ล้านบาท 67.08 %		607.55 ล้านบาท 87.41 %		87.51 ล้านบาท 12.59 %	
ผลการเบิกจ่าย งบ พ.ร.บ.66	32.14 ล้านบาท 4.54%		201.58 ล้านบาท 28.48%		354.66 ล้านบาท 50.1%		396.66 ล้านบาท 57.07%			
- จ้างเหมาทั้งโครงการ (15 รายการ วงเงิน 199.59 ล้านบาท)			20.47 ล้านบาท 2.89 %		52.92 ล้านบาท 7.48 %		67.53 ล้านบาท 9.72 %			
- จ้างเหมาดำเนินการเอง (32 รายการ วงเงิน 191.01 ล้านบาท)	1.74 ล้านบาท 0.25%		8 ล้านบาท 1.13%		46.49 ล้านบาท 6.57%		60.88 ล้านบาท 8.76%		86.56 ล้านบาท 12.45%	- งานจ้างเหมา เบิกจ่ายแล้ว 50.91 ล้านบาท คงเหลือ 37.55 ล้านบาท - งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว 9.97 ล้านบาท คงเหลือ 6.01 ล้านบาท
- ดำเนินการเอง (187 รายการ วงเงิน 304.46 ล้านบาท)	30.4 ล้านบาท 4.29%		173.1 ล้านบาท 24.45%		255.25 ล้านบาท 36.05%		268.25 ล้านบาท 38.59%		0.95 ล้านบาท 0.14%	

หมายเหตุ : ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบติดตาม CEN-project ณ วันที่ 9 ส.ค. 2566

- โอนจัดสรรทุกทงทหน่วยรับงบประมาณ 597,408,496 บาท
โอนหน่วยรับงบประมาณ สบอ. วงเงิน 451,768,502 บาท ผลเบิกจ่ายจำนวน 278,936,623 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.74
โอนหน่วยรับงบประมาณ สขป.1-17 วงเงิน 145,639,995 บาท ผลเบิกจ่ายจำนวน 117,722,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.83
- งานจ้างเหมาบางส่วน ยกเลิก 4 รายการ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
- บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท
- บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท
- บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท
- บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท
- งานดำเนินการเอง ยกเลิก 2 รายการ คือช.ภาคกลาง
- ค่าก่อสร้างสถานีวัดน้ำแบบอัตโนมัติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางพลอง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท
- ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางพลอง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบเงินกันเหลือปี 65)

เงินกันเหลือปี 65 (จำนวนรายการ วงเงิน 311.74 ล้านบาท)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบหมดความจำเป็นโอนกลับส่วนกลางแล้ว
	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	
คาดการณ์เบิกจ่าย	38.57 ล้านบาท			158.04 ล้านบาท			217.1 ล้านบาท			310.86 ล้านบาท			0.88 ล้านบาท
	12.37 %			50.7 %			69.64 %			99.72 %			0.28 %
ผลเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี 65	23.43 ล้านบาท			121.13 ล้านบาท			208.17 ล้านบาท			209.13 ล้านบาท			67.08%
	7.51 %			38.86 %			66.78 %			69.69 %			84.7 %
										217.26 ล้านบาท			310.86 ล้านบาท
										69.69 %			99.72 %

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

เงินลงทุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2566 (วงเงิน 44.07 ล้านบาท)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบหมดความจำเป็น/เหลือจ่าย
	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
คาดการณ์เบิกจ่าย	21.7 ล้านบาท			21.7 ล้านบาท			22.12 ล้านบาท			43.53 ล้านบาท			0.54 ล้านบาท
	49.25 %			49.25 %			50.2 %			98.77 %			1.23%
ผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2566	0.75 ล้านบาท			0.75 ล้านบาท			21.77 ล้านบาท			21.79 ล้านบาท 49.43%			
	1.71 %			1.71 %			49.39 %			33.04 ล้านบาท 74.97 %			
										40.96 ล้านบาท 92.94 %			45.53 ล้านบาท 98.77 %

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566
รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 309 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	59	22,224,900	21,627,766	0	21,627,766	0	0	0	21,627,766	0	21,627,766	97.31
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	27,461,360	27,293,008	19,699,770	7,593,238	0	0	0	21,869,259	15,759,816	6,109,443	79.64
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	72	597,549,730	502,621,299	392,831,063	109,790,236	1	10,143,900	0	270,268,794	187,369,609	82,899,185	45.23
ส่วนอุทกวิทยา	35	115,845,516	113,600,329	8,688,800	104,911,529	0	0	0	106,075,132	4,650,700	101,422,432	91.56
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	6	11,487,983	11,484,508	4,287,983	7,196,526	0	0	0	8,134,247	2,292,983	5,841,265	70.81
ส่วนความมั่นคงขั้นพื้นฐาน	9	136,402,264	136,393,247	124,402,263	11,990,984	0	0	0	86,776,834	78,413,407	8,363,427	63.62
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	50	26,228,792	26,170,457	1,090,690	25,079,767	0	0	0	21,089,280	619,840	20,469,440	80.41
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนบน	10	18,183,300	18,128,700	0	18,128,700	0	0	0	14,922,414	0	14,922,414	82.07
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนล่าง	8	14,650,612	14,650,582	0	14,650,582	0	0	0	12,862,166	0	12,862,166	87.79
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	12,249,200	12,183,920	0	12,183,920	0	0	0	9,502,405	0	9,502,405	77.58
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคกลาง	11	17,044,700	16,981,220	0	16,981,220	0	0	0	13,671,906	0	13,671,906	80.21
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออก	10	12,753,560	12,753,560	0	12,753,560	0	0	0	10,698,135	0	10,698,135	83.88
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันตก	8	12,231,100	12,177,093	0	12,177,093	0	0	0	9,602,896	0	9,602,896	78.51
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคใต้	8	9,951,120	9,951,120	0	9,951,120	0	0	0	6,941,112	0	6,941,112	69.75
ส่วนยุทธศาสตร์	7	15,672,600	15,668,262	0	15,668,262	0	0	0	12,780,652	0	12,780,652	81.55
	1	934,600	934,600	0	934,600	0	0	0	749,332	0	749,332	80.18
รวมทั้งสิ้น	309	1,050,871,336	952,619,671	551,000,568	401,619,103	1	10,143,900	0	627,570,330	289,106,354	338,463,975	59.72

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2566
- เงินกู้ยืมเพื่อปี 2565
- เงินสนับสนุนเงินเพื่อการชลประทาน 2566
- เบิกจ่ายร้อยละ 81.55 เนื่องจากจำนวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ไม่รวมวงเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ วงเงิน 195,500 บาท**
 - งานดำเนินการเอง ยกลูก 2 รายการ คือขุดลอก
 - ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำผันน้ำแบบอัตโนมัติ ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางขวาง อำเภอสรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท
 - ค่าจัดทำบัญชีข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางขวาง อำเภอสรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการหนี้และจุฬารักษายา โครงการพัฒนา BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566
รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2566

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2566		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (บาท)			ค่างวดจ่าย (ร้อยละ) ภายในวันที่ 31 ก.ค.66	ผลต่าง				
	รวมทั้งสิ้น 234 รายการ	งบประมาณ	งบประมาศคงเหลือโอนไปก่อนเปิด	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	รวม	จ้างเหมา	จ้างเหมา	รวม	จ้างเหมา	จ้างเหมา	รวม	จ้างเหมา	จ้างเหมา			รวม			
																					จำนวน	จ้างเหมา	จ้างเหมา
ศูนย์ศุลกากร	1	934,600	934,600	1	934,600	0	934,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,268	85.03	80.18	-4.85	
สำนักบริหารจัดการหนี้	11	27,761,600	27,461,360	11	27,293,008	19,699,770	7,593,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,795	74.89	79.64	-4.75	
ศูนย์ประมวลผลและคัดแยกข้อมูล	39	318,191,940	308,075,260	35	213,146,828	163,838,140	49,308,688	1	10,143,900	10,143,900	0	0	0	0	0	0	0	0	44,297,544	108,053,036	43.20	34.11	-9.09
ศูนย์ศุลกากร	28	115,197,000	115,005,516	28	112,760,229	7,888,800	104,911,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,810,700	7,527,197	94.79	91.50	-3.29
สำนักบริหารการคลัง	5	11,200,000	11,190,000	5	11,186,626	3,990,000	7,196,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,941,265	1,995,000	81.47	70.03	-11.44
ส่วนงานคอมพิวเตอร์	7	94,000,000	93,551,148	7	93,542,131	81,551,147	11,990,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,363,427	3,350,261	68.52	46.95	-21.56
สำนักบริหารการคลัง	63	26,274,500	26,108,952	63	26,050,617	970,850	25,079,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,999,440	5,081,176	90.99	80.32	-10.68
ศูนย์ศุลกากร	14	18,183,300	18,183,300	14	18,128,700	0	18,128,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,922,414	3,206,286	88.32	82.07	-6.25
ศูนย์ศุลกากร	8	14,787,000	14,650,612	8	14,650,582	0	14,650,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,862,166	1,788,416	88.47	87.79	-0.67
ศูนย์ศุลกากร	4	12,249,200	12,249,200	4	12,183,920	0	12,183,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,502,405	2,681,515	86.65	77.58	-9.07
ศูนย์ศุลกากร	13	17,444,700	17,044,700	13	16,981,220	0	16,981,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,671,906	3,309,314	87.84	80.21	-7.63
ศูนย์ศุลกากร	13	13,787,900	12,753,560	11	12,753,560	0	12,753,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,698,135	2,055,425	89.68	83.88	-5.79
ศูนย์ศุลกากร	10	12,231,100	12,231,100	10	12,177,093	0	12,177,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,602,896	2,574,198	87.09	78.51	-8.58
ศูนย์ศุลกากร	10	9,967,700	9,951,120	10	9,951,120	0	9,951,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,941,112	3,010,008	88.67	69.75	-18.92
ศูนย์ศุลกากร	8	15,672,600	15,672,600	8	15,668,262	0	15,668,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,780,652	2,887,610	86.26	81.55	-4.72
รวมทั้งสิ้น	234	707,883,140	695,063,028	228	597,408,496	277,898,707	319,509,789	1	10,143,900	10,143,900	0	0	0	0	0	0	0	0	200,749,873	159,474,652	66.11	57.07	-9.04

หมายเหตุ : เบิกจ่ายร้อยละเบ็ดเสร็จถึงงบประมาณตาม พ.ร.บ. 66

รายการประเมินผล

- งานจ้างแรงงาน ยกได้ 4 รายการ ฝ่าฝืนตามและรายการดำเนินการดังนี้
 - บัญชีรายจ่ายที่มีรายการรวมกลุ่มเข้าบัญชีและโอนออก พ.ศ.2566 ฝ่าฝืนตามและรายการดำเนินการดังนี้ แยกงานคนไข้หอผู้ป่วย 2 ชุดคิด งบประมาณ 1,258,800 บาท
 - บัญชีรายจ่ายที่มีรายการรวมกลุ่มเข้าบัญชี พ.ศ.2566 ฝ่าฝืนตามและรายการดำเนินการดังนี้ แยกงานคนไข้หอผู้ป่วย 2 ชุดคิด งบประมาณ 1,308,400 บาท
 - บัญชีรายจ่ายที่มีรายการรวมกลุ่มเข้าบัญชี พ.ศ.2566 ฝ่าฝืนตามและรายการดำเนินการดังนี้ แยกงานคนไข้หอผู้ป่วย 2 ชุดคิด งบประมาณ 1,082,200 บาท
 - บัญชีรายจ่ายที่มีรายการรวมกลุ่มเข้าบัญชี พ.ศ.2566 ฝ่าฝืนตามและรายการดำเนินการดังนี้ แยกงานคนไข้หอผู้ป่วย 2 ชุดคิด งบประมาณ 1,078,900 บาท
- งานคำนวณภาษี ยกได้ 2 รายการ ผิด พ.ศ.2566
 - ค่าก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ งบลงทุนในหนี้ ศูนย์ศุลกากรขยายงบประมาณกลาง พ.ศ.2566 ด้านงบลงทุน อื่นต่อรายการ จ้างที่ปรึกษา วงเงิน 436,000 บาท
 - ค่าจ้างทำบัญชีงบการเงิน งบลงทุนในหนี้ ศูนย์ศุลกากรขยายงบประมาณกลาง พ.ศ.2566 ด้านงบลงทุน อื่นต่อรายการ จ้างที่ปรึกษา วงเงิน 117,000 บาท

ความแตกต่างและวิธีแก้ไขในคอลัมน์ "เบิกจ่าย (ร้อยละ)"

- สีเขียว หมายถึง เบิกจ่ายเกินตามรายการ
- สีเหลือง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนทางการดำเนินงาน ร้อยละ 10
- สีแดง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนทางการดำเนินงาน ร้อยละ 10

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชื่อยุทธศาสตร์ตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566
 รายการงบประมาณ : เงินก้อนที่ 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 47 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผลต่าง	
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง			รวม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	267,627,471	267,627,471	228,992,923	38,634,548	165,017,649	126,573,361	38,444,287	0	102,609,822	102,419,562	190,260	64,70	61.66	3.04
ส่วนควบคุมและก่อสร้าง	3	42,851,116	42,851,116	42,851,116	0	42,851,116	42,851,116	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0.00
ส่วนอุทกวิทยา	7	840,000	840,000	840,000	0	840,000	840,000	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	119,840	119,840	119,840	0	119,840	119,840	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0.00
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	1	297,983	297,983	297,983	0	297,983	297,983	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	47	311,736,408	311,736,409	273,101,861	38,634,548	209,126,587	170,682,299	38,444,287	0	102,609,822	102,419,562	190,260	69.69	67.08	-2.61

หมายเหตุ :

ความหมายของแต่ละสีที่ใส่ในคอลัมน์ "เบิกจ่าย (ร้อยละ)"

- สีเขียว หมายถึง เบิกจ่ายเกินแผนคาดการณ์
- สีเหลือง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์ไม่เกิน ร้อยละ 10
- สีแดง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์เกิน ร้อยละ 10

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566
 รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2566

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 60 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือซึ่งไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			คงเหลือซึ่งไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ) ภายใน วันที่ 31 ก.ค.66	เบิกจ่าย ร้อยละ	ผลต่าง		
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง					
ฝ่ายบริหารทั่วไป	59	22,224,900	21,627,766	0	21,627,766	0	0	0	0	0	0	0	0	59	21,627,766	0	21,627,766	0	0	0	97.31	0.00
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1	21,847,000	21,847,000	0	21,847,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	157,354	0	157,354	0	21,689,646	0	51.98	-51.26
รวมทั้งสิ้น	60	44,071,900	43,474,766	0	43,474,766	0	0	0	0	0	0	0	60	21,785,120	0	21,785,120	0	21,689,646	0	21,689,646	74.97	-25.54


หมายเหตุ :

ความหมายของแต่ละสีที่ไฮไลต์ในคอลัมน์ "เบิกจ่าย (ร้อยละ)"


- สีเขียว หมายถึง เบิกจ่ายเกินแผนคาดการณ์
- สีเหลือง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์ไม่เกิน ร้อยละ 10
- สีแดง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์เกิน ร้อยละ 10

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 2566) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566

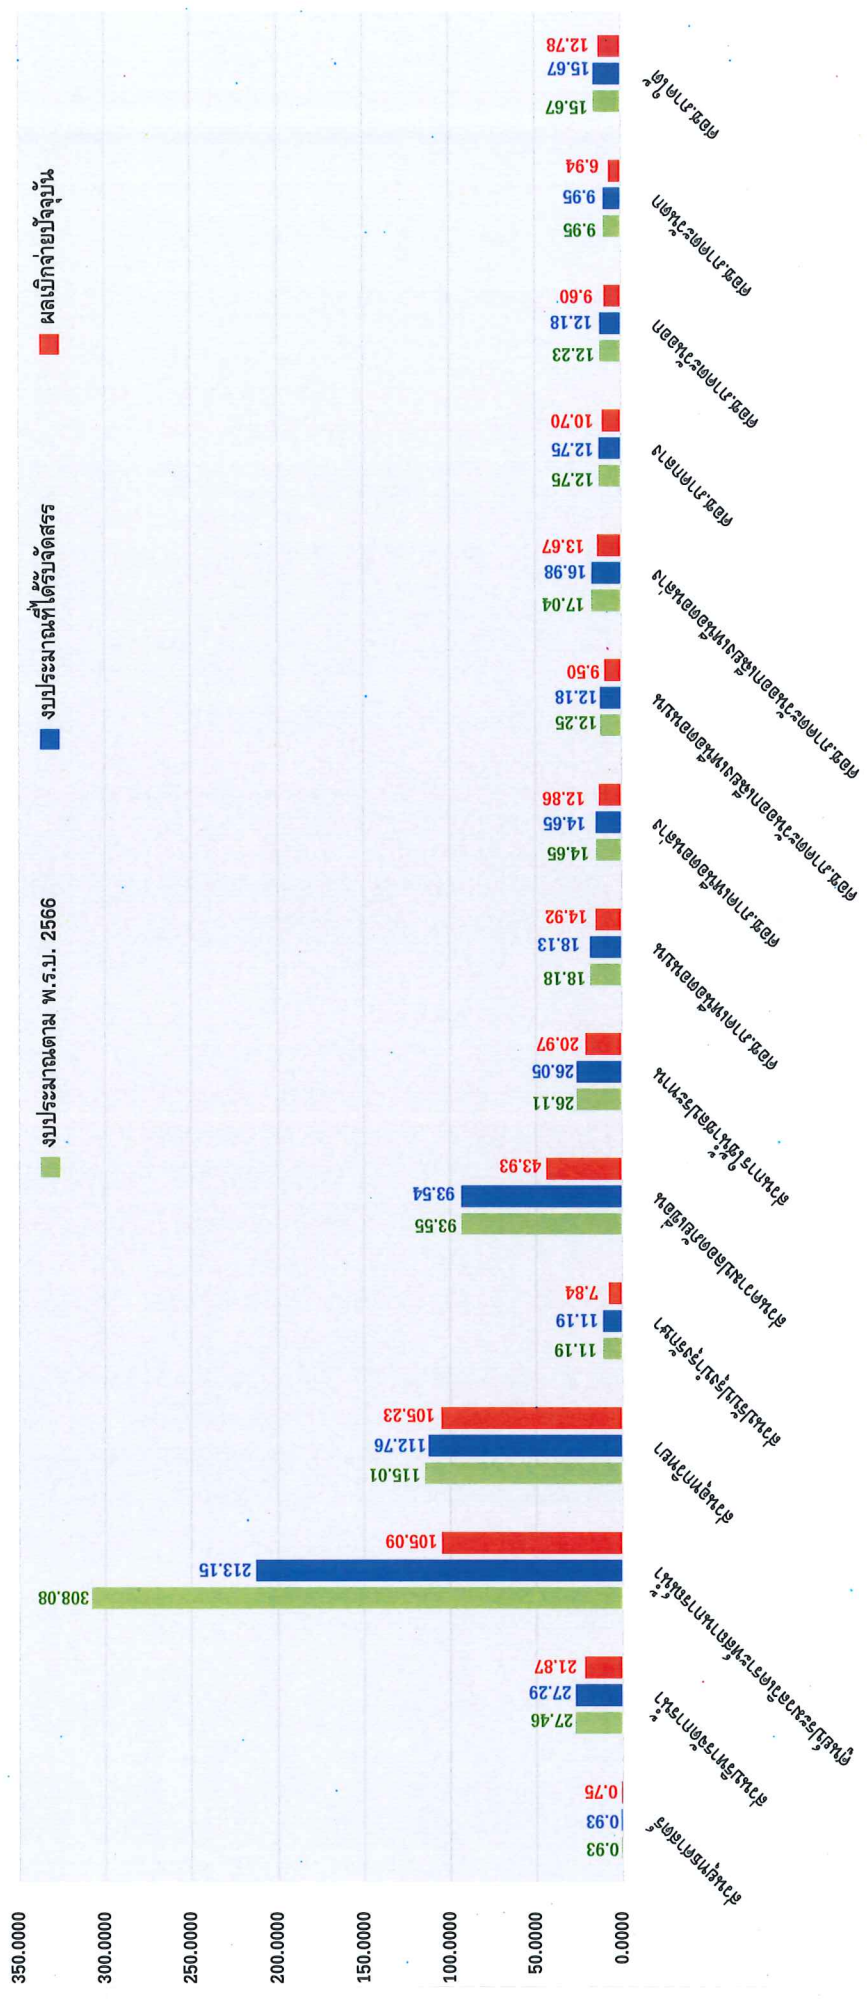

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 65) สำนักงานบริหารจัดการหน้าและออกอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566

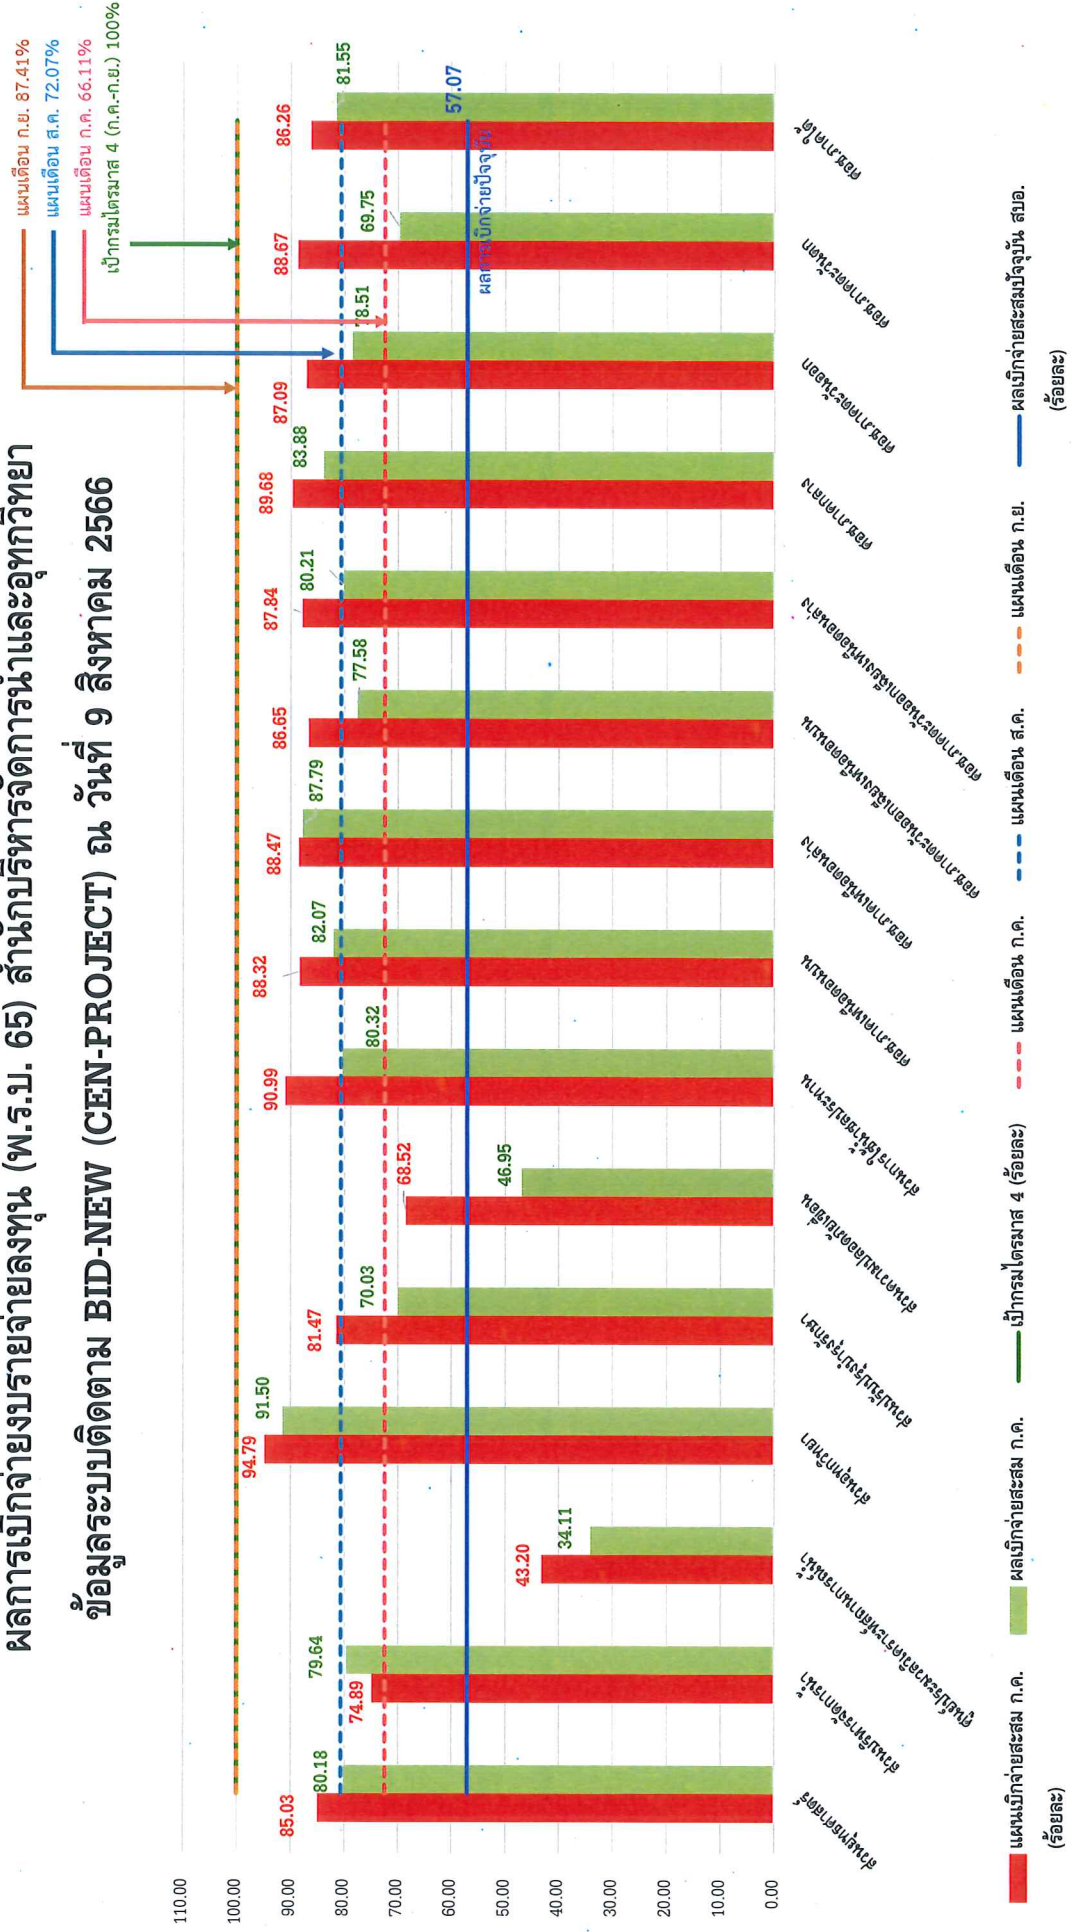

รายการที่ยังได้รับจัดสรรไม่ครบถ้วน ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค.66 (งบ พ.ร.บ.66)

หน่วยงาน	ชื่อรายการงานที่มีเลขออนไลน์	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)	วงเงินที่ได้รับจัดสรรแล้ว (บาท)	คงเหลือที่ยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)	ยืนยันสถานะการดำเนินงานปัจจุบัน	ปัญหาอุปสรรคที่ยังได้รับเงินจัดสรรไม่ครบถ้วน
	รวมทั้งสิ้น จำนวน 1 รายการ		16,585,300	6,441,400	10,143,900		
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ตน.บอ.)	งานไตรมาสเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	จ้างเหมาทั้งโครงการ	16,585,300	6,441,400	10,143,900	ยกเลิกจ้างประกวดราคาเดิมและประกาศสร้างใหม่ 10 ส.ค.66	ดำเนินงาน 2 สัญญา 1. ติดตั้งระบบไตรมาส โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 สำหรับงานไตรมาสเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงินตามสัญญา 6,441,400.00 บาท (อยู่ในขั้นตอนดำเนินงานตามสัญญา) 2. ติดตั้งระบบไตรมาสเพื่อการติดตามสถานการณ์น้ำของอาคารชลประทาน พ.ศ.2566 สำหรับงานไตรมาสเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงินงบประมาณ 10,085,300.00 บาท (การพิจารณาผลไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา จึงยกเลิกและจัดซื้อจัดจ้างใหม่) แผนการดำเนินงาน 80% ผลการดำเนินงาน 50%

รายการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่องาน / ประมาณการ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			การดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน	ปัญหา-อุปสรรค และเหตุผลที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
		รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
	จำนวน 2 รายการ	82,320,770	82,312,530	8,240	0	0	0		
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(7) งานโทรมาตรเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [9193]	6,441,400	6,441,400	0	0	0	0	กำลังดำเนินงาน	สัญญาเลขที่ จ.51/2566/สบอ. ลงวันที่ 21 มี.ค. 2566 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 22 มี.ค. 2566 ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 ส.ค. 2566 เบิกจ่าย 1 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและ กรรมการตรวจรับงานครบถ้วนแล้ว ครบกำหนดส่งมอบ 17 ส.ค. 2566
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.71) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2166]	9,730,000	9,730,000	0	0	0	0	ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 30 พ.ค.66 อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1	กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (ภายในวันที่ 29 ส.ค.66)

แผนและผลการเบิกเงินเหลือปี 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	หน่วยงาน	งบประมาณเงินกันไว้ เบิกเหลือ พ.ศ. 2565	แผนเดือน ก.ค.66		ผลเบิกจ่ายเดือน ก.ค.66		คงเหลือ		แผนเดือน ส.ค.66		แผนเดือน ก.ย.66		งบหมดความจำเป็น/เหลือจ่าย (งานแล้วเสร็จ/ยกเลิก)		ขั้นตอนการดำเนินงานปัจจุบัน	คาดการณ์ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	ชี้แจงเหตุผล ปัญหา/ อุปสรรค ในการ ดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน	หมายเหตุ
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ				
จำนวน 1 รายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำและ	155.3624	61.11	39.33	53.63	34.52	101.07	65.06	107.88	69.44	154.70	99.57	0.66	0.43				
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ (ตบ.บอ.)	155.3624	61.1067	39.33	53.6275	34.52	101.0739	65.06	107.8781	69.44	154.7014	99.57	0.6610	0.43	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินงาน สัญญาเลขที่ จ.9/2566(สพต.) ลงวันที่ 23 ธ.ค. 65 อายุสัญญา 300 วัน วันเริ่มอายุสัญญา 24 ธ.ค. 65 ครบกำหนดอายุสัญญา 19 ต.ค. 66 จำนวนงวดงานทั้งหมด 4 งวด เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด แผนการ ปฏิบัติงาน 95% ผลการปฏิบัติงาน 70%	30-ก.ย.-66		- เงินกันเหลือ สบอ. 117,061,000 บาท - เงินกันเหลือ สขป.9 38,301,400.52 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สบอ.

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	สบอ. วางบิลตั้งเบิก ไปที่กองการเงิน (บาท)	ผลเบิกจ่าย (ตัดยอดในระบบ GFMIS) (บาท)				งบประมาณคงเหลือ (บาท)			หมายเหตุ
				ครั้งที่ 1 12 เม.ย. 2566	ครั้งที่ 2 25 พ.ค. 2566	ครั้งที่ 3 13 มิ.ย. 2566	รวมทั้งสิ้น	หลังจากที่ตัดยอดในระบบ GFMIS	คงเหลือที่อยู่ระหว่างการตั้ง เบิก	งบประมาณโครงการคงเหลือ สุทธิ	
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัย สถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 070035300C0003220140	116,400,000.00	48,798,780.00	2,768,800.00	2,768,800.00	9,788,520.00	15,326,120.00	101,073,880.00	33,472,660.00	67,601,220.00	เงินวางบิลอีกจำนวน 33,472,660 บ. อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร และตั้งเบิกต่อไป
