



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ **สผบ.ปด.** ๐๔/๒๑๓/๒๕๖๕

วันที่ **๒๖** พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เงินกันเหลือในปี ๒๕๖๔ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับทุกแหล่งงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๘,๕๔๓,๓๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๔,๒๙๗,๓๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๗ เงินกันเหลือในปี ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๖๒,๔๗๐,๐๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๗ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๗๗๕,๙๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๔ รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ เนตรวงศา)

ผปบ.บอ.

# ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

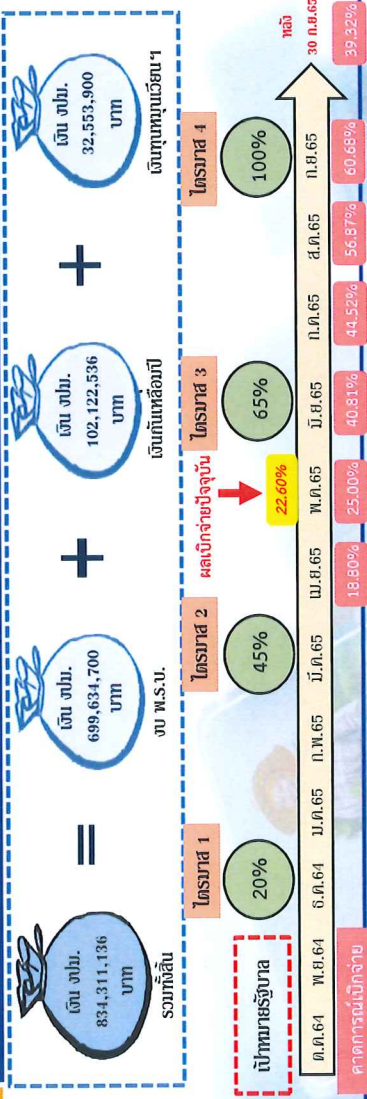

### งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (พ.ร.บ.)

**699,634,700 บาท**

- จำนวน 207 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 445,937,160 บาท (จำนวน 203 รายการ)
- งบเบิกจ่ายปัจจุบัน 124,297,387 บาท
- คิดเป็นร้อยละ: 17.77
- เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 3 ร้อยละ: 65

### เงินกู้ยืมปี 2564

**102,122,536 บาท**

- จำนวน 33 รายการ
- งบเบิกจ่ายปัจจุบัน 62,170,017 บาท
- คิดเป็นร้อยละ: 61.17
- คาดว่าจะเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2 จำนวน 30 รายการ
- คาดว่าจะเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 จำนวน 3 รายการ

### เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565 และ 2564

**32,553,900 บาท**

- จำนวน 67 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 32,553,900 บาท (จำนวน 67 รายการ)
- งบเบิกจ่ายปัจจุบัน 1,775,975 บาท
- คิดเป็นร้อยละ: 5.64

### รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2565

**จำนวน 208 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 699,829,700 บาท**

**แบ่งเป็น**

- งบลงทุน จำนวน 207 รายการ (699,634,700 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเชื้อ)

### ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	อยู่ระหว่าง อนุมัติ เสร็จสิ้น	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)		อนุมัติ งบผูกพัน งบผูกพัน (สัญญา)		
			เปิดของ จัดซื้อ-จัด จ้าง	ปิดของ งบผูกพัน งบผูกพัน (สัญญา)			
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	207	0	0	1	0	3	201
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	0	1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	0	0	0	0	0	10
ส่วนอุทกวิทยา	24	0	0	0	0	0	24
ส่วนปรับปรุงคูระบายน้ำ	5	0	0	0	0	0	5
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	8	0	0	0	0	0	8
ส่วนการเฝ้าระวังและรักษา	41	0	0	0	0	0	41
ส่วนประมงและประมงน้ำจืด	40	0	0	1	0	2	36
หอมาตรหลวง	13	0	0	0	0	0	13
หอมาตรระดับเขต	10	0	0	0	0	1	9
หอมาตรระดับออก	7	0	0	0	0	0	7
หอมาตรระดับออกเชิงเหนือ	6	0	0	0	0	0	6
ตอมบ	13	0	0	0	0	0	13
ตอมบระดับออกเชิงเหนือ	9	0	0	0	0	0	9
ตอมบระดับออกเชิงใต้	12	0	0	0	0	0	11
ตอมบระดับออก	8	0	0	0	0	0	8

**หมายเหตุ :** 1. ทุนประมงและประมงน้ำจืดตามกรมนี้ ยกเลิก 1 รายการ  
2. ตอมบระดับออกตอมบ ยกเลิก 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 307 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	ทำเอง	จ้างเหมา	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	67	32,555,900	32,308,976	0	32,308,976	0	0	0	1,775,975	0	1,775,975	5.46
สำนักบริหารจัดการน้ำ	11	7,811,400	7,811,400	249,000	7,562,400	0	0	0	3,715,069	249,000	3,466,069	47.56
ศูนย์ปฏิบัติการระดมทุนภาคการน้ำ	52	452,007,670	208,648,283	146,579,576	62,068,707	7	0	238,521,300	46,342,888	35,996,385	10,346,503	10.25
สำนักอุทกวิทยา	39	69,981,000	69,803,280	10,174,600	59,628,680	0	0	0	11,605,759	2,635,000	8,970,759	16.58
สำนักปรับปรุงบำรุงรักษา	5	9,200,000	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	4,103,891	0	4,103,891	44.61
ส่วนควบคุมและก่อสร้าง	11	129,509,806	122,329,524	116,524,924	5,804,600	0	0	0	40,521,045	37,594,580	2,926,465	31.29
ส่วนการก่อสร้างชลประทาน	42	15,716,660	15,284,160	567,860	14,716,300	2	432,500	432,500	10,612,983	467,622	10,145,362	67.53
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	10,666,361	0	10,666,361	60.34
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	10,257,974	0	10,257,974	69.37
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	14,610,700	14,610,700	1,123,500	13,487,200	0	0	0	8,259,156	1,123,500	7,135,656	56.53
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	16,763,600	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	8,782,233	0	8,782,233	52.39
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	13	13,787,900	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	9,525,372	0	9,525,372	69.09
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	7	11,360,400	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	6,737,470	0	6,737,470	59.31
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	5,046,712	0	5,046,712	50.63
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	9	17,576,600	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	10,067,420	0	10,067,420	57.28
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	523,072	0	523,072	52.31
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>307</b>	<b>834,311,136</b>	<b>580,368,672</b>	<b>277,206,009</b>	<b>303,162,663</b>	<b>9</b>	<b>238,953,800</b>	<b>238,953,800</b>	<b>188,543,379</b>	<b>78,066,086</b>	<b>110,477,292</b>	<b>22.60</b>

ส่วนควบคุมและก่อสร้าง

(19) ค่าศึกษา สักราง ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 2055 ] วงเงิน 12,447,400 บาท

อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สขป.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน.พ.ร.บ. 2565

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบ้านฝ้ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2894 ] วงเงิน 1,285,400 บาท

- (54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8494 ] วงเงิน 160,193,000

อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 119,061,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สขป.9 (โครงการสร้างและบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ) วงเงิน 41,132,000 บาท

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 2868 ] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  
 รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2565

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2565			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	รวมทั้งสิ้น	รายการ	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน		รวม
	207	รายการ	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน		รวม
ส่วนยุทธศาสตร์	1		1,000,000	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1	523,072	52.31
สำนักบริหารจัดการน้ำ	10		7,562,400	10	7,562,400	0	7,562,400	0	0	0	0	10	3,466,069	45.83
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	40		406,161,700	37	162,802,313	100,733,606	62,068,707	7	238,521,300	238,521,300	0	33	14,967,403	10,346,503
ส่วนอุทกวิทยา	24		66,951,000	24	66,773,280	7,144,600	59,628,680	0	0	0	0	17	9,960,759	8,970,759
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5		9,200,000	5	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	0	4	4,103,891	44.61
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	8		77,847,400	8	70,667,317	64,862,717	5,804,600	0	0	0	0	8	12,655,872	2,926,465
ส่วนการขุดลอกประตู	41		15,504,800	41	15,072,300	356,000	14,716,300	2	432,500	432,500	0	41	10,401,124	10,145,362
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	12		17,877,000	11	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	0	11	10,666,361	60.34
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8		14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	8	10,257,974	69.37
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	6		13,487,200	6	13,487,200	0	13,487,200	0	0	0	0	6	7,135,656	52.91
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13		16,765,600	13	16,765,600	0	16,765,600	0	0	0	0	13	8,782,233	52.39
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13		13,787,900	13	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	13	9,525,372	69.09
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	7		11,360,400	7	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	7	6,737,470	59.31
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10		9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	9	5,046,712	50.63
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	9		17,576,600	9	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	0	9	10,067,420	57.28
รวมทั้งสิ้น	207		699,634,700	203	445,937,160	175,083,473	270,853,687	9	238,953,800	238,953,800	0	190	124,297,387	108,701,317

หมายเหตุ : เบิกจ่ายร้อยละเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ. 65

ส่วนความเคลื่อนไหวอื่น

(19) ค่าศึกษา สำหรับ ออกแบบ งานจัดการต้นความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 2055 ] วงเงิน 12,447,400 บาท  
 อยู่ในความรับผิดชอบของ สปอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สปบ.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2894 ] วงเงิน 1,285,400 บาท  
 - (54) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8494 ] วงเงิน 160,193,000 บาท  
 อยู่ในความรับผิดชอบของ สปอ. วงเงิน 119,061,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สปบ.9 (โครงการลุ่มน้ำและบำรุงรักษาประแสร์) วงเงิน 41,132,000 บาท

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,676) ทำางบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 2868 ] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  
 รายการงบประมาณ : เงินก้อนที่ 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 33 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่ายร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา		ทำเอง
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	12	45,845,970	45,845,970	45,845,970	0	0	0	31,375,485	0	68.44
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	1,123,500	1,123,500	1,123,500	0	0	0	1,123,500	0	100.00
ส่วนควบคุมลวดกั้นเขื่อน	3	51,662,207	51,662,207	51,662,207	0	0	0	27,865,172	0	53.94
ส่วนอุทกวิทยา	15	3,030,000	3,030,000	3,030,000	0	0	0	1,645,000	0	54.29
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	211,860	211,860	211,860	0	0	0	211,860	0	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	249,000	249,000	249,000	0	0	0	249,000	0	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33</b>	<b>102,122,536</b>	<b>102,122,536</b>	<b>102,122,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,470,017</b>	<b>0</b>	<b>61.17</b>

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (GEN-PROJECT) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565


โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 65 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	65	31,473,900	65	0	31,228,976	0	0	0	1,775,975	0	1,775,975	5.64
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65</b>	<b>31,473,900</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>31,228,976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,775,975</b>	<b>0</b>	<b>1,775,975</b>	<b>5.64</b>

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	2	1,080,000	1,080,000	2	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

รายการที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ชื่องาน / งบประมาณ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ	23,136,300	23,136,300	0
	<b>ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ</b>	23,136,300	23,136,300	0
1	(52) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8492 ]	16,585,300	16,585,300	0
2	(1.146) ปรับปรุงสถานีหลักระบบโทรมาตร ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 714 ]	6,551,000	6,551,000	0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 2565) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

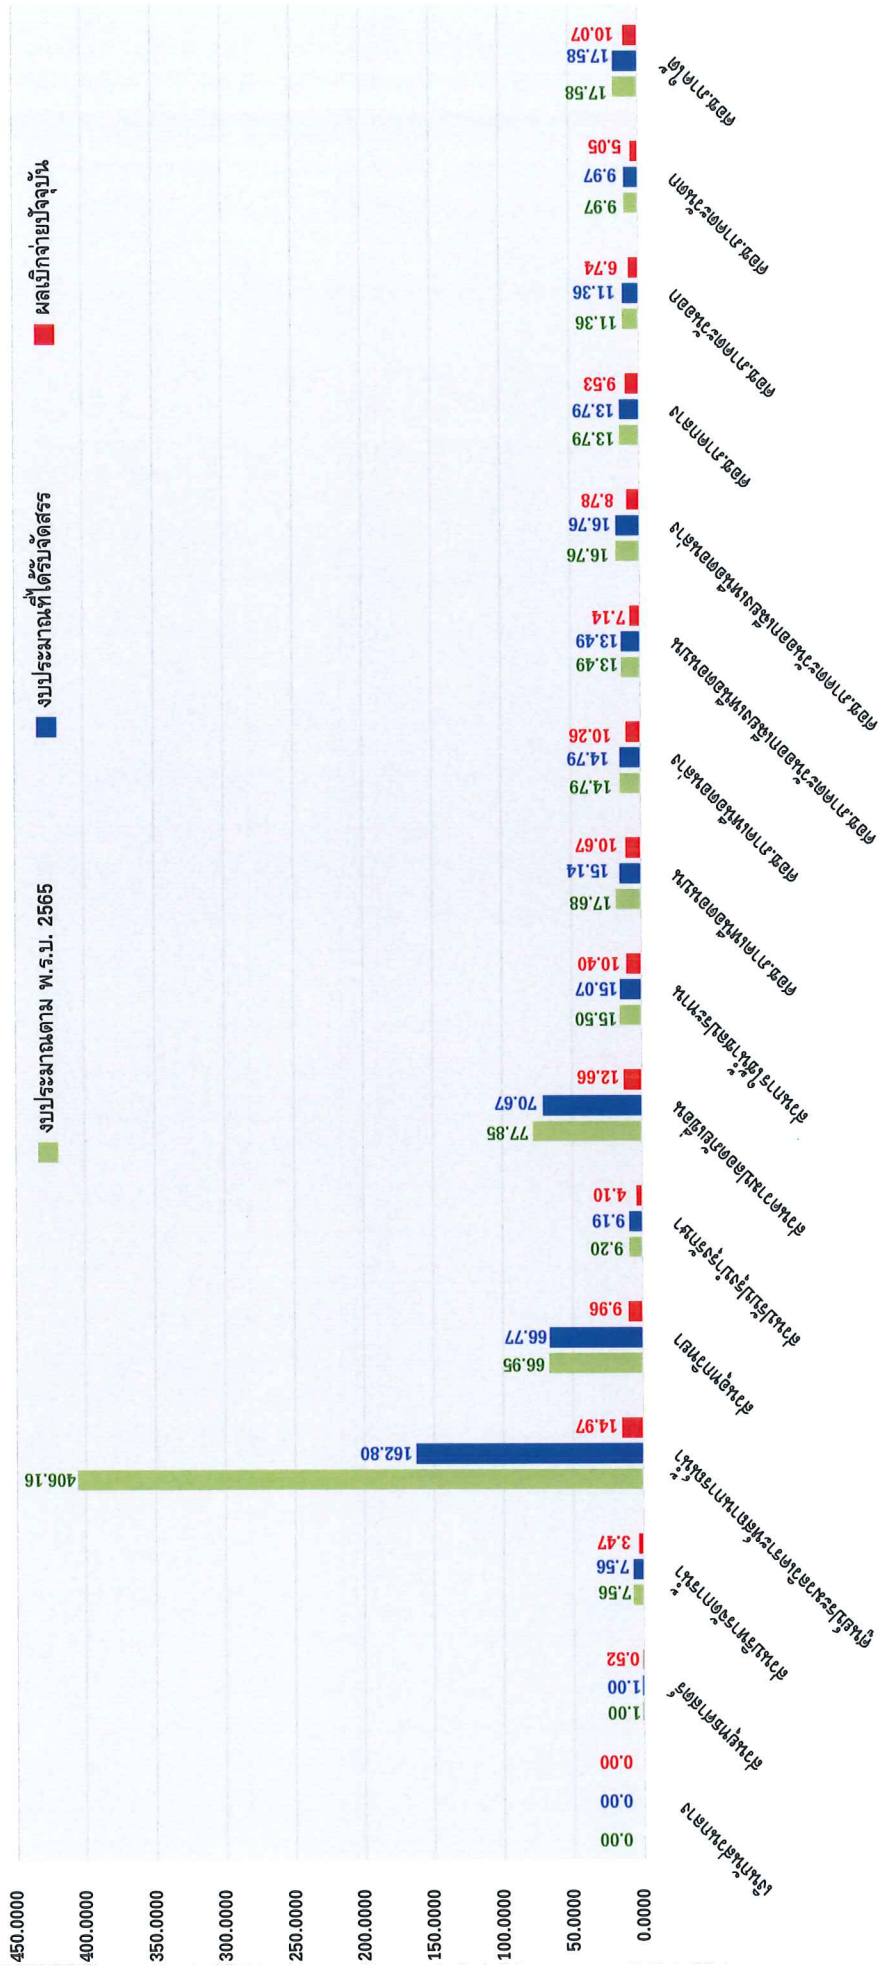



ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 65) สำนักบริหารจัดกาหน้าและออกทุกวิทยา  
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

