



## บันทึกข้อความ

เลขที่บันทึก E.....

๗๙๖

26 ม.ค. 2564

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กคชง ๐๖/๕๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๒๕๘๔

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔

- ทราบ

เรียน ผอ.ส่วน., ผอ.ทก

เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔

**สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ**  
**ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)**

ม 584

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 5 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 94,116.43 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 18,849.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.03 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 13,382 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 72 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.54 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1,982 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.81 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 9,923 รายการ คิดเป็นร้อยละ 74.15 ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 1,212 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.06 และยกเลิก จำนวน 193 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.44 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 74,106.98 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 10,196.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.76 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,569.82 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 2,231.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.47 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 66,537.16 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 7,965.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.97 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,399 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 72 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.77 เนื่องจากส่วนใหญ่ มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง/แก้ไขสัญญา/แก้ไขประมาณการ ค่าควบคุมงาน และติดปัญหาที่ดิน เช่น การขออนุญาต เข้าใช้พื้นที่ ราษฎรเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ เป็นต้น อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 729 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.76 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 8,241 รายการ คิดเป็นร้อยละ 87.68 ดำเนิน แล้วเสร็จ จำนวน 171 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.82 และยกเลิก จำนวน 186 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.98 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอื่นแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้น

2. งบเงินกู้เบิกเห็ลลือมปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 11,209.80 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 5,049.9103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.05 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 46.2055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 78.6171 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.70 คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 6,035.0701 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.84 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,557 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1,064 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.34 ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 490 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.21 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.19

3. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 6,970.95 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,466.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.72 มีจำนวนรายการ 698 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.29 ได้แก่ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหี่ยยน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 66.18 ล้านบาท เนื่องจากแก้ไขแบบก่อสร้าง และฝ่ายบ้านนาแก้ว - นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97.99 ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากกรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 151 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.63 ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 542 รายการ คิดเป็นร้อยละ 77.65 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43

4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 893.70 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 มีจำนวนรายการ 1,637 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1,246 รายการ คิดเป็นร้อยละ 86.11 เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอโอนจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 382 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.34 ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.55

5. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 135.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.45 มีจำนวนรายการ 91 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.49 เนื่องจากส่วนใหญ่มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 85 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.41 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.10

\*\*\*\*\*



# ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

## ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

## รายละเอียดข้อมูล

1 > สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

- 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง
- 2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง
- 2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
- 2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564
- 2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564
- 2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตุ้มเทียม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

3 > งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564




1

## สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| รายละเอียดงบประมาณ                                                                                                                                                                                          | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) |            |        | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ) |                 |                           |                              |           | หมายเหตุ                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ                        | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | รวม                                 | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | แล้วเสร็จ |                                                                                                                                                                             |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                 | 94,116.43                       | 18,849.52  | 20.03  | 13,382                              | 72              | 1,982                     | 9,923                        | 1,212     | ยกเลิก 193 รายการ                                                                                                                                                           |
| 1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรมบัญชีกลาง)                                                                                                                                                         | 74,106.98                       | 10,196.73  | 13.76  | 9,399                               | 72              | 729                       | 8,241                        | 171       |                                                                                                                                                                             |
| 1.1 งบรายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                          | 7,569.82                        | 2,231.05   | 29.47  | -                                   | -               | -                         | -                            | -         |                                                                                                                                                                             |
| 1.2 งบรายจ่ายลงทุน                                                                                                                                                                                          | 66,537.16                       | 7,965.68   | 11.97  | 9,399                               | 72              | 729                       | 8,241                        | 171       | ยกเลิก 186 รายการ                                                                                                                                                           |
| 2. งบเงินกู้ยืมไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563                                                                                                                                                                     | 11,209.80                       | 5,049.91   | 45.05  | 1,557                               | -               | -                         | 1,064                        | 490       | - ปลาย PO สิ้นบาท 46.21 สิ้นบาท<br>- เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ 72.20 สิ้นบาท<br>- ยกเลิก 3 รายการ งบ 6.41 สิ้นบาท<br>- เงินเกินเหลือที่ต้องดำเนินการ 6,035.07 สิ้นบาท |
| 3. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2563                                                                                                                                           | 6,970.95                        | 3,466.03   | 49.72  | 698                                 | -               | 2                         | 151                          | 542       |                                                                                                                                                                             |
| 3.1 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและภัยน้ำท่วมในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 | 2,560.86                        | 2,283.21   | 89.16  | 266                                 | -               | -                         | 5                            | 261       |                                                                                                                                                                             |
| 3.2 โครงการเพื่อต่อต้านภัยแล้งและภัยน้ำท่วมในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสียหายจากดินถล่มด้านอุปโภคและบริโภค ทั้งภัยภัยที่มีความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563      | 393.90                          | 315.42     | 80.07  | 222                                 | -               | -                         | 1                            | 221       |                                                                                                                                                                             |
| 3.3 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563                                                                                         | 719.59                          | 136.86     | 19.02  | 79                                  | -               | 1                         | 50                           | 27        | ยกเลิก 1 รายการ                                                                                                                                                             |
| 3.4 โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563                                                             | 1,426.35                        | 49.77      | 3.49   | 45                                  | -               | 1                         | 43                           | -         | ยกเลิก 1 รายการ                                                                                                                                                             |
| 3.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือและบรรเทาอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563                                                                                    | 284.86                          |            | 0.00   | 8                                   | -               | -                         | 8                            | -         |                                                                                                                                                                             |
| 3.6 โครงการอื่น ๆ งบประมาณพระราชดำริ (งบปร.) ประจำปี 2563                                                                                                                                                   | 1,585.39                        | 680.78     | 42.94  | 78                                  | -               | -                         | 44                           | 33        | ยกเลิก 1 รายการ                                                                                                                                                             |
| 4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอุปโภคบริโภค                                                                                                                                                                     | 893.70                          | 1.70       | 0.19   | 1,637                               | -               | 1,246                     | 382                          | 9         |                                                                                                                                                                             |
| 5. จัดรูปที่ดิน                                                                                                                                                                                             | 935.00                          | 135.15     | 14.45  | 91                                  | -               | 5                         | 85                           | -         | ยกเลิก 1 รายการ                                                                                                                                                             |

# ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

## 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564




รายการ

9,399 รายการ

66,510.04 ล้านบาท

|   |        |
|---|--------|
| ✗ | 0.77%  |
| ✗ | 72     |
| ✗ | 7.76%  |
| ✗ | 729    |
| ✗ | 89.50% |
| ✓ | 8,412  |
| ✓ | 1.98%  |
| ✓ | 186    |

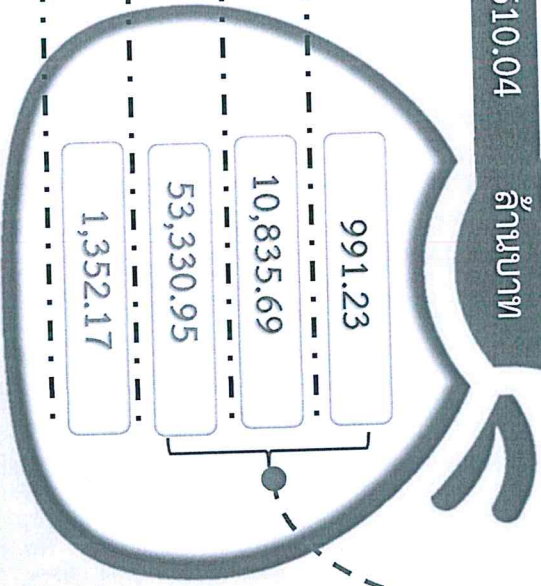

ผลการก่อหนี้ผูกพัน

ข้อมูลจาก ระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 72 รายการ (0.78%)  
 งบประมาณ 991.23 ล้านบาท (1.52%)

- แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา/แก้ไขประมาณการ 25 รายการ
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น การขออนุญาตเข้าพื้นที่ 12 รายการ
- ค่าความคุ้มงาน 10 รายการ
- สะท้อนการปรับแผนการดำเนินงานโครงการซ่อมแซม 7 รายการ
- บำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของ 18 รายการ
- เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (โครงการ 1 ล้านบาท) 18 รายการ
- อื่น ๆ เช่น โอนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ เปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน เป็นต้น


ดำเนินการแล้วเสร็จ  
171 รายการ (1.86%)

ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8,412 รายการ (91.31%)  
 งบประมาณ 53,330.95 ล้านบาท (81.85%)


อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 จำนวน 729 รายการ (7.91%)  
 งบประมาณ 10,835.69 ล้านบาท (16.63%)

- อนุมัติแผน 208 รายการ งบประมาณ 2,124.47 ล้านบาท
- ประกาศ TOR 30 รายการ งบประมาณ 1,198.98 ล้านบาท
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 133 รายการ งบประมาณ 3,213.97 ล้านบาท
- เปิดซอง 69 รายการ งบประมาณ 1,284.68 ล้านบาท
- อนุมัติราคา 289 รายการ งบประมาณ 2,013.59 ล้านบาท

✗ ยังไม่ดำเนินการ  
 ✗ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ✓ ก่อหนี้ผูกพัน  
 ✓ ยกเลิก



สรุปผลการอภิปรายผู้แทน ข้าราชการท้องถิ่นงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนกตามสำนัก/กอง

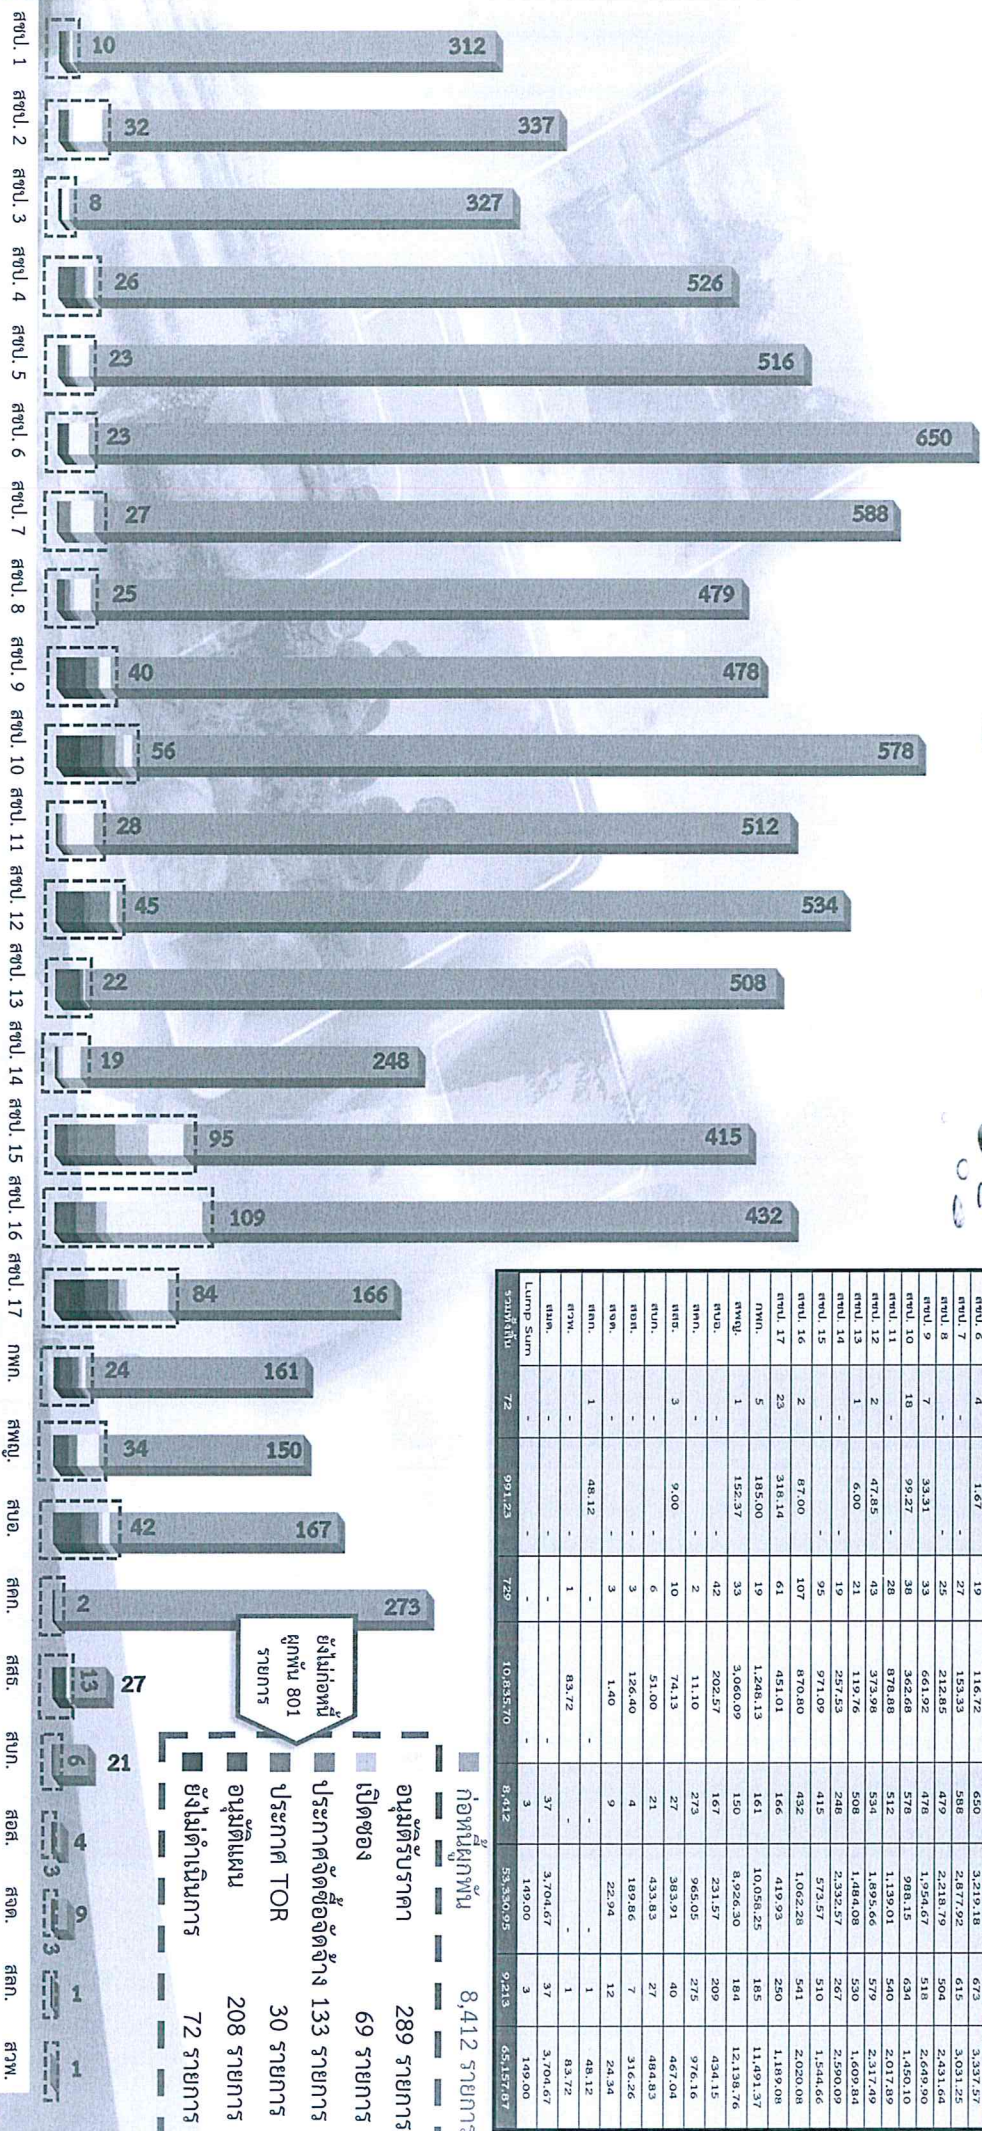

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Gen Protect ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

| สำนัก/กอง | งบประมาณ<br>พ.ร.บ. | เบิกจ่าย | ร้อยละ | จำนวนรายการ | ยังไม่ดำเนินการ |          |             | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง |             |           | ทำข้อผูกพัน                   |         |         |         |         |       |  |
|-----------|--------------------|----------|--------|-------------|-----------------|----------|-------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|--|
|           |                    |          |        |             | จำนวนรายการ     | งบประมาณ | จำนวนรายการ | งบประมาณ                  | จำนวนรายการ | งบประมาณ  | อยู่ระหว่างดำเนินการ (งบกลาง) |         |         |         |         |       |  |
|           |                    |          |        |             |                 |          |             |                           |             |           | 0-19 %                        | 20-39 % | 40-59 % | 60-79 % | 80-99 % | 100 % |  |
|           |                    |          |        |             |                 |          |             |                           |             |           |                               |         |         |         |         |       |  |
| รวม       | 65,157.87          | 7,927.60 | 12.17  | 9,213       | 72              | 991.23   | 729         | 10,835.70                 | 8,412       | 53,330.95 | 6,154                         | 924     | 428     | 361     | 374     | 171   |  |
| สถป. 1    | 1,200.46           | 192.50   | 16.04  | 322         | 2               | 2.00     | 8           | 118.10                    | 312         | 1,080.36  | 204                           | 54      | 24      | 12      | 15      | 3     |  |
| สถป. 2    | 1,296.34           | 146.10   | 11.27  | 369         | 1               | 0.01     | 31          | 117.93                    | 337         | 1,178.40  | 279                           | 36      | 10      |         | 11      | 1     |  |
| สถป. 3    | 1,966.73           | 164.37   | 8.36   | 335         |                 | 1.49     | 6           | 18.04                     | 327         | 1,947.20  | 246                           | 27      | 11      | 15      | 22      | 6     |  |
| สถป. 4    | 1,295.07           | 95.45    | 7.37   | 496         |                 |          | 26          | 216.38                    | 470         | 1,078.69  | 447                           | 20      | 3       |         |         |       |  |
| สถป. 5    | 2,891.26           | 382.39   | 13.23  | 549         |                 |          | 23          | 76.15                     | 526         | 2,815.11  | 306                           | 81      | 55      | 32      | 46      | 6     |  |
| สถป. 6    | 3,337.57           | 667.69   | 20.01  | 673         | 4               | 1.67     | 19          | 116.72                    | 650         | 3,219.18  | 406                           | 86      | 34      | 56      | 55      | 13    |  |
| สถป. 7    | 3,031.25           | 467.38   | 15.42  | 615         |                 |          | 27          | 153.33                    | 588         | 2,877.92  | 354                           | 59      | 33      | 55      | 82      | 5     |  |
| สถป. 8    | 2,431.64           | 203.33   | 8.36   | 504         |                 |          | 25          | 212.85                    | 479         | 2,218.79  | 283                           | 80      | 53      | 14      | 24      | 25    |  |
| สถป. 9    | 2,649.90           | 201.87   | 7.62   | 518         | 7               | 33.31    | 33          | 661.92                    | 478         | 1,954.67  | 323                           | 80      | 18      | 20      | 31      | 6     |  |
| สถป. 10   | 1,450.10           | 91.41    | 6.30   | 634         | 18              | 99.27    | 38          | 362.68                    | 578         | 988.15    | 501                           | 60      |         | 7       | 4       | 6     |  |
| สถป. 11   | 2,017.89           | 141.48   | 7.01   | 540         |                 |          | 28          | 878.88                    | 512         | 1,139.01  | 370                           | 34      | 58      | 19      | 20      | 11    |  |
| สถป. 12   | 2,317.49           | 288.77   | 12.46  | 579         | 2               | 47.85    | 43          | 373.98                    | 534         | 1,895.66  | 376                           | 33      | 24      | 78      | 10      | 13    |  |
| สถป. 13   | 1,609.84           | 179.57   | 11.15  | 530         | 1               | 6.00     | 21          | 119.76                    | 508         | 1,484.08  | 383                           | 70      | 27      | 6       | 13      | 9     |  |
| สถป. 14   | 2,590.09           | 197.93   | 7.64   | 267         |                 |          | 19          | 257.53                    | 248         | 2,332.57  | 158                           | 25      | 18      | 8       | 15      | 24    |  |
| สถป. 15   | 1,544.66           | 43.65    | 2.83   | 510         |                 |          | 95          | 971.09                    | 415         | 573.57    | 381                           | 24      |         | 3       | 4       | 3     |  |
| สถป. 16   | 2,020.08           | 51.46    | 2.55   | 541         | 2               | 87.00    | 107         | 870.80                    | 432         | 1,062.28  | 349                           | 36      | 19      | 11      | 4       | 13    |  |
| สถป. 17   | 1,189.08           | 32.37    | 2.72   | 250         | 23              | 318.14   | 61          | 451.01                    | 166         | 419.93    | 132                           | 14      | 7       | 6       | 4       | 3     |  |
| สถก.      | 976.16             | 246.92   | 25.29  | 275         |                 |          | 2           | 11.10                     | 273         | 965.05    | 215                           | 16      | 20      | 4       | 4       | 14    |  |
| สถก.      | 48.12              |          |        | 1           | 1               | 48.12    |             |                           |             |           |                               |         |         |         |         |       |  |
| สถบ.      | 484.83             | 19.45    | 4.01   | 27          |                 |          | 6           | 51.00                     | 21          | 433.83    | 21                            |         |         |         |         |       |  |
| สถบ.      | 434.15             | 35.87    | 8.26   | 209         |                 |          | 42          | 202.57                    | 167         | 231.57    | 92                            | 59      | 9       | 4       | 3       |       |  |
| สถส.      | 467.04             | 60.49    | 12.95  | 40          | 3               | 9.00     | 10          | 74.13                     | 27          | 383.91    | 12                            | 12      |         | 2       |         | 1     |  |
| สถญ.      | 12,138.76          | 1,569.95 | 12.93  | 184         | 1               | 152.37   | 33          | 3,060.09                  | 150         | 8,926.30  | 132                           | 6       | 1       | 4       | 3       | 4     |  |
| สวพ.      | 83.72              |          |        | 1           |                 |          | 1           | 83.72                     |             |           |                               |         |         |         |         |       |  |
| สอธ.      | 316.26             | 8.11     | 2.56   | 7           |                 |          | 3           | 126.40                    | 4           | 189.86    | 4                             |         |         |         |         |       |  |
| อนก.      | 11,491.37          | 1,469.90 | 12.79  | 185         | 5               | 185.00   | 19          | 1,248.13                  | 161         | 10,058.25 | 150                           | 4       | 2       | 2       | 2       | 1     |  |
| สถม.      | 3,704.67           | 965.06   | 26.05  | 37          |                 |          |             |                           | 37          | 3,704.67  | 20                            | 7       | 2       |         | 3       | 3     |  |
| สถด.      | 24.34              | 3.29     | 13.52  | 12          |                 |          | 3           | 1.40                      | 9           | 22.94     | 7                             | 1       |         |         |         | 1     |  |
| LUMP SUM  | 149.00             | 0.84     | 0.57   | 3           |                 |          |             |                           | 3           | 149.00    | 3                             |         |         |         |         |       |  |

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 186 รายการ งบประมาณ 1,352.17 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเพื่อใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบกลาง เป็นต้น

2. โครงการสนับสนุนจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองหัว-บางพระ จังหวัดชลบุรี: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีความเห็นให้ชะลอโครงการไว้ก่อน ตามมติประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 186 รายการ งบประมาณ 1,352.17 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเพื่อจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบกลาง เป็นต้น

2. โครงการผันเงินจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองห้อย-บางพระ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีความเห็นให้ชะลอโครงการไว้ก่อน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการขยายขนาดใหญ่โครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนเป็นงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Gen Project ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

| ลำดับ/กอง                            | งบประมาณ<br>พ.ร.บ. | เบิกจ่าย | ร้อยละ | จำนวน<br>รายการ | ทำอยู่ทุกปี                                  |        |     |           |       |           |       |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------|--------------------|----------|--------|-----------------|----------------------------------------------|--------|-----|-----------|-------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                      |                    |          |        |                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)                |        |     |           |       |           |       |     |     |     |     |     |
|                                      |                    |          |        |                 | 0-19 % 20-39 % 40-59 % 60-79 % 80-99 % 100 % |        |     |           |       |           |       |     |     |     |     |     |
|                                      |                    |          |        |                 |                                              |        |     |           |       |           |       |     |     |     |     |     |
| รวม                                  | 65,157.87          | 7,927.60 | 12.17  | 9,213           | 72                                           | 991.23 | 729 | 10,835.70 | 8,412 | 53,330.95 | 6,155 | 923 | 428 | 361 | 374 | 171 |
| โครงการจัดหาแท่นและแท่นที่ผลิตประทุน | 19,692.71          | 2,664.75 | 13.53  | 407             | 6                                            | 140.00 | 52  | 2,965.18  | 349   | 16,587.54 | 296   | 34  | 4   | 6   | 4   | 5   |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 8,248.90           | 553.35   | 6.71   | 223             | 4                                            | 232.37 | 26  | 992.19    | 193   | 7,024.34  | 187   | 4   | 1   | 1   |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 2,187.62           | 527.72   | 24.12  | 1,610           | 7                                            | 75.73  | 91  | 261.33    | 1,512 | 1,850.55  | 1,058 | 220 | 73  | 54  | 55  | 52  |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 1,370.90           | 69.88    | 5.10   | 41              |                                              |        | 5   | 129.00    | 36    | 1,241.90  | 36    |     |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 3,232.41           | 323.11   | 10.00  | 97              |                                              |        |     |           | 97    | 3,232.41  | 87    | 10  |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 371.66             | 24.20    | 6.51   | 8               | 2                                            | 145.00 |     |           | 6     | 226.66    | 6     |     |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 355.53             | 39.24    | 11.04  | 4               | 2                                            | 15.00  |     |           | 2     | 340.53    | 1     |     |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 6,909.16           | 1,652.35 | 23.92  | 5,294           | 30                                           | 68.05  | 301 | 572.02    | 4,963 | 6,269.10  | 3,508 | 536 | 297 | 265 | 259 | 98  |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 1,377.98           | 44.27    | 3.21   | 49              |                                              |        | 21  | 515.25    | 28    | 862.73    | 25    | 2   | 1   |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 2,149.58           | 214.60   | 9.98   | 601             | 5                                            | 47.25  | 68  | 636.25    | 528   | 1,466.08  | 342   | 63  | 37  | 29  | 45  | 12  |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 6,078.69           | 250.12   | 4.11   | 388             | 2                                            | 39.25  | 50  | 1,129.05  | 336   | 4,910.39  | 300   | 28  | 5   |     |     | 1   |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 1,125.27           | 83.90    | 7.46   | 38              | 1                                            | 15.00  | 4   | 71.89     | 33    | 1,038.38  | 33    |     |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 1,996.78           | 24.08    | 1.21   | 183             | 2                                            | 27.85  | 77  | 992.91    | 104   | 976.02    | 93    | 9   | 2   |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 276.15             | 18.86    | 6.83   | 117             | 1                                            | 55.00  | 2   | 67.85     | 114   | 153.30    | 88    | 11  | 7   | 2   | 6   |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 160.63             |          |        | 9               | 7                                            | 121.73 | 1   | 24.90     | 1     | 14.00     | 1     |     |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 701.60             | 9.56     | 1.36   | 17              |                                              |        | 5   | 223.85    | 12    | 477.75    | 12    |     |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 1,045.99           | 82.01    | 7.84   | 10              |                                              |        |     |           | 10    | 1,045.99  | 7     | 1   |     | 1   |     | 1   |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 1,231.35           | 255.09   | 20.72  | 15              |                                              |        | 2   | 603.32    | 13    | 628.03    | 10    | 1   | 1   | 1   |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 410.92             | 2.36     | 0.57   | 7               |                                              |        | 2   | 23.80     | 5     | 387.12    | 4     |     |     |     | 1   |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 284.71             | 26.87    | 9.44   | 4               |                                              |        |     |           | 4     | 284.71    | 4     |     |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 331.98             | 6.31     | 1.90   | 6               |                                              |        | 2   | 130.00    | 4     | 201.98    | 2     |     |     |     | 1   | 1   |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 266.59             | 0.39     | 0.14   | 5               |                                              |        |     |           | 5     | 266.59    | 5     |     |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 349.82             | 67.41    | 19.27  | 4               |                                              |        | 1   | 10.00     | 3     | 339.82    | 3     |     |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 2,159.25           | 687.71   | 31.85  | 12              | 1                                            | 3.00   | 3   | 781.82    | 8     | 1,374.43  | 7     |     |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 640.47             | 6.08     | 0.95   | 13              | 1                                            | 5.00   | 2   | 93.00     | 10    | 542.47    | 10    |     |     |     | 1   |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 213.40             | 39.70    | 18.60  | 5               |                                              |        | 2   | 6.00      | 3     | 207.40    | 3     |     |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 80.20              | 10.43    | 13.01  | 6               | 1                                            | 1.00   | 1   | 2.00      | 4     | 77.20     | 4     |     |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 526.44             | 143.94   | 27.34  | 10              |                                              |        | 3   | 15.50     | 7     | 510.94    | 3     | 2   |     |     | 1   | 1   |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 412.62             | 0.20     | 0.05   | 5               |                                              |        | 3   | 385.97    | 2     | 26.65     | 2     |     |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 123.62             | 1.77     | 1.43   | 5               |                                              |        |     |           | 5     | 123.62    | 4     | 1   |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 167.63             |          |        | 3               |                                              |        | 3   | 167.63    |       |           |       |     |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 421.76             | 21.94    | 5.20   | 10              |                                              |        |     |           | 10    | 421.76    | 9     | 1   |     |     |     |     |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       | 255.60             | 75.02    | 29.51  | 7               |                                              |        | 2   | 35.00     | 5     | 220.60    | 5     |     |     |     |     |     |

หมายเหตุ : 1. : 1. ยกเลิก จำนวน 186 รายการ งบประมาณ 1,352.17 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบบุคลากร เงินเดือนจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบกลาง เป็นต้น


2. โครงการพัฒนาจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองหอย-บางพระ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีความเห็นให้ชะลอโครงการไว้ก่อน ตามมติประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563



## 2.5

### ผลการเบิกจ่ายงบประมาณชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

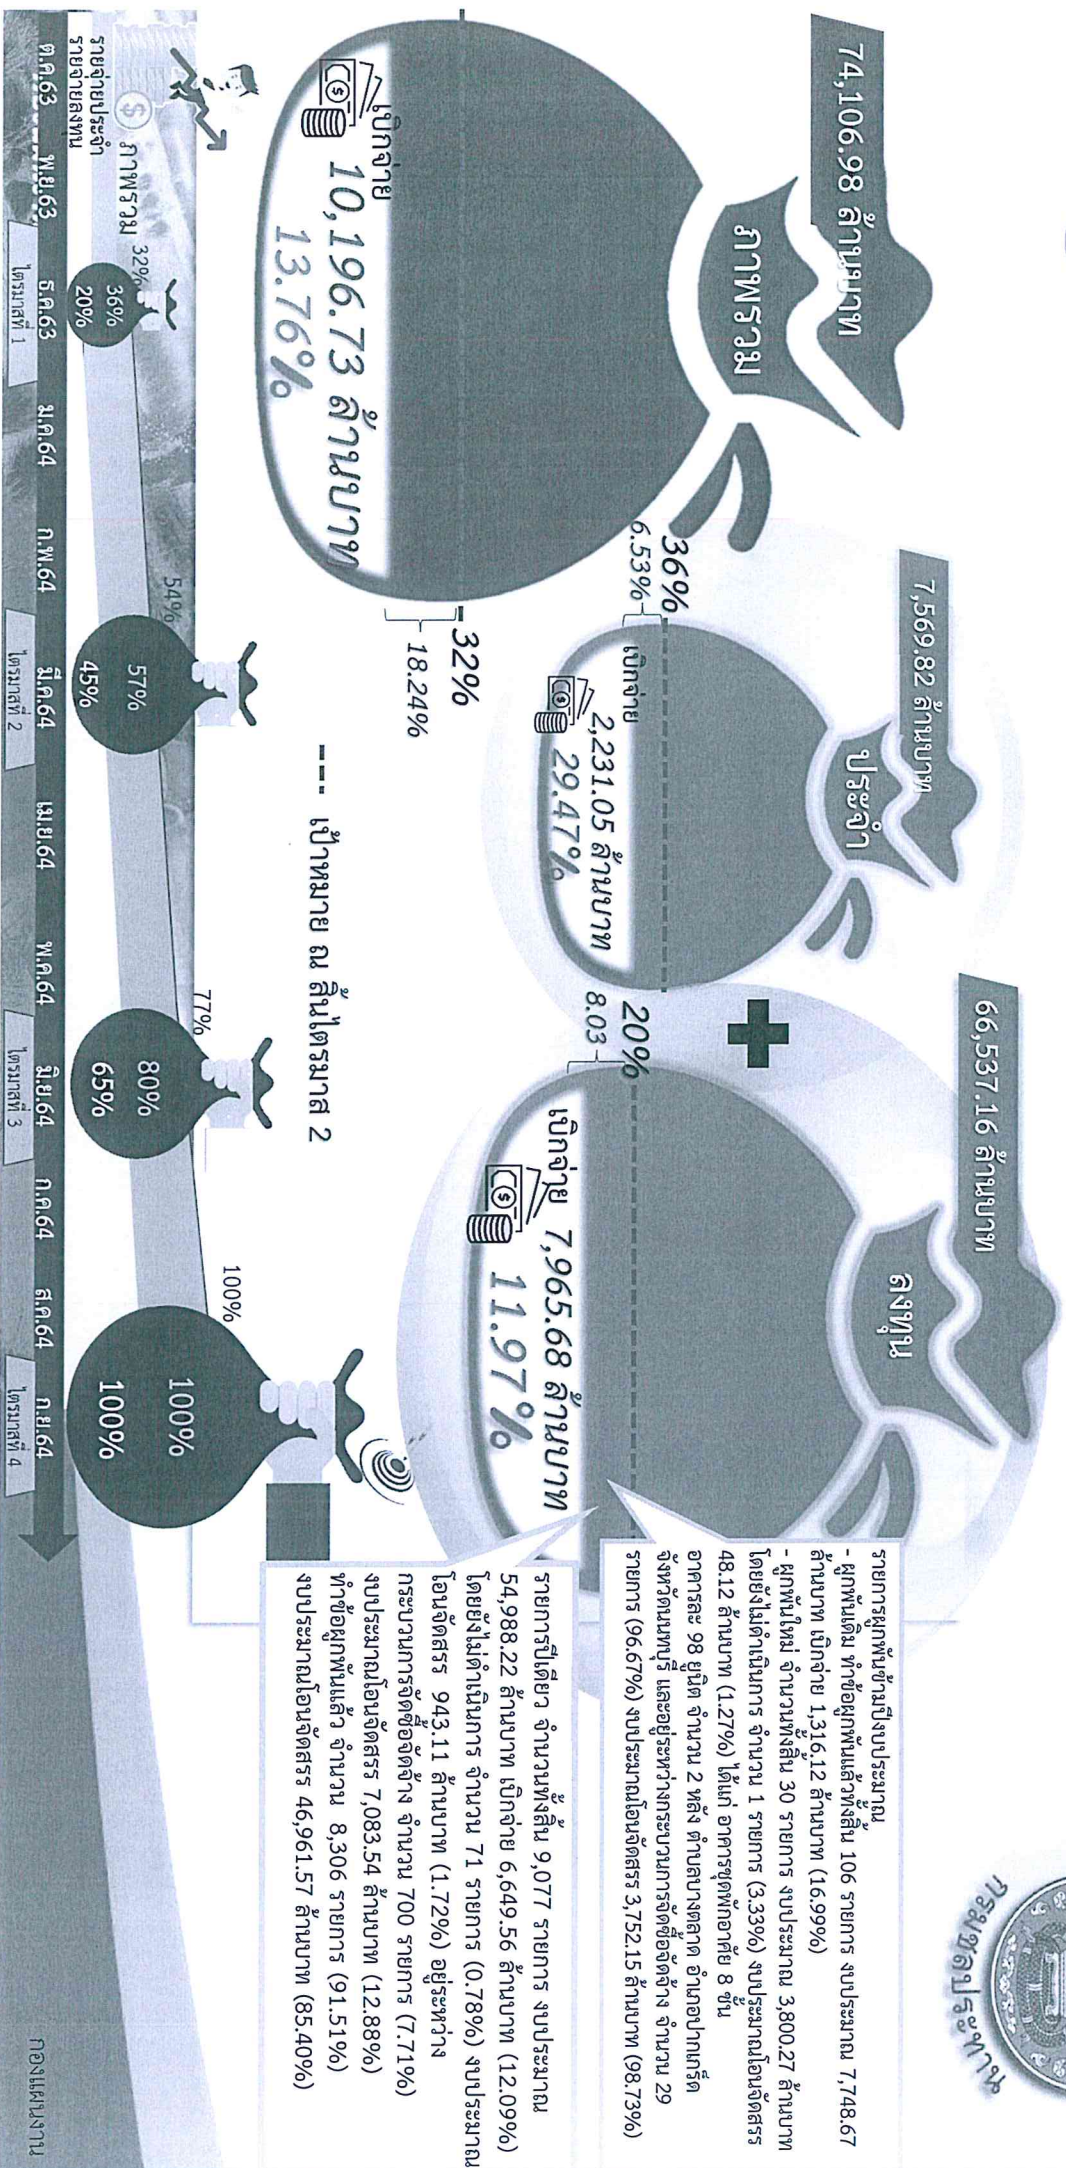



รายการผู้เบิกจ่ายงบประมาณ

- ผู้เบิกจ่าย 106 รายการ งบประมาณ 7,748.67 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,316.12 ล้านบาท (16.99%)
- ผู้เบิกจ่ายใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 30 รายการ งบประมาณ 3,800.27 ล้านบาท โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 1 รายการ (3.33%) งบประมาณโอนจัดสรร 48.12 ล้านบาท (1.27%) ได้แก่ อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 29 รายการ (96.67%) งบประมาณโอนจัดสรร 3,752.15 ล้านบาท (98.73%)

รายการรับเดียว จำนวนทั้งสิ้น 9,077 รายการ งบประมาณ 54,988.22 ล้านบาท เบิกจ่าย 6,649.56 ล้านบาท (12.09%) โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 71 รายการ (0.78%) งบประมาณโอนจัดสรร 943.11 ล้านบาท (1.72%) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 700 รายการ (7.71%) งบประมาณโอนจัดสรร 7,083.54 ล้านบาท (12.88%) ทำข้อผูกพันแล้ว จำนวน 8,306 รายการ (91.51%) งบประมาณโอนจัดสรร 46,961.57 ล้านบาท (85.40%)

## 2.6


สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564  
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

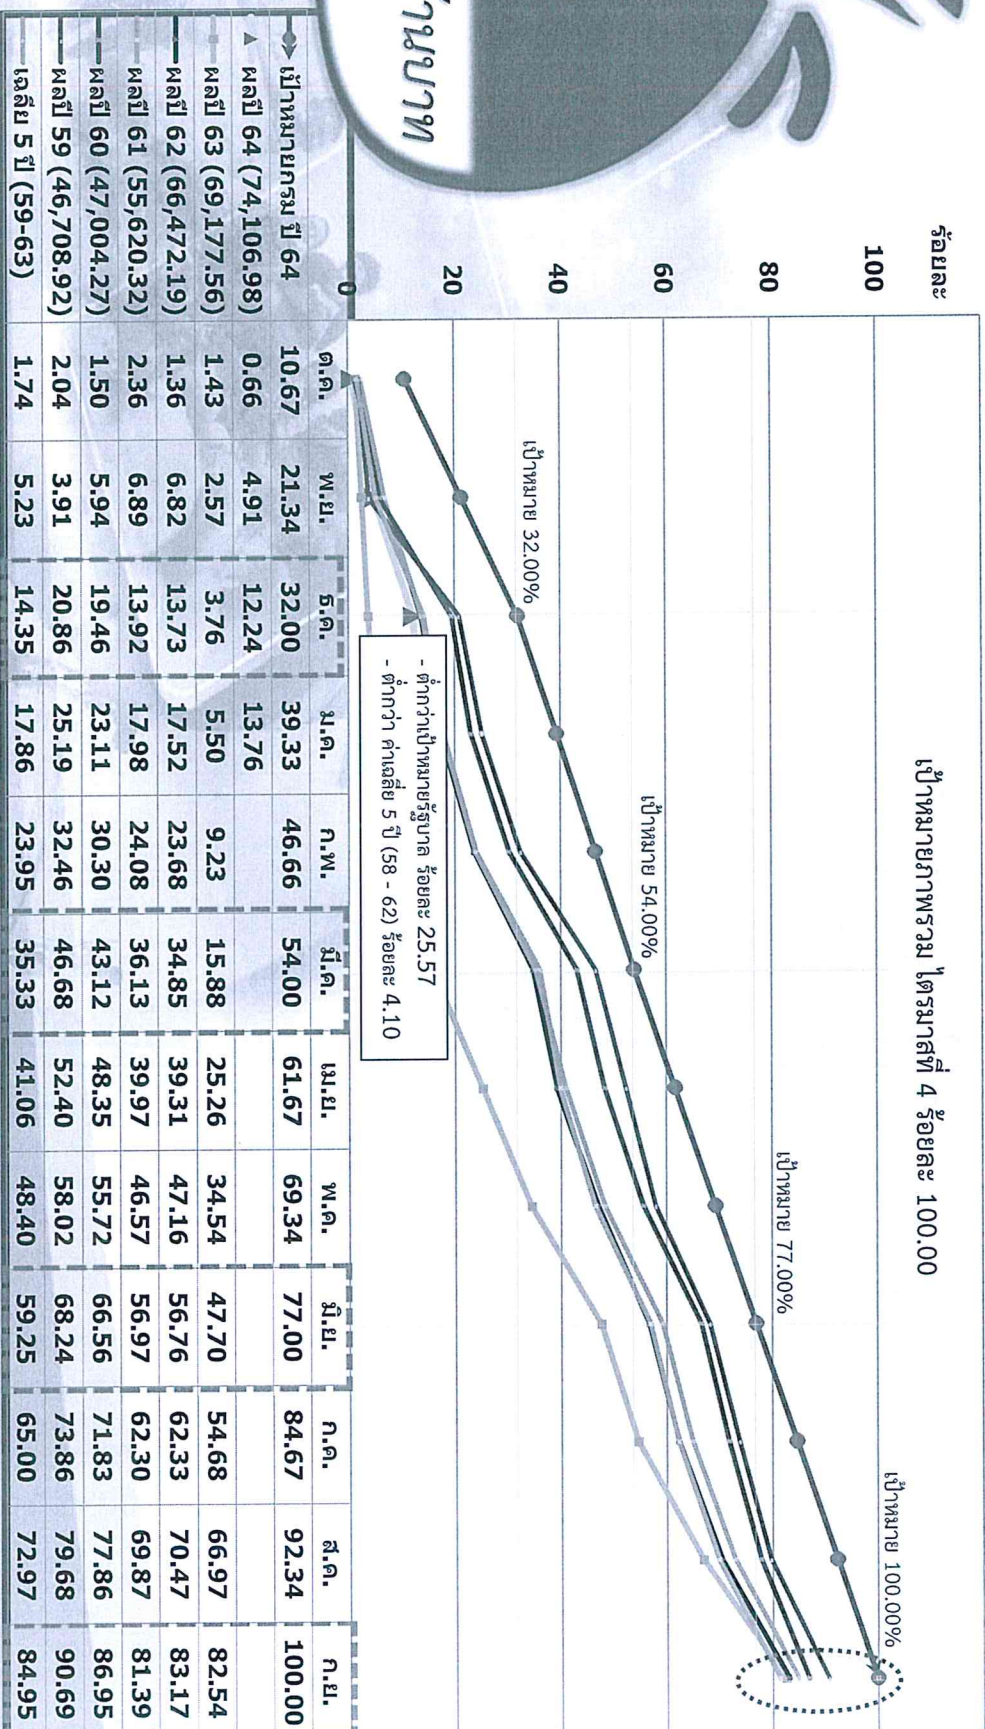

## 2.7

### สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

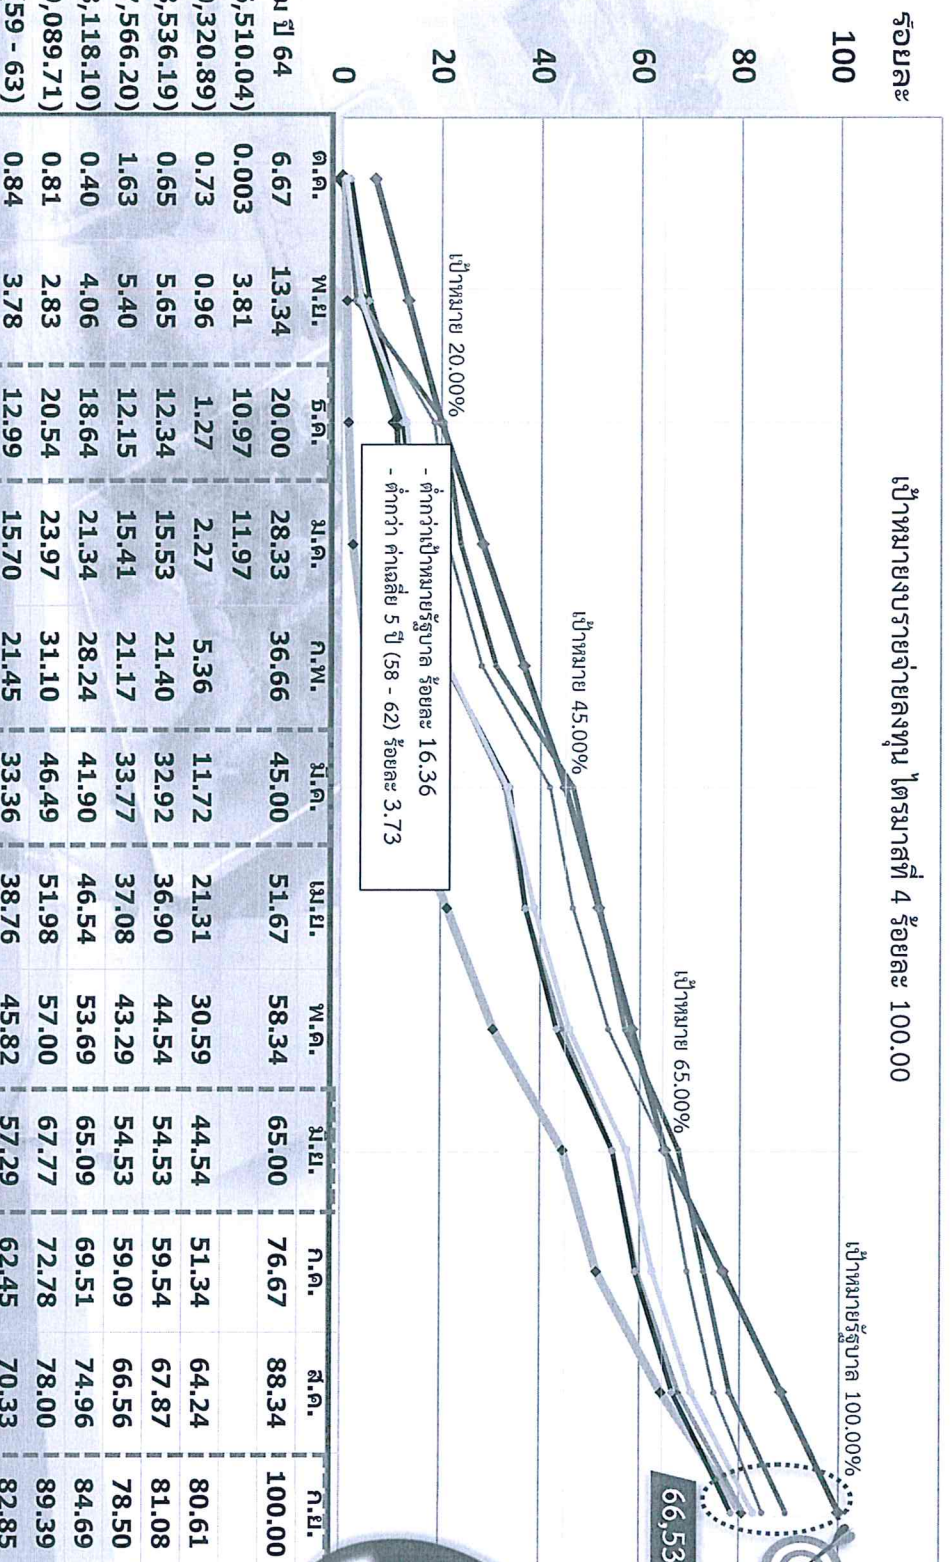


7,965.68 ล้านบาท  
11.97%

ลงทุน

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลจากระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

| หน่วยงาน | งบประมาณ ทรบ.<br>(ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ | หน่วยงาน | งบประมาณ ทรบ.<br>(ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|----------|----------------------------|----------------------------|--------|
| สชป.1    | 1,200.46                   | 192.50                     | 16.04  | สคก.     | 976.16                     | 246.92                     | 25.29  |
| สชป.2    | 1,296.34                   | 146.10                     | 11.27  | สคก.     | 48.12                      | -                          | -      |
| สชป.3    | 1,966.73                   | 164.37                     | 8.36   | สบก.     | 484.83                     | 19.45                      | 4.01   |
| สชป.4    | 1,295.07                   | 95.45                      | 7.37   | สบอ.     | 434.15                     | 35.87                      | 8.26   |
| สชป.5    | 2,891.26                   | 382.39                     | 13.23  | สสร.     | 467.04                     | 60.49                      | 12.95  |
| สชป.6    | 3,337.57                   | 667.69                     | 20.01  | สพญ.     | 12,138.76                  | 1,569.95                   | 12.93  |
| สชป.7    | 3,031.25                   | 467.38                     | 15.42  | สวพ.     | 83.72                      | -                          | -      |
| สชป.8    | 2,431.64                   | 203.33                     | 8.36   | สอธ.     | 316.26                     | 8.11                       | 2.56   |
| สชป.9    | 2,649.90                   | 201.87                     | 7.62   | กพท.     | 11,491.37                  | 1,469.90                   | 12.79  |
| สชป.10   | 1,450.10                   | 91.41                      | 6.30   | สผด.     | 3,704.67                   | 965.06                     | 26.05  |
| สชป.11   | 2,017.89                   | 141.48                     | 7.01   | สจค.     | 24.34                      | 3.29                       | 13.52  |
| สชป.12   | 2,317.49                   | 288.77                     | 12.46  | LUMP SUM | 149.00                     | 0.84                       | 0.57   |
| สชป.13   | 1,609.84                   | 179.57                     | 11.15  |          |                            |                            |        |
| สชป.14   | 2,590.09                   | 197.93                     | 7.64   |          |                            |                            |        |
| สชป.15   | 1,544.66                   | 43.65                      | 2.83   |          |                            |                            |        |
| สชป.16   | 2,020.08                   | 51.46                      | 2.55   |          |                            |                            |        |
| สชป.17   | 1,189.08                   | 32.37                      | 2.72   |          |                            |                            |        |
| รวม      | 65,157.87                  | 7,927.60                   | 12.17  |          |                            |                            |        |

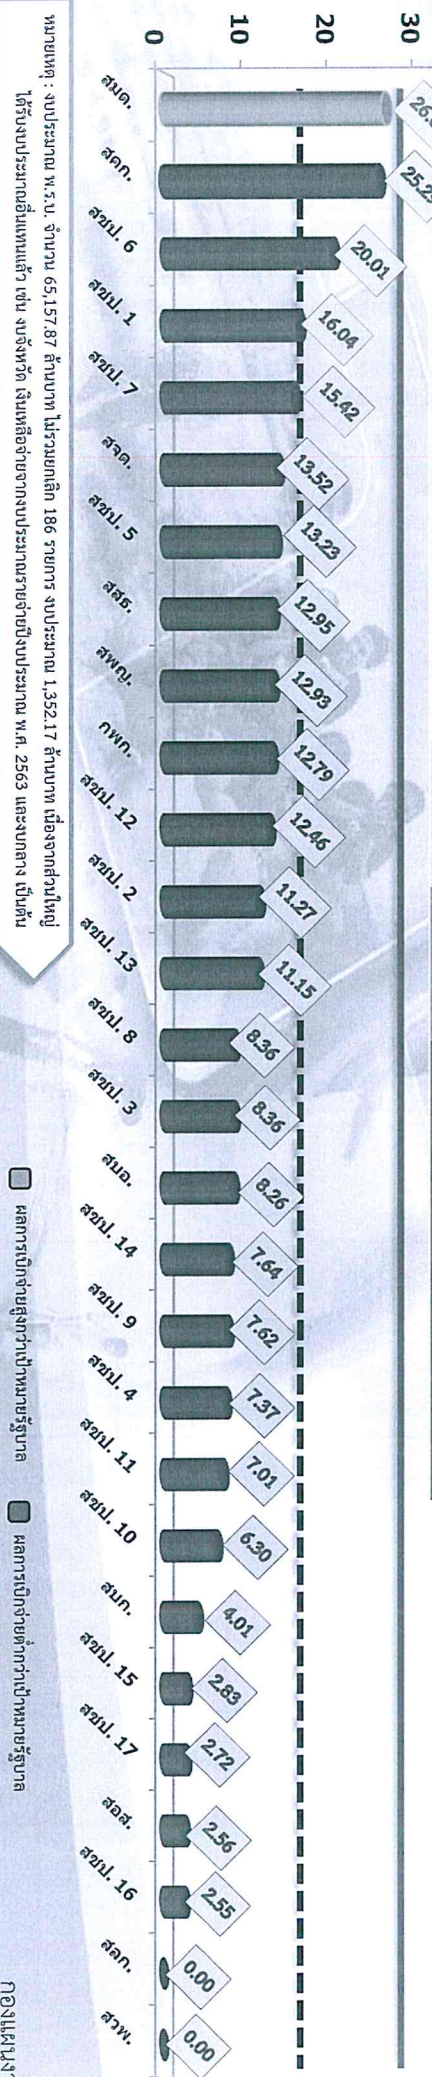

หมายเหตุ : งบประมาณ พ.ร.บ. จำนวน 65,157.87 ล้านบาท ไม่รวมยกเลิก 186 รายการ งบประมาณ 1,352.17 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น จังหวัด เงินเพื่อจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายถึงงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบกลาง เป็นต้น

☐ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล ☒ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

## 2.9

### ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

| ปี | หน่วยงาน                                                           | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  |                       |        | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  |                       |        | ผลต่าง<br>ร้อยละ<br>เบิกจ่าย |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------------------|
|    |                                                                    | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่าย<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่าย<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ |                              |
|    | <b>ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)</b>  |                       |                       |        |                       |                       |        |                              |
| 1  | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                              | 72,630.79             | 72,630.79             | 11.84  | 65,946.91             | 1,266.28              | 1.92   | 9.92                         |
| 2  | กระทรวงมหาดไทย                                                     | 80,699.88             | 80,699.88             | 9.08   | 66,183.14             | 4,129.86              | 6.24   | 2.84                         |
| 3  | กระทรวงคมนาคม                                                      | 177,618.79            | 177,618.79            | 8.27   | 167,454.60            | 10,329.13             | 6.17   | 2.10                         |
|    | <b>ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)</b> |                       |                       |        |                       |                       |        |                              |
| 1  | กรมชลประทาน                                                        | 66,537.16             | 7,965.68              | 11.97  | 58,536.19             | 1,103.31              | 1.88   | 10.09                        |
| 2  | กรมพัฒนาที่ดิน                                                     | 2,173.52              | 175.10                | 8.06   | 2,996.79              | -                     | -      | 8.06                         |
| 3  | กรมฝนหลวงและการบินเกษตร                                            | 1,184.81              | 37.18                 | 3.14   | 1,411.19              | 162.62                | 11.52  | -8.38                        |
|    | <b>ระดับกรม (ผู้เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)</b>              |                       |                       |        |                       |                       |        |                              |
| 1  | กรมโยธาธิการและผังเมือง                                            | 27,512.17             | 6,106.78              | 22.20  | 24,489.16             | 3,316.73              | 13.54  | 8.66                         |
| 2  | กรมชลประทาน                                                        | 66,537.16             | 7,965.68              | 11.97  | 58,536.19             | 1,103.31              | 1.88   | 10.09                        |
| 3  | กรมทางหลวง                                                         | 120,258.39            | 12,556.13             | 10.44  | 111,461.43            | 8,521.42              | 7.65   | 2.79                         |
| 4  | กรมทางหลวงชนบท                                                     | 47,202.12             | 1,543.30              | 3.27   | 45,229.02             | 1,459.26              | 3.23   | 0.04                         |

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากการบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง) เฉลี่ย 13.56%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (42 หน่วยงาน) เฉลี่ย 12.00%

11,209.80 ล้านบาท

# สถานการณ์ในงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

490 รายการ 1,693.35 ล้านบาท

คงเหลือ 6.41 ล้านบาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1,064 รายการ 9,444.25 ล้านบาท

หมายเลข 6.035.07 ด้านบาท

ຍກເລີກຮາຍກາ

3 รายการ 72.20 ล้านบาท

งบคงเหลือที่ต้องดำเนินการ ☒

6,035.07 ล้านบาท

53.84%

คงเหลือ

ปัญหา/อุปสรรค

1. แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่

2. ผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนกำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

3. การส่งมอบวัสดุทุกข้อที่มีความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

สุภาพบุรุษ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้เพื่อเบิกเหลือในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 64


|            | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม   | เมษายน    | พฤษภาคม  | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
|------------|--------|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|
| ผลรวม      | 991.29 | 1,863.30   | 2,360.42 | 1,717.71  | 1,307.88 | 1,226.59 | 444.95  | 271.98  | 282.29  | 117.58 | 97.23     | 518.57  |
| ผล         | 991.29 | 1,636.08   | 1,956.4  | 466.14    |          |          |         |         |         |        |           |         |
| หักต่าง    | -      | -227.22    | -404.02  | -1,251.57 |          |          |         |         |         |        |           |         |
| ต.ค.63     | พ.ย.63 | ธ.ค.63     | ม.ค.64   | ก.พ.64    | มี.ค.64  | เม.ย.64  | พ.ค.64  | มิ.ย.64 | ก.ค.64  | ส.ค.64 | ภ.ย.64    |         |
| เดือนที่ 1 |        |            |          |           |          |          |         |         |         |        |           |         |
| เดือนที่ 2 |        |            |          |           |          |          |         |         |         |        |           |         |
| เดือนที่ 3 |        |            |          |           |          |          |         |         |         |        |           |         |
| เดือนที่ 4 |        |            |          |           |          |          |         |         |         |        |           |         |

សេរីកម្រៃ  
100%

งบกลาง ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม 6 ครั้ง 6,970.9511 ล้านบาท  
จำนวน 698 รายการเบิกจ่าย 3,466.0309 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 49.72

ล้านบาท

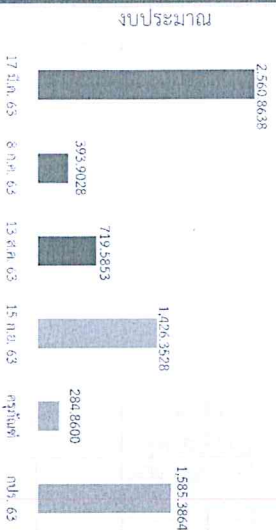

ผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง | 2 รายการ   |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ      | 151 รายการ |
| การก่อสร้าง               | 542 รายการ |
| งานแล้วเสร็จ              | 3 รายการ   |
| ยกเลิก                    | 698 รายการ |

ผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 698 รายการ

ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มติ ครม.<br>17 มี.ค.                                                                                                                                                                              | มติ ครม.<br>8 ก.ค.                                                                                                                                                                          | มติ ครม.<br>13 ส.ค.                                                                                                                                                                       | มติ ครม.<br>15 ก.ย.                                                                                                                                                              | มติ ครม.<br>15 ก.ย.<br>ครุภัณฑ์                                                                                                                                                  | กปร.<br>ปี 2563                                                                                                                                                                  |
| 266 รายการ                                                                                                                                                                                        | 222 รายการ                                                                                                                                                                                  | 79 รายการ                                                                                                                                                                                 | 45 รายการ                                                                                                                                                                        | 8 รายการ                                                                                                                                                                         | 78 รายการ                                                                                                                                                                        |
| 3,079.47 ล้านบาท                                                                                                                                                                                  | 393.9028 ล้านบาท                                                                                                                                                                            | 719.5853 ล้านบาท                                                                                                                                                                          | 1,426.3528 ล้านบาท                                                                                                                                                               | 284.8600 ล้านบาท                                                                                                                                                                 | 1,585.3864 ล้านบาท                                                                                                                                                               |
| เบิกจ่าย 2,283.2137 ล้านบาท<br>คิดเป็นร้อยละ 89.16                                                                                                                                                | เบิกจ่าย 315.4165 ล้านบาท<br>คิดเป็นร้อยละ 80.07                                                                                                                                            | เบิกจ่าย 136.8553 ล้านบาท<br>คิดเป็นร้อยละ 19.02                                                                                                                                          | เบิกจ่าย 49.7689 ล้านบาท<br>คิดเป็นร้อยละ 3.49                                                                                                                                   | เบิกจ่าย -<br>คิดเป็นร้อยละ -                                                                                                                                                    | เบิกจ่าย 680.7765 ล้านบาท<br>คิดเป็นร้อยละ 42.94                                                                                                                                 |
| • แล้วเสร็จ 94.05 %<br>261 รายการ<br>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ<br>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ                                                                                           | • แล้วเสร็จ 98.95 %<br>221 รายการ<br>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ<br>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ                                                                                     | • แล้วเสร็จ 40.29 %<br>27 รายการ<br>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 50 รายการ<br>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ<br>• ยกเลิก 1 รายการ                                                              | • แล้วเสร็จ 4.77 %<br>- รายการ<br>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 43 รายการ<br>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ<br>• ยกเลิก 1 รายการ                                                       | • แล้วเสร็จ 40.00 %<br>- รายการ<br>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 รายการ<br>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 รายการ                                                                            | • แล้วเสร็จ 43.32 %<br>33 รายการ<br>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 45 รายการ                                                                                                             |
| คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด มี.ค. 64                                                                                                                                                                 | คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด มี.ค. 64                                                                                                                                                           | คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด มี.ค. 64                                                                                                                                                         | คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด มี.ค. 64                                                                                                                                                | คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด มี.ค. 64                                                                                                                                                | คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด มี.ค. 64                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. อนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาท</li> <li>2. อนุมัติงบ 60.82 ล้านบาท</li> <li>3. อนุมัติงบ 378.145 ล้านบาท</li> <li>4. อนุมัติงบ 79,624 ล้านบาท</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. อนุมัติงบ 50.49 ล้านบาท</li> <li>2. อนุมัติงบ 38,250 ล้านบาท</li> <li>3. อนุมัติงบ 6,565.7 ล้านบาท</li> <li>4. อนุมัติงบ 7,520 ล้านบาท</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. อนุมัติงบ 3.16 ล้านบาท</li> <li>2. อนุมัติงบ 41,620 ล้านบาท</li> <li>3. อนุมัติงบ 7,520 ล้านบาท</li> <li>4. อนุมัติงบ 20,470 ล้านบาท</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. อนุมัติงบ 1,350 ล้านบาท</li> <li>2. อนุมัติงบ 6.04 ล้านบาท</li> <li>3. อนุมัติงบ 65,738 ล้านบาท</li> <li>4. อนุมัติงบ 20 ปี</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. อนุมัติงบ 1,350 ล้านบาท</li> <li>2. อนุมัติงบ 6.04 ล้านบาท</li> <li>3. อนุมัติงบ 65,738 ล้านบาท</li> <li>4. อนุมัติงบ 20 ปี</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. อนุมัติงบ 1,350 ล้านบาท</li> <li>2. อนุมัติงบ 6.04 ล้านบาท</li> <li>3. อนุมัติงบ 65,738 ล้านบาท</li> <li>4. อนุมัติงบ 20 ปี</li> </ul> |
| โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน                                                                                                                                                   | โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน                                                                                                                                             | โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน                                                                                                                                           | โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน                                                                                                                                  | โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน                                                                                                                                  | โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน                                                                                                                                  |
| งบกลาง 2563                                                                                                                                                                                       | งบกลาง 2563                                                                                                                                                                                 | งบกลาง 2563                                                                                                                                                                               | งบกลาง 2563                                                                                                                                                                      | งบกลาง 2563                                                                                                                                                                      | งบกลาง 2563                                                                                                                                                                      |

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 18 มี.ค. 64)




5

## ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564




รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 18 ม.ค. 64)

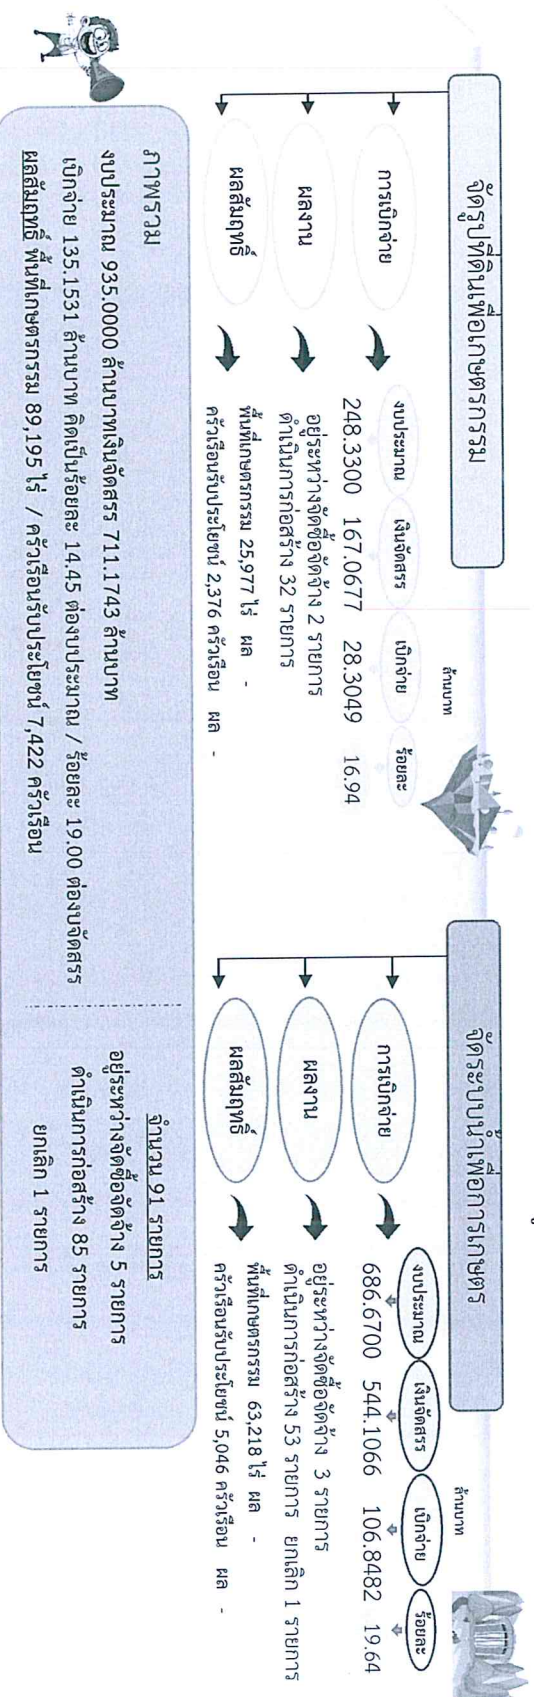

งานกองทุนจัดรูปที่ดิน  
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564

เงินทุนหมุนเวียน  
เพื่อการชลประทาน  
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564

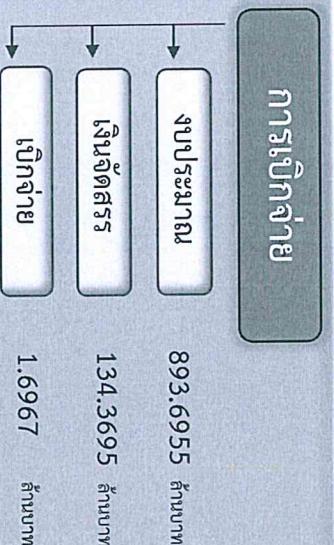

จำนวน 1,637 รายการ  
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,246 รายการ  
อยู่ระหว่างดำเนินการ 382 รายการ  
แล้วเสร็จ 9 รายการ

