



ด่วนที่สุด

เลขที่เอกสารในระบบ E..... ๗๖๖ ๐๖/๒๓๐/๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๗๓๐/๗๖๖๔ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุบบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๗๖๖๔

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุบบกลางการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำแนกตามหลักเกณฑ์ ของการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๒ ประเภท รวม ๖ โครงการ แบ่งเป็น ประเภท รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๕ โครงการ และประเภทรายจ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖,๙๗๐.๙๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๔,๓๙๒.๙๕๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๒ จำนวนทั้งสิ้น ๖๙๘ รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๑๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๘ และยกเลิก ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๔ เนื่องจากงบประมาณถูกปรับ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๓ มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อชช. และสำเนาเรียน รองอธิบดี เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

- ทรม
- โยธ พอ.สน., พอ.ภค., ทน.๑-๙ นอ.
และ ผมท.นอ. (น.ม.นอ., พด.นอ.)
เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทัยวุฒิ ขำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔
(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.


ผลการดำเนินงานจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบกลาง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม 6 ครั้ง 6,970.9511 ล้านบาท
จำนวน 698 รายการ

เบิกจ่าย 4,392.9571 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 63.02

ล้านบาท

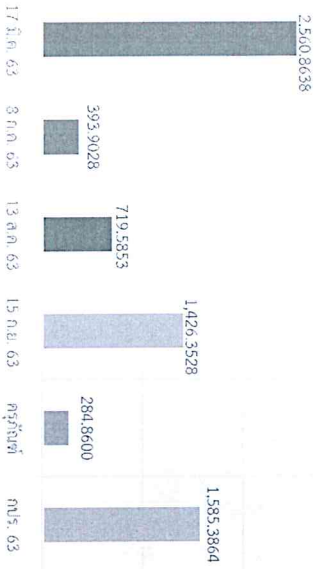

ผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 75 รายการ

การก่อสร้าง 619 รายการ

งานแปลแล้วเสร็จ 3 รายการ

ยกเลิก 698 รายการ

ยกเลิก : เนื่องจากงบประมาณถูกปรับตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 698 รายการ

ผลการดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้

มติ ครม.
17 ม.ค.

มติ ครม.
8 ก.ค.

มติ ครม.
13 ส.ค.

มติ ครม.
15 ก.ย.

มติ ครม.
15 ก.พ.
ครุฑ ๒๕๖๓

266 รายการ

2,560.8638 ล้านบาท

เบิกจ่าย 2,349.5778 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 91.67



• แล้วยเสร็จ


264 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ

222 รายการ

393.9028 ล้านบาท

เบิกจ่าย 390.2096 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 99.06



• แล้วยเสร็จ

222 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 รายการ

79 รายการ

719.5853 ล้านบาท

เบิกจ่าย 434.9664 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 60.45



• แล้วยเสร็จ

65 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ

45 รายการ

1,426.3528 ล้านบาท

เบิกจ่าย 149.7794 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 10.50



• แล้วยเสร็จ

27 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 รายการ

8 รายการ

284.8600 ล้านบาท

เบิกจ่าย 14.9800 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.26



อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 รายการ

- ทั้งหมดประมาณ 1,300 ไร่
- ปริมาณน้ำ 60.82 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่
- รับประโยชน์ 79,624 ครัวเรือน

โครงการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
นำในฤดูฝนปี 2563

- ปริมาณน้ำ 50.49 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่
- รับประโยชน์ 6,5657 ครัวเรือน

โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับ
ปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 บึงกุ่มกลาง
เสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุทกและบริโภคน้ำ

- ปริมาณน้ำ 3.16 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่
- รับประโยชน์ 7,520 ครัวเรือน

โครงการบรรเทาภัยพิบัติภัยแล้งและ
น้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

- พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่
- ปริมาณน้ำ 6.04 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่
- รับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน

โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2566

- เครื่องสูบน้ำ รถปั่นจั่น และรถสูด
จำนวน 44 เครื่อง/คัน/ลำ เพื่อการเตรียม
ความพร้อมแก้มลิงและบรรเทาอุทกภัย
ต่อองค์การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการ
เตรียมความพร้อมแก้มลิงและบรรเทา
อุทกภัย

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำแนกตามหลักเกณฑ์ของการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท 6 โครงการ แบ่งเป็น

- รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 5 โครงการ
- รายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ

โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6,970.9511 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 4,392.5778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.02 จำนวนทั้งสิ้น 698 รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.14 คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการ 75 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.74 ดำเนินการแล้วเสร็จ 619 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.68 และยกเลิก 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.44 เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 79,624 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,560.8638 ล้านบาท จำนวน 266 รายการ และมีแผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน งบประมาณ จำนวน 250.0000 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,349.5778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.75 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 264 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่

1. แก้มลิงหนองนกทา ระยะที่ 1 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 4.7278 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.0381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ผลการดำเนินงานร้อยละ 7.00 เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา โดยผู้รับจ้างรายเดิมได้ขนย้ายเครื่องจักร-เครื่องมือ ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันกรมได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิม และเริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่อีกครั้ง โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนเมษายน 2564

2. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหว ตำบลน่าน้อย อำเภอน่าน้อย จังหวัดน่าน งบประมาณ 9.6156 ล้านบาท เบิกจ่าย 2.0378 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ผลการดำเนินงานร้อยละ 30 เนื่องจากปัจจุบันเป็นรอบเวรการส่งน้ำเพื่อการเกษตรก่อน

2. โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี : 8 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

ผลสัมฤทธิ์ : ความจุเพิ่มขึ้น 50.4904 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 8,500 คริวเรือน และปริมาณการกำจัดวัชพืช 8,033,612 ตัน

ระยะเวลาดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 25

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 393.9028 ล้านบาท จำนวน 222 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 390.2096 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.06 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 222 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 186.1678 ล้านบาท เบิกจ่าย 184.0693 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 98.87 ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. โครงการแผนการดำเนินงานขุดลอกคู คลอง ในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 9.2336 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.0312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.81 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ

3. โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 215 รายการ งบประมาณ 198.5014 ล้านบาท เบิกจ่าย 197.1092 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.30 ดำเนินการแล้วเสร็จ 215 รายการ

3. โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะ ฝนทิ้งช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 3.1572 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 7,390 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 719.5853 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ 79 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 434.9664 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.45 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 65 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 รายการ และยกเลิก 1 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 52.9970 ล้านบาท เบิกจ่าย 38.7264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.07 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ
2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 63.2664 ล้านบาท เบิกจ่าย 63.2621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ
3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.0096 ล้านบาท เบิกจ่าย 83.3085 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.80 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ
4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 69 รายการ งบประมาณ 151.2844 ล้านบาท เบิกจ่าย 143.8456 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.08 ดำเนินการแล้วเสร็จ 61 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 128.2364 ล้านบาท เบิกจ่าย 57.7959 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.07 อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 24.5700 ล้านบาท เบิกจ่าย 23.3672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.10 ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหียน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 66.1790 ล้านบาท เบิกจ่าย 10.5152 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.89 อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 96.0425 ล้านบาท เบิกจ่าย 14.1455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.73 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 20,470 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,426.3528 ล้านบาท มีแผนดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 45 รายการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 153.0981 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.73 โดยอยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 27 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกพิงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 34 รายการ งบประมาณ 306.8528 ล้านบาท เบิกจ่าย 153.0981 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.89 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 27 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 6 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว - นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97.988 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขแบบโดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนพฤษภาคม 2564

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือชุดใช้งานชลประทาน จำนวน 6 ลำ 6 รายการ งบประมาณ 870.0000 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกพิงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถชุดแบบโป๊ะเหล็ก จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 249.5000 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ

5. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย
มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรม ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไข และบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำ รถปั้นจั่น และเรือชุด เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไข และบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 284.8600 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 14.9800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 ลงนามในสัญญา 8 รายการ

6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,585.3864 ล้านบาท จำนวน 78 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,050.1252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.24 ดำเนินการแล้วเสร็จ 41 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 36 รายการ ยกเลิก 1 รายการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมือง ตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 25.0000 ล้านบาท เนื่องจาก ราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมชลประทานได้รับ จัดสรรงบประมาณ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

**ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)							หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวมรายการ ทั้งสิ้น	อยู่ระหว่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก		
						ผลงานร้อยละ 1 - 40	ผลงานร้อยละ 41 - 80	ผลงานร้อยละ 81 - 99			รวม	
รวมทั้งหมด	6,970.9511	4,392.9571	63.02	698	1	10	41	24	75	619	3	
1.1 โครงการจ้างดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางฤดูตั้งแต่ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	2,560.8638	2,349.5778	91.75	266		2			2	264		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในปลายปี 2564
1.2 โครงการก่อสร้างนันทนาการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสียหายขาดแคลนน้ำที่อำเภอบึงสามพันและบริเวณที่ระอให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563	393.9028	390.2096	99.06	222						222		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
1.3 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563	719.5853	434.9664	60.45	79			7	6	13	65	1	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในปลายปี 2564
1.4 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำหรือ บรณทานปัญหาพื้นที่ท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,426.3528	153.0981	10.73	45	1	2	12	2	16	27	1	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในปลายปี 2564
1.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก่ชลประทานอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	284.8600	14.9800	5.26	8			8		8			โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในปลายปี 2564
1.6 โครงการอื่นไม่รวมจากพระราชดำริ (งบปร) ประจำปี 2563	1,585.3864	1,050.1252	66.24	78		6	14	16	36	41	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในปลายปี 2564

หมายเหตุ :

1. ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่
 1. งบประมาณกรมชลประทานปี งบปร ฝก-2R งบ 2+200-2+300 สกปีสูงน้ำ PK2 จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 0.3238 ล้านบาท เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
 2. วัตถุประสงค์ขาดแคลนและสิ่งอำนวยความสะดวก ขนถ่ายส่งสินค้ามากกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลกลางเหนือ อำเภอออตสะคดี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ลำ งบประมาณ 145,000 ล้านบาท เนื่องจากงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
 3. โครงการสร้างฝายกั้นน้ำบ้านหนองชะวอเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าอ้อ จังหวัดพิจิตร งบประมาณ 25,000 ล้านบาท เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ดำเนินการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ คือ ฝายบ้านนาแก้ว - นาแฝง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแฝง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 97,998 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขแบบโดยคาดว่าจะได้รับประมาณเดือนพฤษภาคม 2564
3. ปัญหาอุทกภัยการดำเนินงาน ได้แก่
 1. ฤดูกาลเพาะปลูก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดและภารกิจสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
 2. ผลตกในพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อนที่หลายครั้ง นำมาซึ่งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
 3. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้รับจ้างรายเดิมไม่ขยับขยายเครื่องจักร-เครื่องมือ ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้รับจ้างรายเดิม และเริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่อีกครั้ง โดยคาดว่าจะได้รับจ้างภายในเดือนเมษายน 2564
