



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๒๙๙/๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุบบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔๒35๗8

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบกลาง จำแนกตามหลักเกณฑ์ ของการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๒ ประเภท รวม ๖ โครงการ แบ่งเป็น ประเภท รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๕ โครงการ และประเภทรายจ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖,๙๗๐.๙๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๕,๑๗๑.๘๔๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๙ จำนวนทั้งสิ้น ๖๙๘ รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๔๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๔ และยกเลิก ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ เนื่องจากงบประมาณถูกปรับ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๓ มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อช. และสำเนาเรียน รองอธิบดี เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

- เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ช.ทต., ทช.๑-๗ ทอ.

ผ.ด; ผบ.ท.บอ. (งบ.บอ., พด.บอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563




กรมชลประทาน

งบกลาง ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม 6 ครั้ง จำนวน 6,970.9511 ล้านบาท
698 รายการ

เบิกจ่าย 5,171.8473 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 74.19

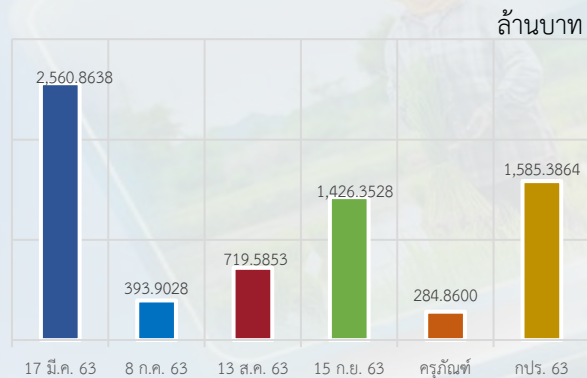

ผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 46 รายการ
- งานแล้วเสร็จ 648 รายการ
- ยกเลิก 3 รายการ

ยกเลิก : เนื่องจากงบประมาณถูกปรับตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานรวมรวมทั้งสิ้น 698 รายการ

ผลการดำเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้

มติ ครม. 17 มี.ค.	มติ ครม. 8 ก.ค.	มติ ครม. 13 ส.ค.	มติ ครม. 15 ก.ย.	มติ ครม. 15 ก.ย. ครุภัณฑ์	กปร. ปี 2563
266 รายการ	222 รายการ	79 รายการ	45 รายการ	8 รายการ	78 รายการ
2,560.8638 ล้านบาท	393.9028 ล้านบาท	719.5853 ล้านบาท	1,426.3528 ล้านบาท	284.8600 ล้านบาท	1,585.3864 ล้านบาท
เบิกจ่าย 2,325.0775 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.79	เบิกจ่าย 390.6331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17	เบิกจ่าย 480.8815 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.63	เบิกจ่าย 880.7925 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.75	เบิกจ่าย 14,9800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.26	เบิกจ่าย 1,079.4827 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.09
• แล้วเสร็จ 264 รายการ • อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ	• แล้วเสร็จ 222 รายการ	• แล้วเสร็จ 69 รายการ • อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ • ยกเลิก 1 รายการ	• แล้วเสร็จ 34 รายการ • อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ • อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ • ยกเลิก 1 รายการ	• แล้วเสร็จ 2 รายการ • อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 รายการ	• แล้วเสร็จ 57 รายการ • อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 รายการ • ยกเลิก 1 รายการ
91.20 %	100 %	91.05 %	66.66 %	60.00 %	60.26 %
<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ปริมาณน้ำ 60.82 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่ รับประโยชน์ 79,624ครัวเรือน 	<ul style="list-style-type: none"> ปริมาณน้ำ 50.49 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่ ปริมาณวัชพืช 6.5657 ล้านตัน 	<ul style="list-style-type: none"> ปริมาณน้ำ 3.16 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่ รับประโยชน์ 7,520 ครัวเรือน 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่ ปริมาณน้ำ 6.04 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่ รับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน 	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องสูบน้ำ รถปั้นจั่น และเรือชุด จำนวน 44 เครื่อง/คัน/ลำ เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563	โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสียหายการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค	โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ	โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 256	โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2563

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 17 พ.ค. 64)

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำแนกตามหลักเกณฑ์ของการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท 6 โครงการ แบ่งเป็น

- รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 5 โครงการ
- รายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ

โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6,970.9511 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 5,171.8473 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.19 จำนวนทั้งสิ้น 698 รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.14 คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 46 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.59 ดำเนินการแล้วเสร็จ 648 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.84 และยกเลิก 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 79,624 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,560.8638 ล้านบาท จำนวน 266 รายการ และมีแผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน งบประมาณ จำนวน 250.0000 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,325.0775 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.79 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 264 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่

1. แก้มลิงหนองนงทา ระยะที่ 1 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 4.7278 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.0381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ผลการดำเนินงานร้อยละ 7.00 เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ปัจจุบันเลิกสัญญาและเริ่มกระบวนการจัดหาใหม่อีกครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่างรอลงนามภายในสัญญา โดยคาดการณ์ว่าจะลงนามภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

2. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหว ตำบลน่าน้อย อำเภอน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ 9.6156 ล้านบาท เบิกจ่าย 2.0378 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ผลการดำเนินงานร้อยละ 50 เนื่องจากเป็นรอบเวรการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

2. โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี : 8 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

ผลสัมฤทธิ์ : ความจุเพิ่มขึ้น 50.4904 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่ คร่าวเรือนรับประโยชน์ 8,500 คร่าวเรือน และปริมาณการกำจัดวัชพืช 8,033,612 ต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 25

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 393.9028 ล้านบาท จำนวน 222 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 390.6331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 222 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 186.1678 ล้านบาท เบิกจ่าย 184.0693 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.87 ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. โครงการแผนการดำเนินงานขุดลอกคู คลอง ในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 9.2336 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.1731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.35 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ

3. โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 215 รายการ งบประมาณ 198.5014 ล้านบาท เบิกจ่าย 197.3907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.44 ดำเนินการแล้วเสร็จ 215 รายการ

3. โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะฝนทิ้งช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 3.1572 ล้าน ลบ.ม. คร่าวเรือนรับประโยชน์ 7,390 คร่าวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 719.5853 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ 79 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 480.8815 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.83 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 69 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ และยกเลิก 1 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการแก้ไขปัญหาลิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 52.9970 ล้านบาท เบิกจ่าย 38.7264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.07 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 63.2664 ล้านบาท เบิกจ่าย 63.2621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ

3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.0096 ล้านบาท เบิกจ่าย 99.6857 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.76 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ

4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 69 รายการ งบประมาณ 151.2844 ล้านบาท เบิกจ่าย 147.6050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.57 ดำเนินการแล้วเสร็จ 63 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว

5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 128.2364 ล้านบาท เบิกจ่าย 58.8771 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.91 อยู่ระหว่างดำเนินการ

6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 24.5700 ล้านบาท เบิกจ่าย 23.3672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.10 ดำเนินการแล้วเสร็จ

7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหี่ยน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 66.1790 ล้านบาท เบิกจ่าย 21.5712 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.60 อยู่ระหว่างดำเนินการ

8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 96.0425 ล้านบาท เบิกจ่าย 27.7867 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.93 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ

ในฤดูฝนปี 2563

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่ คราวเรือนรับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,426.3528 ล้านบาท มีแผนดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 45 รายการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 880.7925 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.75 โดยอยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 34 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 34 รายการ งบประมาณ 306.8528 ล้านบาท เบิกจ่าย 156.5425 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.02 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 29 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว - นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97.988 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขแบบโดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนพฤษภาคม 2564

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือชุดใช้งานชลประทาน จำนวน 6 ลำ 6 รายการ งบประมาณ 870.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย 724.2500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.25 ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถชุดแบบโป๊ะเหล็ก จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 249.5000 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ

5. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรมได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไข และบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำ รถปั้นจั่น และเรือชุด เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไข และบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 284.8600 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 14.9800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 ลงนามในสัญญา 8 รายการ

6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,585.3864 ล้านบาท จำนวน 78 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,079.4827 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.09 ดำเนินการแล้วเสร็จ 57 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 20 รายการ ยกเลิก 1 รายการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมือง ตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 25.0000 ล้านบาท เนื่องจาก ราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมชลประทานได้รับ จัดสรรงบประมาณ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ เมื่อ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบกลาง
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)								หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวมรายการ ทั้งสิ้น	อยู่ระหว่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง				แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
						ผลงานร้อยละ 1 - 40	ผลงานร้อยละ 41 - 80	ผลงานร้อยละ 81 - 99	รวม			
รวมทั้งสิ้น	6,970.9511	5,171.8473	74.19	698	1	5	20	21	46	648	3	
1.1 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	2,560.8638	2,325.0775	90.79	266		1	1		2	264		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564
1.2 โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563	393.9028	390.6331	99.17	222						222		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
1.3 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563	719.5853	480.8815	66.83	79			3	6	9	69	1	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564
1.4 โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาภัยน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,426.3528	880.7925	61.75	45	1	1	8		9	34	1	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564
1.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	284.8600	14.9800	5.26	8				6	6	2		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนพฤษภาคม 2564
1.6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2563	1,585.3864	1,079.4827	68.09	78		3	8	9	20	57	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564

หมายเหตุ :

- ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่
 - งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC-2R กม.2+200-2+300 สถานีสูบน้ำ PR.2 จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 0.3238 ล้านบาท เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
 - เรือชุดชนิดหัวชุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลวงแหวน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ลำ งบประมาณ 145.00 ล้านบาท เนื่องจากงบประมาณถูกปรับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 25.0000 ล้านบาท เนื่องจากราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
- อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว - นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอกาชาด จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97.988 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขแบบโดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนพฤษภาคม 2564
- ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ได้แก่
 - ฤดูกาลเพาะปลูก** เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดและการกักตัวสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง มีผลกระทบต่อการทำงาน
 - ฝนตกในพื้นที่ดำเนินการ** เนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นหลายครั้ง น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ช้ากว่าแผนที่กำหนด
 - ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา** โดยผู้รับจ้างรายเดิมได้ขอย้ายเครื่องจักร-เครื่องมือ ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันกรมได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิม และเริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่อีกครั้ง โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนเมษายน 2564
