



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/ ๗๖๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุบบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๖๒ 4436
เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุบบกลางการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำแนกตามหลักเกณฑ์ ของการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๒ ประเภท รวม ๖ โครงการ แบ่งเป็น ประเภท รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๕ โครงการ และประเภทรายจ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖,๙๗๐.๙๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๕,๔๑๔.๔๒๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๖๙๘ รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๕๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๓ และยกเลิก ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ เนื่องจากงบประมาณถูกปรับ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๓ มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อช. และสำเนาเรียน รองอธิบดี เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ

- ทราชม

- โยธม ผอ.ส่วน, ผอ.ช.ภค., ทน.๑-๓

และ ผ.ท.นอ. (ผ.นอ., ผ.นอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔


ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบกลาง ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม 6 ครั้ง 6,970,9511 ล้านบาท
จำนวน 698 รายการ

เบิกจ่าย 5,414,4283 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 77.67

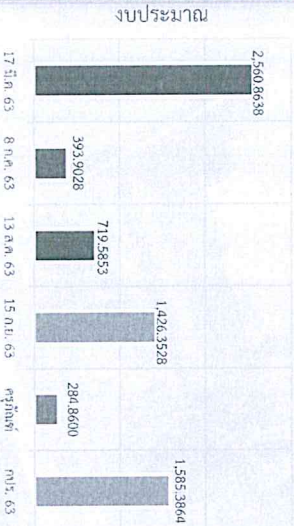

ผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 37 รายการ
- การก่อสร้าง 657 รายการ
- ยกเลิก 3 รายการ

ยกเลิก - เนื่องจากงบประมาณถูกขยับตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย 2563 มาดำเนินการแล้ว และรายชื่อในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้

งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
<p>มติ ครม. 17 มี.ค.</p> <p>266 รายการ</p> <p>มูลค่า 2,560,8638 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 2,326,4187 ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 90.85</p> <p>89.27%</p> <p>• แล้วยเสร็จ 264 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ</p>	<p>มติ ครม. 8 ก.ค.</p> <p>222 รายการ</p> <p>มูลค่า 393,9028 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 390,6331 ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 99.17</p> <p>100%</p> <p>• แล้วยเสร็จ 222 รายการ</p>	<p>มติ ครม. 13 ส.ค.</p> <p>79 รายการ</p> <p>มูลค่า 719,5853 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 496,7379 ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 69.03</p> <p>91.36%</p> <p>• แล้วยเสร็จ 69 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ</p> <p>• ยกเลิก 1 รายการ</p>	<p>มติ ครม. 15 ก.ย.</p> <p>45 รายการ</p> <p>มูลค่า 1,426,3528 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 892,6699 ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 62.58</p> <p>69.47%</p> <p>• แล้วยเสร็จ 34 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ</p> <p>• ยกเลิก 1 รายการ</p>	<p>มติ ครม. 15 ก.ย. ครุฑฉัตร</p> <p>8 รายการ</p> <p>มูลค่า 284,8600 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 137,2485 ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 48.18</p> <p>62.20%</p> <p>• แล้วยเสร็จ 5 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ</p>	<p>กปร. 2563</p> <p>78 รายการ</p> <p>มูลค่า 1,585,3864 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 1,180,8740 ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 73.84</p> <p>77.32%</p> <p>• แล้วยเสร็จ 63 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 รายการ</p> <p>• ยกเลิก 1 รายการ</p>

(ข้อมูลการะเบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 15 มิ.ย. 64)

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบกลาง
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดทำ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

รายละเอียดของงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)							หมายเหตุ
	งบประมาณ	สลับเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวมรายการ ทั้งสิ้น	อยู่ระหว่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก		
						ผลงานร้อยละ 1 - 40	ผลงานร้อยละ 41 - 80	ผลงานร้อยละ 81 - 99			รวม	
รวมทั้งหมด	6,970,951.1	5,414,428.3	77.67	698	1	3	19	15	37	657	3	
1.1 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่ทำนบในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	2,560,863.8	2,326,418.7	90.85	266		1			2	264		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564
1.2 โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสียหายจากดินโคลนถล่ม อุทกภัยในภาคและบริเวณ ที่ระลอกใต้ความเสียหายและผลกระทบต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563	393,902.8	390,633.1	99.17	222						222		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564
1.3 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563	719,585.3	496,737.9	69.03	79			3	6	9	69	1	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564
1.4 โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาภัยน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,426,352.8	892,669.9	62.58	45	1	1	8		9	34	1	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564
1.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมดินและบรรเทาภัยกับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	284,860.0	137,248.5	48.18	8				3	3	5		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564
1.6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบฯ) ประจำปี 2563	1,585,386.4	1,170,720.2	73.84	78		1			14	63	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564

หมายเหตุ :

- ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่
 - งานซ่อมแซมแหล่งส่งน้ำท้าย MC-2R กม.2+200-2+300 สถานีสูบน้ำ PK.2 จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 0.3238 ล้านบาท เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
 - เรือชุดชนิดหัวทุกลำและส่งเงินช่วยเหลือ ขาดต่อส่งเงินไม่ยอกกว่า 14 ล้านบาท ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลถนงเหนือ อำเภอตยสะเกต จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ลำ งบประมาณ 145,000 ล้านบาท เนื่องจากงบประมาณผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหมือหรือชะกุ่มเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 25,000.00 ล้านบาท เนื่องจากรายการเงินไม่ทันตัดดำเนินการดำเนินงาน
- อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ คือ ฝ่ายยานพาหนะ - บานส่ง พืชระบบส่งน้ำ ตำบลสนางค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ งบประมาณ 97,988 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา โดยคาดว่าจะได้ลงนามในสัญญาประมาณเดือนมิถุนายน 2564
- ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ได้แก่
 - ฤดูการเพาะปลูก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) สงครามที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดและการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยง มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
 - ฝนตกในพื้นที่ที่ดำเนินการ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ช้ากว่าแผนที่กำหนด
 - ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา โดยผู้รับจ้างรายเดิมได้ขอยกเลิก-หรือย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันกรมได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิม และเริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่อีกครั้ง โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่ในเดือนเมษายน 2564

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำแนกตามหลักเกณฑ์ของการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท 6 โครงการ แบ่งเป็น

- รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 5 โครงการ
- รายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ

โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6,970.9511 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 5,414.4283 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.67 จำนวนทั้งสิ้น 698 รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.14 คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการ 37 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.30 ดำเนินการแล้วเสร็จ 657 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.13 และยกเลิก 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 เนื่องจากงบประมาณถูกปรับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่ คราวเรือนรับประโยชน์ 79,624 คราวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,560.8638 ล้านบาท จำนวน 266 รายการ และมีแผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน งบประมาณ จำนวน 250.0000 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,326.4187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.85 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 264 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่

1. แก้มลิงหนองนกทา ระยะที่ 1 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 4.7278 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.0381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ผลการดำเนินงานร้อยละ 7.00 เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ปัจจุบันเลิกสัญญา และเริ่มกระบวนการจัดหาใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

2. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแห้ง ตำบลน่าน้อย อำเภอน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ 9.6156 ล้านบาท เบิกจ่าย 3.3790 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.14 ผลการดำเนินงานร้อยละ 65.00 เนื่องจากระยะที่ผ่านมาเป็นรอบเวรการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัจจุบันสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

2. โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี : 8 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

ผลสัมฤทธิ์ : ความจุเพิ่มขึ้น 50.4904 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 8,500 คริวเรือน และปริมาณการกำจัดวัชพืช 8,033,612 ต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 393.9028 ล้านบาท จำนวน 222 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 390.6331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 222 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 186.1678 ล้านบาท เบิกจ่าย 184.0693 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 98.87 ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. โครงการแผนการดำเนินงานขุดลอกคู คลอง ในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 9.2336 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.1731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.35 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ

3. โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 215 รายการ งบประมาณ 198.5014 ล้านบาท เบิกจ่าย 197.3907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.44 ดำเนินการแล้วเสร็จ 215 รายการ

3. โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะ ฝนทิ้งช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาระเบือนน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 3.1572 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 7,390 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 719.5853 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ 79 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 496.7379 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.03 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 69 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ และยกเลิก 1 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 52.9970 ล้านบาท เบิกจ่าย 38.7264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.07 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ
2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 63.2664 ล้านบาท เบิกจ่าย 63.2621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ
3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.0096 ล้านบาท เบิกจ่าย 100.5984 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.42 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ
4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 69 รายการ งบประมาณ 151.2844 ล้านบาท เบิกจ่าย 147.9307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.78 ดำเนินการแล้วเสร็จ 63 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 128.2364 ล้านบาท เบิกจ่าย 59.3714 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.30 อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 24.5700 ล้านบาท เบิกจ่าย 23.3672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.10 ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหี่ยน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 66.1790 ล้านบาท เบิกจ่าย 26.7747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.46 อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 96.0425 ล้านบาท เบิกจ่าย 36.7070 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.22 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ในฤดูฝนปี 2563

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 20,470 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,426.3528 ล้านบาท มีแผนดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 45 รายการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 892.6699 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.58 โดยอยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 34 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปรับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 34 รายการ งบประมาณ 306.8528 ล้านบาท เบิกจ่าย 168.4199 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.89 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 29 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว - นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97.988 ล้านบาท ปัจจุบันได้รับจ้างแล้วซึ่งอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา โดยคาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ภายใน มิถุนายน 2564 และจะเริ่มดำเนินการทันที คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือชุดใช้งานชลประทาน จำนวน 6 ลำ 6 รายการ งบประมาณ 870.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย 724.2500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.25 ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปรับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถชุดแบบโป๊ะเหล็ก จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 249.5000 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ

5. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรมได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำ รถปั้นจั่น และเรือชุด เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 284.8600 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 137.2485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.18 ลงนามในสัญญา 3 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ

6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,585.3864 ล้านบาท จำนวน 78 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,170.7202 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.84 ดำเนินการแล้วเสร็จ 63 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 14 รายการ ยกเลิก 1 รายการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมือง ตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 25.0000 ล้านบาท เนื่องจาก ราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ เมื่อ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
