



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๑๗/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

๒๖.159

เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๙ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๒,๐๕๐.๓๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๘๒๑.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๔๑.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๒,๐๖๘.๐๕ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๒,๕๘๘.๙๓ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๒๕.๑๙ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ และยกเลิก จำนวน ๙ รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๑ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๗๙๓.๓๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๖ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๘๙๘.๐๔ ตัน ผลการดำเนินงานในภาพรวม ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๕ รายการ (สขป.๑ จำนวน ๒ รายการ สขป.๔ จำนวน ๒ รายการ สขป.๙ จำนวน ๑ รายการ สขป.๑๔ จำนวน ๙ รายการ และสขป.๑๕ จำนวน ๑ รายการ) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๐ รายการ (อนุมัติแผน จำนวน ๓๘ รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ เปิดซอง จำนวน ๓ รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน ๑๗ รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕๓ รายการ และยกเลิก จำนวน ๓ รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานที่ยังไม่ดำเนินการมาด้วยแล้ว

(นางสาวราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชร. รชว. และผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สน., ผอ.ทต., ทน.๑-๗ ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเนนส์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕

โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนាយพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 219 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2,050.38 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,821.06 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,551.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.20 แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา 2,068.05 ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา 2,588.93 ตัน คิดเป็นร้อยละ 125.19 ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 191 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ และยกเลิก จำนวน 9 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- Para Asphalt Concrete จำนวน 161 รายการ งบประมาณจัดสรร 1,332.78 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,185.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.97 แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา 795.88 ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา 1,249.91 ตัน คิดเป็นร้อยละ 157.05 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 146 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- Para Soil Cement จำนวน 29 รายการ งบประมาณจัดสรร 153.95 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 140.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.58 แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา 1,210.72 ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา 1,286.18 ตัน คิดเป็นร้อยละ 106.23 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 27 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ ซ่อมแซมถนนทางเข้าห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คือ ซ่อมแซมถนนท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากที่ประชุมคณะทำงานกรรมการวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3/2563 มีมติให้ชะลอแผนการดำเนินงาน โดยให้ส่วนความปลอดภัยเขื่อนของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จัดตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อศึกษาและสรุปรูปแบบในการแก้ไขและปรับปรุงเขื่อนห้วยยาง จังหวัดสระแก้ว อย่างเร่งด่วน

- โครงการขยายผลท่อนยางพาราดักฝักตบขวา (Para – Log Boom-I) จำนวน 1 รายการ งบประมาณจัดสรร 82.85 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 82.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ

- รายการงานโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 28 รายการ งบประมาณจัดสรร 251.48 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 141.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.41 แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา 61.44 ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา 52.84 ตัน คิดเป็นร้อยละ 86.00 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพารา ในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าห้วงงาน โครงการชลประทาน รวมทั้งสิ้น 131 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท ได้รับงบประมาณ จัดสรร 1,793.32 ล้านบาท เบิกจ่าย 11.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณ การใช้อย่างพารา 898.04 ต้น ผลการดำเนินงานในภาพรวม ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 15 รายการ อยู่ระหว่าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 60 รายการ (อนุมัติแผน จำนวน 38 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ เปิดซอง จำนวน 3 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 17 รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ และยกเลิก จำนวน 3 รายการ โดยจำแนกตามประเภทงาน ได้แก่

- **Para Asphalt Concrete** จำนวน 127 รายการ งบประมาณ 1,802.41 ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร 1,759.23 ล้านบาท เบิกจ่าย 11.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของงบประมาณ จัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 792.54 ต้น ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 15 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 59 รายการ (อนุมัติแผน จำนวน 37 รายการ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง จำนวน 2 รายการ เปิดซอง จำนวน 3 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 17 รายการ) อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ และยกเลิก จำนวน 3 รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณ จากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว



- **Para Soil Cement** จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 34.26 ล้านบาท ได้รับงบประมาณ จัดสรร 34.09 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณ การใช้อย่างพารา 105.50 ต้น ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างอนุมัติแผน จำนวน 1 รายการ และอยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565

กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

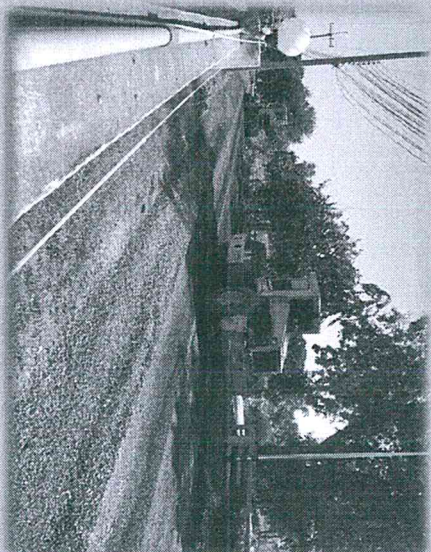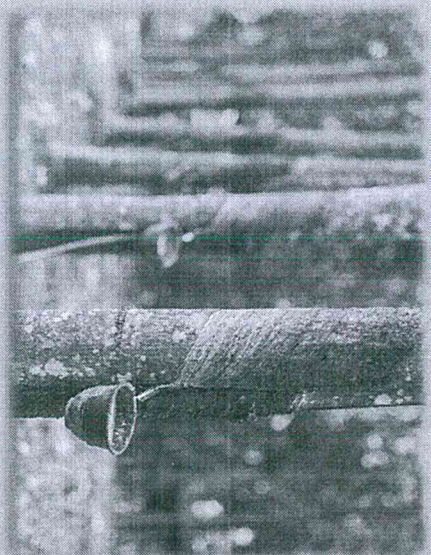



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ที่ดำเนินการต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ร.บ. 2564

ประเภท	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,821.06	219	2,068.05
ผล	1,551.52 (85.20%)	191	2,588.93 (125.19%)

Para Asphalt Concrete

ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,332.78	161	795.88
ผล	1,185.81 (88.97%)	146	1,249.91 (157.05%)

Para Soil Cement

ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	153.95	29	1,210.72
ผล	140.99 (91.58%)	27	1,286.18 (106.23%)

รายการโอนเปลี่ยนแปลง

ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	251.48	28	61.44
ผล	141.86 (56.41%)	17	52.84 (86.00%)

Para - Log Boom-I

ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)
แผน	82.85	1
ผล	82.85 (100%)	1



หมายเหตุ : ยกเลิกจำนวน 9 รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานต้นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร.ย



