



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ **พ.ศ.บอ. (กค.) ๐๔/๓๕๓/๒๕๖๕**

วันที่ **๑๖** สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) เรียน ผส.บอ.

ตามหนังสือส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ(ปก.) ๐๔/๓๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ติดตามเร่งรัดการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้ดำเนินกระบวนการเตรียมความพร้อมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณการฉบับสมบูรณ์ การจัดทำร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) ราคาากลางและเอกสารประกอบราคากลาง รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พต.๐๑) และร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เสนอแผนงาน จำนวน ๒๓๔ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๐๑.๖๓ ล้านบาท โดยส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) จำนวน ๒๓๔ รายการ ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๐๖ รายการ คงเหลือ ๒๘ รายการ (ส่วนอุทกวิทยา สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๒, ๗ และ ๘ ยังไม่ส่งเอกสาร)

๒. งบประมาณการฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๒๓๔ รายการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาเสนอ ผส.บอ. ลงนามอนุมัติ จำนวน ๒๒๖ รายการ ยังไม่ส่งเอกสาร จำนวน ๘ รายการ

๓. ร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานจ้างเหมาทั้งโครงการและงานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๔๖ รายการ

๓.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๔๕ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ

๓.๒ เอกสารร่างขอบเขตของงาน (TOR) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๕ รายการ คงเหลือ ๒๑ รายการ

๓.๓ เอกสารกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑ รายการ คงเหลือ ๔๕ รายการ

๓.๔ เอกสารราคาากลางและเอกสารประกอบราคากลาง ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๔ รายการ คงเหลือ ๒๒ รายการ

๓.๕ รายงานความต้องการพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๓๒ รายการ คงเหลือ ๑๔ รายการ

๓.๖ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการจัดทำราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/เฉพาะเจาะจง ส่งส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา จำนวน ๒๖ รายการ คงเหลือ ๒๐ รายการ

๓.๗ คณะกรรมการ...

๓.๗ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๗ รายการ คงเหลือ ๑๙ รายการ

๔. ร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานดำเนินการเอง จำนวน ๑๘๘ รายการ

๔.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑๖๑ รายการ คงเหลือ ๒๗ รายการ

๔.๒ เอกสารรายงานความต้องการพัสดุ (แบบ พต.๐๑) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑๑๓ รายการ คงเหลือ ๗๕ รายการ

๔.๓ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑๑๑ รายการ คงเหลือ ๗๗ รายการ

ทั้งนี้ มีเอกสารอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๑๓๓ รายการ วงเงิน ๖๑๓.๗๑ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเสนออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๐๑ รายการ วงเงิน ๘๕.๐๘ ล้านบาท แบ่งเป็น

๑. งานจ้างเหมาทั้งโครงการ จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๑๙๒.๒๖ ล้านบาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วครบทุกรายการ

๒. งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๓๒ รายการ วงเงิน ๒๐๐.๙๒ บาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๓๐ รายการ วงเงิน ๑๙๕.๔๔ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเสนออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕.๔๘ ล้านบาท

๓. งานดำเนินการเอง จำนวน ๑๘๘ รายการ วงเงิน ๓๐๖.๖๘ ล้านบาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๘๙ รายการ วงเงิน ๒๒๖.๐๑ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเสนออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙๙ รายการ วงเงิน ๗๙.๕๙ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑ - ๙ บอ. เพื่อมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเคร่งครัด



(นายสิทธิกร แสงสว่าง)

บร.บอ. แทน ผปบ.บอ.

๖) เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑ - ๙ บอ.  
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

## ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สบอ.

### สำนักบริหารจัดกรน้ำและอุทกวิทยา


รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง  
ทั้งสิ้น .....234.....รายการ

งบประมาณทั้งสิ้น ..... 701.6281...ล้านบาท

สรุปคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันทุกรายการ  
ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### ปัญหา อุปสรรค

1. ค่าศึกษา ล้าราคา ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯชุดใหญ่ก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้
2. งานโทรมาตรเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายสัญญา เนื่องจากมีการดำเนินการในหลายพื้นที่
3. งานจ้างเหมาบางส่วน และงานดำเนินการเองพบว่า มีบางรายการที่วงเงินขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างน้อยกว่าประมาณตามร่าง พ.ร.บ. ทำให้งบประมาณรวมน้อยกว่างบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.

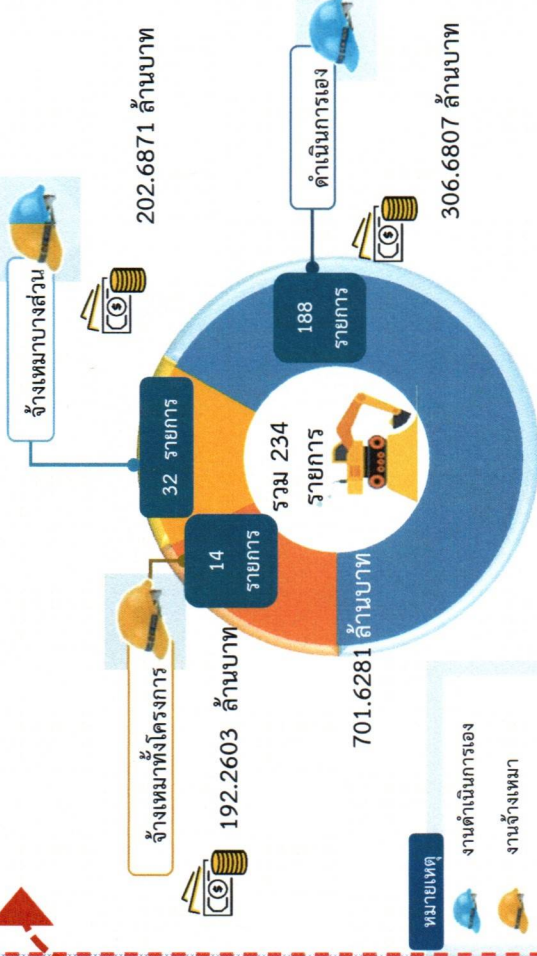

### หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง
- งานจ้างเหมา
- งานจ้างเหมาบางส่วน

รวม	ยังไม่ดำเนินการ		อนุมัติแผน		ประกาศสร้าง TOR		ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติราคา		รวมทั้งสิ้น		
	รายการ	งบ (ล้านบาท)	รายการ	งบ (ล้านบาท)	รายการ	งบ (ล้านบาท)	รายการ	งบ (ล้านบาท)	รายการ	งบ (ล้านบาท)	รายการ	งบ (ล้านบาท)	รายการ	งบ (ล้านบาท)	
101	85.0765	133	613.7120	14	192.2603							234	698.7885		
2	5.4820	30	195.4424											14	192.2603
99	79.5945	89	226.0093											32	200.9244
														188	305.6038

เตรียมความพร้อมพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (Checklist การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
		แผน/ผล การดำเนินงาน	1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	2. ปมก. ฉบับสมบูรณ์ (รายการ)	3. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)			4. กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก ดังนี้ (รายการ)					
			จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	ฉบับสมบูรณ์ (รายการ)	3.1 จัดทำร่าง ขอบเขตของ งาน (TOR)	3.2 กำหนด คุณสมบัติของ เฉพาะของพัสดุ (Spec)	3.3 ราคา และ เอกสาร ประกอบราคา	3.4 รายการ ความต้องการพัสดุ (แบบ พท.01 - พท.02)	4.1 คณะกรรมการ กำหนดร่าง ขอบเขตของงาน	4.2 คณะกรรมการ จัดทำราคากลาง	4.3 คณะกรรมการ พิจารณาคัด (คณะกรรมการ)	4.4 คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ	4.5 คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ
รวม สบอ.	701,628,100	แผน	234	234	46	46	46	224	46	46	46	224	46
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปน 8 ภาค	114,323,500	แผน	80	80	-	-	-	71	-	-	-	71	-
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1-9	23,434,500	แผน	53	53	1	1	1	52	1	1	1	52	1
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	2,843,000	ผล	33 (11)	50 (48)	0	0	0	17	1	1	1	17	1
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	84,195,500	แผน	10	10	1	1	1	10	1	1	1	10	1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	27,761,600	ผล	10	10 (10)	1	-	-	10	1	1	1	10	-
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	321,738,400	แผน	7	7	4	4	4	7	4	4	4	7	4
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	11,200,000	ผล	7 (7)	7 (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนยุทธศาสตร์	934,600	แผน	11	11	1	1	1	11	1	1	1	11	1
ส่วนอุทกวิทยา	115,197,000	ผล	11 (11)	11 (11)	1	1	1	11	1	1	1	11	1
		แผน	39	39	34	34	34	39	34	34	34	39	34
		ผล	39 (39)	36 (36)	23	-	23	30	23	23	23	23	-
		แผน	5	5	1	1	1	5	1	1	1	5	1
		ผล	5 (5)	5 (5)	-	-	-	5	-	-	-	5	-
		แผน	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		ผล	1 (1)	1 (1)	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		แผน	28	28	4	4	4	28	4	4	4	28	4
		ผล	20 (20)	28 (28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- งานประมวลที่ออกติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ เป็นงานส่วนท้องถิ่น ที่ต้องโอนให้ สบป. ดำเนินการ ซึ่งจัดซื้อจัดจ้างเอง
- แบบ พท.01 คือดำเนินการทุกรายการ ยกเว้นกรณีเป็นค่าตอบแทนพนักงาน (234-8-1-1= 224 รายการ)
- ค่าบำรุงรักษาของ ทน.1 เป็นค่าตอบแทน ไม่มีชื่อน้ำมัน จึงไม่ต้องทำ พท.01 (1)
- ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ของศูนย์ฯ (8)
- ค่าดำเนินการสำรวจแผนที่ฯ คอช.ภาคเหนือตอนบน (1)
- ( ) หมายถึง จำนวนรายการงานที่อนุมัติแผนแล้ว

แผนการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	แผนการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566						
	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65
แผนกรม	การดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายใน 15 ก.ย.65						
แผน สบอ.	ดำเนินการประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายใน 14 ต.ค.65, ทำข้อผูกพันสัญญา ภายใน 31 ธ.ค.65						
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายการ/โครงการ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ก.ย.65						
2. จัดทำประมาณการฉบับสมบูรณ์	เตรียมร่าง						
3. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง							
3.1 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผน	46	100%				
	ผล	29	54.35%				
3.2 กำหนดคุณลักษณะของพัสดุ (Spec)	แผน	46	100%				
	ผล	11	2.17%				
3.3 ราคาากลางและเอกสารประกอบราคากลาง	แผน	46	100%				
	ผล	24	52.17%		46	100%	
3.4 รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พด.01 - พด.02)	แผน	224	100%				
	ผล	149	64.73%				
4. กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก ดังนี้							
4.1 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผน	46	100%				
	ผล	26	56.52%				
4.2 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง	แผน	46	100%				
	ผล	26	56.52%				
4.3 คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการเปิดซอง)	แผน	46	100%				
	ผล	26	56.52%				
4.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แผน	224	100%				
	ผล	138	61.61%				
4.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง	แผน	46	100%				
	ผล	21	4.35%				

หมายเหตุ : - - - หมายถึง ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

- - - - - หมายถึง แผนการดำเนินงานของ สบอ.

- - - - - และ - - - - - หมายถึง แผนการดำเนินงานของกรมฯ
