



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E สบอ(ปก.)๐๘/๖๐๕/๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ลวอ 13363/14ม.๖, 65

เรื่อง สรุปรูปข้อสั่งการจากการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

423641
มส.บอ.ท305

เรียน ผส.บอ.

ตามบันทึกกองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กผง๐๖/๖๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยประชุมวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน โดยมี ท่านรองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ขอสรุปรูปข้อสั่งการจากการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ดังนี้

๑. งบประมาณเงินกันเหลือม ปี ๒๕๖๗ เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายใน ไตรมาส ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้พิจารณาเหตุผลความจำเป็น ในการขอขยาย ระยะเวลาและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี ตามบันทึก กผง ๐๖/๕๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ รายงานงานที่จัดหาเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งคืบหน้างบประมาณเหลือจ่ายภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒.๒ รายงานงานที่อยู่ระหว่างจัดหา หากจัดหาเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งคืบหน้างบประมาณ เหลือจ่ายภายในไตรมาส ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)

๓. ตรวจสอบรายงานการณเงินพับและค่างจ่ายผู้รับจ้าง ขอให้เร่งรัดตั้งแผนของงบประมาณ เหลือจ่ายเพื่อดำเนินการชำระหนี้ให้เรียบร้อย (ทั้งนี้ต้องสิ้นสุดกระบวนการและมีใบแจ้งหนี้)

๔. ข้อมูลสินทรัพย์งานระหว่างก่อสร้าง คงค้างในระบบ GFMS ขอให้เร่งรัดตรวจสอบข้อมูลหาก ดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานจบงานและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.1-9 บอ.

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการ


(นายชวลิต ฉลอม)

ผบ.บอ.

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.







ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E-Procurement/๒๐๕/๒๖๖๗

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร.๐ ๒๒๕๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/ ๒๐๕ /๒๕๖๗ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๘๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน โดยขอให้คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง สำหรับคณะกรรมการฯ ส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยใช้ Meeting ID : ๙๓๒ ๐๔๒๖ ๘๕๐๘ Passcode : ๙๙๒๗๘๘ พร้อมนี้ได้แนบระเบียบวาระการประชุมมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

เวลา 13.30 - 16.00 น. ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4

อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

ระเบียบวารสารการประชุม

ONE FOR ALL



ระเบียบวารสารที่ 1

เรื่องที่ประธานแห่งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวารสารที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

ระเบียบวารสารที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

- 3.1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- 3.2 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือเป็น
- 3.3 แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระเบียบวารสารที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กั้นไว้เบิกเหลือเป็น ที่กั้นไว้เบิกเหลือเป็น
- 4.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กั้นไว้เบิกเหลือเป็น
- 4.1.2 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กั้นไว้เบิกเหลือเป็น
- 4.2 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กพท.)

ระเบียบวารสารที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวารสารที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567

ตามบันทึกกองแผนงานที่ กผง 06/482/2567 ลว 29 สิงหาคม 2567

แจ้งให้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 2/2567

ผศ.พญ. แจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที 4 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา



เดิม “ ผศ.พญ. ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 273.60 ล้านบาท แจ้งคืนเงินเบิกจ่ายไม่พื่น 1 รายการ คือ รายการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 55.10 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลแก่งกระจานได้ลงพื้นที่บริเวณหน้างานและสั่งให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการติดตั้งบานระบายแบบพับได้ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการต่อไป ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 ส่วนรายการอื่น ๆ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด ”

แก้ไข “ ผศ.พญ. ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 273.60 ล้านบาท แจ้งคืนเงินเบิกจ่ายไม่พื่น 1 รายการ คือ รายการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 55.10 ล้านบาท เนื่องจากมีกลุ่มราษฎรในพื้นที่คัดค้านการติดตั้งบานระบายน้ำ จึงไม่สามารถดำเนินการต่อไป ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 ส่วนรายการอื่น ๆ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด ”



กรมชลประทาน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คำสั่งกรมชลประทานที่ 1877/2567

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567



องค์ประกอบที่ปรึกษา >> อธช. รธบ. รธส. รธว.

ประธานคณะกรรมการ >> รธร.



คณะกรรมการ >>

ผส.มต. ผส.คก. ผส.จต. ผส.บก. ผส.บอ. ผส.บค. ผส.พญ.
 ผส.จพ. ผส.สร. ผส.อส. ผอ.งบ. ผอ.ปพ. ผอ.พท. ผอ.พต.
 ผอ.พส. ผอ.พส. ลนภ. ผอ.กตบ. ผอ.กพร. ผส.ชป. 1-17

เลขานุการ >> ผอ.ผง.

ผู้ช่วยเลขานุการ >>

ศตป.ผง. ผอ.ผง. ผอ.ผง. ผอ.ผง. ผอ.ผง. ผอ.ผง. ผอ.ผง.

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- กำหนดมาตรการเร่งรัดต่าง ๆ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- กำกับ ติดตาม ร้องการ ก่อหนี้ ของ งบม. ให้เป็นไปตามที่กำหนด
- กำกับ ติดตาม ร้องการ ดำเนินงาน และการใช้จ่าย งบม. ของกรมฯ ได้แก่ งบ ร.บ. เงินถิ่นที่อยู่
งบกลาง เงินกู้ เงินทุนหมุนเวียนฯ และเงินกองทุนจัดรูปที่ดินกลาง
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

*ปีงบประมาณ 2568 แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 4 คณะ

คณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์ประกอบคณะอนุฯ

สายส่งน้ำและ
บำรุงรักษา

สายงาน
ก่อสร้าง

สายงาน
บริหาร

สายงาน
วิชาการ



สายงานส่งน้ำและ
บำรุงรักษา

ประธานคณะอนุฯ >> รธบ.

ผส.บอ. ผส.ชป. 1-17 ผส.พส. ผชช.ชท.1 ผชช.ชท.2 ผบ.บอ. ตป.1 ผง.

สายงานก่อสร้าง

ประธานคณะอนุฯ >> รธส.

ผส.พญ. ผอ.พท. ผส.คก. ผส.จต. ผสญ.1-16 ผสก.1-16
 ผวศ.พญ. ผวศ.พท. ผวศ.คก. ผวศ.จต. ผตป.พท. ผตป.จต.
 ผตป.พญ. ผว.1 พท. ผว.1 พญ. ตป.2 ผง.

สายงานบริหาร

ประธานคณะอนุฯ >> รธร.

ผส.มต. ผส.บค. ผอ.งบ. ผอ.พท. ผอ.พส. ลนภ. ผสพ.พท. ผง.งบ.
 ตป.1 ผง.

สายงานวิชาการ

ประธานคณะอนุฯ >> รธว.


ผส.บก. ผส.จพ. ผส.สร. ผส.อส. ผชช.ผต.2 ผวศ.บก. ผวศ.สร.
 ผวว.จพ. ผวศ.อส. ตป.2 ผง.

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบ

- ติดตาม เร่งรัดการก่อหนี้ งบม. รายจ่ายประจำปีของสายงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ติดตาม ร้องการ ดำเนินงาน และการใช้จ่าย งบม. ของสายงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งบ ร.บ. เงินถิ่น
ที่อยู่ งบกลาง เงินกู้ เงินทุนหมุนเวียนฯ และเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
- รายงานความก้าวหน้าการติดตามงานของแต่ละสายงานให้คณะกรรมการทราบ โดย ก.ผง. สรุปเสนอกรมฯ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.2 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันเงินไว้เบิกเหลือเป็น

 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

31.43

การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินหกเดือน



แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลือเป็น

 ตามบันทึก กพง 06/576/2567 ลจ. 7 พ.ย. 67



รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว



เอกสารสำรองเงินประเภท CX ต้องจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว



เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ภายในไตรมาสที่ 1 (31 ธ.ค. 67)
โดยเฉพาะรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว



ตรวจสอบรายการงบบุคลากรตามจำนวน ยกเลิก ไม่สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนด แจ้งเตือนกองแผนงานโดยเร็ว เพื่อจะได้ทำหรือแนวทางการบริหารงบประมาณร่วมกับ สงป. พิจารณาดำเนินการโอนเงินจัดสรรในรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ต่อไป



ขอร้องให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.3 แผนอภยการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567


หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามที่สัด ที่ นร.0505/23902 สร. 25 ตุลาคม 2567

แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- 1 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม ร้อยละ 94.00 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 98.00 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 80.00 และเป็นรายการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100.00
- 2 ให้นำยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาค ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติงบจัดสรร
- 3 รายงานป็นระยะ ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการก้อหนดผู้ก้อพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ธ.ค. 67 (ไตรมาส 1)
- 4 รายงานผู้ก้อพันใหม่ ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการก้อหนดผู้ก้อพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน มี.ค. 68 (ไตรมาส 2)


วันที่กองแผนงาน ตามที่สัด ที่ กนง 06/582/2567 สร. 7 พฤศจิกายน 2567

กรมชลประทาน

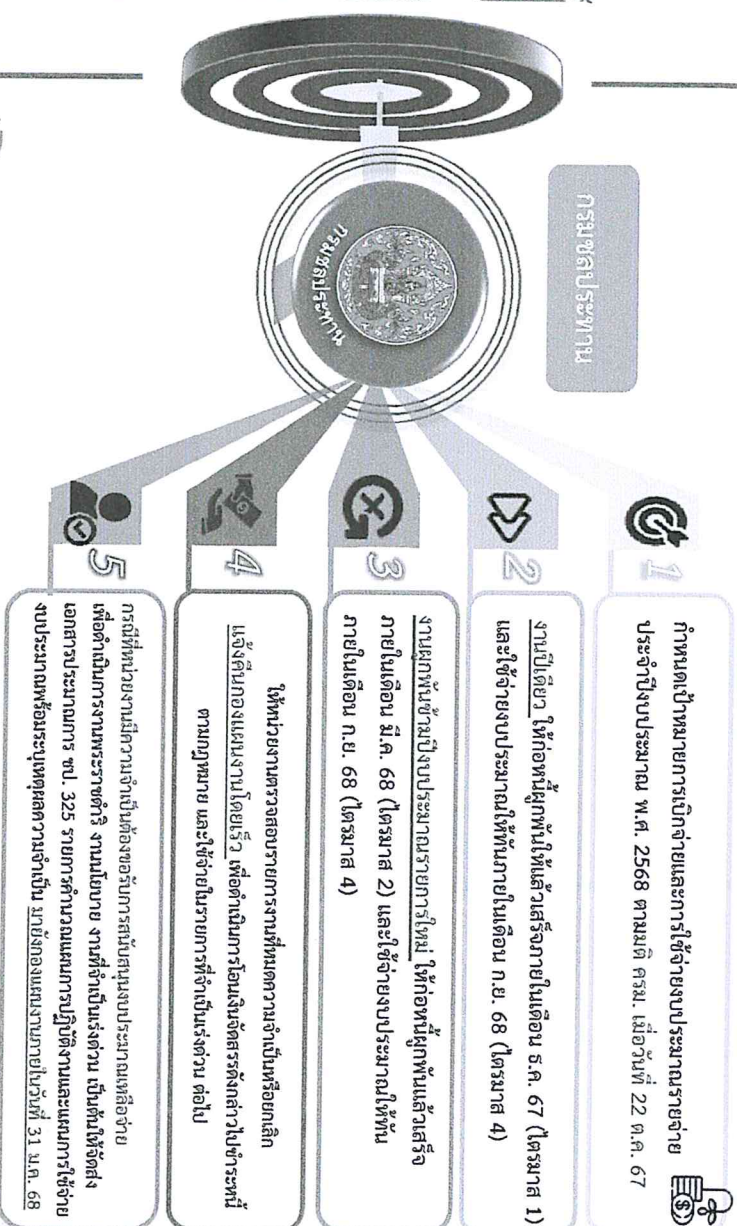

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยดำเนินการถึงประยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

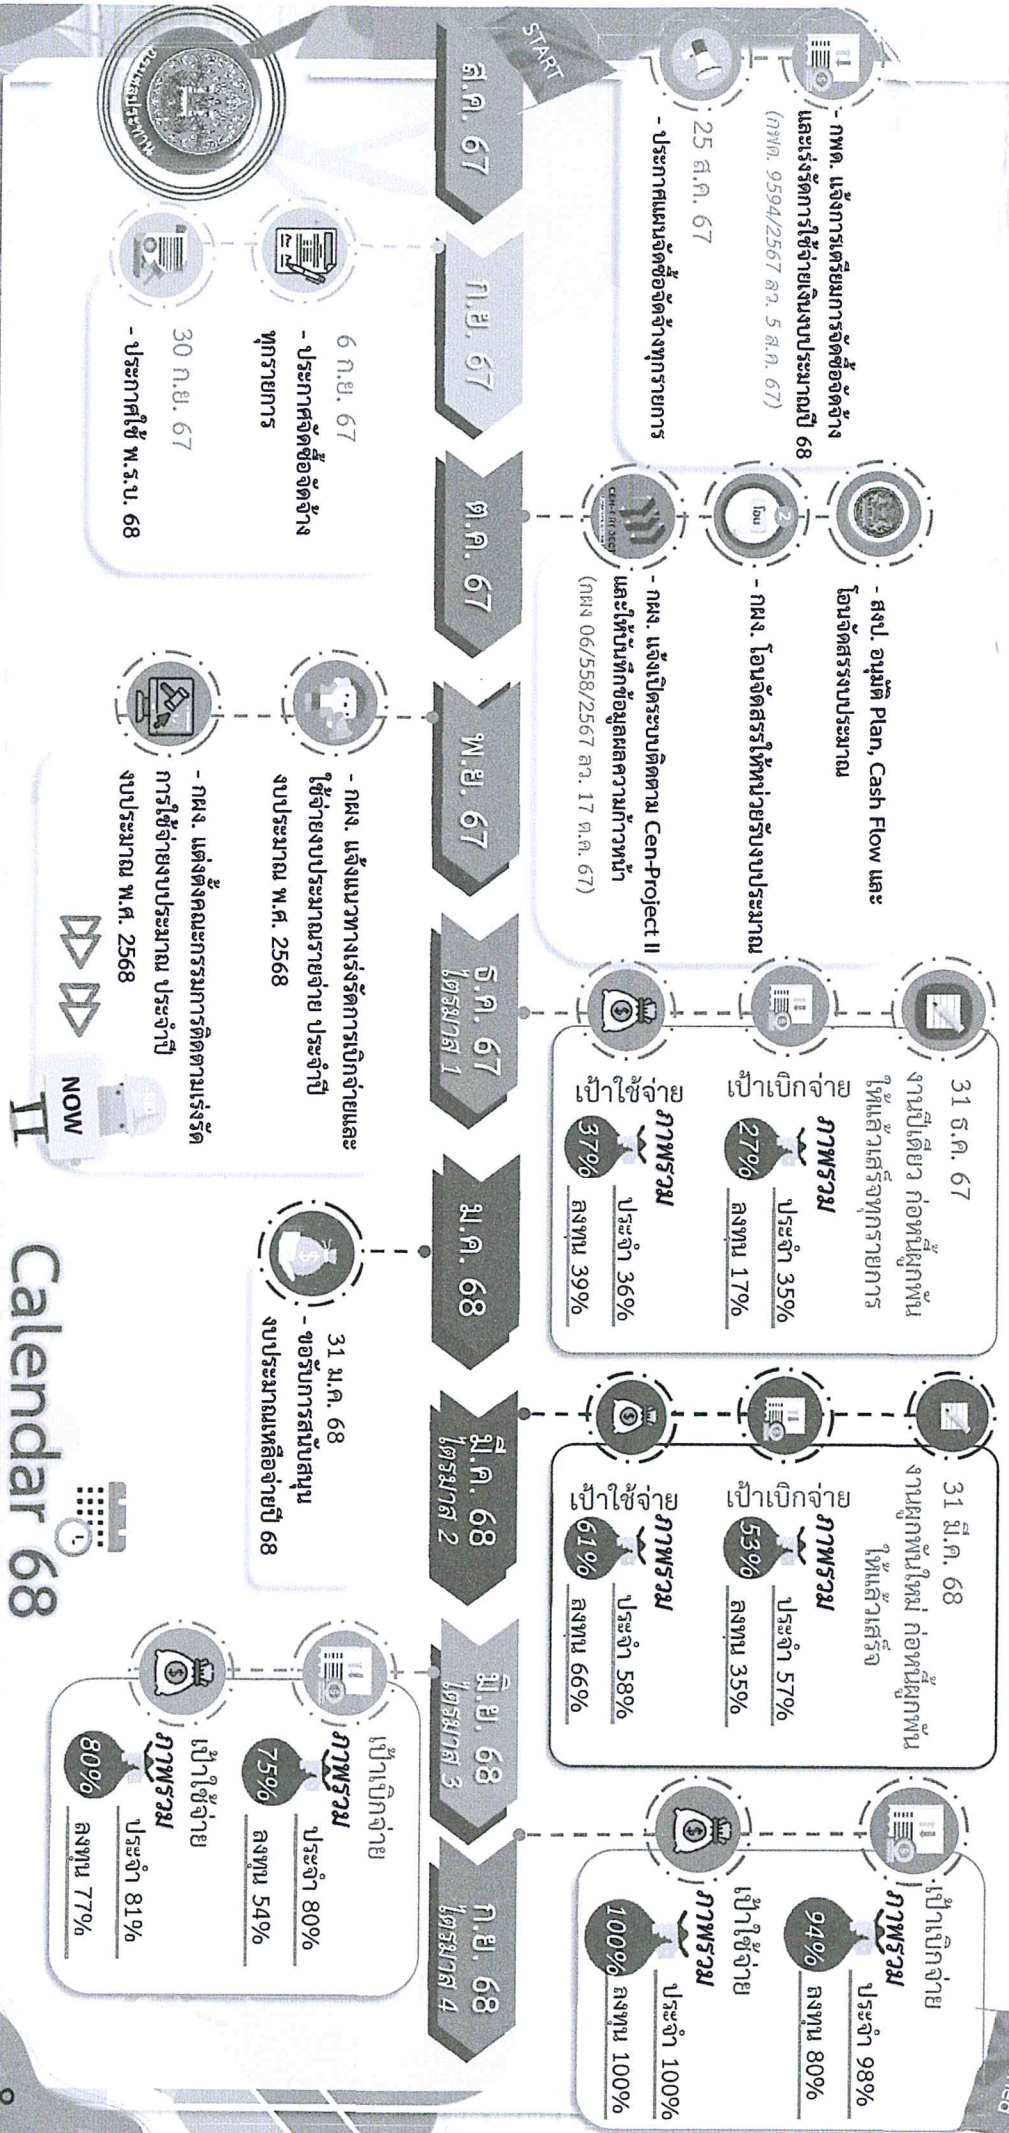

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่คณะผู้บริหาร

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่คณะผู้บริหารเหลือในปี
27,066.11 ล้านบาท



19,092.63



7,973.48

เงินกัน งบ พ.ร.บ. 67 (ล้านบาท)
19,092.63

เงินกัน งบกลาง 67 (ล้านบาท)
7,973.48

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
81,118.28 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย. 67
61,740.24 ล้านบาท
(76.11%)

งบประมาณที่เบิกเหลือในปี
19,092.63 ล้านบาท (23.54%)



กรมชลประทานเงินเบิกเหลือปี 18,775.52 ล้านบาท
หน่วยงานอื่นเงินเบิกเหลือปี 317.11 ล้านบาท

4


แผนงานบูรณาการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ
งบประมาณ 39,825.98 ล้านบาท
เบิกจ่าย 29,650.17 ล้านบาท
(74.45%)

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี
9,733.06 ล้านบาท
(24.44%)

3

แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
งบประมาณ 33,464.24 ล้านบาท
เบิกจ่าย 24,645.39 ล้านบาท
(73.65%)

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี
8,682.52 ล้านบาท
(25.95%)

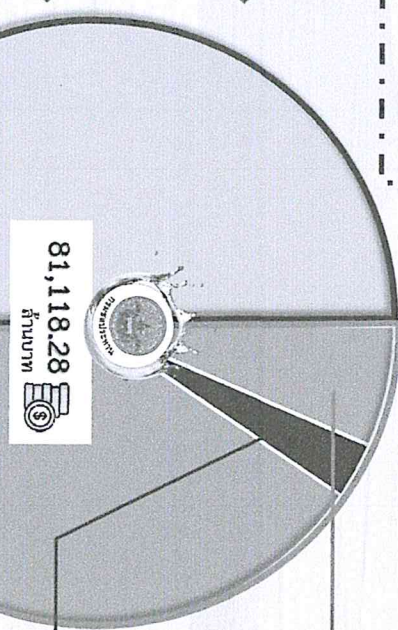

1

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบประมาณ 5,596.59 ล้านบาท
เบิกจ่าย 5,590.69 ล้านบาท
(99.89%)

2

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ 2,231.47 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1,853.99 ล้านบาท
(83.08%)

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี
359.94 ล้านบาท
(16.13%)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่คณะผู้บริหาร

ภาพรวม

งบประมาณ 9,598.92 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,595.67 ล้านบาท (16.62%)

คงเหลือ 29.77 ล้านบาท (0.31%)

เงินกู้ยืมเบิกเหลือในปี 7,973.48 ล้านบาท (83.07%)

1. งบกลางผูกเงิน

งบประมาณ 8,244.88 ล้านบาท

เบิกจ่าย 946.36 ล้านบาท (11.48%)

คงเหลือ 7.00 ล้านบาท (0.08%)

เงินกู้ยืมเบิกเหลือในปี 7,291.52 ล้านบาท (88.44%)

2. งบกลาง กปร.

งบประมาณ 1,354.04 ล้านบาท

เบิกจ่าย 649.31 ล้านบาท (47.95%)

คงเหลือ 22.77 ล้านบาท (1.69%)

เงินกู้ยืมเบิกเหลือในปี 681.96 ล้านบาท (50.36%)

สรุปงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มติ ครม.	โอนจากรัฐ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินกู้ยืมเบิกเหลือในปี
4 ธ.ค. 66	โอน 1 ครั้ง 31 ก.ค. 66	1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหาร จัดการในพื้นที่ จ.เลย	42.13	0.19	0.46%	41.94 99.54%
18 ม.ค. 67	โอน 1 ครั้ง 18 ม.ค. 66	2. เงินทดแทนค่าเสื่อมค่ารถจักรยานยนต์ แบบปรับราคาได้ (ค่าฯ)	90.34	90.34	100.00%	-
24 ม.ค. 67	โอน 1 ครั้ง 24 ม.ค. 67	3. งานขยายอู่รับซ่อมรถจักรยานยนต์ (ที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์) ใช้ถ้ำราษฎร์ใต้รับผลกระทบทงจากการก่อสร้าง โครงการของรัฐ	97.18	97.18	100.00%	-
14 พ.ค. 67	โอน 1 ครั้ง 27 ส.ค. 67	4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหาร จัดการน้ำ	99.00	-	-	99.00 100.00%
25 มิ.ย. 67	โอน 1 ครั้ง 9 ส.ค. 67	5. โครงการขุดปรับระดับพื้นที่ทางบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และ การกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568	2,018.90	318.16	15.76%	4.40 1,696.34 84.02%
2 ก.ค. 67	โอน 1 ครั้ง 18 ก.ย. 67	6. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	82.00	0.01	0.01%	81.99 99.99%
13 ส.ค. 67	โอน 2 ครั้ง 28 ส.ค. 67 13 ก.ย. 67	7. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ได้รับ ความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2567	827.38	4.79	0.58%	0.03 822.56 99.42%
13 ส.ค. 67	โอน 3 ครั้ง 28 ส.ค. 67 5 ก.ย. 67 13 ก.ย. 67	8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในเขื่อนจุฬาภรณ์และการส่งเสริม ความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค	2,409.35	75.11	3.12%	2.17 2,332.07 96.79%
30 ส.ค. 67	โอน 1 ครั้ง 30 ส.ค. 67	9. เงินทดแทนค่าเสื่อมค่ารถจักรยานยนต์ แบบปรับราคาได้ (ค่าฯ)	24.32	24.32	100.00%	-
3 ก.ย. 67	โอน 1 ครั้ง 18 ก.ย. 67	10. โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ	2,220.28	7.53	0.34%	0.40 2,212.35 99.64%
3 ก.ย. 67	โอน 1 ครั้ง 11 ก.ย. 67	11. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่าฯ)	334.00	328.73	98.42%	- 5.27 1.58%

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่กินใช้เบิกเหลือในปี



สรุปเงินคงเหลือ เงินกินใช้เบิกเหลือในปี จำนวนตามสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินงบประมาณและเงินงบกลาง)

เงินกินคงเหลือ ณ 1 ต.ค. 67
26,749.00 ล้านบาท


เบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 67 - 8 พ.ย. 67)
3,052.15 ล้านบาท = 11.41 %

เงินกินคงเหลือ ณ 8 พ.ย. 67
23,683.95 ล้านบาท = 88.54 %

พัน/สลาย PO

(บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว/จบงาน)

12.90 ล้านบาท = 0.05 %

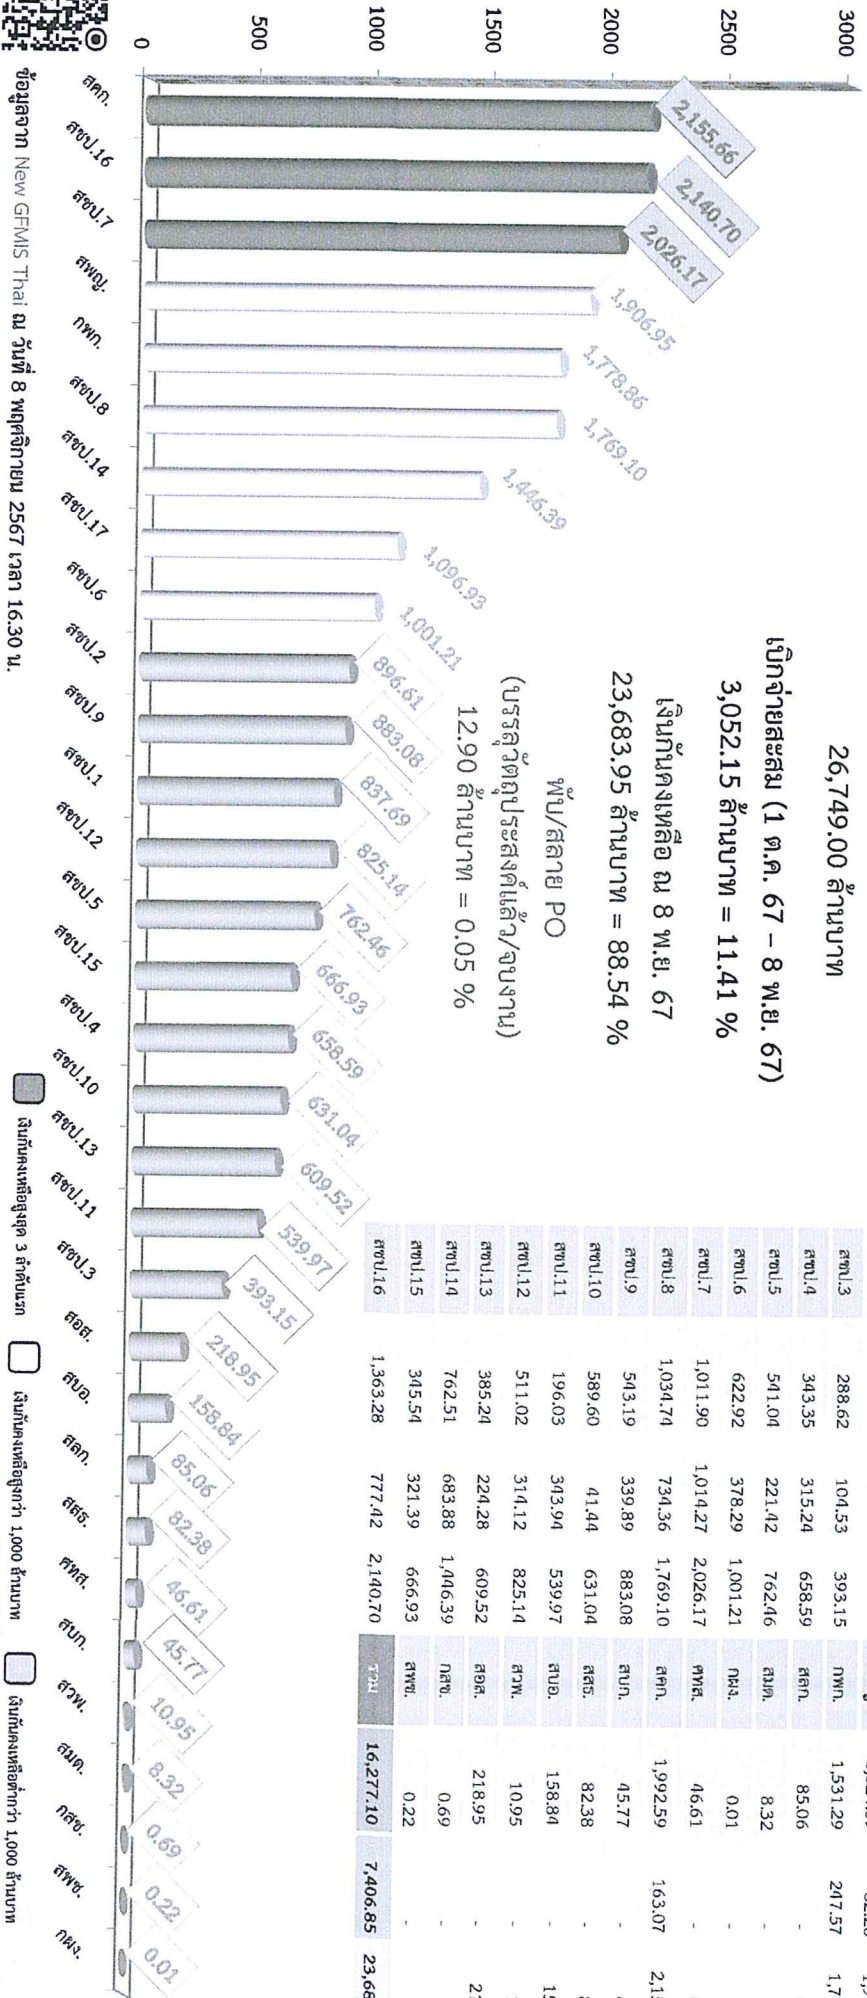

ข้อมูลจาก New GFMS Thai ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16.30 น.

เงินคงเหลือสูงสุด 3 ล้านบาท

เงินคงเหลือสูงกว่า 1,000 ล้านบาท

เงินคงเหลือต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท


กองการเงินและบัญชี สำนักควบคุมงบประมาณ โทร 02 669 5018



ผลการเบิกจ่าย เงินกู้ยืมไว้เบิกเหลือในปี จำนวนตามสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาพรวม)

หน่วยงาน	ราย	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
	ราย	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
	ราย	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
	ราย	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
	ราย	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
	ราย	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
สทช.1	2,537.23	914.61	36.05	76.92	8.41	-	837.69	689.35	189.00	27.42	30.16	15.96	-	158.84						
สทช.2	2,823.27	1,014.17	35.92	117.31	11.57	0.25	896.61	511.78	49.69	9.71	3.92	7.89	-	45.77						
สทช.3	2,304.14	470.07	20.40	76.92	16.36	-	393.15	2,959.55	2,188.57	73.95	32.91	1.50	-	2,155.66						
สทช.4	2,472.79	756.95	30.61	98.35	12.99	0.01	658.59	344.24	88.95	25.84	6.57	7.39	-	82.38						
สทช.5	4,387.35	826.39	18.84	63.93	7.74	-	762.46	606.06	234.43	38.68	15.47	6.60	-	218.95						
สทช.6	4,111.64	1,080.30	26.27	79.09	7.32	-	1,001.21	162.98	-	-	-	6.60	-	-						
สทช.7	6,556.55	2,363.67	36.05	337.50	14.28	-	2,026.17	324.96	98.70	30.37	13.63	13.81	-	-						
สทช.8	5,213.90	2,106.04	40.39	336.94	16.00	-	1,769.10	85.94	10.95	12.74	-	-	-	85.06						
สทช.9	3,342.48	1,053.37	31.51	163.52	15.52	6.77	883.08	148.91	-	-	-	-	-	10.95						
สทช.10	2,452.30	745.68	30.41	137.44	15.37	-	631.04	44.60	0.01	0.02	-	-	-	0.01						
สทช.11	2,190.07	678.44	30.98	114.64	16.02	1.03	539.97	17.64	0.22	1.25	-	-	-	0.22						
สทช.12	3,235.68	982.50	30.36	157.36	16.02	-	825.14	148.73	51.28	34.48	4.67	9.11	-	46.61						
สทช.13	2,678.92	705.42	26.33	95.90	13.59	-	609.52	39.29	0.01	0.03	0.01	1.00	-	-						
สทช.14	3,404.53	1,527.17	44.86	80.42	5.27	0.36	1,446.39	10.17	0.69	6.78	-	-	-	0.69						
สทช.15	2,028.25	771.34	38.03	103.61	13.43	0.80	666.93	78.67	-	-	-	-	-	-						
สทช.16	3,903.65	2,363.11	60.54	218.95	9.27	3.46	2,140.70	10.47	-	-	-	-	-	-						
สทช.17	2,242.35	1,213.00	54.10	116.07	9.57	-	1,096.93	13.82	-	-	-	-	-	-						
สทช.18	12,146.53	2,299.70	18.93	392.55	17.07	0.20	1,906.95	6.39	-	-	-	-	-	-						
สทช.19	15,556.98	1,956.25	12.57	177.39	9.07	-	1,778.86	641.33	317.11	49.45	-	-	-	317.11						
รวม	192,236	8,32	4.33	-	-	-	8.32	90,717.20	27,066.11	29.84	3,032.15	11.28	-	12,90	24,001.06					

ร้อยละ

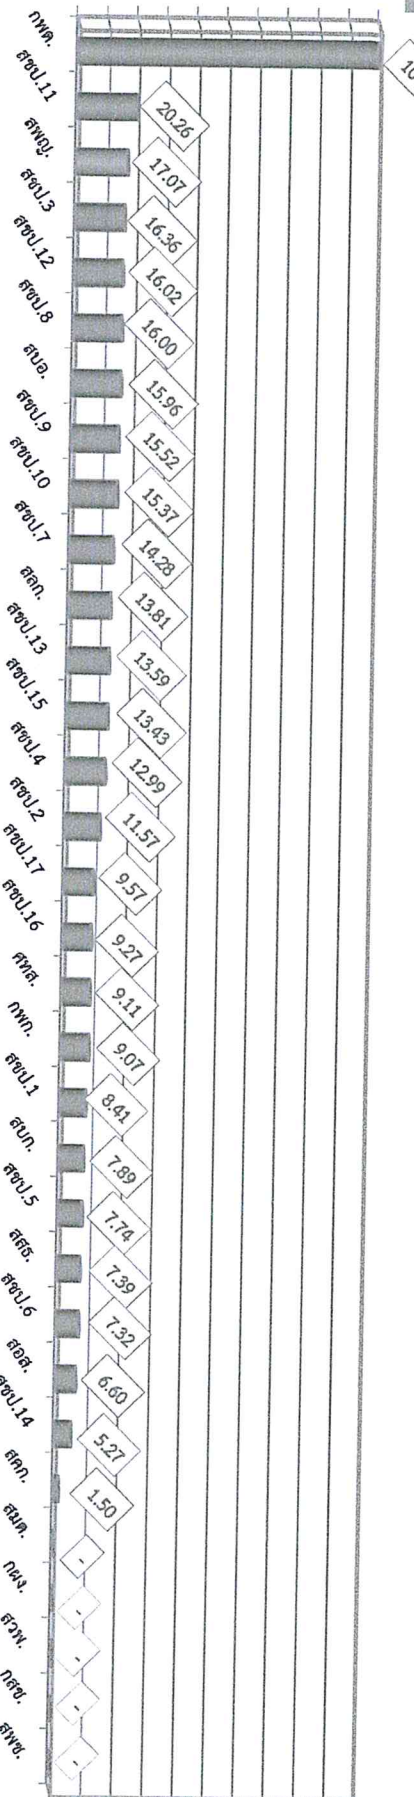

ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567
เวลา 16.30 น.

ข้อมูลจำแนกตาม
สำนัก/กอง

- ผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก
- ผลการเบิกจ่าย



ผลการเบิกจ่าย เงินกู้ยืมวีเบ็กเหลือณปี จำนวนตามสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ)


หน่วยงาน	เงินงบประมาณ รวมปีงบประมาณ	เงินที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย เงินบาท	ร้อยละ เงินบาท	เงินที่ ค้างจ่าย ล้านบาท	หัก/จ่าย PO (ล้านบาท)	เงินที่ คงเหลือ (ล้านบาท)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ รวมปีงบประมาณ	เงินที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย เงินบาท	ร้อยละ เงินบาท	เงินที่ ค้างจ่าย ล้านบาท	หัก/จ่าย PO (ล้านบาท)	เงินที่ คงเหลือ (ล้านบาท)
สขบ.1	1,950,008	479,900	24.61	66,222	13.80	1,380	-	413,688	สขบ.	689,350	189,000	27.42	30,116	15.96	1,388,844	0.01	85,066
สขบ.2	2,501,153	741,866	29.66	103,344	13.93	0.25	288,622	832,271	สขบ.	511,778	49,619	9.71	3,922	7.89	45,777	-	46,601
สขบ.3	2,192,241	360,995	16.46	72,333	20.04	13.36	343.35	2,797,888	สขบ.	2,797,888	2,017,778	72.12	25,119	1.25	1,992,599	-	1,992,599
สขบ.4	2,032,279	996,311	19.50	52,966	8.60	541,044	-	541,044	สขบ.	3,944,244	888,955	22.54	6,577	7.39	82,388	-	82,388
สขบ.5	3,902,071	591,966	15.17	50,922	7.53	622,922	-	622,922	สขบ.	606,066	234,433	38.88	15,477	6.00	218,955	-	218,955
สขบ.6	3,671,866	673,655	18.35	50,733	19.66	1,011,900	-	622,922	สขบ.	1,62,988	98,700	30.37	13,633	13.81	0.01	0.01	85,066
สขบ.7	5,313,900	1,259,588	23.70	247,688	20.06	1,034,714	-	589,600	สขบ.	324,966	98,700	12.74	0.02	0.02	10,955	-	10,955
สขบ.8	4,300,411	1,294,399	30.10	259,655	13.64	589,600	6.77	589,600	สขบ.	85,944	10,955	12.74	0.02	0.02	0.01	0.01	85,066
สขบ.9	2,852,202	636,844	22.33	86,888	15.58	503,199	-	589,600	สขบ.	148,911	0.01	0.02	1.25	4.67	0.22	0.22	0.01
สขบ.10	2,379,811	698,400	29.35	108,800	17.98	196,033	-	196,033	สขบ.	44,600	0.01	0.02	34.48	4.67	9.11	9.11	46,611
สขบ.11	1,755,000	315,544	17.98	118,488	20.66	511,022	-	511,022	สขบ.	148,733	51,288	0.03	0.03	0.01	100	-	100
สขบ.12	2,890,711	644,111	22.29	133,099	15.55	385,244	-	385,244	สขบ.	39,299	0.01	6.78	0.01	0.01	0.69	-	0.69
สขบ.13	2,389,455	456,155	19.09	70,911	7.87	762,511	0.36	762,511	สขบ.	10,117	0.69	6.78	0.01	0.01	0.69	-	0.69
สขบ.14	2,682,275	828,055	30.87	65,188	16.78	345,544	0.80	345,544	สขบ.	78,677	-	-	-	-	-	-	-
สขบ.15	1,637,671	416,171	25.41	69,833	12.49	679,800	3.46	679,800	สขบ.	10,477	-	-	-	-	-	-	-
สขบ.16	3,080,800	1,561,788	50.69	195,044	11.89	1,824,699	13.82	1,824,699	สขบ.	13,822	-	-	-	-	-	-	-
สขบ.17	1,761,688	771,511	43.79	91,711	17.53	1,351,299	0.20	1,351,299	สขบ.	641,333	317,111	49.45	23,544	13.02	1,289	-	317,111
สขบ.18	11,698,233	2,212,800	18.92	387,911	9.15	8,322	-	8,322	สขบ.	91,555	317,111	49.45	2,485,533	13,022	12,899	-	16,594,211
สขบ.19	15,198,116	1,685,544	11.09	154,255	-	-	-	-	สขบ.	81,118,288	19,092,633	23.54	2,485,533	13,022	12,899	-	16,594,211
สขบ.20	192,366	8,322	4.33	-	-	-	-	-	สขบ.	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	43,822,222	10,333,333	23.57	1,333,333	13.02	31,488,889	12,899	31,488,889	รวม	81,118,288	19,092,633	23.54	2,485,533	13,022	12,899	-	16,594,211



ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567
เวลา 16:30 น.

ข้อมูลจำนวนตาม
สำนัก/กอง

- ผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก
- ผลการเบิกจ่าย

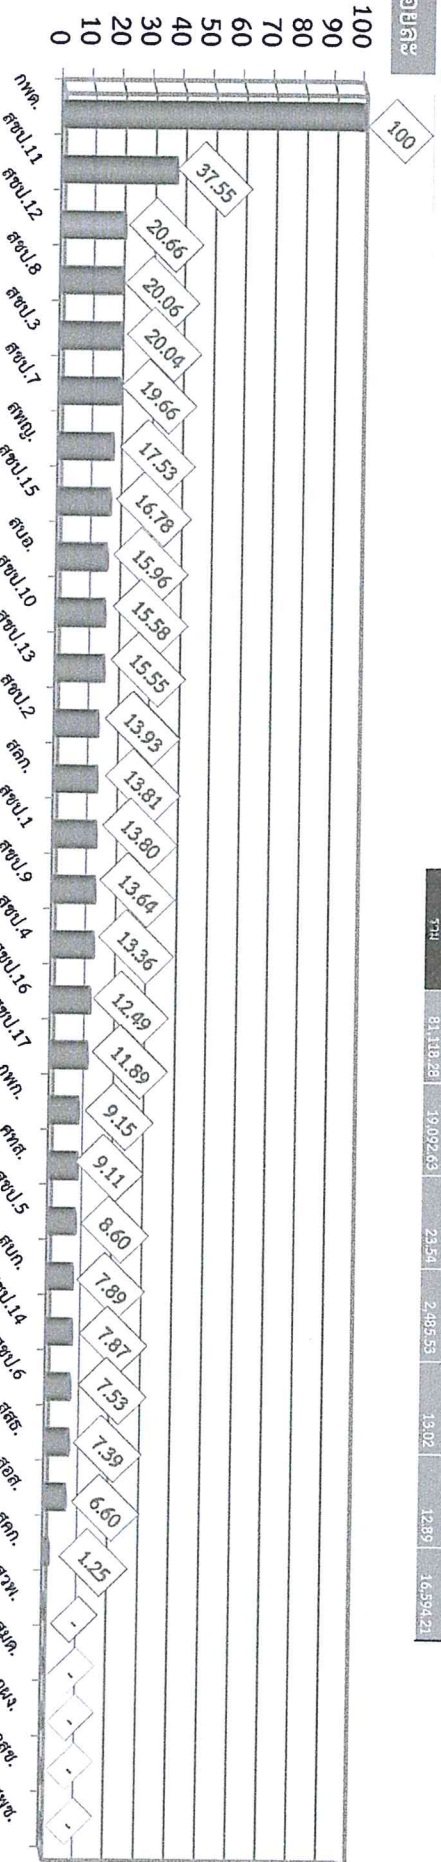



ผลการเบิกจ่าย เงินกู้ยืมไว้เบิกเหลือมีปี จำนวนตามสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จบกลาง)

หน่วยงาน	ที่ตั้งกอง รอบของพัสดุ	เงินที่นำ (ล้านบาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย เงินที่นำ (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	พหุ/สูญ PO (ล้านบาท)	เงินที่นำ คงเหลือ (ล้านบาท)	หน่วยงาน		เงินที่นำ รวมของพัสดุ (ล้านบาท)	เงินที่นำ (ล้านบาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย เงินที่นำ (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	พหุ/สูญ PO (ล้านบาท)	เงินที่นำ คงเหลือ (ล้านบาท)
								สำนัก	กอง							
สพป.1		587.15	74.04	10.70	2.46	-	424.01	สพป.11	435.07	362.90	83.41	18.96	5.22	-	343.94	
สพป.2		321.74	272.31	84.64	5.13	-	258.34	สพป.12	384.97	338.39	87.90	24.27	7.17	-	314.12	
สพป.3		111.90	109.12	97.52	4.21	-	104.53	สพป.13	289.47	249.27	86.11	24.99	10.03	-	224.28	
สพป.4		440.00	360.64	81.96	12.59	0.01	315.24	สพป.14	721.78	699.12	96.86	15.24	2.18	-	683.88	
สพป.5		485.28	234.43	48.31	5.55	-	221.42	สพป.15	390.58	355.17	90.93	33.78	9.51	-	321.39	
สพป.6		439.78	406.65	92.47	6.97	-	378.29	สพป.16	822.85	801.33	97.38	23.91	2.98	-	777.42	
สพป.7		1,242.65	1,104.09	88.85	8.14	-	1,014.27	สพป.17	480.67	441.49	91.85	24.36	5.52	-	417.13	
สพป.8		913.49	811.65	88.85	9.52	-	734.36	สพป.18	448.10	86.90	19.39	4.64	5.34	-	82.26	
สพป.9		490.46	416.53	84.93	18.40	-	339.89	สพป.19	358.82	270.71	75.44	23.14	8.55	-	247.57	
สพป.10		72.49	47.28	65.22	12.35	-	41.44	สพป.20	161.67	170.79	105.64	7.72	4.52	-	163.07	
รวม		9,598.92	7,973.48	83.07	566.62	7.11	7,406.85	รวม	9,598.92	7,973.48	83.07	566.62	7.11	0.01	7,406.85	




ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567
เวลา 16.30 น.

ข้อมูลจำนวนตาม
สำนัก/กอง

- ผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก
- ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ

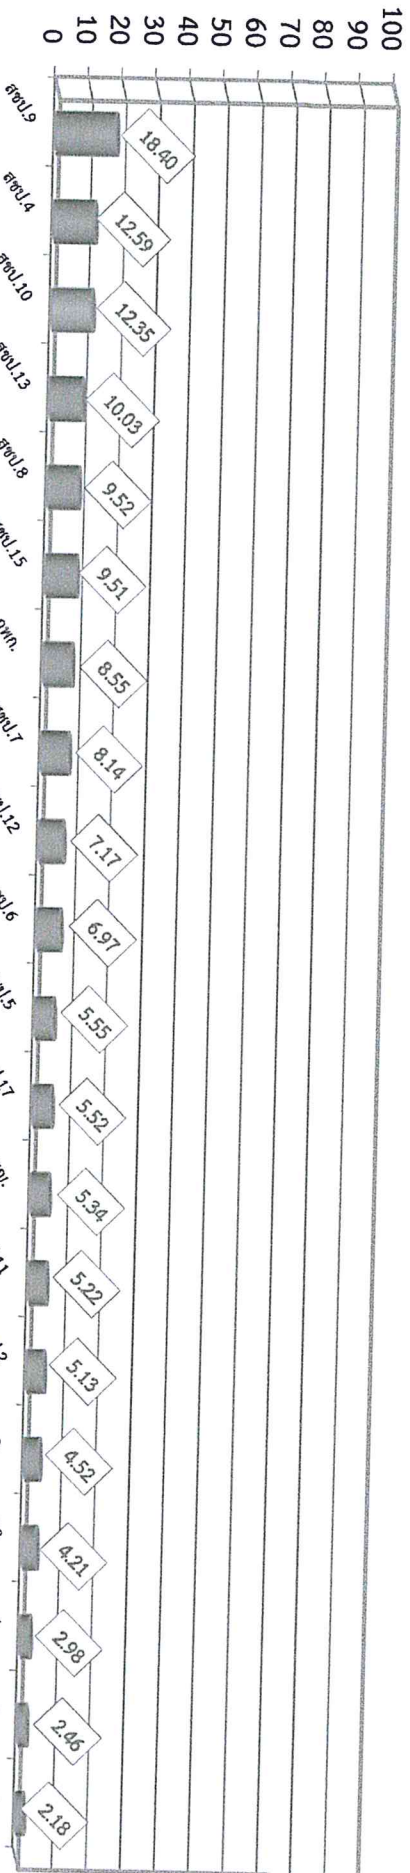

สถค. : มีการโอนเงินตามใบเบิกเหลือมีปีซ้ำสำนักเครื่องจักรกล (0700300012) จำนวน 10.31 ลบ. หลังจากได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมไว้เบิกเหลือมีปี

ระเบียบวารสารที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คนไว้เบิกเหลือมีปี
ค่าสาธารณูปโภคที่ถูกพิบ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

เลขสำรของเงิน	หน่วยงาน ออกรายงาน	หน่วยงาน (บาท)	เงินกั้น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ถูกพิบ (บาท)
รวมทั้งสิ้น					
CK00003492	สชป.1	ศูนย์ศึกษา ท้ายห้องไคร้ฮันเนื่องมาจากพระราชดำริ	21,356,005	18,643,974	2,712,031
CK00003528	สชป.5	ศูนย์ศึกษา ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	754,094	696,113	57,981
CK00003538	สชป.6	สำนักงานชลประทานที่ 6	760,693	755,855	4,838
CK00003526	สชป.6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	2,862,508	2,697,344	165,164
CK00003543	สชป.6	โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	256,497	203,442	53,055
CK00003414	สชป.7	สำนักงานชลประทานที่ 7	382,928	165,530	217,398
CK00003554	สชป.7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาสำมน้ำชีตอนล่าง (อุบลฯ)	1,346,009	1,344,938	1,071
CK00003580	สชป.7	โครงการชลประทานยโสธร	420,969	301,605	119,364
CK00003552	สชป.7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	67,275	61,665	5,610
CK00003547	สชป.7	โครงการชลประทานนครพนม	222,521		222,521
CK00003546	สชป.8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (นครราชสีมา)	1,976,643	1,976,363	281
CK00003541	สชป.9	โครงการชลประทานชลบุรี	760,893	760,061	832
CK00003558	สชป.9	โครงการชลประทานชลบุรี	1,099,865	1,080,397	19,468
CK00003569	สชป.9	โครงการชลประทานจันทบุรี	315,791	287,141	28,650
CK00003571	สชป.9	โครงการชลประทานตราด	347,331	335,460	11,870
CK00008190	สชป.9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยอดศรีโขง (ฉะเชิงเทรา)	152,386	149,070	3,316
	สชป.9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยอดศรีโขง (ฉะเชิงเทรา)	1,015,180	873,957	141,223

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กั้นไว้เบิกเหลือเป็น
ค่าสาธารณูปโภคที่ถูกพบ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

เลขสำรอนเงิน	หน่วยงาน ออกรายงาน	หน่วยงาน (บาท)	เงินกั้น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ถูกพบ (บาท)
CK00003565	สชป.9	โครงการชลประทานสระแก้ว	187,300	171,300	16,000
CK00008193	สชป.11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (ปทุมธานี)	954,296		954,296
CK00003617	สชป.12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	1,479,306	1,478,110	1,196
CK00003610	สชป.13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	347,245	333,937	13,309
CK00003612	สชป.13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (กาญจนบุรี)	199,555	179,983	19,572
CK00003609	สชป.13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง (กาญจนบุรี)	2,533,364	2,420,093	113,271
CK00003592	สชป.12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	97,318	49,775	47,543
CK00003591	สชป.12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา(สุพรรณบุรี)	133,845	133,632	213
CK00003620	สชป.13	โครงการชลประทานนครปฐม	160,952	86,248	74,704
CK00003619	สชป.13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (นครปฐม)	330,739	155,788	174,952
CK00003628	สชป.15	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8 (สำนักงานชลประทานที่ 15)	97,739	93,939	3,800
CK00003588	สชป.16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าซiedad (พิจิตร)	69,945	67,217	2,728
CK00003635	กพท.	สำนักงานชลประทานก่อสร้างขนาดกลาง ที่ 6	140,000	96,334	43,666
CK00003640	กพท.	สำนักงานชลประทานก่อสร้างขนาดกลาง ที่ 8	308,013	291,535	16,478
CK00003641	กพท.	สำนักงานชลประทานก่อสร้างขนาดกลาง ที่ 9	250,216	247,216	3,000
CK00003638	กพท.	สำนักงานชลประทานก่อสร้างขนาดกลาง ที่ 13	1,324,588	1,149,926	174,662

ระเบียบวารสารที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.2 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณ พ.ศ. 2568
82,746.72 ล้านบาท


งบ พ.ร.บ. 68 (ล้านบาท)
82,746.72

งบกลาง 68 (ล้านบาท)
-

งบประมาณตาม พ.ร.บ. 68
82,746.72 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 8 พ.ย. 67
2,997.58 ล้านบาท (3.62%)

ผลการใช้จ่าย ณ วันที่ 8 พ.ย. 67
13,189.51 ล้านบาท (15.94%)

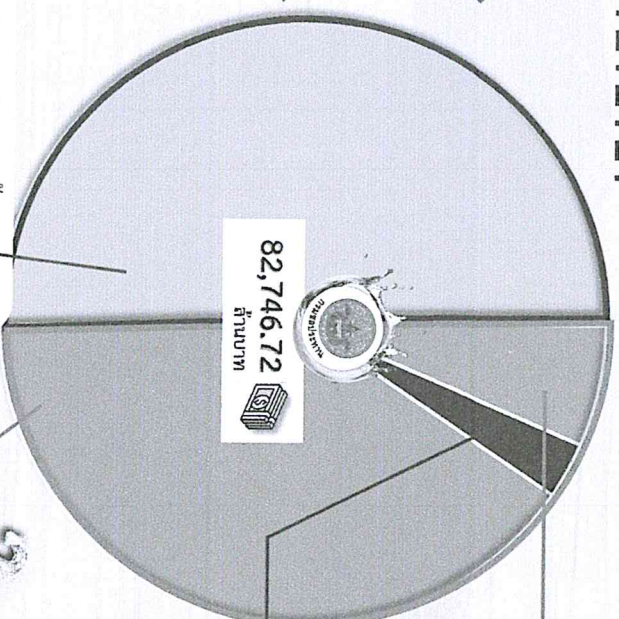

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบประมาณ 5,393.21 ล้านบาท
เบิกจ่าย 756.42 ล้านบาท (14.03%)

2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ 1,859.85 ล้านบาท
เบิกจ่าย 64.44 ล้านบาท (3.46%)
ใช้จ่าย 195.73 ล้านบาท (10.52%)

3 แผนงานยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรน้ำ
งบประมาณ 33,618.90 ล้านบาท
เบิกจ่าย 940.14 ล้านบาท (2.80%)
ใช้จ่าย 2,499.59 ล้านบาท (7.44%)

4 แผนงานบูรณาการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ
งบประมาณ 41,874.76 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1,236.58 ล้านบาท (2.95%)
ใช้จ่าย 9,737.76 ล้านบาท (23.25%)

เป้าเบิกจ่าย
ภาพรวม: 35% (สงวน 17%)
ภาพรวม: 36% (สงวน 39%)



วาระที่ 4.2

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบลงทุน)

ผู้นำเสนอ : กองพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2568 (จบลงทุน)

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.30 น.

ภาพรวม 57.50%

รายการ	วงเงิน	คิดเป็น %
(1) วงเงินจัดทำทั้งหมด	59,581,311,428.38	100.00%
(2) ค่าเงินการจัดหาแล้ว	34,257,258,234.39	57.50%
(3) ยังไม่ดำเนินการ	25,324,053,193.99	42.50%
(3.1) e-bid / คัดเลือก	14,756,004,147.98	24.77%
(3.2) เจริญจง	10,568,049,046.01	17.73%
(4) วงเงินจัดหาที่อนุมัติรับราคาลแล้ว	14,082,711,627.83	23.64%
(5) ผลการอนุมัติรับราคา (ผลจัดหา)	12,833,171,219.37	21.54%
(6) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	20,174,546,606.56	33.86%
(7) วงเงินจัดหา (ลงนามสัญญา)	4,476,708,626.79	7.51%
(8) มูลค่าสัญญา (ลงนามแล้ว)	4,255,020,682.60	7.14%
(9) วงเงินจัดหา (รอลงนามสัญญา)	9,606,003,001.04	16.12%
(10) มูลค่าสัญญา (รอลงนามสัญญา)	8,578,150,536.77	14.40%

สัญญา	วงเงิน (บาท)	รับราคา (%)	จำนวน สัญญา (%)	มูลค่าสัญญา
รวม.	58.59	31.94	8.44	32.99
สนบ.	41.57	17.66	16.74	46.43
สนบ.15	88.25	59.06	4.10	50.47
สนบ.15	76.03	38.41	18.00	41.16
สนบ.17	71.72	21.17	2.11	31.86
สนบ.9	65.19	33.45	6.05	34.90
สนบ.3	64.94	14.63	11.16	16.94
สนบ.17	64.02	58.26	6.42	42.90
สนบ.16	63.26	39.82	13.12	38.73
สนบ.16	63.54	33.89	6.68	34.70
สนบ.1	61.38	51.42	15.40	42.73
สนบ.7	59.50	17.59	4.45	27.18
สนบ.8	56.62	31.74	12.07	33.48
สนบ.7	52.13	17.17	9.14	11.74
สนบ.14	48.18	23.06	2.38	21.54
สนบ.13	42.48	26.87	4.73	24.69
สนบ.4	37.04	75.47	6.77	71.14
สนบ.10	32.31	22.17	5.66	20.05
สนบ.11	17.44	17.07	7.27	13.92
รวม.	17.44	17.44	5.77	11.19
สนบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
สนบ.	44.71	4.14	1.04	11.11
สนบ.	100.00	0.00	0.00	33.33
สนบ.	71.30	46.10	12.17	43.19
สนบ.	47.04	0.00	0.00	11.64
สนบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
สนบ.	54.12	13.81	6.64	24.86
สนบ.	71.44	77.46	11.11	17.47
สนบ.	64.32	50.33	46.16	53.61
สนบ.	31.91	4.01	0.75	12.23
รวม.	11.11	5.14	2.17	11.11
รวม.	57.50	23.64	7.51	29.55

ไม่ทันขอบแผน 807 รก.

สัญญา/กอง	รายการ	วงเงินงบประมาณ
สนบ.1	106	66,792,650.00
สนบ.2	5	5,863,800.00
สนบ.3	10	6,919,500.00
สนบ.4	20	147,768,300.00
สนบ.5	4	1,664,400.00
สนบ.6	10	14,799,650.00
สนบ.7	43	125,488,140.00
สนบ.8	21	82,735,500.00
สนบ.9	25	250,862,000.00
สนบ.10	97	204,397,800.00
สนบ.11	58	153,905,000.00
สนบ.12	107	9,550,700.00
สนบ.13	37	73,905,400.00
สนบ.14	41	262,594,800.00
สนบ.15	2	2,280,800.00
สนบ.16	8	120,811,200.00
สนบ.17	15	71,132,240.00
สนบ.	6	10,166,000.00
สนบ.	14	34,800,000.00
สนบ.	1	81,000.00
สนบ.	5	637,300.00
สนบ.	94	351,134,900.00
สนบ.	1	40,000,000.00
สนบ.	2	57,420,000.00
สนบ.	51	184,900,571.49
สนบ.	2	5,450,000.00
สนบ.	22	2,455,828,800.00
รวม.	807	4,741,890,451.49

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ PWS ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.30 น.

กองพัสดุ กรมชลประทาน

ROOM7_รายงานความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องจักร ปรุเจาะฝังปรุปรุขนาด พ.ศ. 2568
 ข้อมูลจากระบบ PMS ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15:30 น.
 งบลงทุน (ค่าฝักรับ) สัญญา (6811320) และอุปกรณ์ (6811310)

ลำดับ	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	(1)			(11)			(11)			(11)			(14)			[(10)/(11)] [(12)/(11)] [(13)/(11)]			(364743)		ลำดับ		
			จำนวน	หน่วย	มูลค่า	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน		งบลงทุน	งบลงทุน
1	0100	12687	33,001.62	1833.86	20,761	19,335,673.02	9,648,649.80	58.59	31.94	8.44	32.99														
2	0200	124	345,248,644.30	84	315,979,438.00	112,769,138.00	111,506,050.60	58.59	31.94	8.44	32.99														
3	0300	504	1,191,091,938.19	695	1,051,116,999.94	703,457,771.59	626,584,329.67	58.59	31.94	8.44	32.99														
4	0400	608	2,594,119,674.74	1,443	1,972,312,389.95	997,193,835.19	917,269,844.40	58.59	31.94	8.44	32.99														
5	0500	1,241	2,361,606,349.29	921	1,691,696,914.95	506,939,469.84	449,562,626.16	58.59	31.94	8.44	32.99														
6	0600	1,203	1,790,848,424.88	1,613	1,167,749,397.47	599,008,101.95	565,498,076.24	58.59	31.94	8.44	32.99														
7	0700	540	1,478,184,129.88	892	960,460,353.77	511,856,964.05	447,672,670.47	58.59	31.94	8.44	32.99														
8	0800	293	1,259,331,243.35	353	806,171,241.58	733,711,768.45	688,219,855.44	58.59	31.94	8.44	32.99														
9	0900	760	3,300,401,449.00	2,107	2,087,882,339.36	1,314,333,177.92	1,215,884,952.11	58.59	31.94	8.44	32.99														
10	1000	480	2,126,019,321.09	599	1,350,978,014.46	720,592,965.00	682,158,055.73	58.59	31.94	8.44	32.99														
11	1100	548	1,177,983,442.09	1,595	722,992,630.21	605,666,810.74	569,364,867.74	58.59	31.94	8.44	32.99														
12	1200	790	3,743,407,311.90	1,295	2,227,761,401.48	658,535,634.58	576,137,799.36	58.59	31.94	8.44	32.99														
13	1300	991	2,907,423,264.22	2,244	1,646,218,960.27	922,955,645.61	863,132,566.37	58.59	31.94	8.44	32.99														
14	1400	565	1,674,806,518.00	1,479	876,409,781.65	511,327,980.21	499,036,865.51	58.59	31.94	8.44	32.99														
15	1500	424	1,708,148,701.08	707	822,939,132.51	375,325,706.56	375,325,706.56	58.59	31.94	8.44	32.99														
16	1600	1,385	1,080,096,466.05	1,264	428,817,101.73	252,650,878.58	252,650,878.58	58.59	31.94	8.44	32.99														
17	1700	749	1,606,132,953.60	1,476	514,639,303.39	372,787,188.68	372,787,188.68	58.59	31.94	8.44	32.99														
18	1800	1/4	1,329,088,805.43	801	429,480,467.56	294,606,329.93	219,415,011.74	58.59	31.94	8.44	32.99														
19	1900	708	1,327,903,306.97	1,193	231,162,571.54	226,647,772.79	217,482,345.17	58.59	31.94	8.44	32.99														
20	2000	19	5,678,852.66	10	990,766.00	990,766.00	990,766.00	58.59	31.94	8.44	32.99														
21	2100	17	5,598,000.00	10	990,766.00	990,766.00	990,766.00	58.59	31.94	8.44	32.99														
22	2200	2	80,852.66	0	0.00	0.00	0.00	58.59	31.94	8.44	32.99														
23	2300	172	1,342,393,356.20	57	1,264,665,902.69	55,516,955.19	54,888,495.19	58.59	31.94	8.44	32.99														
24	2400	21	678,800,000.00	21	678,800,000.00	0.00	0.00	58.59	31.94	8.44	32.99														
25	2500	130	120,496,618.20	28	85,866,902.69	55,516,955.19	54,888,495.19	58.59	31.94	8.44	32.99														
26	2600	11	543,000,000.00	8	500,000,000.00	0.00	0.00	58.59	31.94	8.44	32.99														
27	2700	10	156,750.00	0	0.00	0.00	0.00	58.59	31.94	8.44	32.99														
28	2800	678	75,231,617,333.56	1,504	13,655,427,536.08	3,494,167,009.71	3,178,647,157.55	58.59	31.94	8.44	32.99														
29	2900	154	12,644,737,863.60	789	9,918,293,483.26	2,840,455,425.42	2,558,871,671.39	58.59	31.94	8.44	32.99														
30	3000	50	231,464,105.26	93	148,886,986.67	156,504,598.72	109,610,432.78	58.59	31.94	8.44	32.99														
31	3100	178	9,780,768,118.80	269	3,121,479,930.24	394,941,131.86	347,619,693.54	58.59	31.94	8.44	32.99														
32	3200	296	2,574,647,086.00	553	467,317,135.91	132,265,653.21	112,540,399.94	58.59	31.94	8.44	32.99														
33	3300	13,556	59,581,311,428.38	22,332	34,257,258,234.39	14,082,711,627.83	12,853,171,219.37	58.59	31.94	8.44	32.99														

ความก้าวหน้าการลดข้อขัดข้อง

การลดข้อขัดข้องอำนาจกรม

110 รก./ผย. **19,364,404,881.03**
 งบ 68 : 7,825,436,753.14
 ผูกพัน (69-71) : 11,496,636,000.00

วิธีลดททา


☐	จ้างก่อสร้าง	(41)	14,777,449,800.00
☐	จ้างทำของ	(5)	386,313,250.00
☐	งานซื้อ	(25)	2,884,791,831.03
☐	จ้างที่ปรึกษา	(29)	772,850,000.00
☐	จ้างออกแบบ	(10)	543,000,000.00

อำนาจอนุมัติส่งข้อลงจ้าง

>	อำนาจกรม	55
>	อำนาจปลัดกระทรวง	55

หน่วยงานเจ้าของงาน

สำนัก/กอง	จำนวน	วงเงินลดททา
กพท.	25	7,330,056,121.03
สศค.	11	1,728,088,000.00
สพญ.	11	6,196,152,100.00
สชป.3	2	263,420,800.00
สชป.6	1	430,000,000.00
สชป.7	1	78,360,000.00
สชป.9	5	386,113,250.00
สชป.10	1	119,919,610.00
สชป.11	3	425,540,000.00
สชป.12	3	638,784,000.00
สชป.13	1	93,400,000.00
สชป.16	4	212,285,000.00
สชป.17	3	146,436,000.00
สชอ.	8	94,050,000.00
สทบ.	21	678,800,000.00
สอ.ส.	10	543,000,000.00
ผลรวม	110	19,364,404,881.03

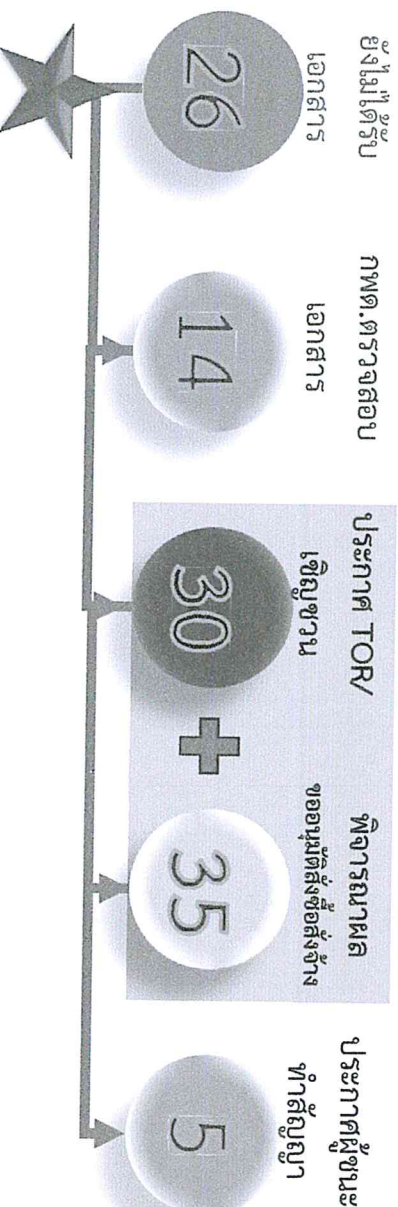

รายการงานอำนาจกรม ที่ยังไม่ส่งให้กองพัสดุดำเนินการ

1	จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณกำแพงถนนกำแพงนคร (คลอง 3L-RWC กม.9+729 ถึง 18+068) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	สขป.6	คณ.เหมืองทราย	วิธี e-bidding	430,000,000.00
2	จ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งเขาดินนา(เดิม) และอาคารประกอบ แขวงตลิ่งเขาดินนา กรุงเทพมหานคร	สขป.11	คส.ขป.11	วิธีคัดเลือก	84,140,000.00
3	จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณแก้มลิงคลองเปรม ประชากร และระบบหมุนเวียนน้ำ พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) แขวงตลิ่งเขาดินนา กรุงเทพมหานคร	สขป.11	คส.ขป.11	วิธีคัดเลือก	180,000,000.00
4	จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ประตูคลองลัดโพธิ์ฝั่งซ้าย ระยะ 150 เมตร ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	สขป.11	คณ.สมุทรปราการ	วิธี e-bidding	161,400,000.00
5	จ้างก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายสายใหญ่คลองแม่สนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	สขป.16	คณ.สตูล	วิธีคัดเลือก	76,658,000.00
6	จ้างก่อสร้างฝายคลองพนาดี ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	สขป.16	คณ.สตูล	วิธีคัดเลือก	37,346,000.00
7	จ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองระบายน้ำคลองตาน บ้านใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพรอน อำเภอดงรัก จังหวัดมหาสารคาม	สขป.17	คณ.โก-ลก	วิธีคัดเลือก	68,796,000.00
8	จ้างก่อสร้างอาคารระบบน้ำฉุกเฉิน (Emergency spillway) พร้อมอาคารประกอบ ปากคลองระบายน้ำหมู่โนะ ต.บ้านคูโนะ อ.แก่งเสือเหียงโก-ลก จ.มหาสารคาม	สขป.17	คณ.โก-ลก	วิธีคัดเลือก	49,140,000.00
9	งานก่อสร้างฝายท้ายใต้รับและอาคารประกอบ โครงการฝายท้ายใต้รับบัว จังหวัดกำแพงเพชร	สพญ.4	สพญ.4	วิธี e-bidding	982,000,000.00
10	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำ แห่งที่ 1 บ้านดงหม้อทอง	สพญ.5	สพญ.5	วิธี e-bidding	499,500,000.00
11	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบผันน้ำ และอาคารประกอบ โครงการผันน้ำลำน้ำชีน้อย - อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย จังหวัดบุรีรัมย์	สพญ.8	สพญ.8	วิธี e-bidding	933,660,000.00
12	จ้างก่อสร้างชุดลอกคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 7 โครงการคลองระบายน้ำหลักบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สพญ.10	สพญ.10	วิธี e-bidding	850,000,000.00
13	งานจ้างก่อสร้าง ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำหลักกษัตริย์นาท-ป่าสัก จังหวัดชัยนาท	สพญ.	สพญ.12	วิธี e-bidding	650,000,000.00

รายการงานอำนาจกรม ที่ยังไม่ส่งให้กองพัสดุดำเนินการ

14	จ้างก่อสร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายท่าตม จังหวัดสุรินทร์	กพท.	ศกท.8	วิธี e-bidding	740,000,000.00
15	จ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ชม. จำนวน 1 งาน สำหรับงานตัดก่อสร้างส่วนประกอบอิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	กพท.	ศกท.13	วิธี e-bidding	88,460,000.00
16	รถแทรกเตอร์ติดเขางพรมมาตร ขนาดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี 7 คัน	ศตท.	ศตท.	วิธี e-bidding	73,500,000.00
17	รถแทรกเตอร์ติดเขางพรมมาตร ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี 8 คัน	ศตท.	ศตท.	วิธี e-bidding	120,000,000.00
18	รถบลูเอเนอร์จี้ขับเคลื่อนด้วยตัวเองพร้อมใบมีด ขนาด 20 คัน สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี 8 คัน	ศตท.	ศตท.	วิธี e-bidding	144,000,000.00
19	รถแทรกเตอร์ติดเขางพรม ขนาดไม่น้อยกว่า 190 แรงม้า สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี 8 คัน	ศตท.	ศตท.	วิธี e-bidding	104,000,000.00
20	เรือกำจัดวัชพืชชนิดแบบโคลงโม่ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 เมตร สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปาก เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 30 ลำ	ศตท.	ศตท.	วิธี e-bidding	240,000,000.00
21	เรือขุดชนิดขุดแบบเบดโคลงโม่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 30 ลำ	ศตท.	ศตท.	วิธี e-bidding	228,000,000.00
22	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี 12 เครื่อง	ศตท.	ศตท.	วิธี e-bidding	94,272,000.00
23	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว ประกอบด้วย หัวสูบน้ำและเครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้น	ศตท.	ศตท.	วิธี e-bidding	212,340,000.00
24	กำลัง สำหรับขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิค สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี 20 เครื่อง	ศตท.	ศตท.	วิธี e-bidding	218,850,000.00
25	งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กุดหลวงตอนบน ตำบลแม่ภาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เครื่อง	ศตส.	ศตส.	จ้างออกแบบ คัดเลือก	18,000,000.00
26	งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำางว (แม่างว) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	ศตส.	ศตส.	จ้างออกแบบ คัดเลือก	25,000,000.00

รายการงานอำนาจกรม ที่อยู่ระหว่างกองพัสดุตรวจสอบเอกสารและดำเนินการ

1	งานจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดเพลลาตัง(Verticzi Turbine Pume) พร้อมชุดควบคุม สำหรับงานปรับปรองสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโตมน้อย ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี	สขบ.7	คณ.โตมน้อย	วิธี e-bidding	78,360,000.00
2	จ้างก่อสร้างระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระยะที่ 5 โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	สขบ.9	คณ.ระยอง	วิธี e-bidding	70,000,000.00
3	จัดทาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเพลลาตัง และจัดหาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับงานปรับปรองสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สขบ.10	คณ.บางบาล	วิธี e-bidding	119,919,610.00
4	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ปตณ.-ปตร. ปลายคลองแม่กลอง กิโลเมตร 6+500 ของต้นกั้นน้ำเติมสายอัมพวา-เอกชัย โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	สขบ.13	คณ.สมุทรสงคราม	วิธี e-bidding	93,400,000.00
5	จ้างก่อสร้างฝายคลองสะหมิง ตำบลปลักหนู อำเภอหนองบัว จังหวัดสงขลา	สขบ.16	คณ.สงขลา	วิธีคิดเลือก	49,140,000.00
6	จ้างก่อสร้างปรับปรุงฝายและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายคลองกุดง อื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบอง อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	สขบ.17	คณ.นราธิวาส	วิธีคิดเลือก	28,500,000.00
7	จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบฝั่งขวา ระยะที่ 1 โครงการประดูระบบน้ำคลองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย	สพญ.	สพญ.5	วิธี e-bidding	430,500,000.00
8	ซ่อมเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ ชนิดใต้ดิน มอก.427-2562 และอื่นๆ รวม 10 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองประเทกต์ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	กพท.	สกท.9	วิธี e-bidding	112,367,600.00
9	ซ่อมเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ ชนิดใต้ดิน มอก.427-2562 และอื่นๆ รวม 5 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว 3.50 กิโลเมตร โครงการสูบน้ำจากคลองสะพานแหวที่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	กพท.	สกท.9	วิธี e-bidding	68,924,900.00
10	จ้างก่อสร้างฝายวางพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายวางบ้านท่า จังหวัดเพชรบูรณ์	กพท.	สกท.10	วิธี e-bidding	475,000,000.00
11	ซ่อมเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำแบบตะเข็บเหล็กและอื่นๆ รวม 38 รายการ สำหรับระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม (ระยะที่ 2) จังหวัดยะลา	กพท.	สกท.16	วิธี e-bidding	92,690,601.00
12	หม้อไอน้ำและอื่นๆ รวม 8 รายการ สำหรับระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม (ระยะที่ 2) จังหวัดยะลา	กพท.	สกท.16	วิธีคิดเลือก	42,332,127.89
13	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ สำหรับเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 50 คัน	สคท.	สคท.	วิธี e-bidding	128,150,000.00
14	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ชนิดระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว สำหรับเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี 14 เครื่อง	สคท.	สคท.	วิธี e-bidding	164,976,000.00

หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 3 ลำดับ

สชบ.11

ภาพรวม 17.41%

R0007_รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูลจากระบบ PMS ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15:30 น.

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยงาน	(1) วงเงินจัดหาทั้งหมด	(10) วงเงินที่จัดมาแล้ว (ตาม RQ)	(11) วงเงินจัดหาที่ยังไม่ได้รับราคาแล้ว (ตาม RQ)	(12) ผลการอนุมัติรับราคา (ไม่จัดหา)	(13) A10-งบงานสัญญา (วงเงินจัดหารวมตาม RQ)	(14) มูลค่าสัญญา (ตามผลจัดหา)	(15) จัดหา PO (มูลค่า PO)	(16) [(10)/(1)]	(17) [(12)/(1)]	(18) [(13)/(1)]
										จัดหา (%)	รับราคา (%)	ลงทุนตามสัญญา (%)
4	สชบ.11	คป.สมุทรปราการ	169,562,180.00	660,899.00	660,899.00	660,805.00	0	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
5	สชบ.11	สชบ.11	30,962,037.19	193,852.21	193,852.21	193,820.78	0	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
11	สชบ.11	คณ.รังสิตเหนือ	39,297,500.00	16,999,816.00	16,999,816.00	16,712,220.83	45	4,510,190.00	4,498,234.48	43.26	43.26	11.48
24	สชบ.11	คณ.พระจอมเกล้า	41,154,560.00	12,162,532.00	12,162,532.00	11,986,420.08	20	2,018,287.00	2,015,744.51	29.55	29.55	4.90
32	สชบ.11	คณ.พระจอมเกล้าจชช	39,477,606.00	11,048,472.00	11,028,792.00	11,028,522.00	89	8,755,871.00	8,755,601.00	27.99	27.94	22.18
39	สชบ.11	คณ.เจ้าพระยา-วัง	39,445,508.79	624,349.49	624,349.49	617,543.26	4	108,000.00	108,000.00	1.58	1.58	0.27
41	สชบ.11	คณ.ภาชีเจริญ	23,192,900.00	12,416,955.10	12,416,955.10	12,332,995.60	71	7,142,636.10	7,090,811.00	53.54	53.54	30.80
52	สชบ.11	คป.ปทุมธานี	12,685,999.70	508,999.70	508,999.70	508,999.70	6	508,999.70	158,999.70	4.01	4.01	4.01
109	สชบ.11	คป.นนทบุรี	38,866,850.00	5,236,675.04	4,609,479.29	4,608,996.29	33	2,142,349.43	1,115,534.40	13.47	11.86	5.51
154	สชบ.11	คส.ขบ.11	617,024,000.00	78,911,335.32	76,549,885.32	69,959,823.81	8	39,476,252.82	37,335,658.93	12.79	12.41	6.40
158	สชบ.11	คณ.ชลหารพิจิตร	169,446,500.00	22,507,392.50	21,100,919.50	21,037,272.12	105	9,900,070.80	9,855,552.15	13.28	12.45	5.84
177	สชบ.11	คณ.รังสิตใต้	34,951,231.16	9,186,276.25	9,186,276.25	9,183,135.50	15	3,686,447.42	3,685,856.00	26.28	26.28	10.55
234	สชบ.11	คณ.พระจอมเกล้า	26,172,234.13	23,317,631.33	23,217,631.33	23,204,064.36	71	7,288,487.95	7,284,831.91	89.09	88.71	27.85
267	สชบ.11	คป.สมุทรสาคร	45,664,200.00	37,387,385.60	37,387,385.60	35,447,725.84	25	11,049,292.00	9,755,277.64	81.87	81.87	24.20
				17.41	17.07			7.27	10,480,881.64	9,342,519.83		

ไฟล์ที่แนบมา

สชบ.11 58 รก 153,905,000.00

หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 3 ลำดับ

สขบ.10

ภาพรวม 32.31%

R0007_รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2567 เวลา 15:30 น.

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยงาน	วงเงินจัดหาระยะแรก (1)	วงเงินเริ่มจัดหาระยะแรก (ตาม RQ) (10)	วงเงินจัดหาระยะแรกที่ได้รับ (ตาม RQ) (11)	ผลการอนุมัติ (ตาม RQ) (12)	A10-งบงานสัญญา (วงเงินจัดหาระยะแรก) (13)	มูลค่าสัญญา (ตาม RQ) (14)	จัดทำ PO (ตาม RQ) (15)	[(10)/(11)] (16)	[(12)/(11)] (17)	[(13)/(11)] (18)
40	สขบ.10	คณ.มโหรีรัมย์	18,297,922.23	2,950,307.69	2,950,307.69	2,948,481.20	1,114,833.88	1,113,007.39	0.00	16.12	16.12	6.09
43	สขบ.10	คณ.แจ้งราษฎร์	60,878,100.00	46,781,717.87	46,781,717.87	32,453,405.42	42,801,295.87	28,565,451.28	2,656,335.28	76.84	76.84	70.31
59	สขบ.10	คณ.สขบ.10	170,428,351.00	21,048,318.00	11,627,461.00	10,736,379.37	0.00	0.00	0.00	12.35	6.82	0.00
73	สขบ.10	คณ.ป.ศึกษาลือชัย	94,843,370.00	48,377,679.32	46,542,139.32	6,791,791.82	1,173,809.32	1,173,358.60	0.00	51.01	49.07	1.24
95	สขบ.10	คณ.ลพบุรี	86,812,775.00	58,175,000.00	58,175,000.00	57,395,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	67.01	67.01	7.95
182	สขบ.10	คณ.มหาสาร	78,336,623.00	22,463,970.00	23,970.00	23,970.00	23,970.00	23,970.00	0.00	28.68	0.03	0.03
185	สขบ.10	คณ.คลองพร้าว	110,663,500.00	6,097,104.17	3,340,975.54	3,340,975.15	0.00	0.00	0.00	5.51	3.02	0.00
187	สขบ.10	คณ.เพชรบูรณ์	53,673,560.00	35,487,501.00	35,473,001.00	34,153,992.56	11,180,348.00	10,942,584.11	2,320,487.05	66.12	66.09	20.83
191	สขบ.10	คณ.มทรกลาง	88,272,650.00	66,952,472.15	17,205,111.15	16,182,211.15	3,766,777.08	3,766,777.08	3,766,777.08	75.85	19.49	4.27
220	สขบ.10	คณ.พระนครศรีอยุธยา	62,292,369.00	2,853,329.60	1,848,288.60	1,244,364.60	0.00	0.00	0.00	4.58	2.97	0.00
225	สขบ.10	คณ.ป.ศึกษาใต้	57,147,071.94	383,205.00	363,205.00	363,205.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00
242	สขบ.10	คณ.นงนพ	199,365,700.00	67,137,371.00	25,973,511.00	22,314,735.31	5,539,131.00	5,539,004.47	3,931,729.58	33.68	13.03	2.78
252	สขบ.10	คณ.สระบุรี	161,109,386.00	214,976.76	214,976.76	214,873.16	214,976.76	214,873.16	0.00	0.13	0.13	0.13
261	สขบ.10	คณ.ขอนแก่น	14,394,489.46	7,000,556.00	4,955,306.00	4,947,078.00	212,956.00	212,956.00	0.00	48.63	34.43	1.48
264	สขบ.10	คณ.โคกเคียน	64,233,100.00	43,196,005.00	38,800,415.00	26,033,665.00	2,054,548.00	2,054,548.00	2,054,548.00	67.25	60.41	3.20
279	สขบ.10	สขบ.10	8,319,637.80	330,944.00	330,944.00	330,944.00	234,944.00	234,944.00	0.00	3.98	3.98	2.82
				32.31	22.17		5.66	38,896,723.94				

ใบให้คะแนน

สขบ.10 97 สก. 204,397,800.00

หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 3 ลำดับ

สรุป

ภาพรวม 32.04%

ROOM7_รายงานความก้าวหน้าการรัดข้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยงาน	วงเงินจัดหาทั้งหมด (1)	วงเงินรับจัดหาแล้ว (ตาม RO) (10)	วงเงินจัดหาที่อนุมัติรับราคาแล้ว (ตาม RO) (11)	ผลการอนุมัติรับราคา (ผลการจัดหน้า) (12)	A10-ลงนามสัญญา (วงเงินจัดหน้าตาม RO) (13)	มูลค่าสัญญา (ตามผลการจัดหน้า) (14)	จัดทำ PO (มูลค่า PO) (15)	[(10)/(11)] จัดหน้า (%) (16)	[(12)/(11)] รับราคา (%) (17)	[(13)/(11)] ลงนามสัญญา (%) (18)
58	สขบป.4	คณ.รังษี	157,963,279.50	25,514,748.92	74	25,032,407.62	2	8,971,346.48	8,666,700.00	16.15	15.85	5.68
110	สขบป.4	คส.ขบป.4	103,978,660.00	53,878,293.00	46	38,942,333.00	29	12,054,833.00	8,171,432.90	51.82	37.45	11.59
137	สขบป.4	คป.สุโขทัย	117,958,702.90	84,865,692.37	91	78,020,097.52	21	18,719,720.72	17,990,072.62	71.95	66.14	15.87
148	สขบป.4	คป.กำแพงเพชร	219,213,787.60	1,701,371.87	20	1,701,371.87	4	57,076.19	42,076.19	0.78	0.78	0.03
179	สขบป.4	คณ.สุโขทัย	94,539,000.00	10,638,212.00	8	3,585,500.00	8	3,585,500.00	3,585,500.00	11.25	3.79	3.79
189	สขบป.4	คป.แพร่	177,606,888.10	26,531,437.20	86	16,166,152.00	64	8,382,333.70	4,150,009.30	14.94	9.10	4.72
213	สขบป.4	คป.ตาก	142,987,132.90	50,953,870.27	179	24,370,564.16	88	7,701,015.18	5,597,550.10	35.64	17.04	5.39
214	สขบป.4	สขบป.4	129,729,651.00	43,386,566.65	30	43,197,806.65	12	12,361,526.87	9,784,993.27	33.44	33.30	9.53
236	สขบป.4	คณ.รังษีจาง-หนอง	128,928,860.00	21,446,424.26	87	18,954,284.26	57	10,435,324.45	5,221,351.84	16.63	14.70	8.09
247	สขบป.4	คณ.พชรของแดง	167,816,368.00	57,612,625.75	62	31,936,569.28	12	17,638,173.60	15,147,580.60	34.33	19.03	10.51
254	สขบป.4	คณ.แม่ยม	165,410,623.60	138,110,061.10	625	126,418,495.62	136	7,989,056.02	6,000,587.80	83.50	76.43	4.83
				32.04		25.42		6.72	19,712,706.37			

ใบชี้แจงขอแผน

สขบป.4 20 สก 147,768,300.00

ระเบียบวารสารที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงานก่อสร้าง คงค้ำจิ่งในระบบ GFMS



ข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงานก่อสร้าง คงค้ำจิ่งในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567)

สำนัก/กอง	ก. งบระหว่างก่อสร้าง/ดำเนินการ		ข. ค่าใช้จ่ายเสร็จสิ้นแล้ว		ค. ค่าใช้จ่ายที่โอนเป็นสินทรัพย์		ง. ค่าใช้จ่ายที่โอนเป็นสินทรัพย์ที่ไม่		จ. ค่าใช้จ่ายที่โอนเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่		ฉ. ค่าใช้จ่ายที่โอนเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่		ช. ค่าใช้จ่ายที่โอนเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่		ซ. ค่าใช้จ่ายที่โอนเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่		ฎ. ค่าใช้จ่ายที่โอนเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่		ฏ. ค่าใช้จ่ายที่โอนเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่		ฐ. ค่าใช้จ่ายที่โอนเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่		ฑ. ค่าใช้จ่ายที่โอนเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่		ฒ. ค่าใช้จ่ายที่โอนเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่		ณ. ค่าใช้จ่ายที่โอนเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่		ด. ค่าใช้จ่ายที่โอนเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่		ด. ค่าใช้จ่ายที่โอนเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่																																																																																																																																						
	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า	รท.	มูลค่า																																																																																																																																					
กม.ก.	1,291	53,472,050,156.79	13	543,198,239.44	30	604,921,730.60	163	4,132,832,762.79	25	520,871,303.93	1	52,400,024.25	3	134,343,783.71	19	8,673,580.86	1,544	59,596,891,558.12	253	6,124,841,401.33	4,950,000.00	1	4,950,000.00	3	64,260,229.25	216	898,189,526.95	132	793,901,752.25	54	300,415,500.09	15	79,315,468.77	223	1,233,586,827.07	30	259,806,723.88	163	685,608,538.81	107	1,031,349,430.56	160	1,165,086,103.95	39	450,183,567.72	117	1,297,065,346.17	17	182,931,605.89	323	4,946,889,657.91	161	2,922,832,654.84	149	487,972,740.21	35	120,500,524.40	257	2,147,577,897.50	79	1,162,290,177.07	188	431,382,085.88	26	90,751,473.17	248	2,130,380,798.22	81	926,314,507.29	115	1,662,837,355.78	27	259,797,771.60	269	1,740,277,017.03	74	448,210,464.92	316	3,568,133,397.99	116	932,095,544.68	205	3,084,832,335.54	81	1,002,850,065.21	200	2,636,039,853.31	2	41,023,156.60	2	111,444,619.69	64	833,993,806.72	3	4,455,687,198.82	3	42,416,412.50	6	16,020,006.55	6	97,928,645.87	4	15,841,996.13	4	105,099,181.06	8	189,460,984.21	8	189,460,984.21	1	557,906,144.54	11	36,316,692.69	35	378,925,229.94	4	27,461,290.93	4	918,127,877.26	54	918,127,877.26	16	472,428,671.72	16	472,428,671.72	2	2,372,052,879.17	2	2,372,052,879.17	145	977,224,431.26	2	8,356,468.70	20	236,051,312.61	20	46,625,835,512.15	1	36,316,692.69	7	99,184,175.47	7	99,184,175.47	1,126	46,625,835,512.15	1	36,316,692.69	5,223	123,529,847,990.84	47	688,885,551.40	161	3,346,935,696.08	1,794	26,935,806,318.26	95	1,124,525,204.09	48	590,716,716.79	40	101,158,176.23	7,508	156,317,875,653.69	2,185	32,788,027,662.85

ระเบียบการรหัสที่ 5



เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์



ขอขอบคุณ.....
