



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๒๐๒/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ค.ม. ๙๙๐๖

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR จำนวน ๑,๑๔๔ รายการ งบประมาณ ๖,๐๓๒.๗๓๓๘ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๗๘ รายการ งบประมาณ ๔,๓๘๖.๓๖๐๕ ล้านบาท เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา จำนวน ๙๔๓ รายการ งบประมาณ ๕,๕๔๓.๕๘๒๙ ล้านบาท ทำข้อผูกพัน จำนวน ๗,๗๒๑ รายการ งบประมาณ ๕๔,๑๒๐.๑๓๓๓ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๗๖ รายการ งบประมาณ ๓๗๖.๒๕๒๔ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการประชุมเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอต้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทุกรายการจะต้องดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า สำนัก/กองที่มีรายการงานที่ยังไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า ๑๐๐ รายการ ได้แก่ สขป. ๑๐ สขป. ๑๒ และ สขป. ๑๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

ไปยื่น พอ.ร.จ.น., พอ.ร.ท.ด., ทน. ๑-๙ มอ.

นายธนทร์ สมบูรณ์

๑๖๑๖๔

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผ.ส.บอ.

(นายวิทยา แก้วมี)

ผ.อ.ผง.



รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ
ถึงประกาศ TOR

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 - ส่วนกลาง


ข้อมูลการระบบ Gen Project ณ วันที่ 28 พ.ย. 65

หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวม

ภาพรวม
000

การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายการภายในวันที่ 14 ต.ค. 2565

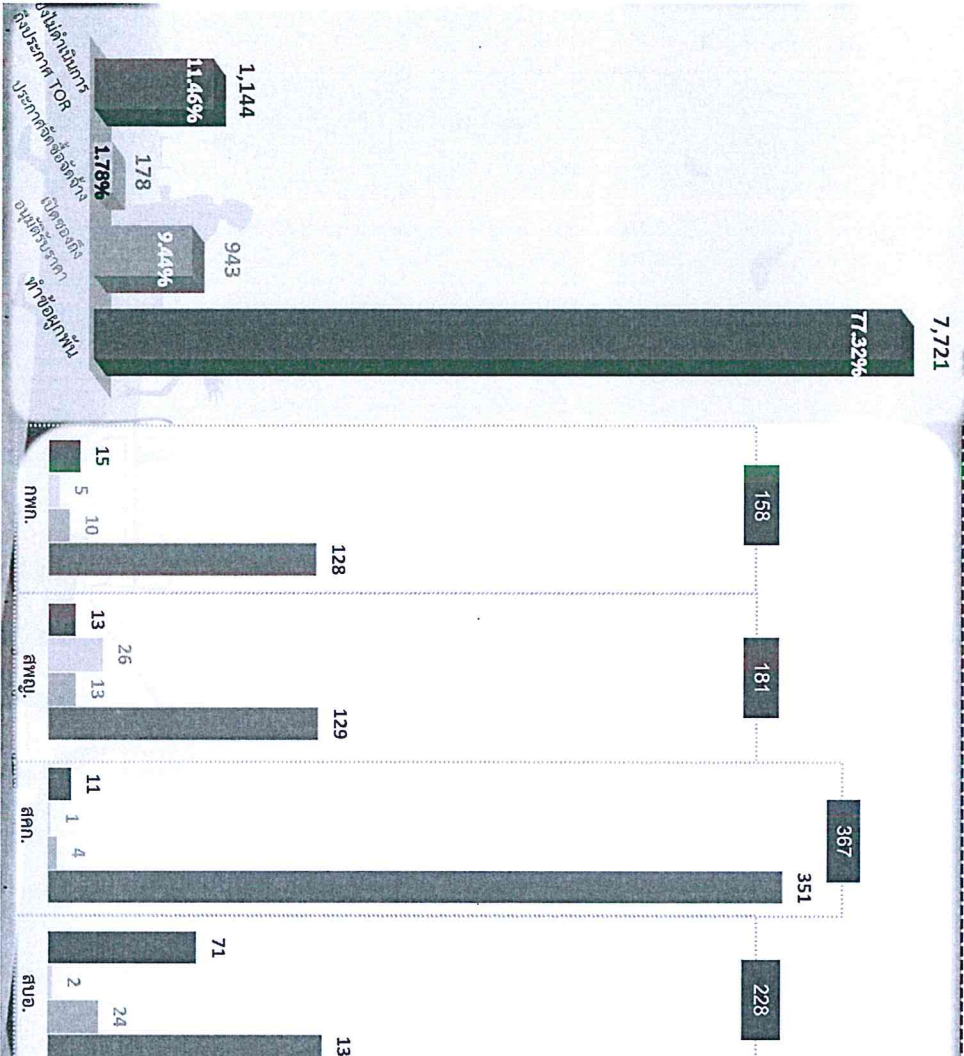


สำนัก/กอง	จำนวนรายการที่สิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประเภท TOR	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดซองซอง	ทำสัญญา
รวม	9,986	70,082.81	1,144	6,032.73	178	4,386.36
กพร.	158	13,162.81	15	447.66	5	511.47
กพญ.	181	11,182.31	13	312.89	26	2,130.76
สถ.	367	1,421.19	11	113.13	1	21.12
สถ.	228	706.59	71	275.96	2	20.48
สถ.	32	598.70				
สถ.	49	272.55	7	57.27	1	9.80
สถ.	4	99.97				
สถ.	39	513.24	5	30.92	8	62.92
สถ.	13	331.04				
สถ.	1	3.00	1	3.00	5	74.00
สถ.	50	5,544.79				

หมายเหตุ

ไม่รวมรายการ จำนวน 79 รายการ งบประมาณ 605.25 ล้านบาท ดังนี้

- ยกเว้น จำนวน 76 รายการ งบประมาณ 376.25 ล้านบาท
- รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

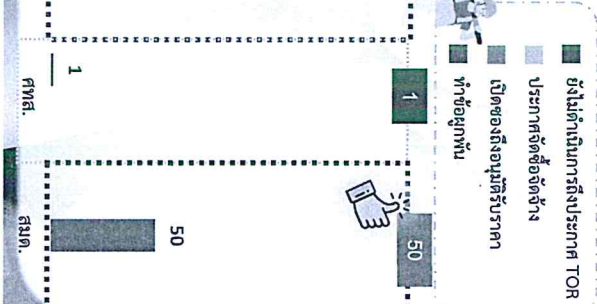

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566

- ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลจากระบบ Gen Project ณ วันที่ 28 พ.ย. 65

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการที่สิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประเภท TOR		ประเภทที่ซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา	ทำสัญญาทัน		
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณ	
สศป. 1	419	1,522.66	7	12.49	5	5.50	14	47.41	393	1,457.27
สศป. 2	405	1,293.45	21	40.45	9	18.35	47	75.43	328	1,159.22
สศป. 3	360	2,212.09	20	95.76	1	1.00	29	103.86	310	2,011.48
สศป. 4	534	1,571.89	8	44.23	4	220.99	20	58.50	502	1,248.17
สศป. 5	494	2,660.15	17	113.94	1	16.00	23	71.54	453	2,458.67
สศป. 6	500	2,834.39	17	97.51	3	52.00	37	237.54	443	2,447.34
สศป. 7	654	5,051.26	5	182.50	8	41.40	8	25.20	633	4,802.17
สศป. 8	626	3,422.40	46	485.34	12	105.42	27	346.74	541	2,484.91
สศป. 9	743	1,686.34	98	280.15	20	101.55	81	119.72	544	1,184.92
สศป. 10	611	1,047.28	611	1,047.28	275	448.29	5	5.95	47	160.93
สศป. 11	582	1,575.14	582	1,575.14	41	332.28	22	106.68	128	114.25
สศป. 12	675	1,476.89	675	1,476.89	143	243.63	10	65.84	101	391.04
สศป. 13	612	1,321.78	612	1,321.78	58	416.14	2	20.50	43	51.87
สศป. 14	360	3,058.43	360	3,058.43	44	645.09	2	1.43	48	342.29
สศป. 15	503	1,217.34	503	1,217.34	145	286.81	5	155.00	20	208.79
สศป. 16	521	3,212.46	521	3,212.46	63	977.05	16	576.30	97	517.07
สศป. 17	265	1,082.67	265	1,082.67	13	90.24	5	61.90	77	490.63

รวมรายการ จำนวน 79 รายการ งบประมาณ 605.25 ล้านบาท ดังนี้

ยกเลิก จำนวน 76 รายการ งบประมาณ 376.25 ล้านบาท
รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

