



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E สบอ(ปก.)๐๔/๕๖๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ เงินกันเหลือในปี ๒๕๖๕ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๖ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับทุกแหล่งงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๙๔๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔,๓๙๖,๓๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๗๐๗,๘๘๓,๑๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔,๓๗๖,๗๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๔ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๒๒,๒๒๔,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙,๕๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ทั้งนี้ เงินกันเหลือในปี ๒๕๖๕ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

ผบ.บอ.

# ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการต้นและอุกวิฑา



## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (พ.ร.บ.) วงลงทุน

จำนวน 234 รายการ  
 - ได้รับโอนจัดสรร 397,933,788 บาท (จำนวน 216 รายการ)  
 - ผลบักจ่ายลงทุน 24,376,741 บาท  
 - ตัดเป็นร้อยละ 3.41  
 เป้าหมายยกงบ ไตรมาส 1 ร้อยละ 32

## เงินหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ 2566

วงประมาณ เงินทุนหมุนเวียนฯ 1  
 - จำนวน 60 รายการ  
 - ได้รับโอนจัดสรร 1,000,000 บาท (จำนวน 1 รายการ)  
 - ผลบักจ่ายลงทุน 19,587 บาท  
 - ตัดเป็นร้อยละ 0.09

## เงินคืนเหลือปี 2565

วงประมาณ เงินคืนเหลือปี  
 - จำนวน 16 รายการ  
 - ผลบักจ่ายลงทุน 0 บาท  
 - ตัดเป็นร้อยละ 0  
 - ภาวะเงินคืนแล้วเสร็จ มาใช้ไตรมาส จำนวน 0 รายการ

## รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2566

- วงลงทุน จำนวน 234 รายการ (707,883,140 บาท) แบ่งเป็น
  - จำนวน 235 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 708,078,640 บาท แบ่งเป็น
    - งบลงทุน จำนวน 234 รายการ (707,883,140 บาท)
    - งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดหนี้)
- งบเงินอุดหนุน (ส่วนความปลอดหนี้)
  - งบลงทุน จำนวน 5,341,432 คิดเป็นร้อยละ 1.91
  - งบเงินอุดหนุนงบประมาณ สบป.1-17 วงเงิน 117,972,237 บาท
  - งบเงินอุดหนุน 19,035,309 คิดเป็นร้อยละ 16.13

## ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2566 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	อนุมัติ แผน	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)				อนุมัติ สรุปราย (สัญญา)	ทำสัญญา (สัญญา)
			ประกาศ TOR	ประกาศ อนุมัติ-จัดจ้าง	เปิดซอง	สัญญา		
สำนักบริหารจัดการต้นและอุกวิฑา	234	57	2	1	1	43	124	
ส่วนอุกวิฑา	1	0	0	0	0	0	1	
ส่วนบริหารรักษา	11	0	1	0	0	0	10	
ส่วนอุกวิฑา	28	5	0	0	0	0	23	
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0	0	0	0	1	4	
ส่วนวางแผนปลอดหนี้	7	2	1	0	0	3	1	
ส่วนการที่นำโครงการ	63	7	0	1	0	11	44	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์	39	9	0	0	1	19	6	
ส่วนภาคกลาง	13	0	0	0	0	8	3	
ส่วนภาคตะวันตก	10	8	0	0	0	0	2	
ส่วนภาคตะวันออก	10	5	0	0	0	0	5	
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	0	0	0	0	1	3	
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	6	0	0	0	0	7	
ส่วนภาคใต้	8	6	0	0	0	0	2	
ส่วนภาคเหนือตอนบน	14	8	0	0	0	0	6	
ส่วนภาคเหนือตอนล่าง	8	1	0	0	0	0	7	

หมายเหตุ : 1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ อนุมัติ 4 รายการ  
 2. ส่วนภาคกลาง อนุมัติ 2 รายการ

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบ พ.ร.บ.66)

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66		
1031618510														
คาดการณ์การเบิกจ่าย สบอ. (707.88 ล้านบาท)	133.93 ล้านบาท			402.46 ล้านบาท			529.01 ล้านบาท			707.88 ล้านบาท				
	18.92%			56.85%			74.73%			100%				
ผลการเบิกจ่าย งบ พ.ร.บ.66	24.38 ล้านบาท													
	3.44%													
- จ้างเหมาทั้งโครงการ (15 รายการ วงเงิน 202.25 ล้านบาท)														
- จ้างเหมา+ดำเนินการเอง (32 รายการ วงเงิน 199.15 ล้านบาท)	1.46 ล้านบาท													
	0.20%													
- ดำเนินการเอง (187 รายการ วงเงิน 306.48 ล้านบาท)	22.92 ล้านบาท													
	3.24%													

หมายเหตุ : ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบติดตาม CEN-project ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2565

- งานจ้างเหมาบางส่วน ยกเลิก 4 รายการ ฝ่ายติดตามและพยาบาลรณีสถานการณ์น้ำ
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยาบาลรณีสถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำป่าน พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยาบาลรณีสถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง พ.ศ.2566 พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยาบาลรณีสถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยาบาลรณีสถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท
- งานดำเนินการเอง ยกเลิก 2 รายการ ศอช.ภาคกลาง
  - ค่าก่อสร้างสถานีวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท
  - ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชลบุรีระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565  
รายการงบประมาณ : รวมทั้งประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 294 รายการ		ได้รับการอนุมัติสรร (บาท)				คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จังหวัด	ทำเอง	จำนวน	รวม	จังหวัด	ทำเอง	รวม	จังหวัด	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	59	22,224,900	0	0	0	59	0	0	21,224,900	0	0	0.00	
ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ	11	27,761,600	7,761,600	0	7,761,600	1	20,000,000	20,000,000	0	0	722,277	2.60	
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	40	343,585,400	62,220,890	10,799,250	51,421,640	21	239,027,350	239,027,350	0	0	2,552,449	0.74	
ฝ่ายอุทกวิทยา	28	115,197,000	107,322,000	0	107,322,000	4	7,875,000	7,875,000	0	0	871,223	0.76	
สำนักงานปฏิบัติการอุทก	5	11,600,000	7,200,000	0	7,200,000	1	4,000,000	4,000,000	0	0	793,413	6.84	
สำนักงานเลขาธิการ	7	94,000,000	73,973,298	61,973,298	12,000,000	4	52,012,892	52,012,892	0	0	1,093,241	1.16	
สำนักงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	63	26,277,500	25,294,500	0	25,294,500	2	980,000	980,000	0	0	2,447,663	9.31	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานเหนือตอนบน	14	18,183,300	18,639,700	0	18,639,700	0	0	0	0	3,287,604	18.08		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	2,894,835	19.58		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	12,250,200	12,249,200	0	12,249,200	0	0	0	0	2,261,634	18.46		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	17,444,700	17,444,700	0	17,444,700	0	0	0	0	1,365,832	7.83		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	13,234,900	0	13,234,900	0	0	0	0	2,790,519	20.24		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานตะวันออก	10	12,267,600	12,231,100	0	12,231,100	0	0	0	0	1,339,414	10.92		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานตะวันออก	10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	677,982	6.80		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	15,672,600	15,672,600	0	15,672,600	0	0	0	0	1,193,167	7.61		
ฝ่ายยุทธศาสตร์	1	934,600	934,600	0	934,600	0	0	0	0	105,075	11.24		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>294</b>	<b>755,942,000</b>	<b>398,933,788</b>	<b>72,772,548</b>	<b>326,161,240</b>	<b>92</b>	<b>323,895,242</b>	<b>323,895,242</b>	<b>21,224,900</b>	<b>24,396,328</b>	<b>0</b>	<b>24,396,328</b>	<b>3.23</b>

รวมตามประเภท

1. งบบุคลากร 2566

2. เงินทดแทน 2565

3. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ 2566

4. เบิกจ่ายร้อยละ เบริณเทียบปริมาณงบประมาณทั้งหมดที่ตรงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รวมตามแหล่งเงิน

1. งานจ้างเหมาบริการ ยานเล็ก 4 รายการ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ

- บักรู้อาชญาธิการที่กรมตำรวจผู้บังคับการระยอง พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท

- บักรู้อาชญาธิการที่กรมตำรวจผู้บังคับการระยอง พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท

- บักรู้อาชญาธิการที่กรมตำรวจผู้บังคับการระยอง พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท

- บักรู้อาชญาธิการที่กรมตำรวจผู้บังคับการระยอง พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท

2. งานดำเนินงาน ยานเล็ก 2 รายการ ศอบภากลาง

- ทำก่อสร้างสถานีวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท

- ทำจัดทำป้ายข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท

ผลการดำเนินงานงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชลบุรีระบบติดตาม BDM-NEW (GEN-PROJECT) ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2566

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2566			โครงการโอนจัดสรร (บาท)					งบเหลือที่ขังไม่ได้รายการโอนจัดสรร (บาท)					ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	รวมสิ้นปี 234 รายการ	งบประมาณ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง			
สำนักหอสมุด	1	994,600	1	994,600	0	994,600	0	0	0	0	1	105,075	0	105,075	11.24		
สำนักบริหารการคลัง	11	27,761,600	10	7,761,600	0	7,761,600	1	20,000,000	20,000,000	0	10	722,277	0	722,277	2.60		
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลกลาง	39	318,191,940	28	61,220,890	10,799,250	50,421,640	21	239,027,350	239,027,350	0	6	2,532,862	0	2,532,862	0.80		
สำนักบริหารการคลัง	28	115,197,000	27	107,322,000	0	107,322,000	4	7,875,000	7,875,000	0	8	871,223	0	871,223	0.76		
สำนักบริหารการคลัง	5	11,200,000	5	7,200,000	0	7,200,000	1	4,000,000	4,000,000	0	4	793,413	0	793,413	7.08		
สำนักบริหารการคลัง	7	94,000,000	5	73,973,298	0	73,973,298	4	52,012,892	52,012,892	0	2	1,093,241	0	1,093,241	1.16		
สำนักบริหารการคลัง	63	26,274,500	62	25,294,500	0	25,294,500	2	980,000	980,000	0	52	2,447,653	0	2,447,653	9.32		
สำนักบริหารการคลัง	14	18,183,300	14	18,639,700	0	18,639,700	0	0	0	0	8	3,287,604	0	3,287,604	18.08		
สำนักบริหารการคลัง	8	14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	8	2,894,835	0	2,894,835	19.58		
สำนักบริหารการคลัง	4	12,249,200	4	12,249,200	0	12,249,200	0	0	0	0	4	2,261,634	0	2,261,634	18.46		
สำนักบริหารการคลัง	13	17,444,700	13	17,444,700	0	17,444,700	0	0	0	0	7	1,365,832	0	1,365,832	7.83		
สำนักบริหารการคลัง	13	13,234,900	11	13,234,900	0	13,234,900	0	0	0	0	11	2,790,519	0	2,790,519	20.24		
สำนักบริหารการคลัง	10	12,231,100	10	12,231,100	0	12,231,100	0	0	0	0	5	1,339,414	0	1,339,414	10.95		
สำนักบริหารการคลัง	10	9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	7	677,982	0	677,982	6.80		
สำนักบริหารการคลัง	8	15,672,600	8	15,672,600	0	15,672,600	0	0	0	0	2	1,193,167	0	1,193,167	7.61		
รวมทั้งสิ้น	234	707,883,140	216	397,933,788	72,772,548	325,161,240	33	323,895,242	323,895,242	0	135	24,376,741	0	24,376,741	3.44		

หมายเหตุ : เบื้องต้นข้อมูลจะเปรียบเทียบกับงบประมาณ พ.ร.บ. 66

วัตถุประสงค์ของเงิน

- งานจ้างเหมาช่างช่าง 4 รายการ ภายใต้นโยบายและมาตรการลดค่าการรั่วไหล
  - จ้างช่างติดตั้งระบบระบายน้ำท่อส่งน้ำออก พ.ศ.2566 ภายใต้นโยบายและมาตรการลดค่าการรั่วไหล 1,308,400 บาท
  - จ้างช่างติดตั้งระบบระบายน้ำท่อส่งน้ำออก พ.ศ.2566 ภายใต้นโยบายและมาตรการลดค่าการรั่วไหล 1,082,200 บาท
  - จ้างช่างติดตั้งระบบระบายน้ำท่อส่งน้ำออก พ.ศ.2566 ภายใต้นโยบายและมาตรการลดค่าการรั่วไหล 1,082,200 บาท
  - จ้างช่างติดตั้งระบบระบายน้ำท่อส่งน้ำออก พ.ศ.2566 ภายใต้นโยบายและมาตรการลดค่าการรั่วไหล 1,082,200 บาท
- งานค่าจ้างช่างช่าง 2 รายการ คือช่างช่าง
  - ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้นโยบายและมาตรการลดค่าการรั่วไหล 495,000 บาท
  - ค่าจ้างช่างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้นโยบายและมาตรการลดค่าการรั่วไหล 117,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชลบุรีระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565  
 รายการงบประมาณ : เงินต้นเดือนปี 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 46 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เงินจ่าย ร้อยละ		
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม		จ้างเหมา	ทำเอง
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	34	257,401,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
จำนวนนอกอัตรากำลัง	3	42,851,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
จำนวนบุคลากร	7	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
จำนวนการใช้จ่ายโครงการ	1	119,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
จำนวนรับจ้างบริหารงาน	1	297,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>46</b>	<b>301,510,470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>


หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชลบุรีระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565  
 รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการลงทุน 2566

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 60 รายการ		โครงการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				คงเหลือส่งไปเบิกจ่าย (บาท)				เบ็ดเตล็ด
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	59	21,224,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ศูนย์ประมวลผลสารสนเทศการประปา	1	1,000,000	1	1,000,000	0	1,000,000	1	19,587	0	19,587	1	980,413	0	980,413	1.96
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59</b>	<b>22,224,900</b>	<b>1</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1</b>	<b>19,587</b>	<b>0</b>	<b>19,587</b>	<b>1</b>	<b>980,413</b>	<b>0</b>	<b>980,413</b>	<b>0.09</b>


ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2566) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565

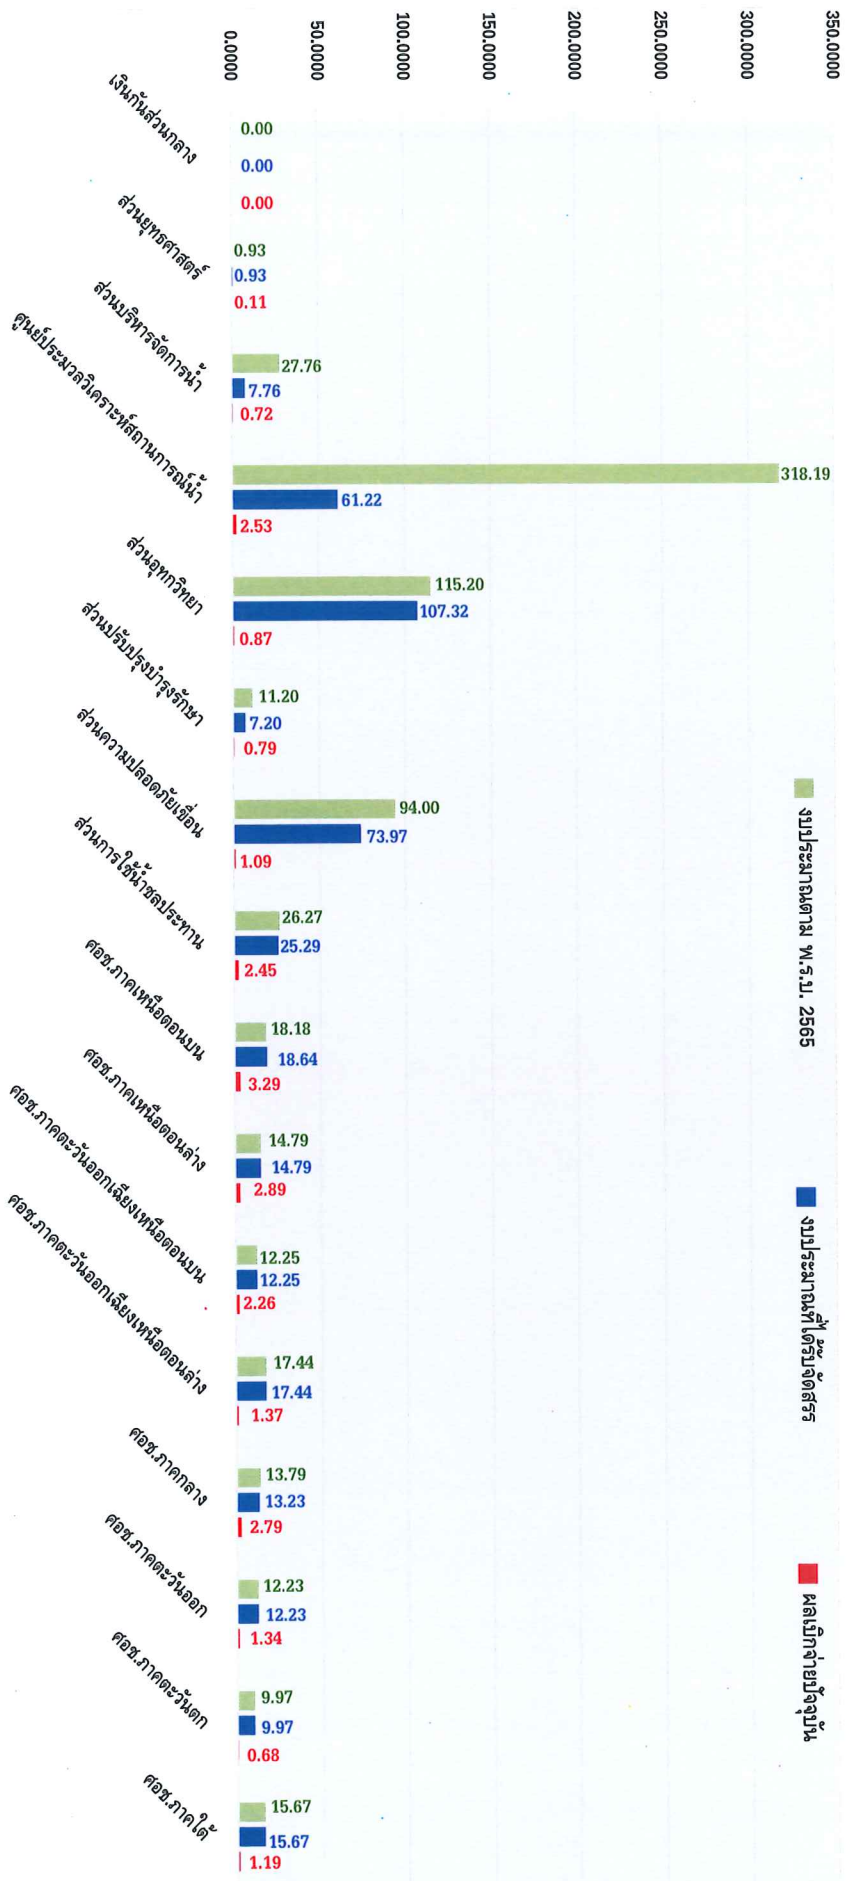



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 65) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565

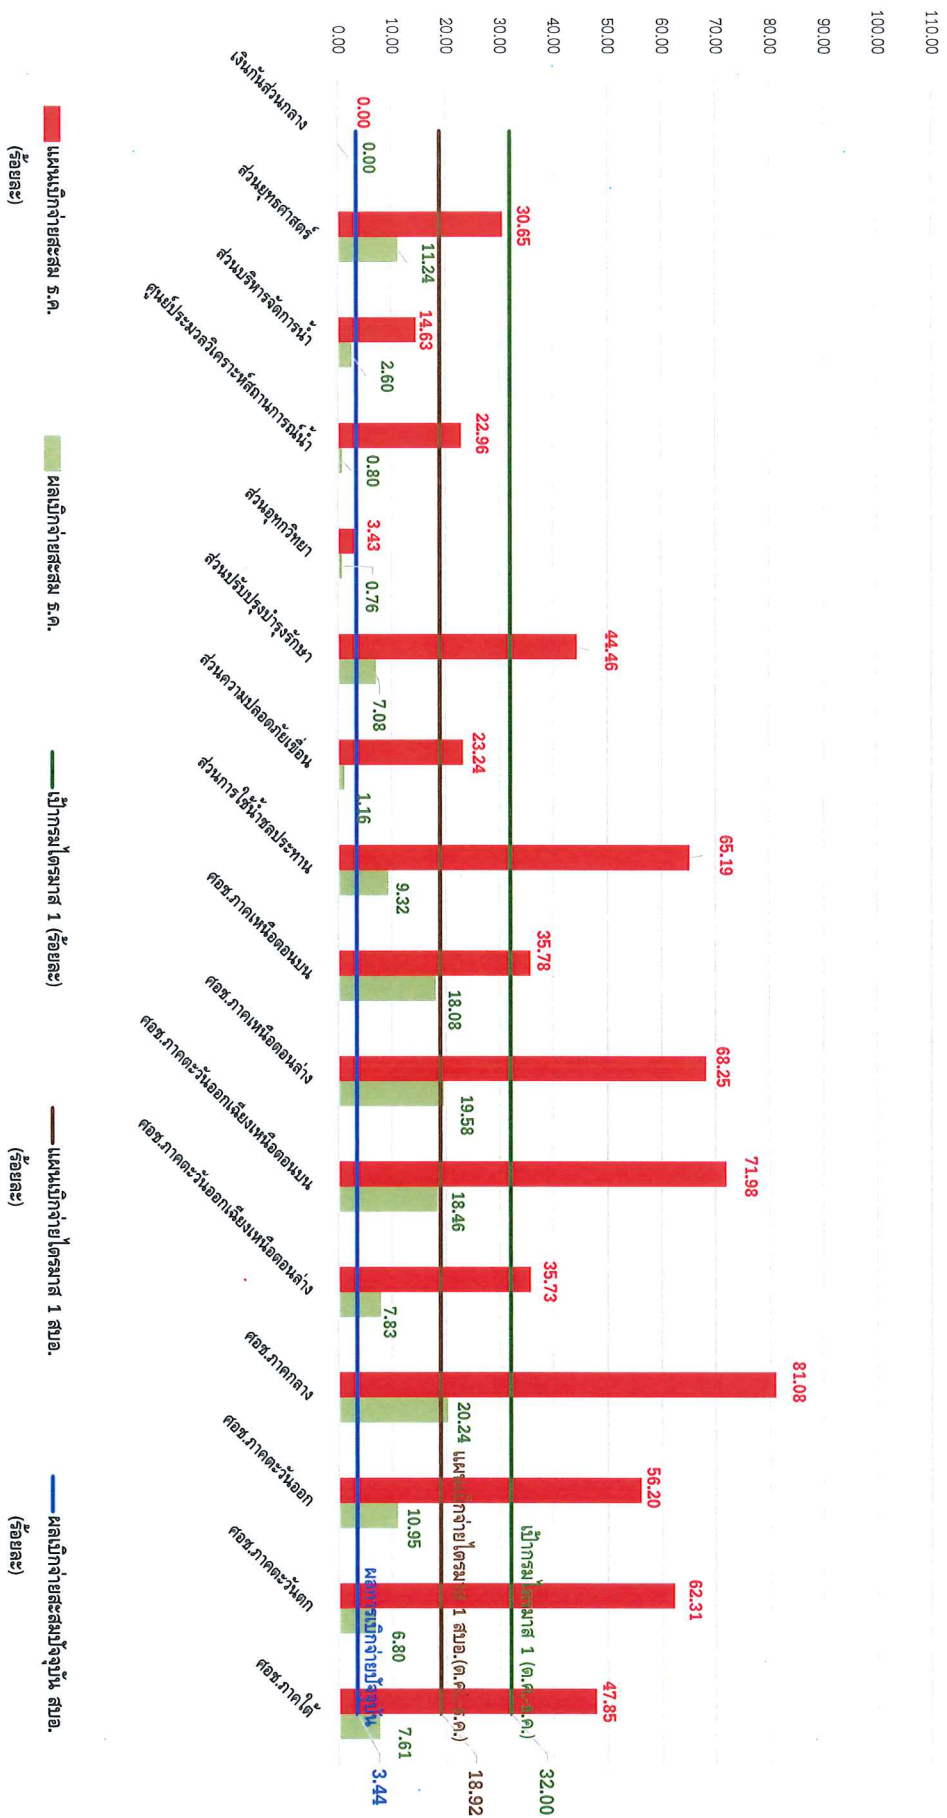

สรุปจำนวนรายการงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ยังดำเนินการไม่ถึงขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	264,327,600	57
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	214,925,300	9
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	2,959,600	8
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	1,831,000	5
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	3,434,700	6
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	4,148,100	6
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	2,775,900	8
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	240,000	1
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	2,038,000	7
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	20,000,000	2
ส่วนอุทกวิทยา	11,975,000	5

แบบฟอร์มรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ยังไม่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565)

										ส่วนที่ให้สำนัก/กองกรอกข้อมูลย้อนขึ้น						
ที่	สำนัก	โครงการ	รายการ	ผลผลิต	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	สถานะการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 06/12/65	ยื่นขึ้นสถานะการดำเนินงานปัจจุบัน (โดยระบุ 1.ไม่ดำเนินการ/2.อนุมัติแผน/3.ประกาศ TOR/4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/5.เปิดซอง/6.อนุมัติรับราคา/7.ก่อนเปิดซอง/8.ยกเลิก)	งานที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วไปกระทรวงศึกษาธิการ	รายการที่ยกเลิกไปกระทรวงศึกษาธิการ	ปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้	แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค	วันที่คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพัน (ระบุเป็นตัวเลข เช่น วันที่ 31 ธ.ค. 2565)			
													วัน	เดือน	พ.ศ.	
						รวมทั้งสิ้น จำนวน 57 รายการ							วันที่	เดือน	พ.ศ.	
						264,327,600										
						214,925,300										
704	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(3) ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 763 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	47,450,000	2.อนุมัติแผน	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง			7. แก้ไขแผนจัดซื้อจัดจ้าง		ม.ค.		2566	
705	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(4) ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งและตะวันออก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 764 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	48,270,000	2.อนุมัติแผน	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง			7. แก้ไขแผนจัดซื้อจัดจ้าง		ม.ค.		2566	
708	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.71) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2166 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	9,980,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			7.อื่นๆ อยู่ระหว่างทำรายงานความคืบหน้าการพัสดุ	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	28	ธ.ค.	2565	
710	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.84) โครงการศึกษาวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำชี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2179 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			7.อื่นๆ อยู่ระหว่างทำรายงานความคืบหน้าการพัสดุ	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	28	ธ.ค.	2565	
713	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.131) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2226 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน								
714	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.132) ปรับปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2227 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	2.อนุมัติแผน	3.ประกาศ TOR								
745	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(5) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 22 ลุ่มน้ำหลัก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 9191 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000	2.อนุมัติแผน	5.เปิดซอง			7.อื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งกรรมการคณะกรรมการขอเสนอของงาน และส่งรายงานความคืบหน้าการพัสดุ (พ.ศ.01)	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	31	มี.ค.	2566	
746	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(7) งานโทรมาตรเพื่อการศึกษาและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 9193 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	16,585,300	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			7. ยังไม่ได้จ้างแรงงาน เพราะยังไม่มีเลขจัดสรรตำแหน่ง		6	ก.พ.	2566	
747	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(9) สำรองจุดสถานีและจัดทำ rating curve สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 9195 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	46,640,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			7.อื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานความคืบหน้าการพัสดุ	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	6	ม.ค.	2566	
						รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 รายการ										
						2,959,600										
692	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.6) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 12 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	117,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			7.อื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ		28	ก.พ.	2566	
693	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.7) ค่าจัดทำเสาตึ๊ง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 13 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	37,600	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			-		21	ธ.ค.	2565	
715	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.157) ค่าซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 2252 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	201,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			-		21	ธ.ค.	2565	
716	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.158) ค่าซ่อมแซมเสาตึ๊งสถานีอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 2253 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	540,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน					31	มี.ค.	2566	
717	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.159) ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จำนวน 1 หน่วย พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 2254 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน					31	มี.ค.	2566	
718	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.161) ค่าบำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 2256 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	768,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			7.อื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานความคืบหน้าการพัสดุ	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	10	ม.ค.	2566	
719	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.162) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 2257 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	556,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน								
720	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.163) ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำท่วม ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 2258 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	240,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			6. แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/เนื้อหา TOR/เอกสารประกวดราคา/ราคากลาง	อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR	30	ม.ค.	2566	



ที่	สำนัก	โครงการ	รายการ	หมวด	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	สถานะการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 06/12/65	ยืนยันสถานะการดำเนินงานปัจจุบัน (โดยระบุ 1.ยังไม่ดำเนินการ/2.อนุมัติแผน/3.ประกาศ TOR/4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/5.เปิดซอง/6.อนุมัติรับราคา/7.ก่อนนี้ผูกพัน/8.ยกเลิก)	งานที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว โปรครเบญชที่สัญญา	รายการที่ยกเลิก โปรครเบญชที่ยกเลิก	ปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้	แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค	วันที่คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพัน (ระบุเป็นตัวเลข เช่น วันที่ 31 ธ.ค. 2565)		
													วัน	เดือน	พ.ศ.
		ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	จำนวน 8 รายการ			2,775,900							วันที่	เดือน	พ.ศ.
696	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	(1.72) ค่าก่อสร้างขุดเจาะขุดลอกคูคลองเพื่อการเตือนภัย ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2566 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ - [ 78 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	494,000	2.อนุมัติแผน	7.ก่อนนี้ผูกพัน	ใบสั่งซื้อที่ 046/66 ลว. 28 พฤศจิกายน 2565		7. อื่นๆ รายงานความคืบหน้าการพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	30	มิ.ย.	2566
697	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	(1.73) ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2566 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 79 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	37,600	2.อนุมัติแผน	7.ก่อนนี้ผูกพัน	ใบสั่งซื้อที่ 068/66 ลว. 1 ธันวาคม 2565		7. อื่นๆ เริ่มดำเนินการสำรวจฯ เดือน ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด			
698	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	(1.74) ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2566 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 80 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	156,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน							
724	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	(1.1514) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศคูคลองชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2566 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3609 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	889,500	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน	เป็นค่าตอบแทน		6. แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/เนื้อหา TOR/		1	ก.พ.	2566
725	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	(1.1515) ค่าซ่อมเครื่องตรวจวัดปริมาณการไหลและนำตัดการไหลในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2566 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3610 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	135,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			7. อื่นๆ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	28	ธ.ค.	2565
726	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	(1.1518) ค่าซ่อมมอเตอร์ดีเซล ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2566 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3613 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	200,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			7. อื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานความต้องการพัสดุ	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	6	ม.ค.	2566
727	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	(1.1519) ค่าดำเนินการสำรวจแผนที่ภาพถ่ายอากาศ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2566 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3614 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	253,800	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน	เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ค่าเบี้ยเลี้ยง)		7. อื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานความต้องการพัสดุ	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	6	ม.ค.	2566
728	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	(1.1522) โครงการจัดทำระบบการเตรียมการเพื่อรับมือภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (Flood Preparation System for Chiang Mai City) ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2566 - [ 3617 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	610,000	2.อนุมัติแผน	7.ก่อนนี้ผูกพัน	ใบสั่งซื้อที่ 069/66 ลว. 1 ธันวาคม 2565		7. อื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานความต้องการพัสดุ	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	28	ธ.ค.	2565
		ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	จำนวน 1 รายการ			240,000									
706	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	(1.5) ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำท่วม อำเภอวิเศษ จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ. 2566 - [ 1988 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	240,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			7. อื่นๆ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	28	ธ.ค.	2565
		ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	จำนวน 7 รายการ			2,038,000									
699	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.120) ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา ส่วนที่ 30 คน จำนวน 1 หัว สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (หัวบ้านยาง) พ.ศ.2566 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 126 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	350,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			7. อื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานความต้องการพัสดุ	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	16	ม.ค.	2566
702	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.336) ซ่อมแซมท่อที่ทรุดและท่อฉีกขาด ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 342 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	240,000	2.อนุมัติแผน	6.อนุมัติรับราคา			7. อื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานความต้องการพัสดุ	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	27	ธ.ค.	2566
703	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.107) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) พ.ศ. 2566 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 500 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	400,000	2.อนุมัติแผน	6.อนุมัติรับราคา			7. อื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ		30	ธ.ค.	2565
707	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.70) โครงการจัดหารัฐวิสาหกิจซ่อมแซมคูคลองชลประทาน เกษตร แวจนนครราชสีมา เขตสุโขทัย กรุงเทพมหานคร - [ 2165 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	92,000	2.อนุมัติแผน	7.ก่อนนี้ผูกพัน	พด.(ว) 19/2566(สขย.)		7. อื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ		30	ธ.ค.	2565
735	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.2460) ศึกษาซ่อมแซมท่อใต้และยึดรางการให้น้ำชลประทานในระยะต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไร่ที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 4555 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	340,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			7. อื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ		30	ธ.ค.	2565
736	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.2461) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (หัวบ้านยาง) พ.ศ. 2566 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 4556 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	450,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			2.แก้ไขข้อราชการงานให้ถูกต้อง เนื่องจากสืบค้นรายการปรับราคาขึ้น		31	ม.ค.	2566
742	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.4106) โครงการศึกษาและสาธิตการทำนาแบบลดต้นทุนและประหยัดน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ในพื้นที่โครงการสำน้ำและบำรุงรักษาขุมน้ำ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [ 6201 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	166,000	2.อนุมัติแผน	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง			7. อื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ		30	ธ.ค.	2565

ที่	สำนัก	โครงการ	รายการ	ผลผลิต	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	สถานะการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 06/12/65	มีบันทึกสถานะการดำเนินงานปัจจุบัน (โดยระบุ 1.ยังไม่ดำเนินการ/2.อนุมัติแผน/3. ประกาศ TOR/4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ 5.เปิดซอง/6.อนุมัติรับราคา/7.ก่อนยื่นผูกพัน/8. ยกเลิก)	งานที่ก่อนยื่นผูกพันแล้ว ไประบุแบบที่สัญญา	รายการที่ยกเลิก โปร่งระบุเหตุผล ที่ยกเลิก	ปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ 1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา /2. แก้ไขชื่อรายการงานให้ถูกต้อง เนื่องจาก โปร่งระบุให้ชัดเจน .... เช่น มีการปรับเปลี่ยนปริมาณให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดำเนินการปัจจุบัน เป็นต้น /3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากมีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคาแล้วแต่ไม่มีผู้รับจ้างมาขึ้นเอกสารประกวดราคา /4. ผลิตปัญหาเรื่องที่ดิน โปร่งระบุให้ชัดเจน .... เช่น ราษฎรเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ /5. แก้ไขประมาณการ เนื่องจากมีการคำนวณประมาณการค่าเช่า/6. แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ เนื้อหา TOR/เอกสารประกวดราคา/ราคากลาง /7. อื่นๆ โปร่งระบุ ....	แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค	วันที่คาดว่าจะก่อให้เกิด (ระบุเป็นตัวเลข เช่น วันที่ 31 ธ.ค. 2565)		
													วัน	เดือน	พ.ศ.
		ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	จำนวน 2 รายการ			20,000,000							วันที่	เดือน	พ.ศ.
744	สำนักบริหารจัดการน้ำและ อุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(3) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำและเครื่องวัดคุณภาพน้ำในเขื่อน เขื่อนจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร - [ 9189 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	2.อนุมัติแผน	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง					10	ม.ค.	2566
748	สำนักบริหารจัดการน้ำและ อุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(76) ศึกษาความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนเขื่อนน้ำบึงคน ตำบลสันใจ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา - [ 9262 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	2.อนุมัติแผน	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง			6. แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/เนื้อหา TOR/		1	ก.พ.	2566
		ส่วนอุทกวิทยา	จำนวน 5 รายการ			11,975,000									
709	สำนักบริหารจัดการน้ำและ อุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.74) โครงการพัฒนาการพยากรณ์ค่าการผันน้ำด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2566 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2169 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	200,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน					30	ธ.ค.	2565
711	สำนักบริหารจัดการน้ำและ อุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.86) จัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2566 ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2181 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,575,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน					31	ม.ค.	2566
712	สำนักบริหารจัดการน้ำและ อุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.107) ป่ารักษากระบวนการข้อมูล ส่วนอุทกวิทยา พ.ศ. 2566 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2202 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	200,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			7. อื่นๆ แก้ไขประมาณการ เนื่องจากมีการรวบรวมและตรวจสอบรายการคำนวณประมาณการจากสำนักงานชลประทาน	เร่งดำเนินการปรับปรุง TOR และ ราคากลาง	31	มี.ค.	2566
729	สำนักบริหารจัดการน้ำและ อุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.2372) โครงการประเมินผลกระทบต่อก่อนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดทำแผนการจัดการตะกอนอย่างยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนอุทกวิทยา - [ 4467 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน			6. แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR	31	มี.ค.	2566
743	สำนักบริหารจัดการน้ำและ อุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.5035) โครงการประเมินผลกระทบต่อก่อนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดทำแผนการจัดการตะกอนอย่างยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำปากลำตะเพิน จังหวัดนครราชสีมา ส่วนอุทกวิทยา - [ 7130 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	2.อนุมัติแผน	2.อนุมัติแผน					31	ม.ค.	2566
