



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๓๒๓/๒๕๖๕

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พ.ม. ๑๑๕

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR จำนวน ๗๖๐ รายการ งบประมาณ ๕,๐๐๐.๓๗๖๖ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๕๓ รายการ งบประมาณ ๓,๙๙๗.๔๔๓๙ ล้านบาท เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา จำนวน ๗๖๕ รายการ งบประมาณ ๕,๓๘๗.๔๘๖๒ ล้านบาท ทำข้อผูกพัน จำนวน ๘,๒๙๗ รายการ งบประมาณ ๕๕,๖๓๕.๑๕๘๘ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๘๗ รายการ งบประมาณ ๔๓๘.๕๙๗๓ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทุกรายการจะต้องดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า สำนัก/กองที่มีรายการงานที่ยังไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า ๑๐๐ รายการ คือ สชป. ๑๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ. กต., ทน.๑-๙ นอ.
11/๑๒ ๒๒๓.๒๐.

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

นายธเนศร์ สมบูรณ์
อช.
๑๑๖๖

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

นายอนุชิต : ๒๒๓ ๒๒๓.๒๐. ๑๑๖๖
๑๑๖๖



รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ
ถึงประกาศ TOR

- ส่วนกลาง

หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวม




การประชุมเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ **ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการภายในวันที่ 14 ต.ค. 2565**

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,975	70,020.47	760	5,000.38	153	3,997.44	765	5,387.49	8,297	55,635.16
กพท.	158	13,162.81	14	535.28	4	414.00	9	1,102.78	131	11,110.75
สพญ.	181	11,182.31	11	309.83	24	2,015.26	14	536.16	132	8,321.06
สคก.	367	1,421.19	6	9.00	5	48.48	5	143.68	351	1,220.03
สบอ.	228	706.59	57	264.33	2	20.48	19	93.71	150	328.07
สบก.	32	598.70					12	94.87	20	503.83
สจด.	49	272.55	7	57.27			15	79.11	27	136.17
สลก.	4	99.97					3	50.89	1	49.08
สสร.	39	513.24	1	6.15	5	35.82	12	151.00	21	320.26
สอส.	13	331.04			5	74.00	1	10.00	7	247.04
ศทส.	1	3.00	1	3.00						
สมต.	48	5,538.62							48	5,538.62

8,297


83.18%

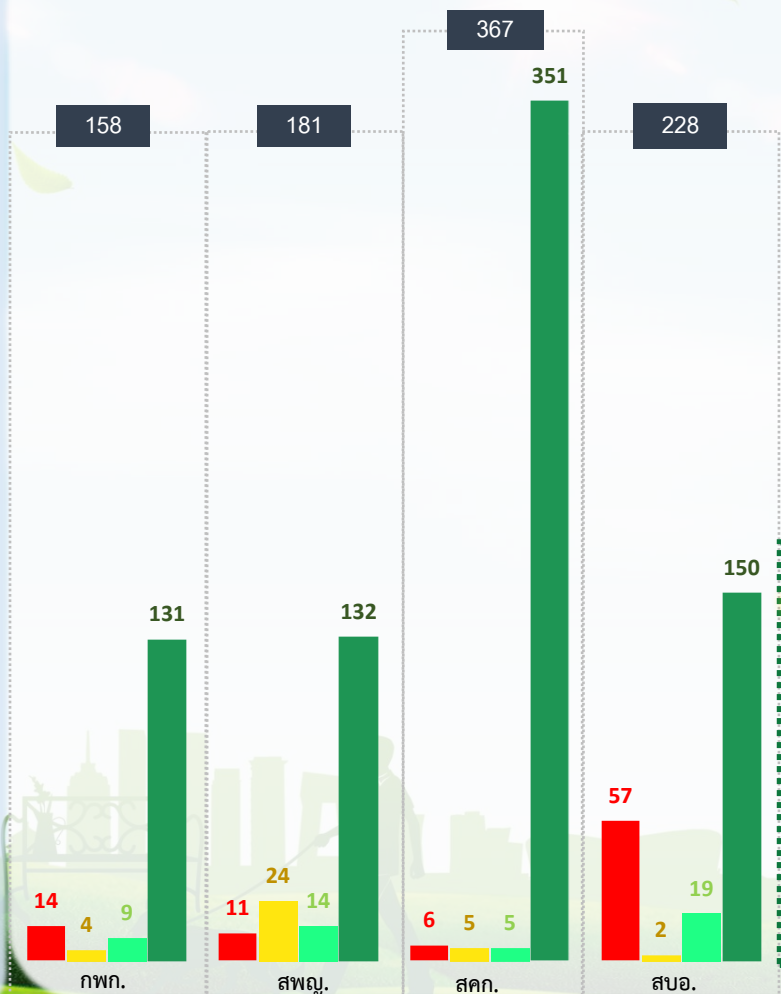

ไม่รวมรายการ จำนวน 90 รายการ งบประมาณ 667.60 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 87 รายการ งบประมาณ 438.60 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

- ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา
- ทำข้อผูกพัน

ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR 760 7.62%
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 153 1.53%
 เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา 765 7.67%
 ทำข้อผูกพัน 8,297 83.18%

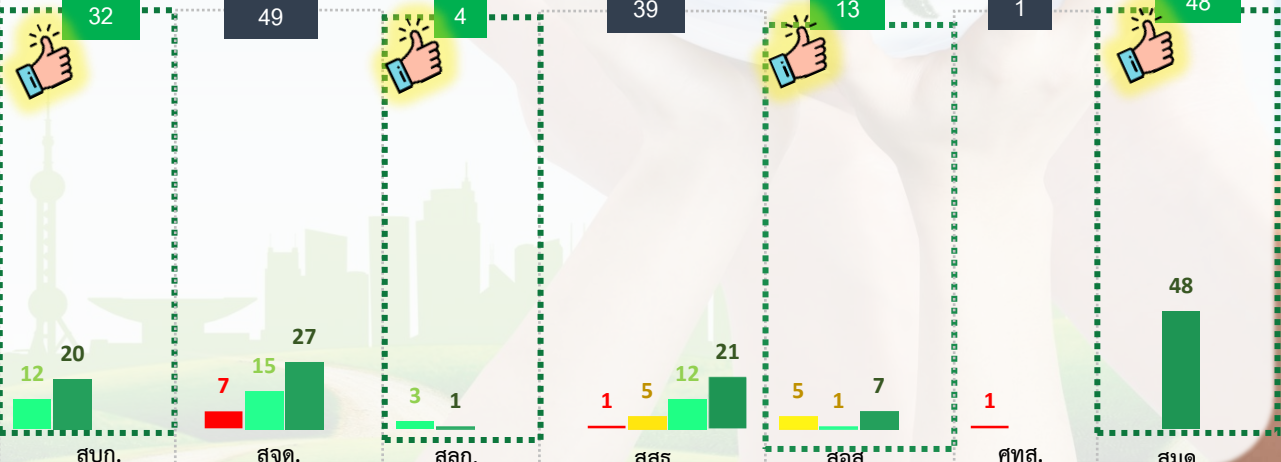

- ส่วนภูมิภาค

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน		สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ				จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	419	1,522.66	5	9.99	5	5.50	12	44.50	397	1,462.68	สขป. 10	609	1,044.83	173	308.14	5	25.92	39	127.79	392	582.98
สขป. 2	405	1,293.45	13	34.26	1	3.00	30	77.04	361	1,179.16	สขป. 11	582	1,575.14	36	304.77	13	100.58	104	97.98	429	1,071.81
สขป. 3	360	2,212.09	15	84.35	2	8.32	24	71.05	319	2,048.38	สขป. 12	675	1,476.89	89	179.58	6	22.03	116	430.75	464	844.54
สขป. 4	534	1,571.89	6	40.61	5	222.49	12	34.14	511	1,274.65	สขป. 13	612	1,321.78	43	394.92	2	20.50	21	17.78	546	888.59
สขป. 5	494	2,660.15	7	6.42	1	16.00	12	59.61	474	2,578.12	สขป. 14	356	3,006.75	35	571.66	3	3.00	42	307.85	276	2,124.25
สขป. 6	500	2,834.39	10	85.85	2	51.00	27	147.95	461	2,549.59	สขป. 15	501	1,215.79	69	175.95	6	156.50	21	209.18	405	674.16
สขป. 7	654	5,051.26	5	182.50	8	41.40	5	6.62	636	4,820.75	สขป. 16	521	3,212.46	43	772.45	14	517.00	57	634.02	407	1,288.98
สขป. 8	625	3,421.90	17	305.47	15	118.42	25	250.44	568	2,747.58	สขป. 17	265	1,082.67	13	90.24	1	1.20	63	491.68	188	499.54
สขป. 9	743	1,686.34	84	268.35	19	76.55	65	116.92	575	1,224.52											



ไม่รวมรายการ จำนวน 90 รายการ งบประมาณ 667.60 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 87 รายการ งบประมาณ 438.60 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

