



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘, ๒๒๘๖
ที่ กพง ๐๖/๙๔๕๕/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รช.10155

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR จำนวน ๕๗๙ รายการ งบประมาณ ๔,๓๔๑.๗๔๘๒ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๒๘ รายการ งบประมาณ ๓,๓๑๘.๗๑๒๖ ล้านบาท เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา จำนวน ๖๘๘ รายการ งบประมาณ ๕,๗๑๙.๖๕๗๐ ล้านบาท ทำข้อผูกพัน จำนวน ๘,๕๖๗ รายการ งบประมาณ ๕๖,๕๘๗.๑๔๕๘ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๑๐๐ รายการ งบประมาณ ๔๙๑.๗๙๙๓ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทุกรายการจะต้องดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า สำนัก/กองที่มีรายการงานที่ยังไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า ๑๐๐ รายการ คือ สขป. ๑๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

ต้นเตี๊ยม

[Signature]
(นายวิทยา แก้วมี)

เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.๑-๙ บอ. และ ผบท.บอ.
เพื่อโปรดทราบและเร่งรัดการเบิกจ่าย

ผอ.ผง.

[Signature]

(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.
๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕



รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR

[Handwritten signature]


รายงานผลตรวจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 - ส่วนกลาง

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 13 ธ.ค. 65

นาย : ตำบลท่า

ภาพรวม


การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการภายในวันที่ 14 ต.ค. 2565

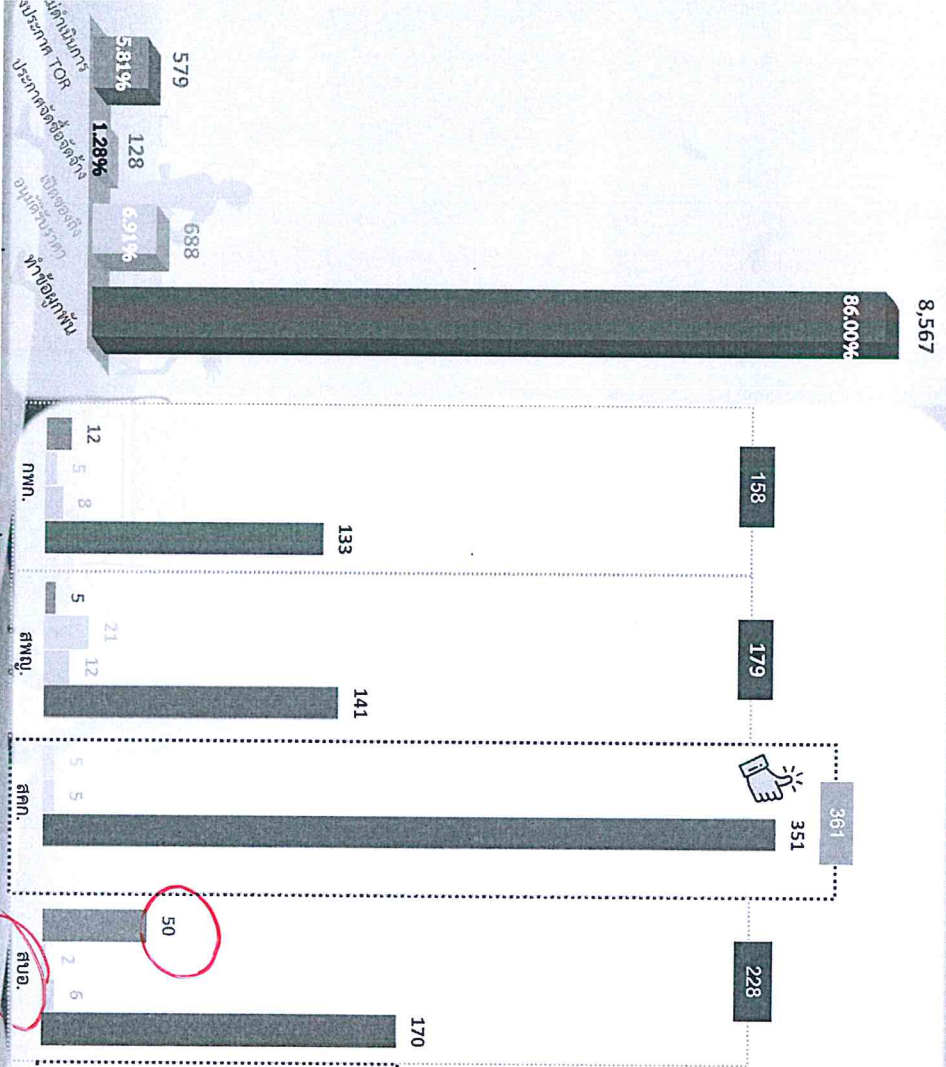

สำนัก/กอง	จำนวนรายการที่สิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ได้ในการถึงประกาศ TOR	งบประมาณ	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดของถึงอนุมัติราคา	ทำสัญญา
รวม	9,962	69,967.26	579	4,341.75	128	3,318.71	688
อำนวยการ	158	13,162.81	12	427.80	5	511.47	8
ประกวดราคา	179	11,147.31	5	270.05	21	1,599.86	12
คัดเลือก	361	1,412.19	50	260.84	5	48.48	5
ราคาซองปิดซอง	228	706.59	2	260.84	2	20.48	6
ราคาซองเปิดซอง	32	598.70					12
ราคาซองเปิดซองแบบพิเศษ	49	272.55			4	16.57	11
ราคาซองเปิดซองแบบพิเศษ (กรณีฉุกเฉิน)	4	99.97					3
ราคาซองเปิดซองแบบพิเศษ (กรณีฉุกเฉิน - กรณีพิเศษ)	39	513.24			1	6.22	12
ราคาซองเปิดซองแบบพิเศษ (กรณีฉุกเฉิน - กรณีพิเศษ - กรณีพิเศษ)	13	331.04			1	55.00	5
ราคาซองเปิดซองแบบพิเศษ (กรณีฉุกเฉิน - กรณีพิเศษ - กรณีพิเศษ - กรณีพิเศษ)	1	3.00	1	3.00			7
ราคาซองเปิดซองแบบพิเศษ (กรณีฉุกเฉิน - กรณีพิเศษ - กรณีพิเศษ - กรณีพิเศษ - กรณีพิเศษ)	48	5,538.62					48

ไม่รวมรายการ จำนวน 103 รายการ งบประมาณ 720.80 ล้านบาท ดังนี้

- ยกเลิก จำนวน 100 รายการ งบประมาณ 491.80 ล้านบาท
- รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

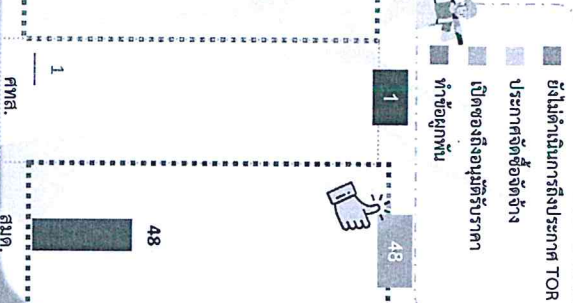

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566


- ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลจากระบบ Gen Project ณ วันที่ 13 ธ.ค. 65

สำนัก/กอง	จำนวนรายการที่สิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึง		ประกาศซื้อจ้าง	เปิดของถึง	ทำสัญญา	สำนัก/กอง	จำนวนรายการที่สิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึง		ประกาศซื้อจ้าง	เปิดของถึง	ทำสัญญา
			จำนวน	งบประมาณ							จำนวน	งบประมาณ			
สชป. 1	418	1,522.48	4	9.81	5	5.50	10	43.61	399	1,463.57	10	43.61	399	1,463.57	
สชป. 2	405	1,293.45	8	31.79	6	5.47	24	69.45	367	1,186.74	24	69.45	367	1,186.74	
สชป. 3	360	2,212.09	10	69.85	2	8.32	23	67.05	325	2,066.88	23	67.05	325	2,066.88	
สชป. 4	534	1,571.89	6	40.61	5	222.49	12	34.14	511	1,274.65	12	34.14	511	1,274.65	
สชป. 5	494	2,660.15	5	4.42	1	16.00	10	59.34	478	2,580.39	10	59.34	478	2,580.39	
สชป. 6	500	2,834.39	5	62.27	3	17.00	21	172.25	471	2,582.88	21	172.25	471	2,582.88	
สชป. 7	654	5,051.26	5	182.50			13	48.01	636	4,820.75	13	48.01	636	4,820.75	
สชป. 8	625	3,421.90	11	229.53	10	97.10	20	175.49	584	2,919.78	20	175.49	584	2,919.78	
สชป. 9	743	1,686.34	73	261.44	15	18.05	58	163.77	597	1,243.08	58	163.77	597	1,243.08	
สชป. 10	609	1,044.83	609	224.31	3	21.92	31	124.02	447	674.58	31	124.02	447	674.58	
สชป. 11	582	1,575.14	30	271.81	15	126.56	92	93.61	445	1,083.17	92	93.61	445	1,083.17	
สชป. 12	674	1,469.89	70	155.29	6	24.10	104	300.24	494	990.25	104	300.24	494	990.25	
สชป. 13	612	1,321.78	25	382.56	2	20.50	15	12.23	570	906.50	15	12.23	570	906.50	
สชป. 14	356	3,006.75	35	571.66	1	0.50	38	243.63	282	2,190.96	38	243.63	282	2,190.96	
สชป. 15	500	1,215.76	54	169.09	6	156.50	20	208.98	420	681.19	20	208.98	420	681.19	
สชป. 16	519	3,210.46	33	631.95	11	335.05	60	931.01	415	1,312.45	60	931.01	415	1,312.45	
สชป. 17	265	1,082.67	5	64.61	2	2.15	63	462.41	195	553.49	63	462.41	195	553.49	

ไม่รวมรายการ จำนวน 103 รายการ งบประมาณ 720.80 ล้านบาท ดังนี้

- ยกลัก จำนวน 100 รายการ งบประมาณ 491.80 ล้านบาท
- รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

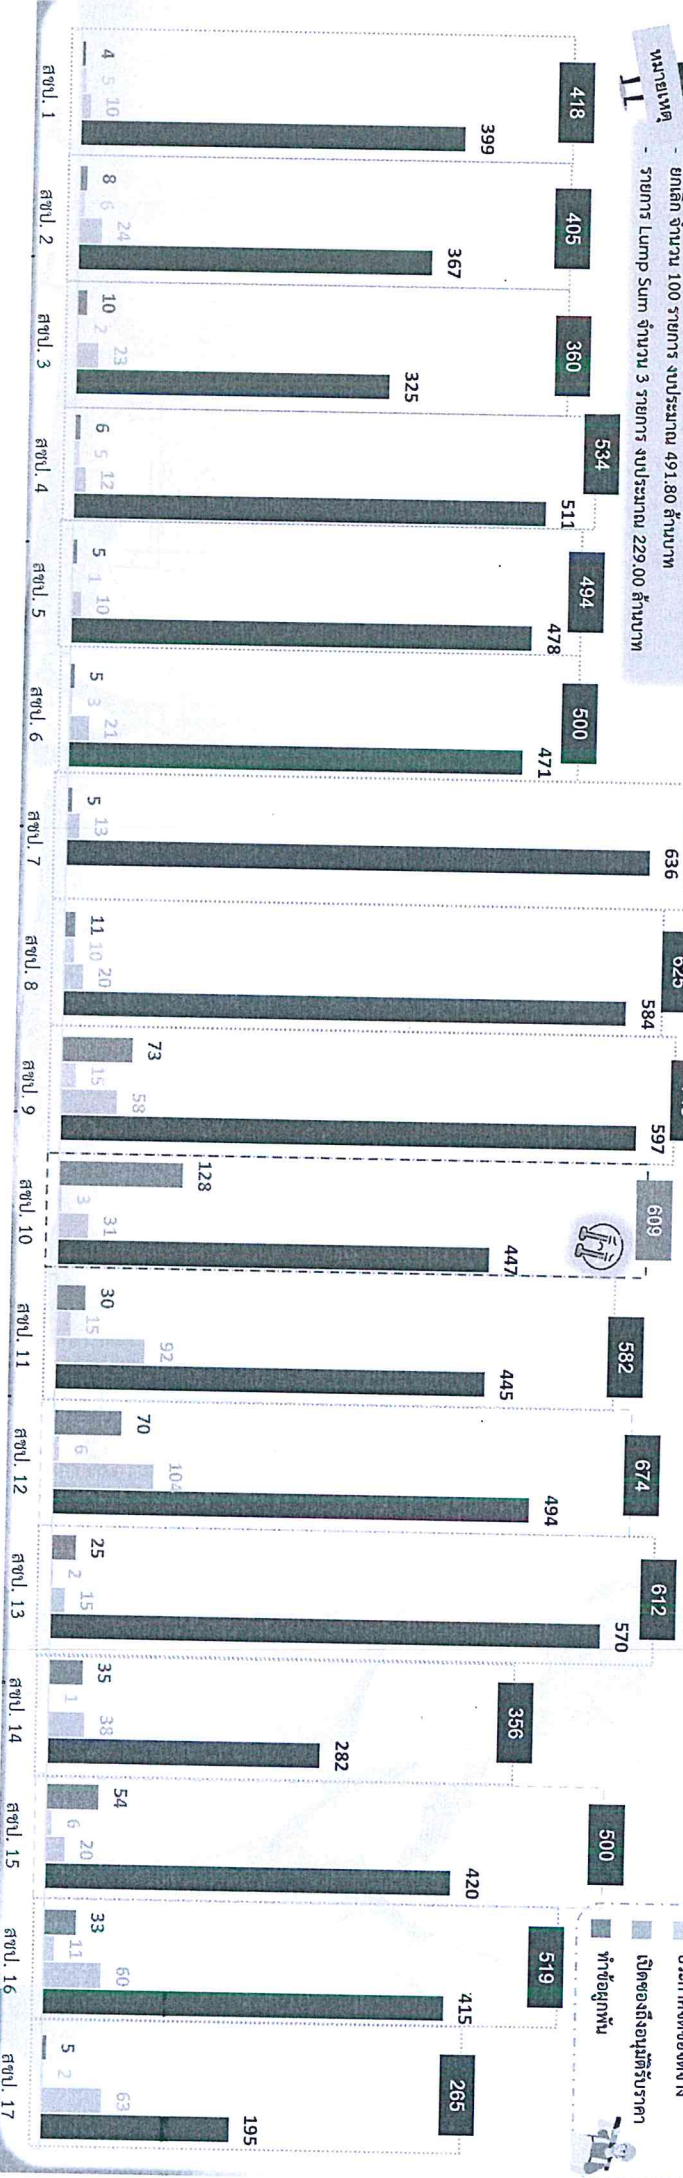

ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR
 ประกาศซื้อจ้าง
 เปิดของถึงอนุมัติรับราคา
 ทำสัญญา

พื้นที่	ชื่อโครงการงานที่มีเลขของใบ)	แหล่งที่มาโครงการ	ประเภทงาน	งบค่าจ้างปี พ.ศ. 2566 (บาท)	ขั้นตอนการจัดจ้าง วันที่ 13/12/65
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.3970) ค่าซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีอุทกวิทยาของประทาน ศูนย์อุทกวิทยาของประทานภาคใต้ พ.ศ.2566 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [6065]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	777,500	2.อนุมัติแผน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.3971) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาของประทานภาคใต้ พ.ศ.2566 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [6066]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,260,000	2.อนุมัติแผน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.3972) ค่าสำรวจลอกคู คลองฝาย และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาของประทานภาคใต้ พ.ศ.2566 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [6067]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,124,000	2.อนุมัติแผน -
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.3973) ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำท่วม ศูนย์อุทกวิทยาของประทานภาคใต้ พ.ศ.2566 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [6068]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	181,800	2.อนุมัติแผน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.4106) โครงการศึกษาและสาธิตการทำนากบลดก้นหูลงและประหยัสน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำน่าน ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [6201]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	166,000	2.อนุมัติแผน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.5035) โครงการประเมินผลกระทบต่อตะกอนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดทำแผนการจัดการตะกอนอย่างยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำปางสักหลิงฮี จังหวัดลพบุรี ส่วนอุทกวิทยา - [7130]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	2.อนุมัติแผน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(3) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9189]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	2.อนุมัติแผน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(5) ค่าเช่าหอส่งน้ำรักษาไว้ระเทศขนาดใหญ๋ 22 ลุ่มน้ำหลัก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9191]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000	2.อนุมัติแผน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(7) งานโทรมาตรเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรีเขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9193]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	16,585,300	2.อนุมัติแผน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(9) ค่าตรวจปกติส่งน้ำและจัดทำ rating curve สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [9195]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	46,640,000	2.อนุมัติแผน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(76) ศึกษาความมั่นคงเขื่อนระยองเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันไร่ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก - [9262]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	2.อนุมัติแผน
