



## บันทึกข้อความ

สป11/655/2565

20 ม.ค.65 (16.53 น.)

424

ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๒๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รับ. 519

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ดำเนินการมาด้วยแล้ว




(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ



(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕

โดยน พอ.สม., พอ.ทต., ทน.จ-ส.มอ.,

พมท.มอ. (ม.มอ., พด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ



(นายประยูร เย็นใจ)

ผชช.จช.3 รักษาการแทน ผส.บอ.

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕



**สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ**  
**ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 6 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 98,998.27 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 22,605.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.83 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 13,834 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 141 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.02 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2,273 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.43 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 10,015 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.39 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,310 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.47 และยกเลิก จำนวน 95 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.69 จำแนกได้ดังนี้

1. **งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.)** งบประมาณ จำนวน 77,143.43 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 13,596.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.62 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,118.69 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,788.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.13 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 70,024.74 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 11,807.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.86 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,554 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 141 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.48 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 746 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.81 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 8,363 รายการ คิดเป็นร้อยละ 87.53 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 214 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.24 และยกเลิก จำนวน 90 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.94 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น

2. **งบเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564** งบประมาณ จำนวน 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,423.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.34 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว จำนวน 83.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 7,776.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.92 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,067 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 710 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.54 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 357 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.46

3. **งบกลาง พ.ศ. 2564** งบประมาณ จำนวน 4,605.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,934.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.02 มีจำนวนรายการ 1,188 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 790 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.50 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 396 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 เนื่องจากมีการแก้ไขสถานที่การดำเนินงานจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

4. **เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)** ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 งบประมาณ จำนวน 4,224.82 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,497.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.78 มีจำนวนรายการ 384 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 54 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.06 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 327 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.16 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น ดำเนินการแล้ว

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 806.12 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 มีจำนวนรายการ 1,541 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1,525 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.96 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.04

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 152.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.29 มีจำนวนรายการ 100 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.00 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 98 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.00

\*\*\*\*\*



# ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

## ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

## รายละเอียดข้อมูล

- 1 วัตถุประสงค์ดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)
  - 2.1 วัตถุประสงค์อนุมัติผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  - 2.2 วัตถุประสงค์อนุมัติผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง
  - 2.3 วัตถุประสงค์จัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง
  - 2.4 วัตถุประสงค์จัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
  - 2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  - 2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
  - 2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
  - 2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  - 2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565
- 3 งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 6 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## รายละเอียดงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

## ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

## ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)

งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ
----------	------------	--------	-----	-----------------	---------------------------	------------------------------	-----------

98,998.27	22,605.17	22.83	13,834	141	2,273	10,015	1,310
-----------	-----------	-------	--------	-----	-------	--------	-------

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (กรมบัญชีกลาง)

1.1 งบรายจ่ายประจำ

1.2 งบรายจ่ายลงทุน

2. งบเงินกู้เงินกู้ยืมเพื่อปี พ.ศ. 2563

3. งบกลาง พ.ศ. 2564

3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564

- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

- โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่วัดแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

3.2 โครงการอื่นนอกงบประมาณพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี พ.ศ. 2564

4. เงินกู้ ประจำปี พ.ศ. 2564

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565

6. จัดสรรที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565

4,605.14	1,934.98	42.02	1,188				
3,419.87	1,234.45	36.10	1,117				
426.47			24				
1,183.31	324.31	27.41	44				6
1,562.30	904.76	57.91	1,046				366
94.70	0.07	0.07	1				1
83.09	1.26	1.52	1				1
70.00	4.05	5.78	1				1
1,185.27	700.53	59.10	71				24
4,224.82	3,497.44	82.78	384				54
806.12	0.95	0.12	1,541		1,525		16
935.00	152.36	16.29	100		2		98



งบลงทุน

# 2

## ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

### 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### ผลการก่อหนี้ผูกพัน


ข้อมูลจาก ระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 1

รายการ 9,554

งบ พ.ร.บ.




งบจัดสรร

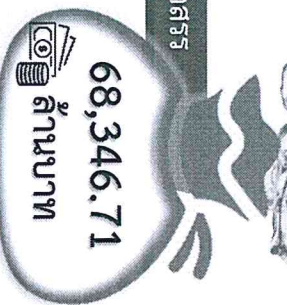

✗	1.48%	141
✗	7.81%	746
✓	89.77%	8,577
CANCEL	0.94%	90





1,827.87
8,697.29
58,323.57
1,286.89

1,827.82
8,691.04
57,827.85

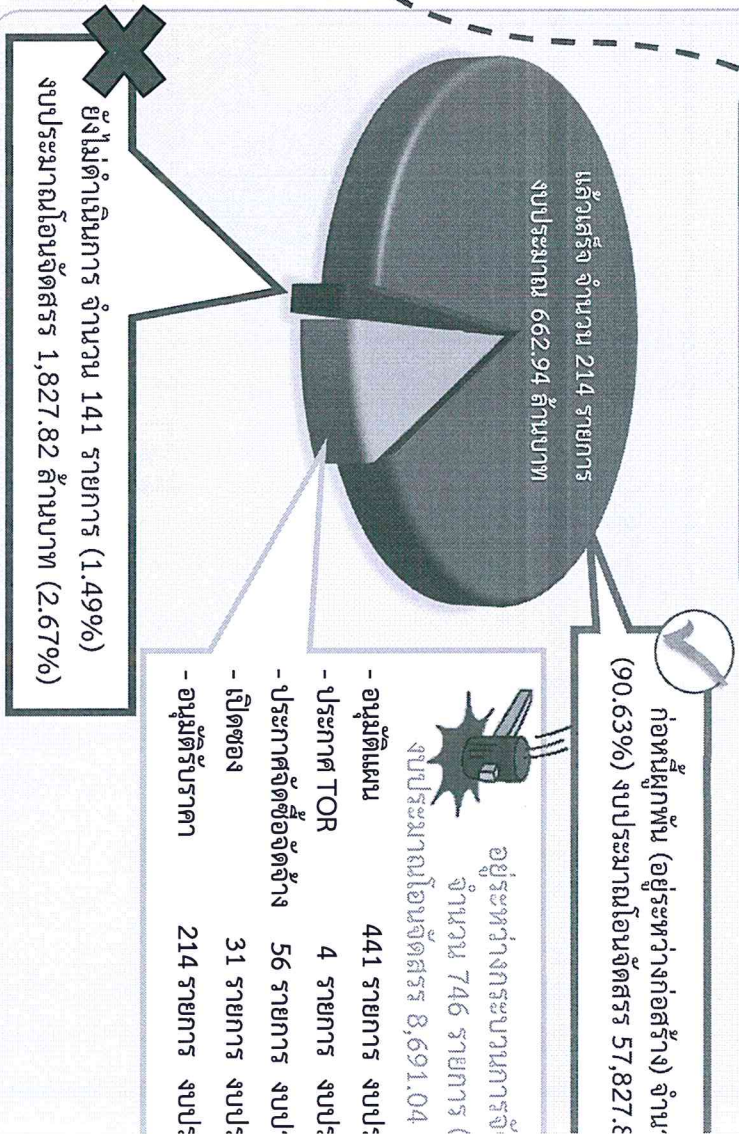


- อยู่ระหว่างกระบวนการจัด จำนวน 746 รายการ ( 8,691.04
- อนุมัติแผน 441 รายการ งบประ
  - ประกาศ TOR 4 รายการ งบประ
  - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 56 รายการ งบประ
  - เปิดซอง 31 รายการ งบประ
  - อนุมัติรับราคา 214 รายการ งบประ

- ✗ ยังไม่ดำเนินการ
- ✗ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ✓ ก่อหนี้ผูกพัน
- CANCEL ยกเลิก





สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

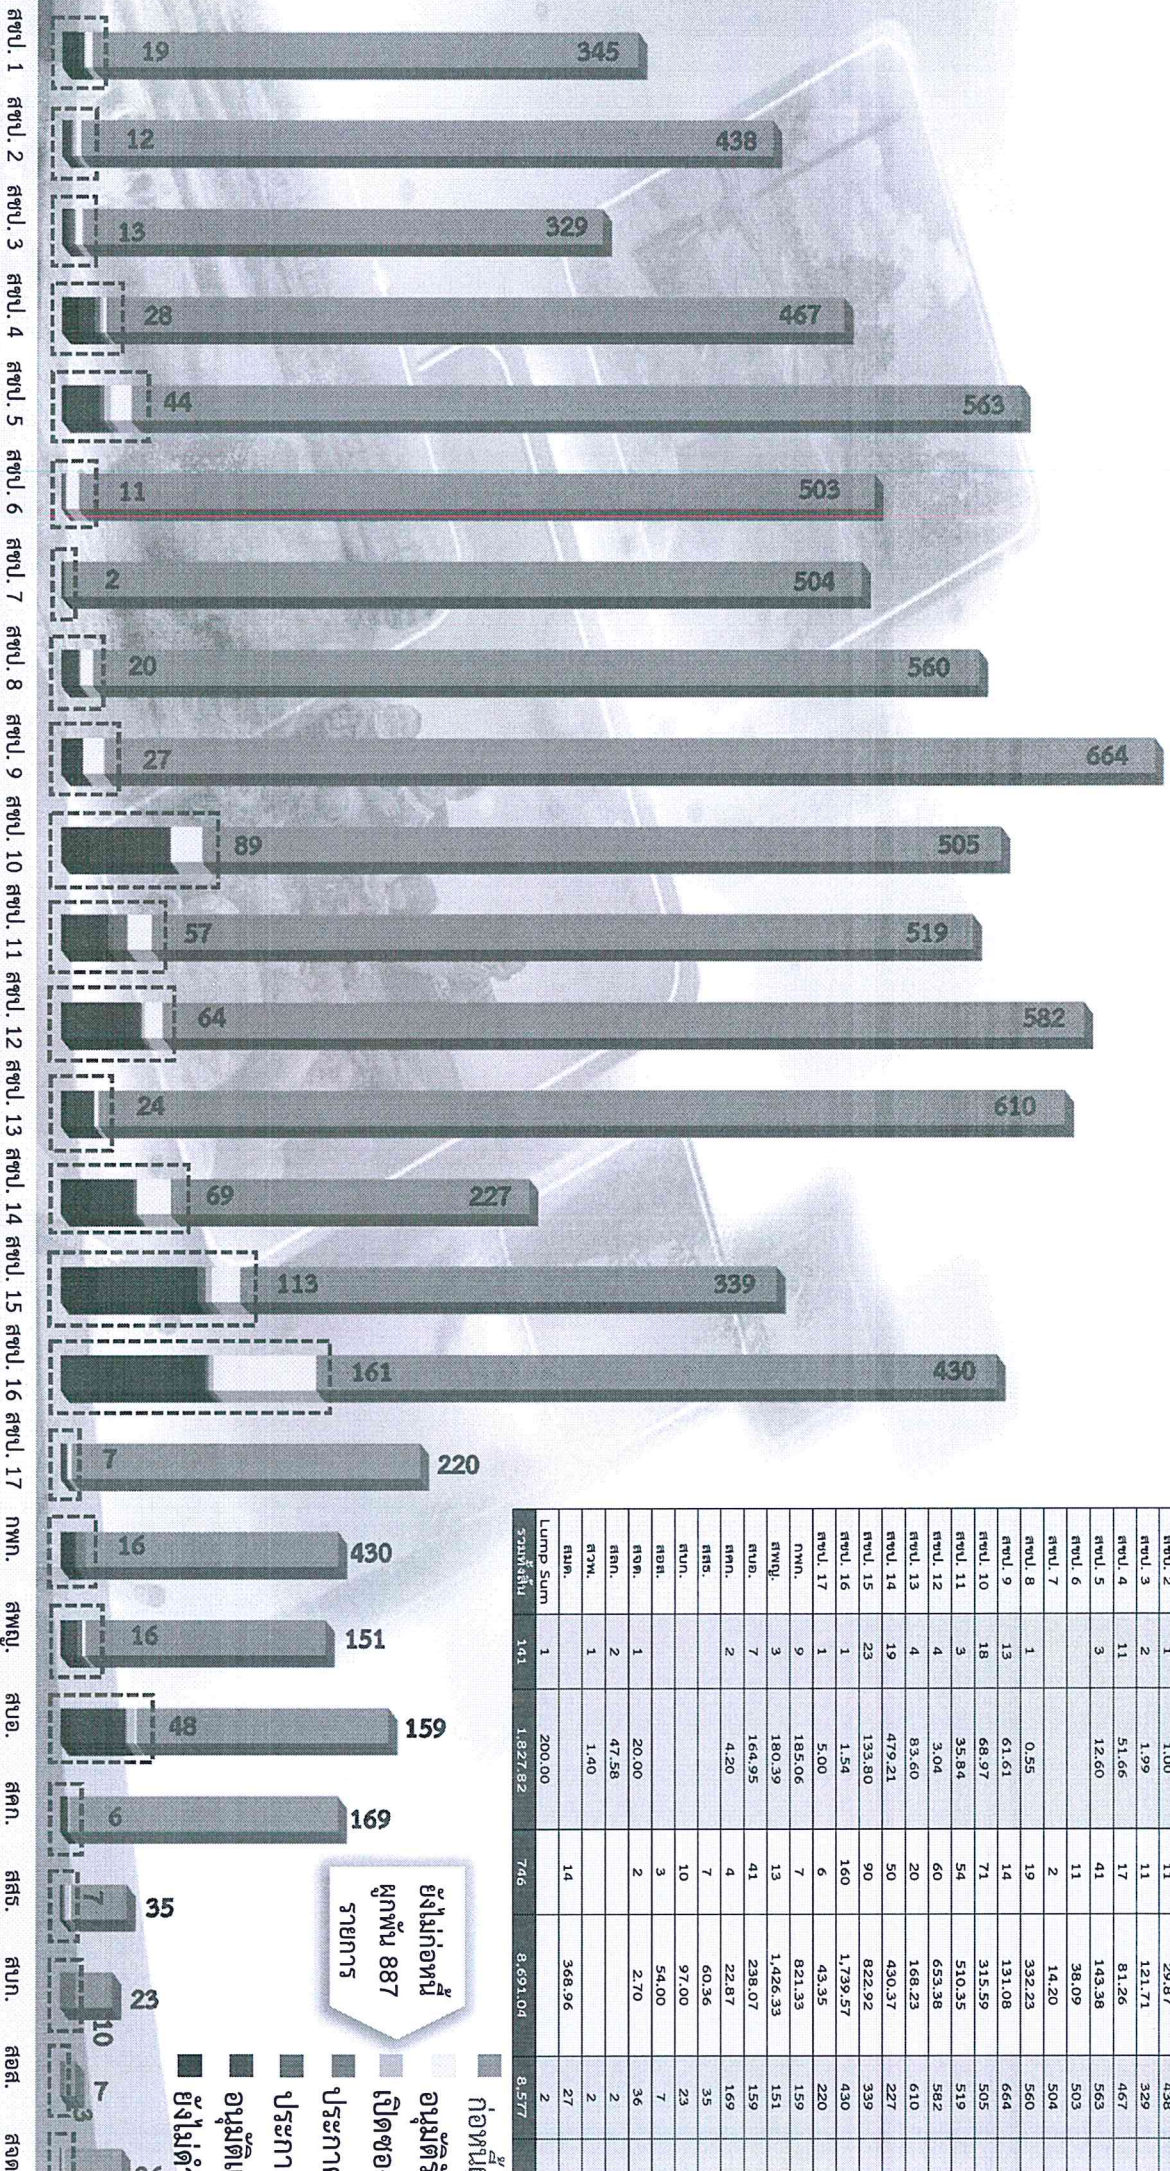

ก่อหนี้  
 อนุมัติ  
 เปิดขอ  
 ประกาศ  
 ประการ  
 อนุมัติ  
 ยังไม่ได้  
 ยังไม่ก่อหนี้  
 ผูกพัน 887  
 รายการ



# 2.3

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS จากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบประมาณ โอนจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ			อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			จำนวนรายการ	งบจัดสรร (ล้านบาท)	ทำข้อผูกพัน				
						จำนวนรายการ	งบจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบจัดสรร (ล้านบาท)			อัตราผูกพัน				
														0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-	
รวม	68,848.73	68,346.71	11,711.47	17.14	9,464	141	1,827.82	746	8,691.04	8,577	57,827.85	5,519	1,180	691	1			
สชป. 1	1,608.42	1,607.13	370.27	23.04	364	11	83.84	8	23.86	345	1,499.43	90	87	69				
สชป. 2	1,890.25	1,875.38	217.38	11.59	450	1	1.00	11	29.87	438	1,844.52	312	66	36				
สชป. 3	2,334.81	2,337.33	170.13	7.28	342	2	1.99	11	121.71	329	2,213.64	227	21	20				
สชป. 4	1,082.89	1,079.94	142.83	13.23	495	11	51.66	17	81.26	467	947.02	384	51	20				
สชป. 5	2,677.70	2,778.92	464.98	16.73	607	3	12.60	41	143.38	563	2,622.95	284	99	58				
สชป. 6	2,646.30	2,628.42	630.27	23.98	514			11	38.09	503	2,590.33	154	63	49				
สชป. 7	2,404.07	2,373.32	994.81	41.92	506			2	14.20	504	2,359.12	141	110	105				
สชป. 8	4,047.67	4,028.87	269.34	6.69	580	1	0.55	19	332.23	560	3,696.10	389	62	39				
สชป. 9	2,464.74	2,437.53	392.88	16.12	691	13	61.61	14	131.08	664	2,244.84	409	121	46				
สชป. 10	1,343.45	1,342.48	113.84	8.48	594	18	68.97	71	315.59	505	957.92	425	32	23				
สชป. 11	1,582.28	1,579.35	120.49	7.63	576	3	35.84	54	510.35	519	1,033.16	391	68	40				
สชป. 12	2,418.02	2,366.54	270.03	11.41	646	4	3.04	60	653.38	582	1,710.13	358	86	53				
สชป. 13	2,130.91	2,117.82	221.62	10.46	634	4	83.60	20	168.23	610	1,865.99	435	108	21				
สชป. 14	3,261.18	3,257.91	393.04	12.06	296	19	479.21	50	430.37	227	2,348.33	116	34	32				
สชป. 15	1,900.69	1,899.63	122.36	6.44	452	23	133.80	90	822.92	339	942.91	302	26	6				
สชป. 16	3,057.93	3,049.59	64.00	2.10	591	1	1.54	160	1,739.57	430	1,308.48	347	17	27				
สชป. 17	682.65	672.68	42.84	6.37	227	1	5.00	6	43.35	220	624.33	173	27	8				
พจน.	12,255.70	11,934.04	2,228.31	18.67	175	9	185.06	7	821.33	159	10,927.65	142	5	6				
สพญ.	12,143.33	12,070.03	2,444.33	20.25	167	3	180.39	13	1,426.33	151	10,463.32	134	8	2				
สพอ.	699.63	696.41	37.24	5.35	207	7	164.95	41	238.07	159	293.39	79	62	11				
สพท.	727.00	727.00	201.37	27.70	175	2	4.20	4	22.87	169	699.93	139	13	7				
สสอ.	531.51	529.13	75.58	14.28	42			7	60.36	35	468.77	35						
สพท.	549.48	549.48	59.62	10.85	33			10	97.00	23	452.48	23						
สสอ.	376.65	376.65	33.58	8.91	10			3	54.00	7	322.65	7						
สจต.	158.22	157.88	45.17	28.61	39	1	20.00	2	2.70	36	135.18	7	10	8				
สสท.	82.68	82.68	0.12	0.15	4	2	47.58			2	35.10	2						
สวท.	4.71	4.71	0.08	1.74	3	1	1.40			2	3.31	2						
สผด.	3,536.83	3,536.83	1,584.74	44.81	41	1		14	368.96	27	3,167.88	10	4	5				
Lump Sum	249.00	249.00	0.22	0.09	3	1	200.00			2	49.00	2						

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 90 รายการ งบประมาณ 1,286.89 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบบุคลากร เงินเพื่อจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น

# งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

บัญชี พ.ศ. 2564

1,067 รายการ

83.76 ล้านบาท

**ผลการเบิกจ่าย**

3,423.04 ล้านบาท 30.34 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

83.90 ล้านบาท 0.74 %

**คงเหลือต้องดำเนินการต่อ**

7,776.82 ล้านบาท

68.92 %

**สถานะการดำเนินงาน**

ดำเนินการแล้วเสร็จ 357 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 710 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน



## แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564

5,46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95
6,97	1,077.98	347.53								
3,49	-1,221.49	-1,238.71								

เบิกจ่าย 100%

64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4

# ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

## นิมิตงาน

งบ อนุมัติงบกลาง 64 รวม

1,188 รายการ

05.14 ว่างบาท

ว่างบาท 42.02 %

## ผลการดำเนินงาน



แล้วเสร็จ

396 รายการ 33.33 %



ดำเนินการ

790 รายการ 66.50 %

## ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ละประมาณ 900 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่

พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 300,404 30.27 % ไร่

ปริมาณน้ำ 16.74 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์ = 1.27 ล้าน ลบ.ม. 7.59 %

ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 41,933 ครัวเรือน 29.73 %



44 รายการ

1,183.31 ว่างบาท

เบิกจ่าย 324.31 ว่างบาท  
คิดเป็นร้อยละ 27.41

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 38 รายการ
  - แล้วเสร็จ 6 รายการ
- 25.46 %

พื้นที่รับประโยชน์ 16 ก.ล. 64



1,046 รายการ

1,562.30 ว่างบาท

เบิกจ่าย 904.76 ว่างบาท  
คิดเป็นร้อยละ 57.91

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 678 รายการ
  - แล้วเสร็จ 366 รายการ
  - ยกเลิก 2 รายการ
- 51.22 %

พื้นที่รับประโยชน์ 23 ก.ม. 64



1 รายการ

94.70 ว่างบาท

เบิกจ่าย 0.070 ว่างบาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.07

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ
- 1 %

พื้นที่รับประโยชน์ 29 ก.ม. 64



1 รายการ

83.09 ว่างบาท

เบิกจ่าย 1.26 ว่างบาท  
คิดเป็นร้อยละ 1.52

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ
- 5 %

พื้นที่รับประโยชน์ 29 ก.ล. 64




1 รายการ

70.00 ว่างบาท

เบิกจ่าย 4.05 ว่างบาท  
คิดเป็นร้อยละ 5.78

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ
- 15.00 %

พื้นที่รับประโยชน์ 29 ก.ม. 64



71 รายการ

1,185.27 ว่างบาท

เบิกจ่าย 700.53 ว่างบาท  
คิดเป็นร้อยละ 59.10

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 47 รายการ
  - แล้วเสร็จ 24 รายการ
- 38.23 %

พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่า เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ปี 2564

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำฝายใหญ่ฝายขวา 3 และคลองระบายน้ำชาติ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝายแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

ดำเนินงานก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564

# เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการเงินฟิวเจอร์ธุรกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

จ่ายงบประมาณ  
ณ 4,224.8246 ล้านบาท


97.43	ล้านบาท	82.78%
4.54	ล้านบาท	12.89%
2.84	ล้านบาท	4.33%

54	รายการ	= 14.06%
327	รายการ	= 85.16%
3	รายการ	= 0.85%

รวมจากแหล่งอื่นเพื่อดำเนินการแล้ว

567	ไร่	= 11,607 ไร่	59.02%
98	ล้าน ลบ.ม.	= 6.56 ล้าน ลบ.ม.	24.31%
6,53	ไร่	= 143,369 ไร่	68.38%
9,52	ครัวเรือน	= 46,004 ครัวเรือน	70.83%
3,716	คน	= 10,657 คน	109.69%

จำนวนรายการ  
ผลการดำเนินงานจำแนกตามสำนัก/กอง

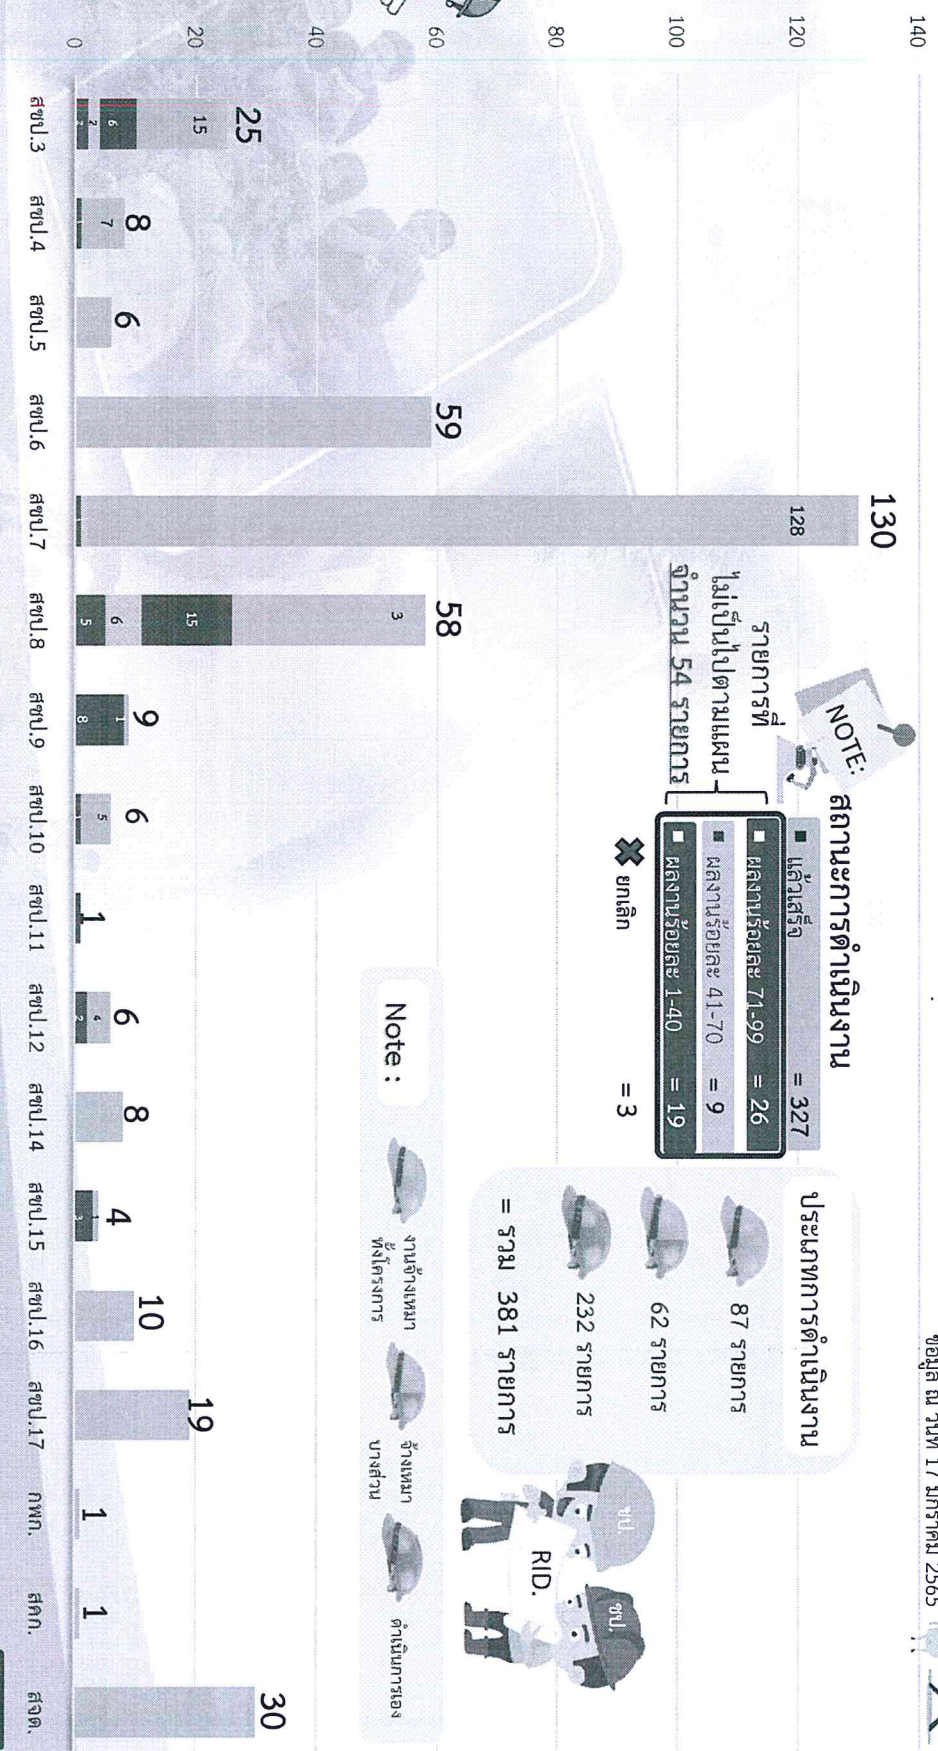

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่ สชป.6 = 2 รายการ และสชป.7 = 1 รายการ  
2. งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 182.84 ล้านบาท เนื่องจากการทำงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว

สำนัก/กอง




กระทรวงศึกษาธิการ

# ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 17 มกราคม 2565)

## ยอดและผลความสำเร็จของงานด้านการดำเนินงาน

### จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

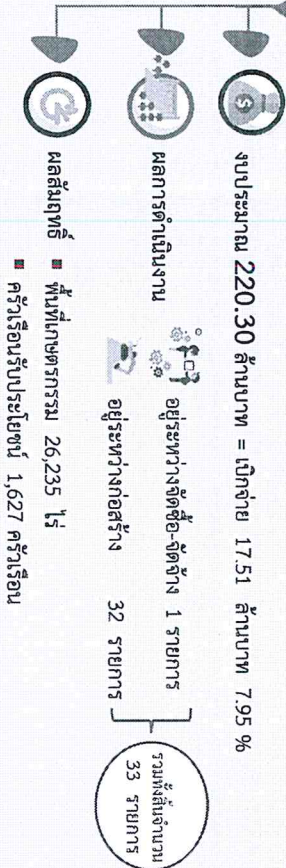

### จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร

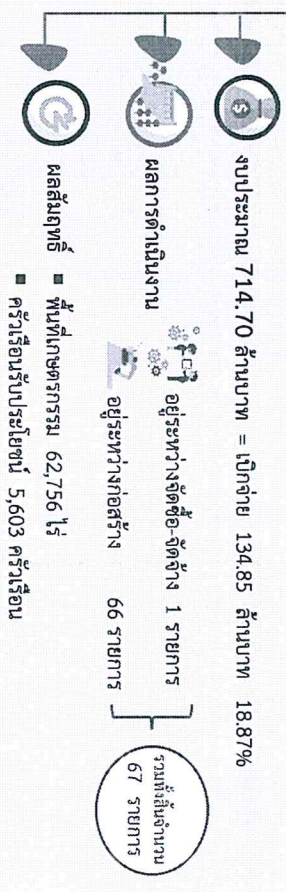

## ทุนคืน

### ภาพรวม

งบประมาณ 935.00 ล้านบาท  
= เบิกจ่าย 152.35 ล้านบาท 16.29%



ผลการดำเนินงาน : 100 รายการ



ผลสัมฤทธิ์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 2 รายการ

▪ พื้นที่เกษตรกรรม 88,991 ไร่

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 98 รายการ

□ ครบถ้วนรับประโยชน์ 7,230 ครัวเรือน

## หมุนเวียน งบประมาณ


### ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ 806.12 ล้านบาท  
งบจัดสรร 336.50 ล้านบาท  
= เบิกจ่าย 0.95 ล้านบาท 0.12%

### ผลการดำเนินงาน : 1,541 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,525 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 รายการ



สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบ พ.ร.บ. ปี 65 (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	141	1,827.8688
สขป. 1	11	83.8369
สขป. 2	1	1.0000
สขป. 3	2	2.0330
สขป. 4	11	51.6620
สขป. 5	3	12.6000
สขป. 8	1	0.5460
สขป. 9	13	61.6095
สขป. 10	18	68.9708
สขป. 11	3	35.8441
สขป. 12	4	3.0350
สขป. 13	4	83.6000
สขป. 14	19	479.2090
สขป. 15	23	133.8046
สขป. 16	1	1.5400
สขป. 17	1	5.0000
สบอ.	7	164.9468
สพญ.	3	180.3856
สลก.	2	47.5842
สวพ.	1	1.4000
กพก.	9	185.0613
สคก.	2	4.2000
สจค.	1	20.0000
Lump Sum	1	200.0000

## รายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 141 รายการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 65
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 141 รายการ			1,827,868,800
1	สขป. 1	(1.1648) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดุมธราฯ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3840 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
2	สขป. 1	(1.1537) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [ 3729 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
3	สขป. 1	(1.1434) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำโอง่าง โครงการชลประทานลำพูน ปริมาณดิน 35,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน - [ 3626 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,035,000
4	สขป. 1	(1.1210) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปริมาณดิน 29,907 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3402 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	488,500
5	สขป. 1	(1.1209) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปริมาณดิน 26,168 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3401 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	427,300
6	สขป. 1	(1.1208) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ปริมาณดิน 26,791 ลูกบาศก์เมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันโอง อำเภอเวียง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3400 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	437,500
7	สขป. 1	(1.1207) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปริมาณดิน 20,037 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3399 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	457,800
8	สขป. 1	(4) ถนนทางเข้าวังงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.000 กม. - [ 2133 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	45,787,500
9	สขป. 1	(3) ถนนพาราเอสพีสิทธิ์รอบแก้วฝั่งแม่แตง แห่งที่ 1 , 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.150 กม. - [ 2132 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	30,525,000
10	สขป. 1	(1.671) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน - [ 1611 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	1,500,000
11	สขป. 1	(1.1464) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3656 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	178,300
12	สขป. 2	(1.1808) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง - [ 4000 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
13	สขป. 3	(1.2032) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC.2)โครงการน้ำริดช่วง 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาจาก ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ - [ 4224 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
14	สขป. 3	(1.1496) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดอุตรดิตถ์ - [ 3688 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	33,000
15	สขป. 4	(139) ปรับปรุงคลองยมเก่าปากน้ำพร้อมระบบระบายน้ำ ระยะที่ 2ตำบลปากน้ำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย - [ 9399 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	15,000,000
16	สขป. 4	(1.2077) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตตาดคลอง LMC กม.56+000 ถึง 57+492 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ - [ 4269 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
17	สขป. 4	(1.2067) ซ่อมแซมตลิ่งและฝายแม่คำมี ตำบลคำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ - [ 4259 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000
18	สขป. 4	(1.2064) ขุดลอกตะกอนคลองขอยในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 16 สาย ตำบลแม่หลายน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ - [ 4256 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,550,000
19	สขป. 4	(1.1122) ขุดลอกตะกอนทราย โดยรถขุดดำเนินการเอง หน้าที่ฝ่ายด้านใหญ่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ปริมาณดิน 252,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโค้งไม้ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร - [ 3314 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000
20	สขป. 4	(1.1121) ขุดลอกตะกอนทราย โดยรถขุดดำเนินการเอง หน้าที่ ปตร.หินชะโงก โครงการชลประทานกำแพงเพชร ปริมาณดิน 252,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร - [ 3313 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000
21	สขป. 4	(1.1120) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายขอย 1R-MC ของขวัญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลาดสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - [ 3312 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,570,000
22	สขป. 4	(1.1119) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ MC ของขวัญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ปริมาณดิน 185,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลาดสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - [ 3311 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,400,000
23	สขป. 4	(1.87) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม พื้นที่ชลประทาน 196,000 ไร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ - [ 2279 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,142,000
24	สขป. 4	(1.34) ปรับปรุง ทบ.ปากคลอง กม.4+793 (เกษตรแปลงใหญ่มหาชัย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยทองแดง ตำบลมหาชัย อำเภอโพธาราม จังหวัดกำแพงเพชร - [ 602 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 65
25	สขป. 4	(1.33) ปรับปรุง ทรบ.ปากคลอง กม.4+004 (เกษตรแปลงใหญ่มหาชัย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต่อของเขต ตำบลมหาชัย อำเภอโทรังาม จังหวัดกำแพงเพชร - [ 601 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000
26	สขป. 5	(1.2410) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมวาทิ จังหวัดอุดรธานี - [ 4602 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
27	สขป. 5	(1.1442) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำข้างเขมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินลิว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม. ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย - [ 3634 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000
28	สขป. 5	(1.67) ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมวาทิ ตำบลแชนล อำเภอภูมวาทิ จังหวัดอุดรธานี - [ 155 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,600,000
29	สขป. 8	(1.1485) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดศรีสะเกษ - [ 3677 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	546,000
30	สขป. 9	(224) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ Spillway อ่างเก็บน้ำดอกกราย พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง - [ 8870 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000
31	สขป. 9	(1.3879) ซ่อมแซมบานระบายน้ำบ้านช้าง ขนาด 1.20x1.50 ม. พร้อมหินเรียงด้านท้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ - [ 6071 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,250,000
32	สขป. 9	(1.3789) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.38+235 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสีอียด ตำบลคูยาดูยามี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 5981 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	420,000
33	สขป. 9	(1.3754) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก - [ 5946 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
34	สขป. 9	(1.3742) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย กม.2+500 ถึง กม.3+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก - [ 5934 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	500,000
35	สขป. 9	(1.3741) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย กม.0+000 ถึง กม.2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 5933 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	500,000
36	สขป. 9	(1.3701) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง - [ 5893 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
37	สขป. 9	(1.1258) จ้างเหมาขุดลอกคลองระบาย ฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+500 ถึง กม.22+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 3450 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	470,000
38	สขป. 9	(1.1257) จ้างเหมาขุดลอกคลองระบาย ฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย ระยะทาง 3,300 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 3449 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	489,000
39	สขป. 9	(1.841) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน พื้นที่ 157 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - [ 3033 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	507,800
40	สขป. 9	(28) ซ่อมสร้างผิวทางเข้าห้วงงานโครงการ ระยะทาง 2.74 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 2157 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	24,000,000
41	สขป. 9	(1.1483) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดระยอง - [ 3675 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,245,000
42	สขป. 9	(1.1473) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดปราจีนบุรี - [ 3665 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	227,700
43	สขป. 10	(60) แก้มลิงลำบางชัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านแปง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [ 9124 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
44	สขป. 10	(58) แก้มลิงคลองบางเขม ปริมาตรเก็บกัก 0.28 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [ 9122 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000
45	สขป. 10	(1.4260) ซ่อมแซมโครงการชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกร โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 6452 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
46	สขป. 10	(1.4254) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 6446 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
47	สขป. 10	(1.4218) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [ 6410 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
48	สขป. 10	(1.4097) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพ็ญ-เส้าไห้ จังหวัดสระบุรี - [ 6289 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
49	สขป. 10	(1.4094) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองส่งน้ำ 2 ขวา กม.3+000 ถึง กม.5+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลหนองชนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 6286 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000



ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 65
50	สขป. 10	(1.4093) ซ่อมแซมเครื่องกวนบ้านระบาย ปรศ.คลองห้วยป่าฝั่งซ้าย ตำบลหนองน้ำใส อำเภอ ภาษี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 6285 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000
51	สขป. 10	(1.4088) ซ่อมแซมแก้มตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 7 ขวา กม.0+500 ถึง กม.3+000 (เป็นช่วงๆ) พื้นที่ 1,000 ตร.ม. ตำบลชลสิทธิ์ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี - [ 6280 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	600,000
52	สขป. 10	(1.4085) ซ่อมแซมคันคลองทวายลายบน ฝั่งขวา กม.7+000 ถึง กม.9+000 (เป็นช่วงๆ) จังหวัดสระบุรี - [ 6277 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	940,000
53	สขป. 10	(1.4065) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา ฝั่งซ้าย กม.2+500 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษามหาราช ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - [ 6257 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	280,000
54	สขป. 10	(1.4063) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา ฝั่งขวา กม.2+335 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - [ 6255 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	280,000
55	สขป. 10	(1.4062) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.21+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - [ 6254 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	800,000
56	สขป. 10	(1.4053) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ซ้าย กม.2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลคตุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [ 6245 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	750,000
57	สขป. 10	(1.4005) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี - [ 6197 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
58	สขป. 10	(1.3883) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท - [ 6075 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
59	สขป. 10	(1.1259) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองส่งน้ำสาย 5 กม.0+000-กม. - 1+500 ปริมาณ ดิน 7,300 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี - [ 3451 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	360,000
60	สขป. 10	(1.1484) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดลพบุรี - [ 3676 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	460,800
61	สขป. 11	(122) ปรับปรุงคันกันน้ำจากอาคารปลายคลองถึงคลองพระยาบรรลือตำบลหลักซ้าย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 9382 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	35,082,500
62	สขป. 11	(1.4370) ซ่อมแซมคันกันน้ำพระยาบรรลือฝั่งเหนือ กม.0+000-2+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนง ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 6562 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	650,000
63	สขป. 11	(1.1471) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดปทุมธานี - [ 3663 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	111,600
64	สขป. 12	(1.165) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบาย 4 ขวา สุพรรณ 1 กิโลเมตร 4+500 ขนาด 8x10 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลนางลิ้อ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท - [ 1921 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
65	สขป. 12	(1.1497) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดอุทัยธานี - [ 3689 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	585,000
66	สขป. 12	(1.1492) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 3684 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	300,000
67	สขป. 12	(1.1461) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดชัยนาท - [ 3653 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	150,000
68	สขป. 13	(47) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ซ้าย กม.56+590 ถึง กม.56+670 ระยะทาง 0.080 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม - [ 8487 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000
69	สขป. 13	(88) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 6Aขวา-สองพี่น้อง กม.0+120 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 804 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	45,000,000
70	สขป. 13	(1.93) ปรับปรุงท่อลอดถนน ค-ส-ร.1ขวานนครชัยศรี กม.5+500 ของคันกันน้ำ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 661 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000
71	สขป. 13	(1.238) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี - [ 326 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,600,000
72	สขป. 14	(92) เขื่อนป้องกันตลิ่งชุมชนบ้านเขาย้อยฝั่งตะวันออก อ.ปราณบุรีตำบลปราณบุรี อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 9352 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	35,000,000
73	สขป. 14	(232) อาคารบังคับน้ำคลองบางโทรดมหรือระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - [ 8878 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	งานปีเดียว	16,529,000
74	สขป. 14	(31) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำปราณบุรี ปริมาณ 501,000ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จุดที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ - [ 8471 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
75	สขป. 14	(1.5549) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 7741 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 65
76	สขป. 14	(1.5529) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนองของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี - [ 7721 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
77	สขป. 14	(1.5460) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทาน ตามข้อเสนองของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 7652 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	970,000
78	สขป. 14	(43) ปรับปรุงถนนลาดยางรอบอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ ตำบลนาทูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 2172 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	45,000,000
79	สขป. 14	(1.56) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 60ซ้าย และ 61ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.370 กม. - [ 2117 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,860,000
80	สขป. 14	(1.55) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 44ซ้าย-4ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.520 กม. - [ 2116 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,100,000
81	สขป. 14	(1.54) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 41ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.655 กม. - [ 2115 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,270,000
82	สขป. 14	(1.53) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 34 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระชาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. - [ 2114 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,080,000
83	สขป. 14	(1.52) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 22ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสทิงพระ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.120 กม. - [ 2113 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,950,000
84	สขป. 14	(1.51) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-5ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสทิงพระ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.480 กม. - [ 2112 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000
85	สขป. 14	(1.50) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-4ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสทิงพระ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. - [ 2111 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,540,000
86	สขป. 14	(1.49) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-2ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสทิงพระ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.700 กม. - [ 2110 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,850,000
87	สขป. 14	(45) ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำวังชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 1672 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	15,000,000
88	สขป. 14	(100) โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 816 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	260,000,000
89	สขป. 14	(97) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำมรสว ตำบลลิ้มเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 813 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	65,000,000
90	สขป. 14	(1.99) ปรับปรุงอาคารรับน้ำเข้า โครงการอ่างเก็บน้ำวังชุมพล 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 667 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,560,000
91	สขป. 15	(162) อ่างเก็บน้ำสำนักสงฆ์ไร่ไหม ปริมาตรเก็บกัก 0.020 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลประสงค อำเภอท่ายาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 8808 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	18,000,000
92	สขป. 15	(1.5694) ซ่อมแซมเครื่องกวนบ้านระบายน้ำฝายไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพ่องันบน ตำบลเกาะขันธุ์ อำเภอยะฮาด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 7886 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	300,000
93	สขป. 15	(1.5690) อาคารบังคับน้ำเหมืองนายปลัด ขนาด 2.00x2.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพ่องันบน จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 7882 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,200,000
94	สขป. 15	(1.5682) ปรับปรุงท่อลอดท่อส่งน้ำบ้านควนมีชัย กม.10+170 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพ่องันบน ตำบลวังอ่าง อำเภอยะฮาด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 7874 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	750,000
95	สขป. 15	(1.5681) ปรับปรุงท่อลอดท่อส่งน้ำบ้านควนมีชัย กม.1+780 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพ่องันบน ตำบลวังอ่าง อำเภอยะฮาด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 7873 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	850,000
96	สขป. 15	(1.5634) ซ่อมแซมคันคลองฝายคลองส่งน้ำสาย LMC ฝ่ายคลองท่าดี ช่วง กม.3+500 - 6+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 7826 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	480,000
97	สขป. 15	(1.1410) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบางกระปือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 232,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 3602 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,245,600
98	สขป. 15	(1.1194) โครงการขุดลอกคลอง 3R-MD3 (คลองวัดลาว) ด้วยรถขุดดำเนินการเอง ปริมาณดินขุด 68,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชะเมา อำเภอปากพ่องัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพ่องันล่าง ตำบลชะเมา อำเภอปากพ่องัน จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 3386 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
99	สขป. 15	(45) ปรับปรุงผิวจราจรถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC ฝ่ายคลองไม้เสียบระยะทาง 9.165 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพ่องันบน ตำบลเกาะขันธุ์ อำเภอยะฮาด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 2174 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000
100	สขป. 15	(1.177) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองชักน้ำสาย 3L-MD8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพ่องันบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 1933 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
101	สขป. 15	(1.113) บำรุงรักษาทางลัดใหญ่ โครงการชลประทานกระบี่ ระยะทาง 18.586กิโลเมตร ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ - [ 1869 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,978,000

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 65
102	สขป. 15	(1.595) ชุดลอกตะกอนดินแก้มลิง ปริมาณดิน 50,000 ลูกบาศก์เมตร โดยรถขุดดำเนินการเอง อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเขวง อำเภอบ้านคาชุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 1535 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	2,500,000
103	สขป. 15	(1.113) ประตูระบายน้ำบ้านห้วยลึก ขนาดบาน 4.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 829 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	22,000,000
104	สขป. 15	(1.127) อาคารป้องกันการกัดเซาะท้าย ปตร.คลองชะอวด-แพรงเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 695 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000
105	สขป. 15	(1.125) ปรับปรุงท่อลอดถนน MD1 กม.6+120 - กม. 6+840 ไม่เสียขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลบางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 693 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000
106	สขป. 15	(1.124) อาคารบังคับน้ำเหมืองนายทั้ง ขนาด 2.00x2.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 692 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,200,000
107	สขป. 15	(1.123) ปรับปรุงท่อลอดท่อส่งน้ำบ้านควนมีชัย กม.11+370 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 691 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	700,000
108	สขป. 15	(1.320) อาคารสำนักงานขนาดกลาง จำนวน 1 หลัง โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 408 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	9,900,000
109	สขป. 15	(1.306) ซ่อมแซมคลังน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลลูกลอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 394 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	815,000
110	สขป. 15	(1.304) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนองของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 392 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
111	สขป. 15	(1.288) อาคารที่ทำการส่วนแผนงาน ภายในที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 376 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000
112	สขป. 15	(1.1468) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 3660 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	315,000
113	สขป. 15	(1.1459) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดกระบี่ - [ 3651 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,371,000
114	สขป. 16	(1.612) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ตำบลแหลมสอม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาว 495 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง - [ 1552 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	1,540,000
115	สขป. 17	(1.73) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณห้วงงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซาะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [ 76 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000
116	สคก.	(1.752) กู้จัดซื้อพืชโดยเครื่องจักรในเขตโครงการชลประทานสุโขทัย ปริมาณ 34,297 ต้น ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย - [ 2944 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
117	สคก.	(1.77) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ UNIT SUBSTATION ภายในกรมชลประทาน สามเสน ตำบลแขวงถนนนครไชยศรี อำเภอเขตลาดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 80 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,200,000
118	สลก.	(10) อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [ 557 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานผูกพันใหม่	46,742,000
119	สลก.	(1.460) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [ 548 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	842,200
120	สบอ.	(54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8494 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	160,193,000
121	สบอ.	(1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 2868 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,534,400
122	สบอ.	(1.441) ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จำนวน 1 หน่วย ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 529 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	500,000
123	สบอ.	(1.432) ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 520 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000
124	สบอ.	(1.370) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ. 2565 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 458 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	117,000
125	สบอ.	(1.369) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำและเสาสถิติ จำนวน 1 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ พ.ศ. 2565 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 457 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	64,800
126	สบอ.	(1.367) ค่าจัดทำเสาสถิติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 455 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	37,600

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 65
127	สพญ.	(1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนการป้องกัน แก๊สไข่และพิษนาสิงแวดล้อม - [ 9566 ]	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	งานปีเดียว	8,000,000
128	สพญ.	(5) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม. 1+260 โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง - [ 9265 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	129,385,600
129	สพญ.	(65) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำววกเหล็ก จังหวัดสระบุรี - [ 8711 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	43,000,000
130	กพก.	(1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง) - [ 9550 ]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	งานปีเดียว	79,780,000
131	กพก.	(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ - [ 9533 ]	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	งานปีเดียว	3,000,000
132	กพก.	(202) อาคารประกอบคลองระบายน้ำ โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง(ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง - [ 9462 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	15,900,000
133	กพก.	(1.12) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองระบายน้ำคลองหนึ่งพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา - [ 9232 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	1,588,900
134	กพก.	(1.3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำมอด้ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - [ 9063 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	9,000,000
135	กพก.	(54) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.58 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านห่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร - [ 8700 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	70,000,000
136	กพก.	(1.21) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด - [ 8628 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,575,000
137	กพก.	(1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด - [ 8626 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	2,521,700
138	กพก.	(1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 28.380 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 8625 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,695,700
139	สจด.	(150) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 06 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองห้วยช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ทอสาย 002) ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลตะโหมด อำเภอตลอด จังหวัดพัทลุง - [ 866 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
140	สวพ.	(1.451) ซ่อมแซมอาคารดินวิศวกรรม 1 พร้อมซ่อมเครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์ห้องทดลอง สำนักวิจัยและพัฒนา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [ 539 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,400,000
141	Lump Sum	(199) ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย กรุงเทพมหานคร - [ 9459 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	200,000,000
