

ส่วนติดตามและประเมินผล  
กองแผนงาน 2286 , 2634



ส่วนที่ดูแล

# บันทึกข้อความ

ร.บ. ๗๙๕/๒๕  
ร.ก.ม.๒๕  
๒๕.๗๐๔

1049  
เลขที่เอกสารประกอบ : ๗๖๑๖/๑๑๐/๒๕๖๕  
๑๓.๑๖๘๘  
๒๕

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖  
ที่ กพง ๐๖/๒๑๑ ๑๕.๑๒.๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรียน ผอ.ผง. ๔๒๑๑๖๗

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่ง  
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ  
พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ ออช. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียด  
รายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ดำเนินการมาด้วยแล้ว

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)  
ผตป.ผง.

ธธข.

เรียน ออช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)  
ผอ.ผง.

๕๘ กพ. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ภาค, ทท.๑-๕ ผอ.  
|| ลจ ผบท.ผอ.(จท.ผอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)  
ผส.บอ.

ทราบ

(นายทศศักดิ์ ชนเดโชพล)  
รสบ.

ส่ง ๓๐.๑ ๒๐.

เพื่อทราบ  
 เพื่อดำเนินการ

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)  
ผตป.ผง.

๑๑.๑.๒๕๖๕

**สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ**  
**ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565)**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 6 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 98,998.27 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 26,183.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.45 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 13,834 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 108 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2,065 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.93 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 9,552 รายการ คิดเป็นร้อยละ 69.05 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2,002 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.47 และยกเลิก จำนวน 107 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.77 จำแนกได้ดังนี้

**1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.)** งบประมาณ จำนวน 77,143.43 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 16,394.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.25 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,118.69 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 2,323.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.63 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 70,024.74 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 14,071.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.09 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,554 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 108 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.13 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 538 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.63 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 8,501 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.98 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 307 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.21 และยกเลิก จำนวน 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.05 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น

**2. งบเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564** งบประมาณ จำนวน 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,915.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.70 งบประมาณหมดความจำเป็น จำนวน 156.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.38 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 7,212.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.92 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,067 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 606 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.79 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 459 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.02 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.19 ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เนื่องจากราษฎรบางรายเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ และเกิดข้อพิพาทเรื่องมรดก เนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่ดินได้

**3. งบกลาง พ.ศ. 2564** งบประมาณ จำนวน 4,605.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 2,185.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.46 มีจำนวนรายการ 1,188 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 306 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.76 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 880 รายการ คิดเป็นร้อยละ 74.07 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 เนื่องจากมีการแก้ไขสถานที่ดำเนินการจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

4. เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 งบประมาณ จำนวน 4,224.82 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,497.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.78 มีจำนวนรายการ 384 รายการ ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 41 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.68 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 340 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.54 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 806.12 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 มีจำนวนรายการ 1,541 รายการ ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1,525 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.96 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.04

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 189.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.29 มีจำนวนรายการ 100 รายการ ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.00 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 98 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.00

\*\*\*\*\*



# ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



จัดทำโดย  
ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน  
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565

# รายละเอียดข้อมูล



1 > สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

3 > งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564




1

## สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565





รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	98,998.27	26,183.46	26.45	13,834	108	2,065	9,552	2,002	ยกเลิก 107 รายการ
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (กรมบัญชีกลาง)	77,143.43	16,394.22	21.25	9,554	108	538	8,501	307	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,118.69	2,323.00	32.63						
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	70,024.74	14,071.22	20.09	9,554	108	538	8,501	307	ยกเลิก 100 รายการ
2. งบเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2563	11,283.76	3,915.32	34.70	1,067			606	459	- ยกเลิก 2 รายการ - หมดความจำเป็น จำนวน 156.14 ล้านบาท - คงเหลือต้องดำเนินการต่อ จำนวน 7,212.30 ล้านบาท
3. งบกลาง พ.ศ. 2564	4,605.14	2,185.78	47.46	1,188			306	880	
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	3,419.87	1,451.59	42.45	1,117			260	855	
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	426.47			24			24		
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183.31	327.37	27.67	44			31	13	
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564	1,562.30	1,116.72	71.48	1,046			202	842	ยกเลิก 2 รายการ
- โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	94.70	0.07	0.07	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	83.09	1.55	1.87	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	70.00	5.88	8.40	1			1		
3.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี พ.ศ. 2564	1,185.27	734.19	61.94	71			46	25	
4. เงินกู้ ประจำปี พ.ศ. 2564	4,224.82	3,497.44	82.78	384			41	340	ยกเลิก 3 รายการ
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565	806.12	0.95	0.12	1,541		1,525		16	
6. จัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565	935.00	189.75	20.29	100		2	98		





2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

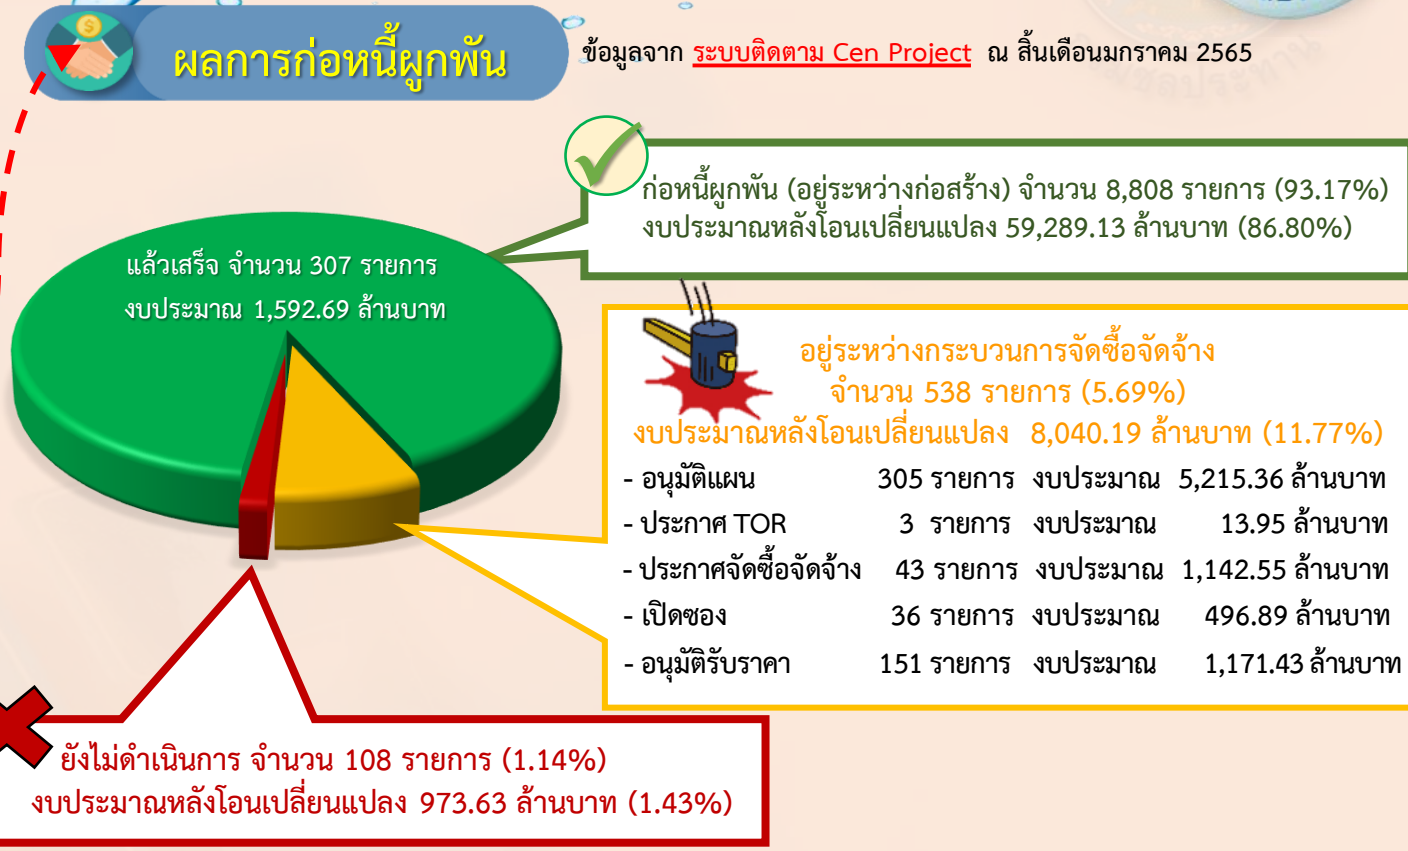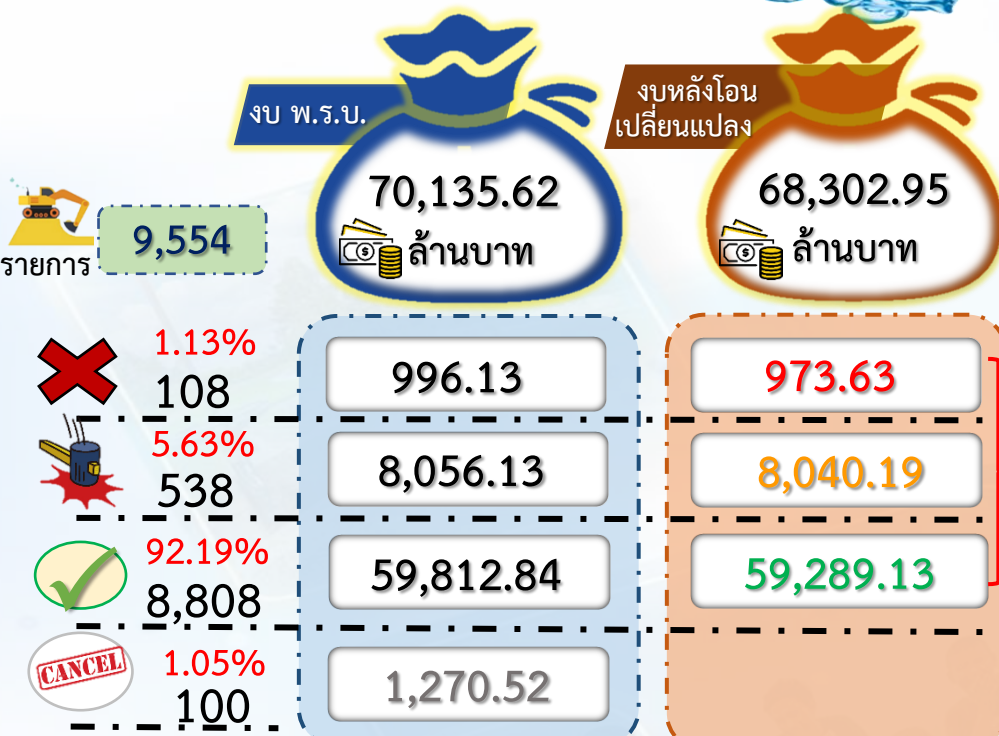

❌ ยังไม่ดำเนินการ  
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

✅ ก่อหนี้ผูกพัน  
ยกเลิก






# 2.2

## สรุปผลการก่อกั้นผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

งบลงทุน

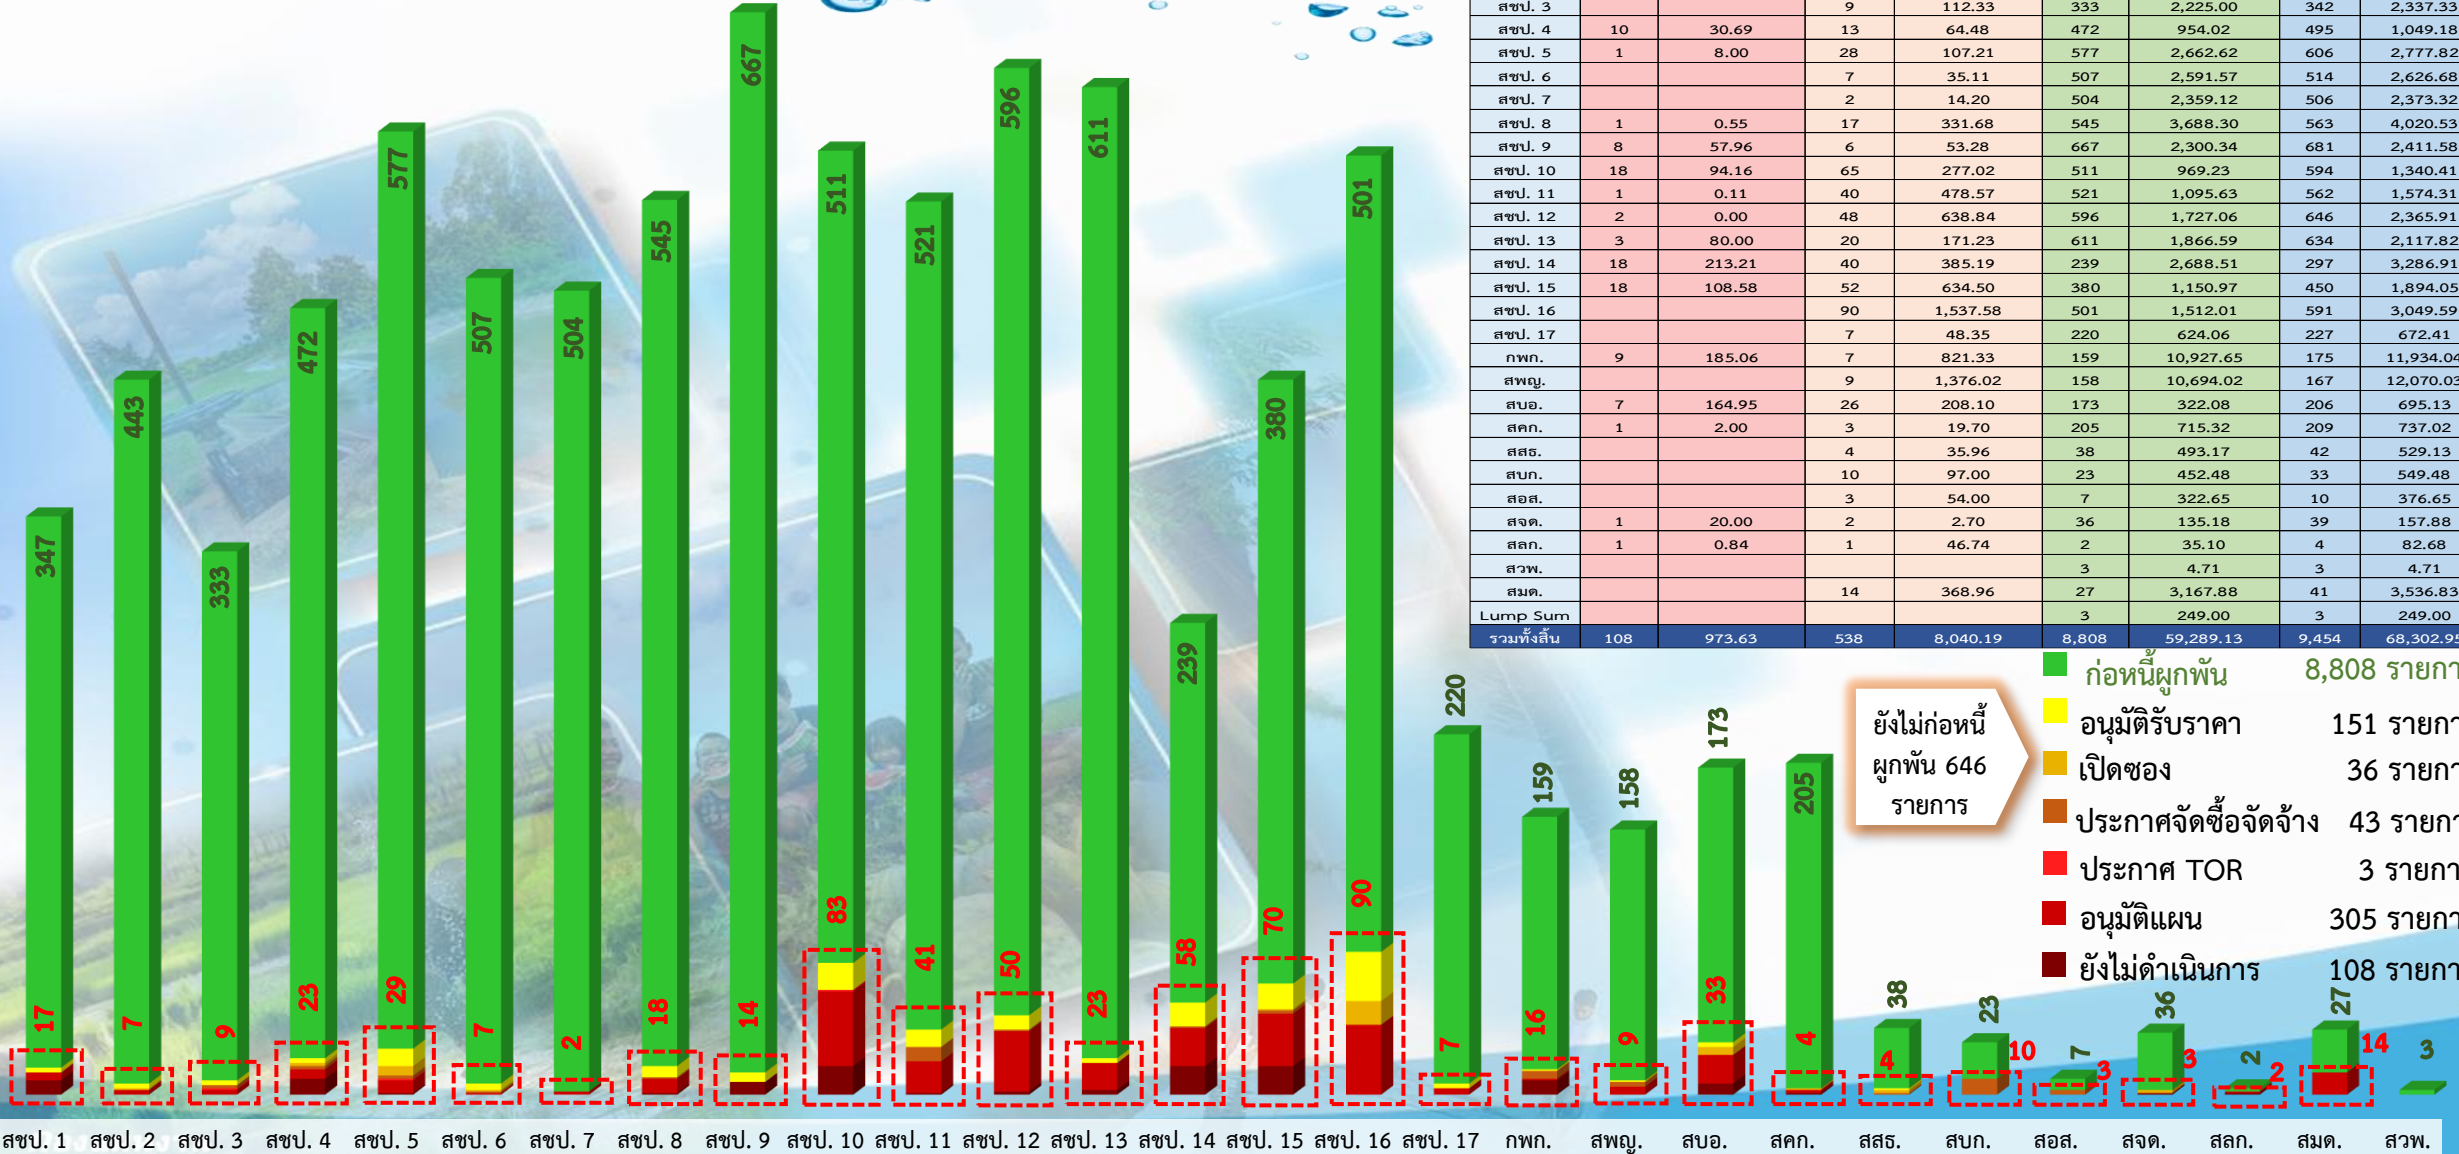

■ ก่อกั้นผูกพัน 8,808 รายการ  
■ อนุมัติรับราคา 151 รายการ  
■ เปิดซอง 36 รายการ  
■ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 43 รายการ  
■ ประกาศ TOR 3 รายการ  
■ อนุมัติแผน 305 รายการ  
■ ยังไม่ดำเนินการ 108 รายการ

ยังไม่ก่อกั้นผูกพัน 646 รายการ





# 2.3

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ **GFMS** และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม **Cen Project** ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ/ งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำซื้อผูกพัน							
						จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
												0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,865.10	68,302.95	13,960.73	20.44	9,454	108	973.63	538	8,040.19	8,808	59,289.13	2,595	2,500	1,489	1,432	485	307
สขป. 1	1,608.42	1,607.13	458.81	28.55	364	9	7.52	8	94.58	347	1,505.03	104	83	93	35	20	12
สขป. 2	1,890.25	1,875.38	314.57	16.77	450			7	25.55	443	1,849.83	45	241	48	80	22	7
สขป. 3	2,334.81	2,337.33	235.75	10.09	342			9	112.33	333	2,225.00	92	101	59	52	15	14
สขป. 4	1,082.89	1,049.18	197.43	18.82	495	10	30.69	13	64.48	472	954.02	147	158	97	40	24	6
สขป. 5	2,676.60	2,777.82	561.44	20.21	606	1	8.00	28	107.21	577	2,662.62	192	106	70	158	30	21
สขป. 6	2,646.30	2,626.68	814.36	31.00	514			7	35.11	507	2,591.57	244	79	63	54	55	12
สขป. 7	2,404.07	2,373.32	1,192.36	50.24	506			2	14.20	504	2,359.12	154	106	96	53	45	50
สขป. 8	4,040.81	4,020.53	355.91	8.85	563	1	0.55	17	331.68	545	3,688.30	98	137	123	142	36	9
สขป. 9	2,458.16	2,411.58	468.54	19.43	681	8	57.96	6	53.28	667	2,300.34	145	163	143	131	58	27
สขป. 10	1,343.45	1,340.41	151.11	11.27	594	18	94.16	65	277.02	511	969.23	108	141	75	140	45	2
สขป. 11	1,577.23	1,574.31	153.11	9.73	562	1	0.11	40	478.57	521	1,095.63	170	130	52	124	28	17
สขป. 12	2,418.02	2,365.91	322.29	13.62	646	2	0.00	48	638.84	596	1,727.06	71	305	91	91	19	19
สขป. 13	2,130.91	2,117.82	277.67	13.11	634	3	80.00	20	171.23	611	1,866.59	238	158	131	64	4	16
สขป. 14	3,290.18	3,286.91	545.48	16.60	297	18	213.21	40	385.19	239	2,688.51	103	53	21	21	14	27
สขป. 15	1,898.12	1,894.05	152.56	8.05	450	18	108.58	52	634.50	380	1,150.97	158	98	80	33	8	3
สขป. 16	3,057.93	3,049.59	92.79	3.04	591			90	1,537.58	501	1,512.01	193	139	62	94	1	12
สขป. 17	682.65	672.41	54.65	8.13	227			7	48.35	220	624.06	100	49	23	30	12	6
กพท.	12,255.70	11,934.04	2,448.52	20.52	175	9	185.06	7	821.33	159	10,927.65	57	51	14	17	14	6
สพญ.	12,143.33	12,070.03	2,725.03	22.58	167			9	1,376.02	158	10,694.02	74	47	11	12	9	5
สบอ.	698.35	695.13	42.23	6.07	206	7	164.95	26	208.10	173	322.08	7	90	48	18	10	
สคก.	737.81	737.02	270.92	36.76	209	1	2.00	3	19.70	205	715.32	35	46	51	40	11	22
สสร.	531.51	529.13	90.29	17.06	42			4	35.96	38	493.17	37					1
สบก.	549.48	549.48	60.89	11.08	33			10	97.00	23	452.48			21			2
สอส.	376.65	376.65	34.14	9.06	10			3	54.00	7	322.65	6	1				
สจด.	158.22	157.88	50.40	31.92	39	1	20.00	2	2.70	36	135.18	1	12	12	2	4	5
สลก.	82.68	82.68	0.12	0.15	4	1	0.84	1	46.74	2	35.10	2					
สวพ.	4.71	4.71	0.72	15.25	3					3	4.71	1		2			
สมต.	3,536.83	3,536.83	1,888.10	53.38	41			14	368.96	27	3,167.88	10	6	3	1	1	6
Lump Sum	249.00	249.00	0.52	0.21	3					3	249.00	3					

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 100 รายการ งบประมาณ 1,270.52 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น



หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ/ งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	จำนวน รายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อมูลพื้นที่							
						จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
												0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,865.10	68,302.95	13,960.73	20.44	9,454	108	973.63	538	8,040.19	8,808	59,289.13	2,595	2,500	1,489	1,432	485	307
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรดิตต์	809.00	789.57	164.94	20.89	10					10	789.57		2		4	4	
โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,561.63	2,561.63	681.64	26.61	14			1	676.20	13	1,885.43	7	4	2			
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	27,227.44	26,955.49	5,998.46	22.25	620	11	233.32	53	1,976.30	556	24,745.87	179	224	102	24	14	13
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	499.74	499.74	81.20	16.25	9	1	79.78			8	419.96	4	2		1		1
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	789.37	1,095.37	216.04	19.72	13					13	1,095.37	12				1	
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่2) จังหวัดสงขลา	141.06	141.06			1					1	141.06	1					
โครงการประตูปรับน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	99.56	43.96	18.54	42.19	3					3	43.96		2	1			
โครงการประตูปรับน้ำลำน้ำพุง-น้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	312.00	312.00	11.97	3.84	4					4	312.00		1	2	1		
โครงการประตูปรับน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย	72.00	72.00	10.34	14.36	4					4	72.00		4				
โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย	275.66	275.66	0.78	0.28	6			1	1.00	5	274.66	2	2		1		
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,441.96	6,426.40	602.12	9.37	373	10	152.96	51	1,230.93	312	5,042.51	86	121	70	27	8	
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	10,918.65	10,844.25	1,435.71	13.24	295	3	32.49	42	1,789.12	250	9,022.64	82	103	45	14	3	3
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	1,033.27	1,081.53	10.15	0.94	14			1	228.00	13	853.53	4	6	1	1	1	
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งองภูมธราธา จังหวัดเชียงใหม่	1,298.06	859.54	396.44	46.12	12			2	4.52	10	855.03	4	2		3	1	
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,195.90	2,190.39	438.47	20.02	746	3	19.00	36	460.54	707	1,710.85	173	178	146	154	37	19
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,627.77	10,511.82	2,826.26	26.89	6,740	69	434.31	325	1,455.23	6,346	8,622.28	1,893	1,730	1,019	1,102	362	240
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	167.77	237.64	1.91	0.80	5					5	237.64	3	2				
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	108.00	108.00	0.00006	0.00	2			1	100.00	1	8.00		1				
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	104.14	117.34	39.88	33.99	6					6	117.34	4				1	1
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	348.02	348.02	19.45	5.59	7					7	348.02	1	2	3	1		
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	637.62	637.62	470.19	73.74	5					5	637.62	2	3				
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	388.00	388.00	17.23	4.44	3	1	3.00			2	385.00	2					
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	525.00	525.00	90.03	17.15	3					3	525.00	1		1	1		
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตต์	313.78	313.78	171.57	54.68	6					6	313.78		5				1
ผลผลิตการจัดกรางงานชลประทาน	969.71	967.15	257.42	26.62	553	10	18.78	25	118.35	518	830.02	135	106	97	98	53	24

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 100 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,270.52 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น






2.5

# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565

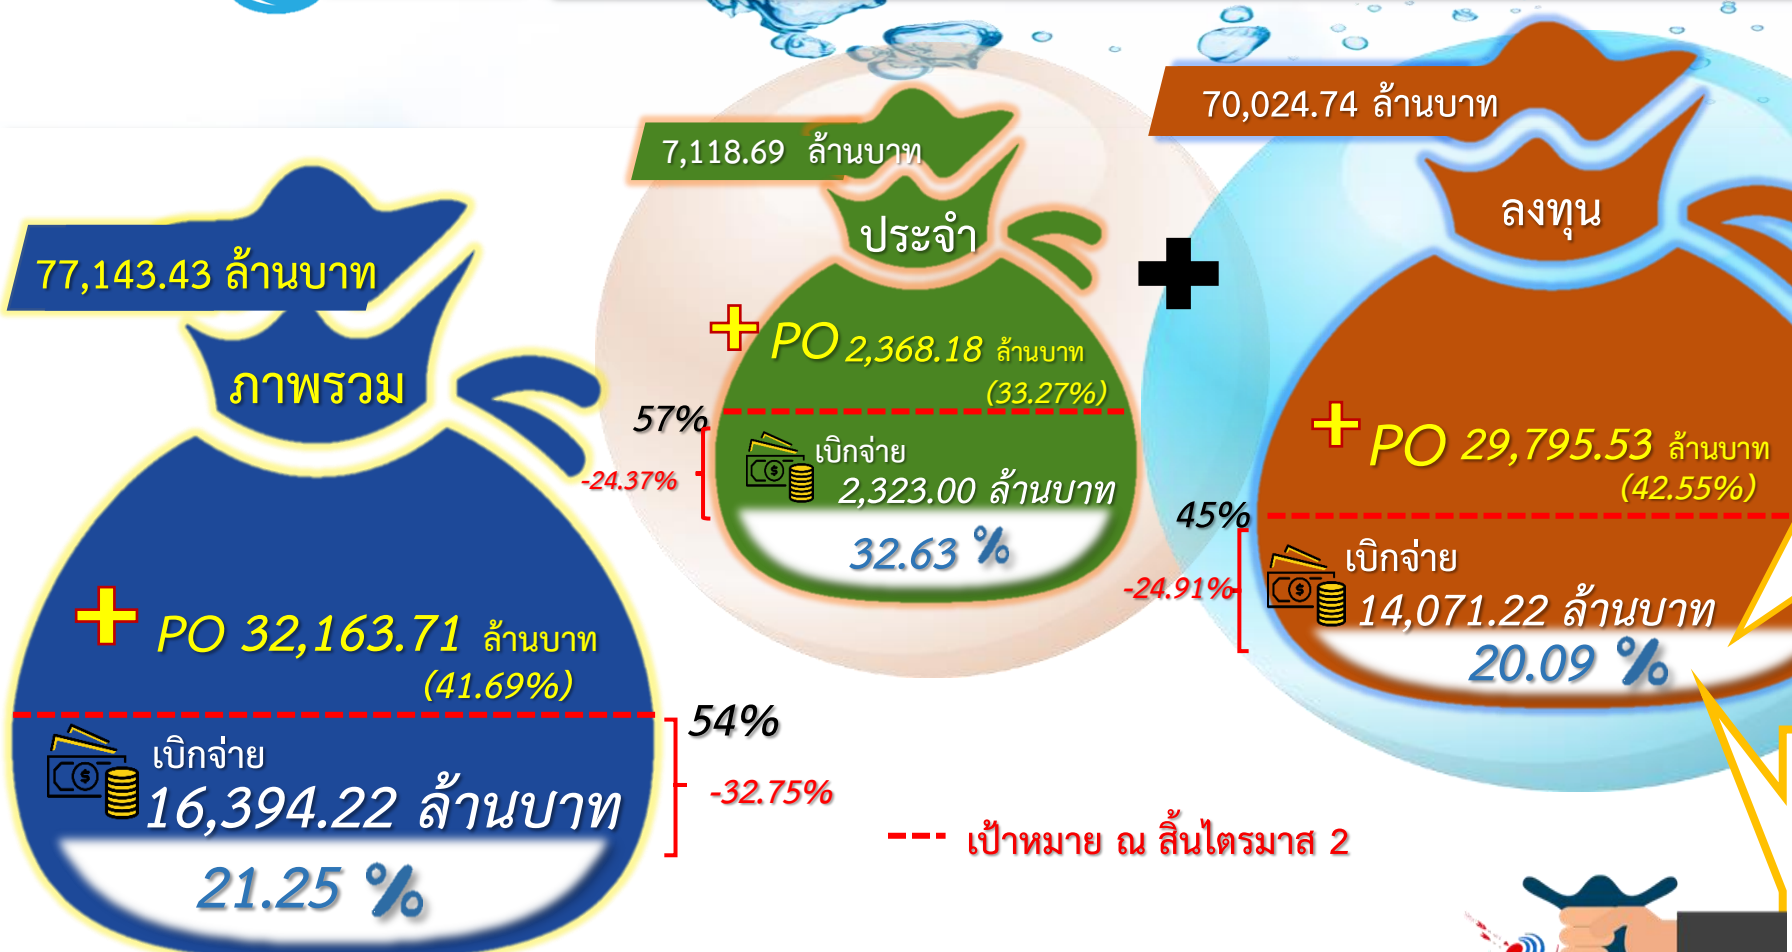

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

- ผูกพันเดิม จำนวนทั้งสิ้น 110 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 10,702.78 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,767.53 ล้านบาท (25.86%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 100 รายการ (90.91%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 10,036.45 ล้านบาท (93.77%) แล้วเสร็จ จำนวน 10 รายการ (9.09%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 666.32 ล้านบาท (6.23%)
- ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,178.07 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 9,319 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 57,143.89 ล้านบาท เบิกจ่าย 11,303.69 ล้านบาท (19.78%) โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 108 รายการ (1.16%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 973.63 ล้านบาท (1.70%) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 513 รายการ (5.50%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 5,862.12 ล้านบาท (10.26%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 8,401 รายการ (90.15%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 49,381.77 ล้านบาท (86.42%) และแล้วเสร็จ จำนวน 297 รายการ (3.19%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 926.37 ล้านบาท (1.62%)

เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 2





77,143.43 ล้านบาท

ภาพรวม

เบิกจ่าย

16,394.22 ล้านบาท

21.25 %

ร้อยละ

เป้าหมายภาพรวม ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

เป้าหมาย 100.00%

เป้าหมาย 32.00%

เป้าหมาย 54.00%

เป้าหมาย 77.00%

- ต่ำกว่าเป้าหมายกรม ร้อยละ 18.08

- สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (60 - 64) ร้อยละ 4.75

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
▶ เป้าหมายกรม ปี 65	10.67	21.34	32.00	39.33	46.66	54.00	61.67	69.34	77.00	84.67	92.34	100.00
▲ ผลปี 65 (77,143.43)	2.45	7.97	16.49	21.25								
▲ ผลปี 64 (74,106.98)	0.66	4.91	12.24	16.05	22.61	34.76	39.61	48.38	59.48	64.67	68.91	83.67
■ ผลปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	7.84	9.23	16.56	25.26	34.54	47.70	54.68	66.97	82.54
■ ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	83.17
■ ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
■ ผลปี 60 (47,004.27)	1.50	5.94	19.46	23.11	30.30	43.12	48.35	55.72	66.56	71.83	77.86	86.95
■ เฉลี่ย 5 ปี (60-64)	1.46	5.43	12.62	16.50	21.98	33.08	38.50	46.47	57.49	63.16	70.82	83.54



2.7

# สถิติการเบิกจ่าย **งบรายจ่ายลงทุน** ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565

ร้อยละ

เป้าหมายงบรายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

100

80

60

40

20

0

เป้าหมายรัฐบาล 100.00%

เป้าหมาย 65.00%

เป้าหมาย 45.00%

เป้าหมาย 20.00%

- ต่ำกว่าเป้าหมายกรม ร้อยละ 8.24

- สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (60 - 64) ร้อยละ 5.82

70,024.74 ล้านบาท

ลงทุน

เบิกจ่าย

14,071.22 ล้านบาท

20.09%

	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายกรม ปี 65	6.67	13.34	20.00	28.33	36.66	45.00	51.67	58.34	65.00	76.67	88.34	100.00
ผลปี 65 (70,135.62)	1.94	7.11	15.67	20.09								
ผลปี 64 (66,423.87)	0.003	3.81	10.97	14.29	20.79	33.39	37.9	46.78	58.21	63.11	66.85	82.02
ผลปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	4.77	5.36	12.51	21.31	30.59	44.54	51.34	64.24	80.61
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
ผลปี 61 (47,566.20)	1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
ผลปี 60 (38,118.10)	0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69
เฉลี่ย 5 ปี (60 - 64)	0.68	3.98	11.07	14.27	19.39	30.90	35.95	43.78	55.38	60.52	68.10	81.38




2.8

# ผลการเบิกจ่าย งบรายจ่ายลงทุน ของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ร้อยละ

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565

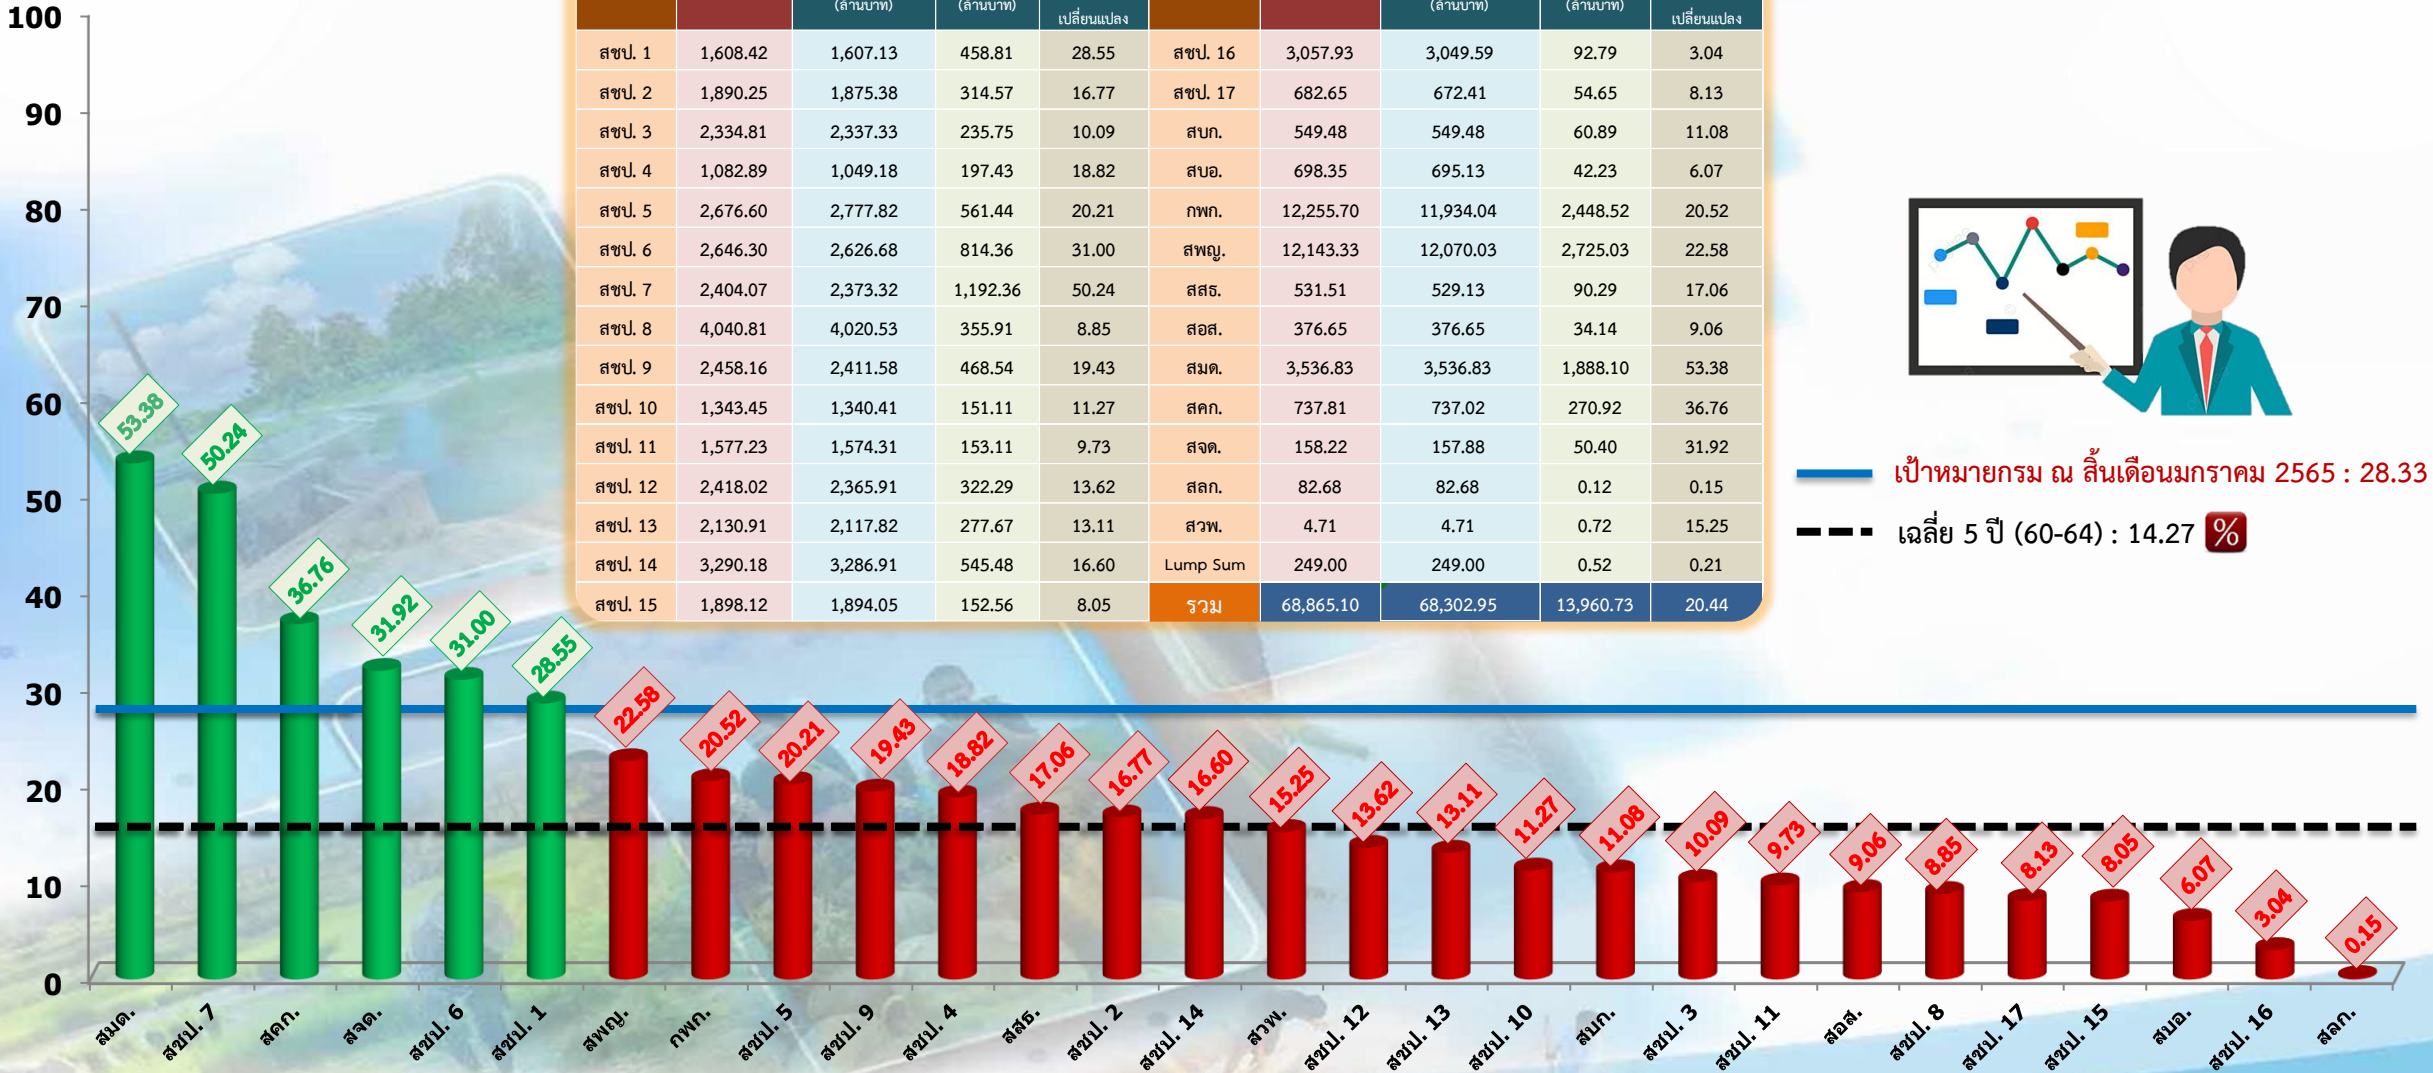

— เป้าหมายกรม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 : 28.33 %  
 - - - เฉลี่ย 5 ปี (60-64) : 14.27 %

หมายเหตุ : งบประมาณ พ.ร.บ. จำนวน 68,865.10 ล้านบาท ไม่รวมยกเลิก จำนวน 100 รายการ งบประมาณ 1,270.52 ล้านบาท

■ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายรัฐบาล ■ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล



# 2.9

## ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
<b>ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)</b>								
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	75,448.43	14,735.38	19.53	72,612.41	10,496.12	14.45	5.08
2	กระทรวงคมนาคม	161,429.57	24,004.04	14.87	177,536.99	17,347.27	9.77	5.10
3	กระทรวงมหาดไทย	75,930.11	8,790.19	11.58	80,678.47	7,945.33	9.85	1.73
<b>ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)</b>								
1	กรมชลประทาน	70,024.74	14,071.22	20.09	66,524.30	9,507.30	14.29	5.80
2	กรมพัฒนาที่ดิน	1,957.56	213.61	10.91	2,167.96	294.04	13.56	-2.65
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,279.24	30.25	2.36	1,184.81	185.10	15.62	-13.26
<b>ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)</b>								
1	กรมชลประทาน	70,024.74	14,071.22	20.09	66,524.30	9,507.30	14.29	5.80
2	กรมโยธาธิการและผังเมือง	29,841.22	5,945.39	19.92	27,512.17	6,454.33	23.46	-3.54
3	กรมทางหลวง	107,856.83	19,370.64	17.96	120,183.05	14,749.99	12.27	5.69
4	กรมทางหลวงชนบท	44,306.09	3,640.44	8.22	47,202.12	1,891.18	4.01	4.21

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 20.39%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (45 หน่วยงาน) เฉลี่ย 18.35%





ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

1,067 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

3,915.32 ล้านบาท 34.70 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

85.54 ล้านบาท 0.76 %

เหลือจ่าย/ยกเลิก

70.60 ล้านบาท 0.62 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

7,212.30 ล้านบาท

63.92 %

งบประมาณที่หมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้รวม 156.14 ล้านบาท 1.38%

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

459 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

606 รายการ

ยกเลิกรายการ

2 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราชการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	839.80								
ผลต่าง	-	- 428.49	- 1,221.49	- 746.44								

ล้านบาท

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

กองแผนงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย 100%





## ผลการดำเนินงาน

มีมติ คร.ม./คำสั่งนายก ออนุมัติงบกลาง 64  
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ  
งบประมาณ 4,605.14 ล้านบาท  
เบิก 2,185.78 ล้านบาท 47.46%

## ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 880 รายการ 74.07%  
ดำเนินการ 306 รายการ 25.76%  
ยกเลิก 2 รายการ 0.17%

## ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่  
ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่  
พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่  
ผลสัมฤทธิ์ = 722,011 ไร่ 72.76%

ปริมาณน้ำ 16.74 ล้าน ลบ.ม.  
ผลสัมฤทธิ์ = 10.09 ล้าน ลบ.ม. 60.27%  
ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน  
ผลสัมฤทธิ์ = 104,500 ครัวเรือน 74.08%

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565



มติ ครม. 8 มิ.ย. 64 ครุภัณฑ์

24 รายการ

426.47 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 รายการ (ส่งมอบ)\*

0%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

มติ ครม. 15 มิ.ย. 64

44 รายการ

1,183.31 ล้านบาท

เบิกจ่าย 327.37 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 27.67

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 31 รายการ

• แล้วเสร็จ 13 รายการ

27.39%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

มติ ครม. 14 ก.ย. 64

1,046 รายการ

1,562.30 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,116.72 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 71.48

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 202 รายการ

• แล้วเสร็จ 842 รายการ

• ยกเลิก 2 รายการ

77.49%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64

คำสั่งนายก 29 ก.ย. 64

1 รายการ

94.70 ล้านบาท

เบิกจ่าย 0.07 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.07

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ

1%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

คำสั่งนายก 29 ก.ย. 64

1 รายการ

83.09 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1.55 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 1.87

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 รายการ

5%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

คำสั่งนายก 29 ก.ย. 64

1 รายการ

70.00 ล้านบาท

เบิกจ่าย 5.88 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 8.40

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 35.00%

35.00%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

กปร. ปี 2564

71 รายการ

1,185.27 ล้านบาท

เบิกจ่าย 734.19 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 61.94

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 46 รายการ

• แล้วเสร็จ 25 รายการ

38.23%

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่  
ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม.  
พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

ปริมาณน้ำ 1.26 ล้าน ลบ.ม.  
พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันกาเกิดอุทกภัย และปัญหาภัยแล้ง ปี 2564

พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564



5

# เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565



## ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ 4,224.82 ล้านบาท

เบิกจ่าย 3,497.44 ล้านบาท 82.78%

คงเหลือ 544.54 ล้านบาท 12.89%

เหลือจ่าย 182.84 ล้านบาท 4.33%


## สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการ 41 รายการ = 10.68%

แล้วเสร็จ 340 รายการ = 88.54%

ยกเลิก 3 รายการ = 0.85%

เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่นเพื่อดำเนินการแล้ว



## ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ชลประทาน 19,667 ไร่ = 12,307 ไร่ 62.58%


ปริมาณน้ำ 26.98 ล้าน ลบ.ม. = 7.46 ล้าน ลบ.ม. 27.65%

พื้นที่รับประโยชน์ 209,653 ไร่ = 157,049 ไร่ 74.91%

ครัวเรือนรับประโยชน์ 64,952 ครัวเรือน = 53,204 ครัวเรือน 81.91%

การจ้างแรงงาน 9,716 คน = 9,716 คน 100%

## ผลการดำเนินงานจำแนกตามสำนัก/กอง

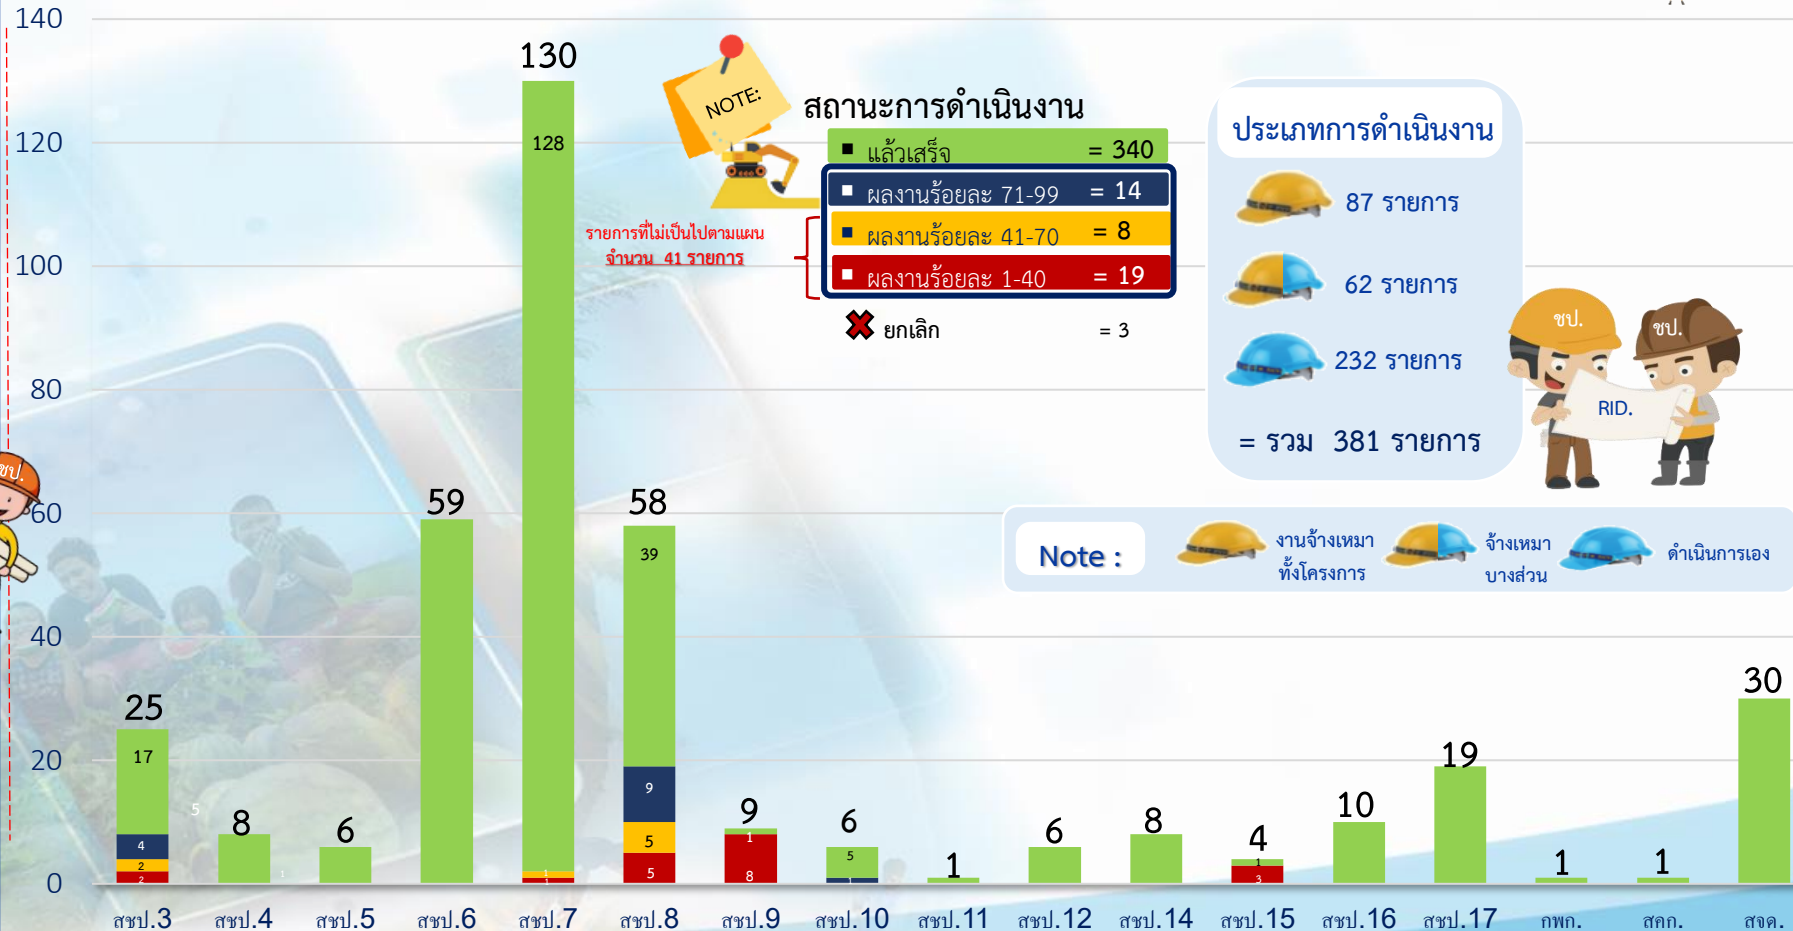

**NOTE:** สถานะการดำเนินงาน

- แล้วเสร็จ = 340
- ผลงานร้อยละ 71-99 = 14
- ผลงานร้อยละ 41-70 = 8
- ผลงานร้อยละ 1-40 = 19
- ✗ ยกเลิก = 3

รายการที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 41 รายการ

**ประเภทการดำเนินงาน**

- 87 รายการ (งานจ้างเหมาทั้งโครงการ)
- 62 รายการ (จ้างเหมาบางส่วน)
- 232 รายการ (ดำเนินการเอง)

= รวม 381 รายการ

**Note :** งานจ้างเหมาทั้งโครงการ, จ้างเหมาบางส่วน, ดำเนินการเอง

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่ สขป.6 = 2 รายการ และสขป.7 = 1 รายการ  
 2. งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 182.84 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว



6

# ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



## รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565)

### งานกองทุน จัดรูปที่ดิน

#### จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- งบประมาณ 220.30 ล้านบาท = เบิกจ่าย 21.62 ล้านบาท 9.81 %
- ผลการดำเนินงาน
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ
  - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 32 รายการ
 รวมทั้งสิ้นจำนวน 33 รายการ
- ผลสัมฤทธิ์
  - พื้นที่เกษตรกรรม 26,235 ไร่
  - ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,627 ครัวเรือน

#### จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร

- งบประมาณ 714.70 ล้านบาท = เบิกจ่าย 168.13 ล้านบาท 23.53%
- ผลการดำเนินงาน
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ
  - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 66 รายการ
 รวมทั้งสิ้นจำนวน 67 รายการ
- ผลสัมฤทธิ์
  - พื้นที่เกษตรกรรม 62,756 ไร่
  - ครัวเรือนรับประโยชน์ 5,603 ครัวเรือน



#### ภาพรวม

- งบประมาณ 935.00 ล้านบาท = เบิกจ่าย 189.75 ล้านบาท 20.29%

- ผลการดำเนินงาน : 100 รายการ
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 2 รายการ
  - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 98 รายการ
- ผลสัมฤทธิ์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
  - พื้นที่เกษตรกรรม 88,991 ไร่
  - ครัวเรือนรับประโยชน์ 7,230 ครัวเรือน



### เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน

#### ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- งบประมาณ 806.12 ล้านบาท
- งบจัดสรร 453.36 ล้านบาท
- = เบิกจ่าย 0.95 ล้านบาท 0.12%

#### ผลการดำเนินงาน : 1,541 รายการ

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,525 รายการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 รายการ



สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ)

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบ พ.ร.บ. ปี 65 (ล้านบาท)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>108</b>	<b>996.1276</b>
สชป. 1	9	7.5244
สชป. 4	10	50.6620
สชป. 5	1	8.0000
สชป. 8	1	0.5460
สชป. 9	8	57.9590
สชป. 10	18	96.2317
สชป. 11	1	0.1116
สชป. 12	2	0.4500
สชป. 13	3	80.0000
สชป. 14	18	213.2090
สชป. 15	18	108.5836
กพก.	9	185.0613
สคก.	1	2.0000
สจต.	1	20.0000
สบอ.	7	164.9468
สลก.	1	0.8422

รายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ 108 รายการ)

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	GFMIS	งบ พ.ร.บ. ปี 65
		<b>รวมทั้งสิ้น จำนวน 108 รายการ</b>				<b>996,127,600.00</b>
1	สขป. 1	(1.1648) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3840 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410J96	1,000,000
2	สขป. 1	(1.1537) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [ 3729 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410I85	1,000,000
3	สขป. 1	(1.1434) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำโฮ้งอ่าง โครงการชลประทานลำพูน ปริมาณดิน 35,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน - [ 3626 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410H82	2,035,000
4	สขป. 1	(1.1210) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปริมาณดิน 29,907 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3402 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410F58	488,500
5	สขป. 1	(1.1209) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปริมาณดิน 26,168 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3401 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410F57	427,300
6	สขป. 1	(1.1208) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ปริมาณดิน 26,791 ลูกบาศก์เมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันป่าเป้า อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3400 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410F56	437,500
7	สขป. 1	(1.1207) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปริมาณดิน 20,037 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3399 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410F55	457,800
8	สขป. 1	(1.671) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน - [ 1611 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	0700353084410670	1,500,000
9	สขป. 1	(1.1464) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3656 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410I12	178,300
10	สขป. 4	(139) ปรับปรุงคลองยมเก่าปากน้ำพร้อมระบบระบายน้ำ ระยะที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย - [ 9399 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	0700352054420179	15,000,000
11	สขป. 4	(1.2067) ซ่อมแซมตลิ่งและฝายแม่คำมี ตำบลต่าหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ - [ 4259 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410O15	5,000,000
12	สขป. 4	(1.2064) ขุดลอกตะกอนคลองซอยในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 16 สาย ตำบลแม่หล้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ - [ 4256 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410O12	1,550,000
13	สขป. 4	(1.1122) ขุดลอกตะกอนทราย โดยรถขุดดำเนินการเอง หน้าฝายด่านใหญ่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ปริมาณดิน 117,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร - [ 3314 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410E71	5,000,000
14	สขป. 4	(1.1121) ขุดลอกตะกอนทราย โดยรถขุดดำเนินการเอง หน้า ปตร.หินชะโงก โครงการชลประทานกำแพงเพชร ปริมาณดิน 117,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร - [ 3313 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410E70	5,000,000
15	สขป. 4	(1.1120) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสายซอย 1R-MC หองขวัญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาสั่ง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - [ 3312 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410E69	1,570,000
16	สขป. 4	(1.1119) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสายใหญ่ MC หองขวัญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ปริมาณดิน 185,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาสั่ง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - [ 3311 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410E68	8,400,000
17	สขป. 4	(1.87) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม พื้นที่ชลประทาน 196,000 ไร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ - [ 2279 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410436	1,142,000
18	สขป. 4	(1.34) ปรับปรุง ทบ.ปากคลอง กม.4+793 (เกษตรแปลงใหญ่ห้วย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยแดง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร - [ 602 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700353052410034	4,000,000
19	สขป. 4	(1.33) ปรับปรุง ทบ.ปากคลอง กม.4+004 (เกษตรแปลงใหญ่ห้วย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยแดง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร - [ 601 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700353052410033	4,000,000
20	สขป. 5	(1.1442) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินสั้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณดินชุด 150,000 ลบ.ม. ตำบลสะพานเทพราช อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย - [ 3634 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410H90	8,000,000
21	สขป. 8	(1.1485) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดศรีสะเกษ - [ 3677 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410I33	546,000
22	สขป. 9	(224) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ Spillway อ่างเก็บน้ำดอกกราย พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกง จังหวัดระยอง - [ 8870 ]	โครงการจัดแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	0700352053420305	30,000,000
23	สขป. 9	(1.3754) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก - [ 5946 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410BY2	1,000,000

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	GFMS	งบ พ.ร.บ. ปี 65
24	สขป. 9	(1.3742) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายชอย 1 ซ้าย กม.2+500 ถึง กม.3+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก - [ 5934 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410BX0	500,000
25	สขป. 9	(1.3741) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายชอย 1 ซ้าย กม.0+000 ถึง กม.2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 5933 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410BW9	500,000
26	สขป. 9	(1.3701) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง - [ 5893 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410BS9	1,000,000
27	สขป. 9	(1.1258) จำเหมายุคลอกคลองระบาย ฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+500 ถึง กม.22+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 3450 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410G06	470,000
28	สขป. 9	(1.1257) จำเหมายุคลอกคลองระบาย ฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายชอย 1 ซ้าย ระยะทาง 3,300 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 3449 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410G05	489,000
29	สขป. 9	(28) ซ่อมสร้างผิวทางเข้าห้วงงานโครงการ ระยะทาง 2.74 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 2157 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0420027	24,000,000
30	สขป. 10	(60) แฉิมสิ่งล้าบางชิ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านแปง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [ 9124 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	0700352053420466	20,000,000
31	สขป. 10	(58) แฉิมสิ่งล้าบางชิ้น ปริมาตรเก็บกัก 0.28 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [ 9122 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	0700352053420464	35,000,000
32	สขป. 10	(19) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแฉิม) ปริมาณดิน 691,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลูกตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี - [ 8459 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0420105	28,060,900
33	สขป. 10	(1.4260) ซ่อมแซมโครงการชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกร โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 6452 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410DW7	1,000,000
34	สขป. 10	(1.4254) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 6446 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410DW1	1,000,000
35	สขป. 10	(1.4218) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [ 6410 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410DS5	1,000,000
36	สขป. 10	(1.4097) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ จังหวัดสระบุรี - [ 6289 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410DG5	1,000,000
37	สขป. 10	(1.4094) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองส่งน้ำ 2 ขวา กม.3+000 ถึง กม.5+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลหนองขนก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 6286 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410DG2	1,000,000
38	สขป. 10	(1.4093) ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบาย ประตูคลองห้วยป่าฝั่งซ้าย ตำบลหนองน้ำใส อำเภอกาชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 6285 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410DG1	2,500,000
39	สขป. 10	(1.4088) ซ่อมแซมแผ่นตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 7 ขวา กม.0+500 ถึง กม.3+000 (เป็นช่วงๆ) พื้นที่ 1,000 ตร.ม. ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี - [ 6280 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410DF6	600,000
40	สขป. 10	(1.4085) ซ่อมแซมคันคลองทวดสายบน ฝั่งขวา กม.7+000 ถึง กม.9+000 (เป็นช่วงๆ) จังหวัดสระบุรี - [ 6277 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410DF3	940,000
41	สขป. 10	(1.4065) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา ฝั่งซ้าย กม.2+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - [ 6257 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410DD3	280,000
42	สขป. 10	(1.4063) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา ฝั่งขวา กม.2+335 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - [ 6255 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410DD1	280,000
43	สขป. 10	(1.4053) ซ่อมแซม ทบ.กลางคลอง 1 ซ้าย กม.2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลลุด อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [ 6245 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410DC1	750,000
44	สขป. 10	(1.4005) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี - [ 6197 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410CX3	1,000,000
45	สขป. 10	(1.3883) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท - [ 6075 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410CL1	1,000,000
46	สขป. 10	(1.1259) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจำเริญคลองส่งน้ำสาย 5 กม.0+000-กม. - 1+500 ปริมาณดิน 7,300 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี - [ 3451 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410G07	360,000

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	GFMS	งบ พ.ร.บ. ปี 65
47	สขป. 10	(1.1484) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดลพบุรี - [ 3676 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410I32	460,800
48	สขป. 11	(1.1471) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดปทุมธานี - [ 3663 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410I19	111,600
49	สขป. 12	(1.1492) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 3684 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410I40	300,000
50	สขป. 12	(1.1461) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดชัยนาท - [ 3653 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410I09	150,000
51	สขป. 13	(47) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ซ้าย กม.56+590 ถึง กม.56+670 ระยะทาง 0.080 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระสี่มุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดนครปฐม - [ 8487 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0420I33	30,000,000
52	สขป. 13	(88) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 6Aขวา-สองพี่น้อง กม.0+120 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 804 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700353052420090	45,000,000
53	สขป. 13	(1.93) ปรับปรุงท่อลอดถนน ค-ส.ร.1ขวาน-นครชัยศรี กม.5+500 ของคันกันน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 661 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700353052410093	5,000,000
54	สขป. 14	(232) อาคารบังคับน้ำคลองบางโทรดมพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลมะมู่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - [ 8878 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	0700352053420313	16,529,000
55	สขป. 14	(148) ฝ่ายสำนักส่งพัทลุง พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 8794 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	0700352053420229	29,000,000
56	สขป. 14	(31) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจางเหมา อ่างเก็บน้ำปราณบุรี ปริมาณ 501,000ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จุดที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 8471 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0420I17	20,000,000
57	สขป. 14	(1.5549) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 7741 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410IV6	1,000,000
58	สขป. 14	(1.5529) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี - [ 7721 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410IT6	1,000,000
59	สขป. 14	(1.5460) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 7652 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410IM7	970,000
60	สขป. 14	(43) ปรับปรุงถนนลาดยางรอบอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 2172 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0420042	45,000,000
61	สขป. 14	(1.56) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 60ซ้าย และ 61ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.370 กม. - [ 2117 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410056	1,860,000
62	สขป. 14	(1.55) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 44ซ้าย-4ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.520 กม. - [ 2116 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410055	2,100,000
63	สขป. 14	(1.54) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 41ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.655 กม. - [ 2115 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410054	2,270,000
64	สขป. 14	(1.53) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 34 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระชาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. - [ 2114 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410053	2,080,000
65	สขป. 14	(1.52) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 22ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลลิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.120 กม. - [ 2113 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410052	1,950,000
66	สขป. 14	(1.51) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-5ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลลิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.480 กม. - [ 2112 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410051	2,500,000
67	สขป. 14	(1.50) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-4ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลลิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. - [ 2111 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410050	2,540,000
68	สขป. 14	(1.49) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-2ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลลิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.700 กม. - [ 2110 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410049	2,850,000
69	สขป. 14	(45) ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 1672 ]	โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	0700353084420043	15,000,000
70	สขป. 14	(97) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำมรสว ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 813 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700353052420099	65,000,000

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	GFMS	งบ พ.ร.บ. ปี 65
71	สขป. 14	(1.99) ปรับปรุงอาคารรับน้ำเข้า โครงการอ่างเก็บน้ำวังขุนพล 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 667 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700353052410099	1,560,000
72	สขป. 15	(162) อ่างเก็บน้ำสำนักสงฆ์ธรรมโศก ปริมาตรเก็บกัก 0.020 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลประแสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 8808 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	0700352053420243	18,000,000
73	สขป. 15	(1.5690) อาคารบังคับน้ำเหมืองนายปลัด ขนาด 2.00x2.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 7882 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410JJ7	3,200,000
74	สขป. 15	(1.5682) ปรับปรุงท่อลอดท่อส่งน้ำบ้านควนมีชัย กม.10+170 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 7874 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410JI9	750,000
75	สขป. 15	(1.5634) ซ่อมแซมคันคลองฝั้งซ้ายคลองส่งน้ำสาย LMC ฝ่ายคลองท่าดี ช่วง กม. 3+500 - 6+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 7826 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410JE1	480,000
76	สขป. 15	(1.1410) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบางกระบือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 232,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 3602 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410H58	4,245,600
77	สขป. 15	(1.1194) โครงการขุดลอกคลอง 3R-MD3 (คลองวัดลาว) ด้วยรถขุดดำเนินการเอง ปริมาณดินขุด 68,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 3386 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410F42	2,000,000
78	สขป. 15	(45) ปรับปรุงผิวจราจรถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย RMC ฝ่ายคลองไม้เสียบ ระยะทาง 9.165 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 2174 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0420044	50,000,000
79	สขป. 15	(1.177) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองชักน้ำสาย 3L-MD8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 1933 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410332	1,000,000
80	สขป. 15	(1.113) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานกระบี่ ระยะทาง 18.586กิโลเมตร ตำบลไล่ไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ - [ 1869 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410268	1,978,000
81	สขป. 15	(1.595) ขุดลอกตะกอนดินแก้มลิง ปริมาณดิน 50,000 ลูกบาศก์เมตร โดยรถขุดดำเนินการเอง อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหุบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 1535 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	0700353084410594	2,500,000
82	สขป. 15	(1.127) อาคารป้องกันการกัดเซาะท้าย ปตร.คลองชะอวด-แพรงเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 695 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700353052410127	1,200,000
83	สขป. 15	(1.125) ปรับปรุงท่อลอดถนน MD1 กม.6+120 - กม. 6+840 ไม้เสียบขยายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 693 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700353052410125	4,000,000
84	สขป. 15	(1.124) อาคารบังคับน้ำเหมืองนายเที่ยง ขนาด 2.00x2.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 692 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700353052410124	3,200,000
85	สขป. 15	(1.320) อาคารสำนักงานขนาดกลาง จำนวน 1 หลัง โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 408 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700354001410547	9,900,000
86	สขป. 15	(1.306) ซ่อมแซมคันลิ่งน้ำบน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 394 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700354001410390	815,000
87	สขป. 15	(1.304) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 392 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700354001410388	1,000,000
88	สขป. 15	(1.288) อาคารที่ทำการส่วนแผนงาน ภายใต้นที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 376 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700354001410372	4,000,000
89	สขป. 15	(1.1468) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 3660 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410116	315,000
90	กพท.	(1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง) - [ 9550 ]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	งานปีเดียว	07003520B6420004	79,780,000
91	กพท.	(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ - [ 9533 ]	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	งานปีเดียว	07003520B3410001	3,000,000
92	กพท.	(202) อาคารประกอบคลองระบายน้ำ โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง - [ 9462 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	0700352054420018	15,900,000
93	กพท.	(1.12) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองระบายน้ำคลองหนั่งพร้อมอาคารประกอบโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรมหัทธง ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา - [ 9232 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	0700352054410012	1,588,900



ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	GFMS	งบ พ.ร.บ. ปี 65
94	กวก.	(1.3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำมอโค ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - [ 9063 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	0700352053410038	9,000,000
95	กวก.	(54) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.58 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านหม้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคม อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสงขลา - [ 8700 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	0700352053420129	70,000,000
96	กวก.	(1.21) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด - [ 8628 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	0700352053410026	1,575,000
97	กวก.	(1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด - [ 8626 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	0700352053410024	2,521,700
98	กวก.	(1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 28.380 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 8625 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	0700352053410023	1,695,700
99	สคก.	(1.752) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรในเขตโครงการชลประทานสุโขทัย ปริมาณ 62,932 ตัน ตำบลยางซ้าย อำเภอมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย - [ 2944 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410LR2	2,000,000
100	สจต.	(150) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 06 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ท่อสาย 002) ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง - [ 866 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700353052420185	20,000,000
101	สสค.	(1.460) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [ 548 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700354001410544	842,200
102	สบอ.	(54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ ขวางถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8494 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0420140	160,193,000
103	สบอ.	(1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 2868 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	07003530C0410A25	2,534,400
104	สบอ.	(1.441) ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จำนวน 1 หน่วย ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 529 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700354001410525	500,000
105	สบอ.	(1.432) ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 520 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700354001410516	1,500,000
106	สบอ.	(1.370) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ. 2565 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 458 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700354001410454	117,000
107	สบอ.	(1.369) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำและเสาสถิติ จำนวน 1 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ พ.ศ. 2565 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 457 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700354001410453	64,800
108	สบอ.	(1.367) ค่าจัดทำเสาสถิติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 455 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	0700354001410451	37,600
