



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สปอ ๑๖๔๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปร้องสั่งการในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และสายงานบริหาร

เรียน ผส.ชป.๑-๑๗, ผส.บอ., ผส.คก., ผส.มต., ผส.บค., ผอ.งบ., ผอ.พต, ผอ.สช., สลก., ผชช.อท.๑, ผชช.อท.๒ และตป.๑ ผง.

ตามที่มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และสายงานบริหาร เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่าน ธรบ. ได้เห็นชอบบันทึกสรุปร้องสั่งการ ตามเอกสารที่แนบ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เห็นควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการ ธรบ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนทร์ สมบูรณ์)  
อนุกรรมการและเลขานุการ

เรียน ผอ.ส่งน้ำ สอ.มต ดบ.บอ.  
ผอ.วางแผน และ ผอ.รท เร่งรัด  
สอ.มต และ สอ.ส่งน้ำ รท. ส่งน้ำ

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

๕ มี.ค. ๒๕๖๔



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ Eสบบอ(ปก.)๐๔/๘๓/๒๕๖๔

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุบข้อสั่งการในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และสายงานบริหาร

เรียน รทบ.

ตามที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และสายงานบริหาร ในวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี รทบ. เป็นประธาน จึงขอสรุปข้อสั่งการจากการประชุม พร้อมทั้งรายงานการประชุม ดังนี้

### ข้อสั่งการที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ สชป.๑-๑๗ สบอ. สลก. สมต. และสคก. คาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินกันไว้เหลือในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ความสามารถในการดำเนินการเบิกจ่าย หากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด ให้แจ้งทาง กผง. ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และมอบหมายให้ กผง. นำเงินงบประมาณในส่วนเงินกันเหลือปีที่ได้จากเรื่องแจ้งคืน เพื่อเปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นที่มีความจำเป็นตามนโยบายของกรมชลประทาน

๒. มอบหมายให้ สชป.๑-๑๗ พิจารณางบประมาณรายจ่ายรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไม่สามารถก่องหนผู้กผัน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ตามมติ ครม. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยให้ดำเนินการแจ้งมาที่ รทบ. ภายในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และมอบหมายให้ กผง. ดำเนินการทำเรื่องขอผ่อนผันไปที่สำนักงบประมาณเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ตามมติ ครม. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

๓. มอบหมายให้ กพด. เร่งรัดรายการงานผูกพันใหม่ในเรื่องการพิจารณาความเหมาะสมของราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

อนุกรรมการและเลขานุการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ Eสบอ(ปก.)๐๔/๘๔/๒๕๖๔

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และสายงานบริหาร

เรียน คณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และสายงานบริหาร

ตามที่มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และสายงานบริหาร เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เอกสารตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

อนุกรรมการและเลขานุการ

## รายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และสายงานบริหาร

วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายทวีศักดิ์	ชนเดโชพล	รชบ.
๒. นายธีระพล	ตั้งสมบุญ	ผส.บอ.
๓. นายเกียรติพงษ์	เพชรศรี	ลกน.
๔. นายสิทธิวัตร	แสงสิริไพบูลย์	ผส.มด.
๕. นายไพฑูรย์	ไชยภูมิสกุล	ผส.พด.
๖. นายสุพิศ	พิทักษ์ธรรม	ผส.คก
๗. นายอเนก	ก้านสังวอน	ผส.บค.
๘. นายวิวัฒน์	มณีอินทร์	ผส.สช.
๙. นายธเนศร์	สมบูรณ์	ผชช.อท.๑
๑๐. นายปกรณ์	สุดสุนทร	ผชช.อท.๒
๑๑. นายนิธ	วรมงคล	ผผง.ขป.๑ แทน ผส.ขป.๑
๑๒. นายสุนทร	คำศรีเมือง	ผผง.ขป.๒ แทน ผส.ขป.๒
๑๓. นายไพฑูรย์	ศรีमुख	รองผส.ขป.๓ แทน ผส.ขป.๓
๑๔. นายไชยงค์	จงอาสาชาติ	ผส.ขป.๔
๑๕. นายสมศักดิ์	อุดมศิลป์	รองผส.ขป.๕ แทน ผส.ขป.๕
๑๖. นายเจษฎาพงษ์	ทิพสิงห์	ผผง.ขป.๖ แทน ผส.ขป.๖
๑๗. นายเกียรติศักดิ์	หนูแก้ว	รก.ผส.ขป.๗
๑๘. นายเกียรติศักดิ์	หนูแก้ว	ผส.ขป.๘
๑๙. นายสุริยพล	นุชอนงค์	ผส.ขป.๙
๒๐. นายศรายุช	พันธุ์บุญ	ผผง.ขป.๑๐ แทน ผส.ขป.๑๐
๒๑. นายวรวิทย์	บุญเนต	ผส.ขป.๑๑.
๒๒. นายกฤษฏา	ศรีเพิ่มพันธ์	ผส.ขป.๑๒.
๒๓. นายชิตชนก	สมประเสริฐ	ผส.ขป.๑๔
๒๔. นายปริญญา	ศักดิ์ชนะ	ผส.ขป.๑๔
๒๕. นายเดช	เล็กวิชัย	ผส.ขป.๑๖
๒๖. นายเฉลิมชัย	ตรีรินทร์	ผส.ขป.๑๗
๒๗. นายนิธ	วรมงคล	ผผง.ขป.๑
๒๘. นายสุนทร	คำศรีเมือง	ผผง.ขป.๒
๒๙. นายวิภา	อุดมมูจลินท์	แทน ผผง.ขป.๓

๓๐. นายยงยศ	เนียมทรัพย์	ผผง.ชป.๔
๓๑. นายสรรัตน์	ปาวริญญานนท์	ผผง.ชป.๕
๓๒. นายเจษฎาพงษ์	ทิพสิงห์	ผผง.ชป.๖
๓๓. นายวรเทพ	วัฒน์วิเชียร	ตป.ชป.๗ แทน ผผง.ชป.๗
๓๔. นายนิวัฒน์	โชติชื่น	ผผง.ชป.๘
๓๕. นายจักรารุช	สุนทรวิภาต	ผผง.ชป.๙
๓๖. นายศรายุช	พันธุ์บุญ	ผผง.ชป.๑๐
๓๗. นายประพจน์	กระโจมแก้ว	ผผง.ชป.๑๑
๓๘. นายศุภเกียรติ	เมฆสินธุ์	ผผง.ชป.๑๒
๓๙. นายพรชัย	ภู่อ้อมพันธุ์	ผผง.ชป.๑๓
๔๐. นายเอกพล	ฉิมพงษ์	ผผง.ชป.๑๔
๔๑. นายพิทักษ์พงษ์	ตีบแก้ว	ผผง.ชป.๑๕
๔๒. นายจงกรม	สมพงษ์	ผผง.ชป.๑๖
๔๓. นายพีรพัฒน์	วรรณธรรม	ผผง.ชป.๑๗
๔๔. นายสมเดช	ศรีวิเชียร	ผปบ.บอ.
๔๕. นายพรชัย	ทองดีมีสุข	ผยศ.สช.
๔๖. นายอธิวัฒน์	โยอาศรี	ผสพ.พด.
๔๗. นางสาวดวงพร	โยอาศรี	ผพพ.พด.
๔๘. นางสาวเอมินทร์	ตั้งธัญเจริญสิน	พพ.๒.พด.
๔๙. นางสาวสมคิด	นิติเกียรติชัย	ผจพ.พด.
๕๐. นายสำราญ	บุญถิ่น	ปค.บอ.
๕๑. นายธนารักษ์	บุญยเกียรติ	ตป.ชป.๔
๕๒. นายสกุล	สุมะโน	ตป.ชป.๑๔
๕๓. นายเพชร	บ้างตระกูล	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ.
๕๔. นายรักสกุล	อรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ.
๕๕. นางสาวนันทิพร	ปิยะมะรัตน์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ.
๕๖. นายสิรภพ	กิมถ้อง	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ.
๕๗. นางสาวธนธรณ์	ดวงพัก	วิศวกรชลประทาน

**ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)**

**สำนักงานชลประทานที่ ๑**

๑. นายจักรกฤษณ์	ชมพู่บาง	ผง.ชป.๑
๒. นายก่อพงศ์	เจษฎาพันธ์	ตป.ชป.๑
๓. นายวชิรวิทย์	กันทา	คพ.ชป.๑
๔. นายอัยยา	อรุณพเพ็ชร	ผคบ.แม่กวางอุดมธารา
๕. นายธีรพันธุ์	เต็ดขาด	วศ.คบ.แม่กวางอุดมธารา
๖. นายเกื้อกุล	มานะสัมพันธ์สกุล	วศ.คป.เชียงใหม่
๗. นายสกลฤทธิ์	ดวงราศี	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

๘. นายกตัญญู	ใจชื่น	ผคป.แม่ฮ่องสอน
๙. นายเกษียร	สฤชติกุล	วศ.คป.แม่ฮ่องสอน
๑๐. นายวุฒิชัย	รักษาสุข	ผคป.ลำพูน
๑๑. นายคณิตย์	สัตย์ชื่อ	วศ.คป.ลำพูน
๑๒. นายธีรวัฒน์	วงศ์วิริยะ	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๑๓. นายบรรจบ	ปิ่นเต๋	นายช่างชลประทานชำนาญงาน
สำนักงานชลประทานที่ ๒		
๑๔. นายนิพนธ์	พุดรี	ผคป.น่าน
๑๕. นายกุลธร	รัตนเสรี	วศ.คป.แม่วัง
๑๖. นายวศิน	ลีลาชีนาเวศ	วศ.คป.กัวลม
๑๗. นายสายัณห์	ลังกาพินธุ์	วศ.คป.๒
๑๘. นายเกียรติกวิน	เพิ่มทวีสิน	ผจ.คป.๒
๑๙. นายกิตติพงษ์	ศรีวิภาต	ตป.คป.๒
๒๐. นายสิทธิศักดิ์	ไชยวรรณ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๑. นายปาโมกษ์	ปิงเมือง	ผคป.พะเยา
๒๒. นายวัชร	ลี้มิพิเศษศิลป์	วศ.คป.พะเยา
๒๓. นายทวีชัย	ไคว้ตระกูล	ผคป.เชียงราย
๒๔. นายอินันท์	นาวิกนันท์	วศ.คป.เชียงราย
๒๕. นายนิรันท์	คชทโรภาส	วศ.คป.แม่ลาว
๒๖. นายประดับพันธ์	เจริญการ	สบ.๔ คป.แม่ลาว
๒๗. นายโชติกรวิชช์	ทวีศักดิ์ทินโชติ	วศ.คป.น่าน
๒๘. นายวิชาญ	กวินภูมิเสถียร	วศ.คป.ลำปาง
๒๙. นายวรชัย	ธนกันต์ธัช	หัวหน้าวิชาการ ศูนย์ภูฟ้าฯ
สำนักงานชลประทานที่ ๓		
๓๐. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผส.คป.๓
๓๑. นายฉัตรชัย	ทองปอนด์	ผวศ.คป.๓
๓๒. นายชลเทพ	ทาดรี	ผจบ.คป.๓
๓๓. นายปิยภัทร	สายเมฆ	ผคป.อุตรดิตถ์
๓๔. นายชำนาญ	ชูเที่ยง	ผคป.พิษณุโลก
๓๕. นายอำนาจ	อินทร์วงศ์แก้ว	ผคป.พิจิตร
๓๖. นายภักษ์วัฒน์	สุขจินดาธนกุล	ผศ.คป.นครสวรรค์
๓๗. นายสมหวัง	ปานสุขसार	ผคป.พลาญชุมพล
๓๘. นายสุรินทร์	ทรัพย์สกุล	ผคป.เขื่อนนเรศวร
๓๙. นายเอกฉัตร	เอี่ยมตาล	ผคป.ดงเจริญรัฐ
๔๐. นายอรุณ	ตรีสิทธิเดช	แทน ผคป.ท่าบัว
๔๑. นายวรวุฒิ	เนียมน้อย	ผคป.แควน้อยบำรุงแดน

๔๒. นายนิวัฒน์ธนา	เพ็ชรสุขุม	ผศ.ชป.๓
๔๓. นายชัยวัฒน์	บุญเพชร	ผง.ชป.๓
๔๔. นางสาวเกษราภรณ์	ภูมามล	ตป.ชป.๓
๔๕. นายอดิศักดิ์	แก้วทอง	นายช่างชลประทานอาวุโส
๔๖. นายบวร	โชคอยู่ประเสริฐ	วศ.คส.๓
๔๗. นายสมประสงค์	ไกรลาศ	นายช่างชลประทานอาวุโส
๔๘. นายอำพล	อิศวานา	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๔๙. นายพงศ์กฤษณ์	เอกธรรมสุทธิ	วศ.คบ.พลาญชุมพล
สำนักงานชลประทานที่ ๔		
๕๐. นายบรรจง	วงศ์มา	ผคบ.วังยาง-หนองขวัญ
๕๑. นายธีระพล	อินชัน	ผง.ชป.๔
๕๒. นายพงศกร	จารุชาติ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๕๓. นายธนพล	มณฑิยรัตน์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๕๔. นางสาววาสนา	หลวงวรรณนา	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๕๕. นายสุริยา	มาอุ้น	วิศวกรชลประทาน
๕๖. นางสาวปิยะฉัตร	ชาติสิริทรัพย์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๕๗. นายกนก	หมื่นกล้า	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๕๘. นายนิคม	ตุ้ยทิม	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๕๙. นายพาโชค	ชันนา	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๖๐. นางจุฑารัตน์	พันทับ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๖๑. นายณัฐกิตติ์	กาญจนหิรัญกิจ	นายช่างชลประทาน
๖๒. นางสมหมาย	เล็กมี	เจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักงานชลประทานที่ ๕		
๖๓. นายจารึก	วัฒนาโกศัย	ผส.ชป.๕
๖๔. นายเริงชัย	ลันขุนทด	ผคบ.ห้วยโมง
๖๕. นายชัยรัตน์	จิ่งวัฒนกุล	ผง.ชป.๕
๖๖. นายทินกร	แสงอาวุธ	วศ.คป.อุดรธานี
๖๗. นายอภิสิทธิ์	มาเมือง	วศ.คป.หนองคาย
๖๘. นายสรายุ	วงศ์ชาชม	วศ.คป.บึงกาฬ
๖๙. นายวรวิทย์	สุภาอ้วน	วศ.คบ.ห้วยหลวง
๗๐. นายทะนงศิลป์	ทวีคุณ	แทน วศ.คป.สกลนคร
๗๑. นายภาณุวัฒน์	สิทธิภาณุพันธ์	แทน วศ.คบ.กุมภวาปี
๗๒. นายภูมิพัฒน์	วงศ์อำมาตย์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๗๓. นายธนวัฒน์	จันทร์แก้ว	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๗๔. นายกิตติ	นาครธรินทร์	วศ.คป.หนองบัวลำภู
๗๕. นายธีรภัทร์	สามไพบุลย์	วศ.คป.เลย

๗๖. นายธนิต	สวนช่วย	วศ.คป.น้ำอูน
๗๗. นายสมคิด	หล้าสกุล	วศ.คส.๕
๗๘. นายภาณุวัฒน์	บุญรอด	วช.ภูพาน
สำนักงานชลประทานที่ ๖		
๗๙. นายศักดิ์ศิริ	อยู่สุข	ผส.ชป.๖
๘๐. นายสมปอง	ฉ่ำกระมล	ผจบ.ชป.๖
๘๑. นายองอาจ	แสนอุบล	ผวศ.ชป.๖
๘๒. นายวีระชัย	ฟุ้งไพศาล	ผคก.ชป.๖
๘๓. นายจักริน	ประเสริฐสุวรรณ	ผคส.๖
๘๔. จิรศักดิ์	มงคลสวัสดิ์	ผคป.ร้อยเอ็ด
๘๕. นายเกริกกรุง	สุภักวนิช	ผคป.กาฬสินธุ์
๘๖. นายพงศ์ศักดิ์	ณ ศรี	ผคป.ชัยภูมิ
๘๗. นายณัฐวรรณ	ถิระวณิชยางกุล	ผคบ.หนองหวาย
๘๘. นายฤาชัย	จำปานิล	ผคบ.ลำปาว
๘๙. นายสรายุทธ์	ช่วยชาติ	ผคบ.เสียวใหญ่
๙๐. นายเรืองโชค	ชัยดำรงกุล	ผคบ.พรม-เข็ญ
๙๑. นายอนันต์ศักดิ์	แย้มชื่น	ผคบ.ซีกลาง
๙๒. นายเกรียงไกร	เวชพันธ์	ผง.ชป.๖
๙๓. นายเกียรติพงษ์	สายเมือง	ยศ.ชป.๖
๙๔. นายภูวดล	หงส์กาญจนกุล	วศ.คป.ขอนแก่น
๙๕. นายสุทธิพันธ์	ตันตระกูล	วศ.คป.กาฬสินธุ์
๙๖. นายออน	วิศาลอาชีวะเจริญ	วศ.คป.ร้อยเอ็ด
๙๗. นายันทศักดิ์	ฝอยทอง	วศ.คป.ชัยภูมิ
๙๘. นายสำรวย	อินพิทักษ์	วศ.คป.ลำปาว
๙๙. นายธณกฤต	พหลทั	วศ.คป.ชีบน
๑๐๐. นายรังสรรค์	วันชัย	วศ.คป.ซีกลาง
๑๐๑. นายทะนงศักดิ์	อะโน	ปช.ชป.๖
สำนักงานชลประทานที่ ๗		
๑๐๒. นายนิวัติ	คำแน่น	ผวศ.ชป.๗
๑๐๓. นายธนพงศ์	วาระโว	วศ.คป.อำนาจเจริญ
๑๐๔. นายราม	ธนาคุณ	วศ.ชป.๗
๑๐๕. นายวรวิทย์	ไชยเนตร	ผง.ชป.๗
๑๐๖. นางปิยะภรณ์	ศรีธานี	นักธรณีวิทยาชำนาญการ
๑๐๗. นางสาวณัฐภัทร์	จงเฉลิมวงศ์	สป.ชป.๗
๑๐๘. นายกรกร	อาจน้อย	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๑๐๙. นางปาริกานต์	พิมพ์สมาน	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ



๑๑๐. นายทวีวัฒน์	ศรีเชียงใหม่	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๑๑๑. นายธรรมรัตน์	ทนานะเวช	ฟท.ชป.๗
๑๑๒. นายธนวัฒน์	ทองทาบ	พนักงานทั่วไป
สำนักงานชลประทานที่ ๘		
๑๑๓. สำนักงานชลประทานที่ ๘		
๑๑๔. นายพิศิษฐ์ศักดิ์	โชตะมังสะ	รอง ผส.ชป. ๘
๑๑๕. นางสาวนีย์	ปึกษา	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๑๑๖. นายวิวัฒน์	ฐิติรัตน์อัศว	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
๑๑๗. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
๑๑๘. นายประภาส	สมานทรัพย์	ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
๑๑๙. นายบุญสม	สาระ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑๒๐. นางสาวกนิษฐธรินทร์	ภูมิภัทรสิฐ	หัวหน้างานพัสดุ
๑๒๑. นางสาวสิริกานต์	ชาญปรีชารัตน์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๑๒๒. นายวรุณ	หังพร	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๑๒๓. นายอานนท์	ลอคทรง	นายช่างชลประทาน
๑๒๔. นายธนะชาติ	ไชโยโส	นายช่างชลประทาน
๑๒๕. นายธีระชล	สมสุข	วิศวกรชลประทาน
๑๒๖. นางสาวภัทจริยา	ศิริสถิตย์	พนักงานทั่วไป
๑๒๗. นายสรราชูฒิ	โสภาค	พนักงานทั่วไป
สำนักงานชลประทานที่ ๙		
๑๒๘. นายธรรมวัฒน์	การุณธนกุล	ผง.ชป.๙
๑๒๙. นายทินกร	สุทิน	ผคป.ชลบุรี
๑๓๐. นายดำรงศักดิ์	นคราวงค์	ผคป.ตราด
๑๓๑. นายสุรชัย	สองสี	ผคบ.คลองสีียด
๑๓๒. นายกิตติธัช	เทพหัสติน ฌ อยุธยา	ผคบ.ประแสร์
๑๓๓. นายบรรเจิด	สิธิจู	ผคบ.บางพลวน
๑๓๔. นายภูษิต	พรหมเมศร์	วศ.คป.ชลบุรี
๑๓๕. นายกิตติศักดิ์	ศักดิ์ตระกูล	วศ.คป.นครนายก
๑๓๖. นายพรพรหม	อุ้นแท่น	วศ.คป.ตราด
๑๓๗. นายพิภวัฒน์	หาญไพบูลย์	วศ.คป.ระยอง
๑๓๘. นายศาสตร์	พรหมรักษ์	วศ.คบ.ขุนด่านประการชล
๑๓๙. นายวุฒิ	สินธุรวงษ์	วศ.คบ.นครนายก
๑๔๐. นายประวีณ	ชนะชัย	วศ.คบ.คลองสีียด
๑๔๑. นายกิตติ	ศรีเจริญ	วศ.คบ.คลองหลวง
๑๔๒. นางสาวคำเครือ	ประกัสสรศิริ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สำนักงานชลประทานที่ ๑๐		
๑๔๓. นายทะนงศักดิ์	มูลใจตา	วศ.คบ.บางตาล

๑๔๔. นายกานต์	จันทร์เลื่อน	ผง.ชป.๑๐
๑๔๕. นายวรวงศ์	มณฑา	ตป.ชป.๑๐
๑๔๖. นายอรรถพร	สุขมงคล	ยศ.ชป.๑๐
๑๔๗. นายกานต์	โพธิ์ดอกไม้	วศ.คป.มหาราช
๑๔๘. นายนภดล	หุ้มเชื้อ	วศ.คป.ป่าสักใต้
๑๔๙. นายนฤนารถ	มีบุญมาก	วศ.กส.๑๐
๑๕๐. นายวรวงศ์	เจริญวงศ์	วศ.คป.ช่องแค
๑๕๑. นายสมพงษ์ธร	ธีระทานันท์	วศ.คป.ลพบุรี
๑๕๒. นายพงศ์ธร	โกศลวดี	วศ.คป.เพชรบูรณ์
๑๕๓. นายวศวรรธน์	นาคนวน	วศ.คป.สระบุรี
๑๕๔. นายสุกิจ	ไชยศรี	วศ.คป.พระนครศรีอยุธยา
๑๕๕. นายมนัส	วีระวัฒน์พงศ์	วศ.คป.มโนรมย์
๑๕๖. นายอำนาจ	เมืองเกต	วศ.คป.โคกกระเทียม
๑๕๗. นายศรมิษฐ์	สิงห์คะนอง	วศ.คป.เรียงราง
๑๕๘. นายไกรฤทธิ	บุษพันธ์	วศ.คป.คลองเพรียว - เส้าไห้
๑๕๙. นายอนุวรรตน์	ไคววารินทร์	วศ.คป.นครหลวง
๑๖๐. นายเจนศักดิ์	สุกกุล	วศ.คป.ป่าสักชลสิทธิ์
สำนักงานชลประทานที่ ๑๑		
๑๖๑. นายวรชัย	สุขผลธรรม	ผวศ.ชป.๑๑
๑๖๒. นายประพจน์	กระโจมแก้ว	ผผง.ชป.๑๑
๑๖๓. นายทวีวัฒน์	บุรมย์ชัย	ผง.ชป.๑๑
๑๖๔. น.ส. โสมสุราง	เอื้อเพื่อ	วิศวกรชลประทาน
๑๖๕. นายพิมาย	จันทะชิต	วศ.คป.ปทุมธานี
๑๖๖. นายคณพศ	วัตอักษร	สบ.คป.ปทุมธานี
๑๖๗. นายนิพนธ์	จันทร์ช่วง	กส.๑ชป.๑๑
๑๖๘. นายจรัญ	ชยุะวัฒน์	กส.๒ชป.๑๑
๑๖๙. นายสุรเดช	ศรีวิเศษ	กส.๓ชป.๑๑
๑๗๐. นายธีรวุฒิ	ผลกล้า	กพ.คส.๑๑
๑๗๑. นายวิรัช	สารทรานูวัฒน์	วศ.คป.สมุทรสาคร
๑๗๒. นายสุรเชษฐ	รงค์พรรณ	วศ.คป.พระพิมล
๑๗๓. นางกัลยารัตน์	เตี้ยรัตน์	บท.คป.พระพิมล
๑๗๔. นายปวิตร	สุขวิจน์	คป.รังสิตใต้
๑๗๕. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บท.คป.รังสิตใต้
๑๗๖. นายสนธยา	จันบำรุง	วศ.คป.พระยาบรรลือ
๑๗๗. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	ผคป.พระองค์ไชยานุชิต
๑๗๘. นายโกศล	ถาวรวัตร	วศ.คป.พระองค์ไชยานุชิต

๑๗๙. นายภูมิวิทย์	นารถสกุล	วศ.คป.สมุทรปราการ
๑๘๐. นายรัฐพล	บุญณะ	วศ.คป.นนทบุรี
๑๘๑. นายสุภชัย	ยังพืง	วศ.คป.รังสิตเหนือ
๑๘๒. นายรุ่งโรจน์	พืงอ่อน	วศ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๑๘๓. นายกีรวิทย์	ศรีสำราญ	วศ.คป.ภาษีเจริญ
๑๘๔. นายมานพ	แจ่มมี	วศ.คป.ชลหารพิจิตร
๑๘๕. นายวิวัฒน์	ผสมทรัพย์	จน.คป.ชลหารพิจิตร
๑๘๖. ร้อยตรีอดยุท	เยี่ยมสถาน	สบ.๒ คป.ชลหารพิจิตร
๑๘๗. นายนพรัตน์	ฉิมเอียด	นายช่างชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒.		
๑๘๘. นายเนรมิต	เทพนอก	ผชช.ชป.๑๒
๑๘๙. นายสมหมาย	ม่วงใหม่	ผวศ.ชป.๑๒
๑๙๐. นายพงษ์ศักดิ์	อัครมณี	ผจบ.ชป.๑๒
๑๙๑. นายพีรยุทธ์	เหมาะพิชัย	ผคป.ชัยนาท
๑๙๒. นายสมชายธนิรินทร์	พ่วงสุวรรณ	ผคป.อ่างทอง
๑๙๓. นายยศดนัย	น้อยแก้ว	ผคป.สุพรรณบุรี
๑๙๔. นายมานิช	ตุ้มทอง	ผคป.ท่าโบสถ์
๑๙๕. นายวัชร	ไกรสัย	ผคส.๑๒
๑๙๖. นายปรีชญา	บุญชู	วศ.คป.พลเทพ
๑๙๗. นายนนทชัย	ตรีจรรยาพงศ์	วศ.คป.ท่าโบสถ์
๑๙๘. นายธัญนนท์	ทองคำ	วศ.คป.สามชุก
๑๙๙. นายศิโรตัน	ลิขิตวรรณการ	วศ.คป.โพธิ์พระยา
๒๐๐. นายรัชพงศ์	สัจปัญญาพิทักษ์	วศ.คป.บรมธาตุ
๒๐๑. นายนพดล	คำชมภู	วศ.คป.ชัยสูตร
๒๐๒. นายนาวา	แก้วลี	วศ.คป.ยางมณี
๒๐๓. นายเริงฤทธิ์	เจียรสุมัย	วศ.คป.ผักไห่
๒๐๔. นายศุภชัย	ไพโรลิน	วศ.คป.เจ้าพระยา
๒๐๕. นายอภิชาติ	ธรรมวิโรจน์ศิริ	วศ.คป.สิงห์บุรี
๒๐๖. นายสิทธิชัย	มานะเจริญสุข	วศ.คส.๑๒
๒๐๗. นายมนตรี	สมกุล	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๐๘. นายวรวุฒิ	แหยมยินดี	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๐๙. นางสาวอัจฉรา	นาคสนิท	งบ.ชป.๑๒
๒๑๐. นางสมคิด	สีใส	พด.ชป.๑๒
๒๑๑. นายณัฐภัทร	ไกรลาศ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๑๒. นายบรรพต	พลแสน	นายช่างชลประทานอาวุโส
๒๑๓. นายธนิต	จักรวานนท์	นายช่างชลประทานอาวุโส

๒๑๔. นายจิรัฏฐ์	เทียมพิทักษ์	นายช่างชลประทานอาวุโส
๒๑๕. นายกิตติศักดิ์	อินทร์น้อย	นายช่างชลประทานอาวุโส
๒๑๖. นางสาววันวิสาข์	ปั้นคุ้ม	นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานชลประทานที่ ๑๓		
๒๑๗. นายสันติศักดิ์	ศรีวารินทร์	ผวศ.ชป.๑๓
๒๑๘. นายประธีป	จุงใจ	ผคก.ชป.๑๓
๒๑๙. นายพงษ์ศักดิ์	ฤทธิสมิต	ผคส.๑๓
๒๒๐. นายประศาสน์	สุขอินทร์	ผคบ.ท่ามะกา รก. ผคป.กาญจนบุรี
๒๒๑. นายพิเชษฐ	ภักพยนต์	ผคป.สมุทรสงคราม
๒๒๒. นายพิทักษ์	ยวามนทร์	ผคบ.นครปฐม
๒๒๓. นายชัชวาลย์	ขาวผ่อง	ผคบ.กำแพงแสน
๒๒๔. นายสีลวัตร	สิงห์มณี	ผคบ.นครชุม
๒๒๕. นายคณิต	ชินวงศ์	ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา
๒๒๖. นายพันธุ์เทพ	โกมารกุล ณ นคร	ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
๒๒๗. นายกิตติ์ชัญชาติ	เสมทอง	ผคบ.ดำเนินสะดวก
๒๒๘. นายณภดล	มีวิเศษ	ผคบ.บางเลน
๒๒๙. นายสัมพันธ์	พิรกุลวานิช	วศ.คบ.กำแพงแสน
๒๓๐. นายกิตติพงษ์	รักจรรยา	วศ.คบ.สองพี่น้อง
๒๓๑. นายดุขฎี	พรพระแก้ว	บน.ชป.๑๓
๒๓๒. นายบุญธรรม	ราชโสภา	ฟท.ชป.๑๓
๒๓๓. นายสมใจ	อินทร์พยุง	วศ.คบ.แม่กลอง
๒๓๔. นายชฎชัย	บุญสนอง	พนักงานทั่วไป
๒๓๕. วิราภรณ์	ดวงอยู่สาร	นักประชาสัมพันธ์
๒๓๖. นายชานนท์	เปล่งไปล	นายช่างไฟฟ้า
๒๓๗. จามร	ทองสม	พนักงานทั่วไป
๒๓๘. นายกิตติ์ชัญชาติ	เสมคำ	ผคบ.ดำเนินสะดวก
๒๓๙. นายนรุตม์	เดชศิริ	วศ.คป.นครปฐม
๒๔๐. นายภูวดล	คำพุด	ผคป.นครปฐม
๒๔๑. นายพงษ์ศักดิ์	ฤทธิสมิต	ผคส.๑๓
๒๔๒. นายวัฒน์ศักดิ์	วงศ์แก้ว	วศ.คส.๑๓
๒๔๓. นายพิเชษฐ	ภักพยนต์	ผคป.สมุทรสงคราม
๒๔๔. นายศานติพงษ์	เดือนศิริรัตน์	วศ.คป.สมุทรสงคราม
๒๔๕. นายนคร	อวารณ์	สบ.คป.สมุทรสงคราม
๒๔๖. นายธนาคาร	เผ่าก้อน	วิศวกรชลประทาน
๒๔๗. นายจิรภานนท์	ภัทรพงศ์ธาริน	วิศวกรชลประทาน
๒๔๘. นายไชยวัฒน์	คุณวัฒนานนท์	วศ.คป.กาญจนบุรี

๒๔๙.นางสาวพัทธนันท์	แม่นทิม	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๕๐.นายณัฐธนนท์	วรกุลพัชรวิวัฒน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๒๕๑.นายนพดล	มีวิเศษ	ผคบ.บางเลน
๒๕๒.นายอุรค์	สุบรรณเสนีย์	จน.คบ.บางเลน
๒๕๓.นายธนภุต	มาตราเงิน	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๕๔.นายชัยรัตน์	หรั่งนิ่ม	นายช่างชลประทาน
๒๕๕.นางพงษ์บริบูรณ์	กลางบุรีรัมย์	วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
สำนักงานชลประทานที่ ๑๔		
๒๕๖.นายบุรีรัตน์	วงศ์บุรี	รอง ผส.ชป.๑๔
๒๕๗.นายศักดิ์สิทธิ์	ครุฑเทียร	ผวศ.ชป.๑๔
๒๕๘.นางสาวปภาณขวัญ	แผนเสื่อ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๕๙.นายสุทธิเชษฐ์	ช่วยสุข	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๖๐.นายยงยุทธ	จุลานนท์	ผคบ.ประจวบคีรีขันธ์
๒๖๑.นายสันต์	จรเจริญ	ผคบ.เพชรบุรี
๒๖๒.นายมีชัย	ปฏิยุทธ์	ผคบ.แก่งกระจาน
๒๖๓.นายพิมล	สกุลดิษฐ์	ผคบ.ปราณบุรี
๒๖๔.นายกิติ	สุนทรเสถียร	วศ.คป.ชุมพร
๒๖๕.นายณัฐพล	ชูชีพ	วศ.คป.ระนอง
๒๖๖.นายธนชาติ	สุขอนันตวงษ์	ปช.ชป.๑๔
๒๖๗.นางสาวสรกมล	อ่องจ้อย	ปบ.ชป.๑๔
๒๖๘.นางลักขณา	การทหาร	หัวหน้าฝ่ายธุรการ / คป.เพชรบุรี
๒๖๙.นายณัฐพล	อินพรม	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ / คป.เพชรบุรี
๒๗๐.นายนิติพัฒน์	จรัสดี	หัวหน้าฝ่ายช่างกล / คป.เพชรบุรี
สำนักงานชลประทานที่ ๑๕		
๒๗๑.นายภราดร	คณะแนม	ยศ.ชป.๑๕
๒๗๒.นายชิรากร	เรียงรุ่งโรจน์	ตป.ชป.๑๕
๒๗๓.นายศุภกิจ	ก้อยสุวรรณ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๗๔.นายประวีติ	ชาคนานนท์	ผคบ.ปากพื้งบน
๒๗๕.นายสำราญ	พุ่มบุญทริก	ปากพื้งล่าง
๒๗๖.นายพรชัย	ไชยสม	วศ.คบ.นครศรีธรรมราช
๒๗๗.นายอำนาจ	ปราชญ์ศักดิ์	วช.ปากพื้ง
๒๗๘.นายณรงค์	เนตรวงศา	วศ.คส.๑๕
๒๗๙.นายปกรณ์	ณ ศิริ	วศ.คป.นครศรีธรรมราช
๒๘๐.นายธงชัย	ไชยคม	วศ.คป.สุราษฎร์ธานี
๒๘๑.นายธีร	ชยเจตน์	วศ.คป.กระบี่
๒๘๒.นายสมโชค	หลักหาญ	วศ.คป.พังงา
๒๘๓.นายพูนสิน	พุทธโร	วศ.คป.ภูเก็ต

สำนักงานชลประทานที่ ๑๖

๒๘๔.นายมานพ	ลี้มทองใบ	ผจบ.ชป.๑๖
๒๘๕.นายสาโรจน์	หนูฤทธิ	ผคก.ชป.๑๖
๒๘๖.นายสุรพงศ์	เจริญการยนต์	ผคป.สงขลา
๒๘๗.นายยงยุทธ	เกิดสินธ์ชัย	ผคบ.ท่าเขียด รก. ผคป.สตูล
๒๘๘.นายธนิษฐ์	หุยทอง	ผคป.ตรัง
๒๘๙.นายสุภกิจ	วงศ์แก้ว	วศ.คป.๑๖
๒๙๐.นายสิทธิพร	พชรศรี	วศ.คป.สงขลา
๒๙๑.นายชาวุฒิชัย	ชัยดำรงกุล	วศ.คป.ระนอง
๒๙๒.นายพิสิษฐ์	แสงมณี	วศ.คป.พัทลุง
๒๙๓.นายณัฐกมน์	หนูขำ	วศ.คป.สตูล
๒๙๔.นายณทรศน์	ศิริรัตนกร	ผง.ชป.๑๖
๒๙๕.นายประทุม	เสียงหวาน	ตป.ชป.๑๖
๒๙๖.นายภัคธร	แข่งง่าย	คพ.ชป.๑๖
๒๙๗.นายธนากร	หวานเส็ง	ยศ.ชป.๑๖

สำนักงานชลประทานที่ ๑๗

๒๙๘.นายชูศักดิ์	สุทธิ	ผคป.ยะลา
๓๐๐.นายอภิวัฒน์	ชนะสงคราม	ผคป.นราธิวาส
๓๐๑.นายสุพรชัย	ปรีชา	ผคบ.ปัตตานี
๓๐๒.นายสุทิน	รามแก้ว	วศ.คป.ปัตตานี
๓๐๓.นายสมพร	ประไพ	วศ.คป.โก-ลก
๓๐๔.นายเถลิงกิตต์	สุวรรณชาติ	วศ.คป.ยะลา
๓๐๕.นายวินัย	สัมพันธ์รัตน์	วศ.คป.ปัตตานี
๓๐๖.นายเมฆินทร์	ชินทัตไทย	วศ.คป.นราธิวาส
๓๐๗.นายนพกรณ์	สอนอินทร์	วศ.คส.๑๗
๓๐๘.นายชาวลิต	มะหะมะ	ปบ.ชป.๑๗
๓๑๐.นายวิทยา	อาวุธเพชร	ผง.ชป.๑๗
๓๑๑.นายวีระพงษ์	แดงเหลือ	ยศ.ชป.๑๗
๓๑๒.นางศิริมณี	ทิพย์อรุณ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๓๑๓.นายทศพล	แก้วศรี	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๓๑๔.นายมนัส	จอกเงิน	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๓๑๕.นายรัชกฤษ	อภิรุ้งธนกุล	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

สำนักเครื่องจักรกล

๓๑๖.นายสมชาย	ธรรมส์จจุล	ตป.คก.
๓๑๗.นายศุภฤกษ์	ลือวัฒน์	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑** ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ขอเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และสายงานบริหาร โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษาและสายงานบริหาร เนื่องจาก รธบ. รักษาราชการแทน รธร.

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องเพื่อทราบ

**๒.๑** รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ ๑. ฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบ โดยหากมีการแก้ไขให้ส่งข้อมูลมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุม หากมีแก้ไขภายหลังให้ประสานที่ฝ่ายเลขานุการ

**๒.๒** ผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี/กันขยาย พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และสายงานบริหาร

ฝ่ายเลขานุการ ผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมของกรมชลประทาน นั้นมี ๑,๕๕๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐ ล้านบาท โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว วงเงินงบประมาณ ๖,๐๓๙.๙๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือที่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมชลประทาน วงเงินงบประมาณ ๕,๐๖๓.๒๑ ล้านบาท ซึ่งอยู่ในสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน ๕๐๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓,๔๕๗.๘๖ ล้านบาท ดังตารางนี้

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>507</b>	<b>5,851.97</b>	<b>2,350.69</b>	<b>40.17</b>	<b>3,457.86</b>
สำนักงานชลประทานที่ 1	13	95.52	48.06	50.32	47.08
สำนักงานชลประทานที่ 2	23	143.30	77.64	54.18	63.83
สำนักงานชลประทานที่ 3	38	143.22	71.59	49.99	71.63
สำนักงานชลประทานที่ 4	43	289.64	184.12	63.57	105.50
สำนักงานชลประทานที่ 5	41	78.22	23.23	29.69	54.99
สำนักงานชลประทานที่ 6	17	135.52	32.66	24.10	102.86
สำนักงานชลประทานที่ 7	27	171.41	74.67	43.56	96.74
สำนักงานชลประทานที่ 8	62	718.88	173.95	24.20	544.93
สำนักงานชลประทานที่ 9	24	482.04	183.11	37.99	294.10
สำนักงานชลประทานที่ 10	7	162.93	71.16	43.67	91.77
สำนักงานชลประทานที่ 11	18	767.38	259.29	33.79	508.09
สำนักงานชลประทานที่ 12	13	108.89	30.02	27.57	78.87
สำนักงานชลประทานที่ 13	21	2.95	0.66	22.46	2.29
สำนักงานชลประทานที่ 14	27	747.70	428.07	57.25	300.85
สำนักงานชลประทานที่ 15	37	537.94	170.49	31.69	350.08
สำนักงานชลประทานที่ 16	25	305.87	84.62	27.67	221.24
สำนักงานชลประทานที่ 17	42	248.11	80.26	32.35	167.85
สำนักบริหารจัดการน้ำและสุขทวีทยา	7	99.76	37.53	37.62	62.06
สำนักเครื่องจักรกล	22	612.70	319.58	52.16	293.13

และอยู่ในสายงาน...

และอยู่ในสายงานบริหาร จำนวน ๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๖.๑๕ ล้านบาท ดังตารางนี้

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินทั่วไปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ล้านบาท)			
		วงงบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7</b>	<b>23.10</b>	<b>5.24</b>	<b>22.67</b>	<b>16.15</b>
สำนักกฎหมายและที่ดิน	4	7.43	0.06	0.77	7.38
สำนักงานเลขานุการกรม	3	15.67	5.18	33.06	8.78

**๒.๓ ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนัก/กองของสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และสายงานบริหาร**

ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวมของกรมชลประทาน วงงบประมาณทั้งสิ้น ๖๖,๕๑๐.๐๔ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๒๐.๑๙ โดยมีรายการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓๕ รายการ วงงบประมาณ ๖๑๗.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๓๘ รายการ วงงบประมาณ ๘,๒๔๐.๒๔ ล้านบาท ทำข้อผูกพันแล้ว จำนวน ๘,๘๓๔ รายการ วงงบประมาณ ๕๖,๐๘๑.๖๒ ล้านบาท ยกเลิกรายการ จำนวน ๑๙๒ รายการ วงงบประมาณ ๑,๕๗๐.๓๗ ล้านบาท ดังตารางนี้

สำนัก	วงเงิน พ.ร.บ. ล้านบาท	เบิกจ่ายสะสม ล้านบาท	ร้อยละ พ.ร.บ.	จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อผูกพัน	
					รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
<b>รวมสายงาน รสบ.</b>	<b>36,234.27</b>	<b>7,579.78</b>	<b>20.92</b>	<b>8,714</b>	<b>27</b>	<b>272.44</b>	<b>289</b>	<b>4,066.53</b>	<b>8,398</b>	<b>31,895.30</b>
สขบ. 1	1,200.46	363.46	30.28	322	1	1.00	5	115.90	316	1,083.56
สขบ. 2	1,296.34	350.98	27.07	369			13	82.46	356	1,213.88
สขบ. 3	1,966.73	421.53	21.43	335	1	0.18			334	1,966.55
สขบ. 4	1,275.11	227.06	17.81	494			15	183.63	478	1,079.48
สขบ. 5	2,891.26	767.16	26.53	549			10	61.52	539	2,829.74
สขบ. 6	3,337.57	1,245.41	37.32	673			1	1.00	672	3,336.57
สขบ. 7	3,031.25	904.69	29.85	615			12	88.20	603	2,943.05
สขบ. 8	2,431.64	357.96	14.72	504			9	143.45	495	2,288.19
สขบ. 9	2,649.90	432.54	16.32	518	6	33.25	20	414.60	492	2,202.05
สขบ. 10	1,444.94	222.37	15.39	632	5	3.80	29	189.41	598	1,251.74
สขบ. 11	2,017.89	292.41	14.49	540			12	789.72	528	1,228.18
สขบ. 12	2,317.49	452.58	19.53	579	2	47.85	24	281.92	553	1,987.73
สขบ. 13	1,609.84	331.59	20.60	530	1	6.00	16	106.16	513	1,497.68
สขบ. 14	2,590.09	391.97	15.13	267			11	185.83	256	2,404.27
สขบ. 15	1,541.16	136.35	8.85	509			41	547.30	468	993.86
สขบ. 16	2,020.08	144.05	7.13	541			20	460.34	521	1,559.74
สขบ. 17	1,189.08	89.86	7.56	250	11	180.36	32	278.30	207	730.42
สขค.	1,001.28	392.71	39.22	279			2	12.16	277	989.12
สบอ.	434.15	55.10	12.69	209			17	124.63	192	309.52
<b>รวมสายงาน รจร.</b>	<b>3,717.71</b>	<b>1,149.24</b>	<b>30.91</b>	<b>37</b>			<b>1</b>	<b>48.12</b>	<b>36</b>	<b>3,669.59</b>
<b>สมค.</b>	<b>3,669.59</b>	<b>1,149.24</b>	<b>31.32</b>	<b>36</b>					<b>36</b>	<b>3,669.59</b>
<b>สขค.</b>	<b>48.12</b>			<b>1</b>			<b>1</b>	<b>48.12</b>		

โดยจะเห็นว่าสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษามีรายการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๗๒.๔๔ ล้านบาท แบ่งเป็นงานจ้างเหมา จำนวน ๗ รายการ งานดำเนินการเอง จำนวน ๑๐ รายการ และจ้างเหมาบางส่วน ๑๐ รายการ และรายการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๒๘๙ รายการ วงเงินงบประมาณ ๔,๐๖๖.๕๓ โดยมีรายละเอียดดังตารางนี้

ชนิด	อนุมัติแผน		ประเภท TOR		ประเภทจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติราคา		รวม	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
รวม	100	871.75	7	249.50	41	1,197.95	34	521.43	107	1,225.90	289	4,066.53
จ้าง	56	670.48	6	234.50	23	1,029.89	26	435.15	69	661.05	180	3,031.08
ดำเนินการเอง	3	74.00	1	15.00	5	64.36	5	83.60	23	477.33	37	714.29
จ้างบางส่วน	41	127.26			13	103.70	3	2.68	15	87.51	72	321.16
รวม					1	48.12					1	48.12
รวม					1	48.12					1	48.12

งานดำเนินการเอง  
งานจ้างเหมา



**๒.๔ ข้อสั่งการ อธช. ให้เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ฝ่ายเลขานุการ

ตามที่ อธช. ได้มีหนังสือข้อสั่งการให้เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

๑) งบ พ.ร.บ. ให้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒ ทุกรายการ และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ ทุกรายการ

๒) งบเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ หากรายการใดไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนดให้แจ้ง กงบ. ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ และให้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ (หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ งบประมาณจะถูกพับ)

๓) งบกลางให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ หากรายการใดไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนดให้แจ้ง กงบ. ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ และให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ (หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ งบประมาณจะถูกพับ)

๔) ดำเนินการและถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ๖๑ และ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ ๖๑ อย่างเคร่งครัด

ประธาน

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน ๕๐๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓,๔๕๗.๘๖ ล้านบาท และสายงานบริหาร จำนวน ๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๖.๑๕ ล้านบาท โดยให้พิจารณาว่าภายใน ๗ เดือน สามารถเบิกจ่ายหมดแล้วเสร็จหรือไม่ หากไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกำหนด ให้แจ้งทาง กผง. เพื่อโอนเงินงบประมาณคืน โดยในปีถัดไป กผง. จะดำเนินการโอนเงินงบประมาณคืนกลับไป เพื่อให้เงินงบประมาณนี้ไม่ถูกพับ ส่วนในเรื่องการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการเร่งรัดตามที่ประชุมเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยผ่านมา ๕ เดือนแล้วยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๗ รายการ ซึ่งเท่าที่ทราบมีบางส่วนที่ยังไม่ดำเนินการเช่น สัญญาเนื่องจากติดปัญหาการใช้พื้นที่ป่า เนื่องจาก กรม. ได้มีมติเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๓ ว่าที่ดินสาธารณะใดที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ให้ถือเป็นพื้นที่ป่า ซึ่งการตั้งงบประมาณได้ดำเนินการตั้งงบประมาณล่วงหน้า ๑ ปี แต่มติ กรม. ออกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเด็นนี้อาจนำมาเป็นข้อผ่อนผัน โดยขอให้ทาง กผง. และ ผวง. พิจารณาประเด็นนี้ด้วย เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาหลังจากการตั้งงบประมาณ ในส่วนของงานงบประมาณที่อยู่ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๒๘๙ วงเงินงบประมาณ ๔,๐๖๖.๕๓ ล้านบาท มีข้อสังเกตว่าในส่วนงานจ้างเหมาให้ กผง. พิจารณาว่าจ้างเหมาทั้งโครงการถ้าอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างจะได้รับการผ่อนผันหรือไม่จากสำนักงบประมาณบัญชีกลางหากทราบแล้วให้ชี้แจงด้วย ในส่วนงานทำเองและงานทำเองร่วมกับงานจ้างเหมา ผส.ชป. สามารถสั่งการ ผอ.คป. ให้ดำเนินการซื้อน้ำมันหรือเบ็ดเตล็ดในส่วนงานทำเองได้หรือไม่ เพื่อก่อนนี้ผูกพันและเพื่อให้สำนักงบประมาณนำออกจากระบบ GFMIS

ระเบียบวาระที่ ๓

**เรื่องเพื่อพิจารณา**

**๓.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ของสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และสายงานบริหาร**

ฝ่ายเลขานุการ...

ฝ่ายเลขานุการ	ตามบันทึก กผง.๐๖/๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องขอให้ศาลาการนัด การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เหลือมปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส่งไปยังสำนัก/กองที่มีเงินกันเหลือมปีให้ทำการยืนยันมาที่ กผง. โดย กผง. ได้มีปฏิทิน การดำเนินงานซึ่งในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ กผง. จะหารือร่วมกับ สำนักงบประมาณ เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน แต่จากข้อมูลพบว่าในสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษามิ่งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๓,๔๕๗.๘๖ ล้านบาท และสายงานบริหาร ๑๖.๑๕ ล้านบาท ทั้งนี้ กผง. ได้วิเคราะห์ พบว่าสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา มีแนวโน้มที่จะถูกพับไปตาม พ.ร.บ. วิธีการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการด้วยกัน เนื่องจากเป็นงานที่มีวงเงินสูง และมีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นให้พิจารณาว่าสามารถ เบิกจ่ายตามกำหนดหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามกำหนดให้ทำ เรื่องมายัง กผง. เพื่อดำเนินการต่อไป
ประธาน ผวง.	การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินกันเหลือมปีมีกำหนดการถึงเมื่อใด หากเป็นเงินกันที่ไม่มีหนี้เหลือจ่าย จะสิ้นสุดภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเงินกัน เหลือมปีเหลือจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สิ้นสุดแล้วเนื่องจาก กผง. ได้เสนอสำนัก งบประมาณเพื่อนำไปจ่ายชดเชยค่าที่ดิน ส่วนเงินกันที่เหลือยังสามารถขยายระยะเวลา ต่อไปได้ โดยต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ประธาน	เงินกันที่อยู่ในสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษามิ่งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๓,๔๕๗.๘๖ ล้านบาท และสายงานบริหาร ๑๖.๑๕ ล้านบาท เงินงบประมาณในส่วนนี้ ไม่ใช่เงินเหลือจ่ายแต่เป็นเงินงบประมาณที่ยังจำเป็นต้องใช้ อยากให้พิจารณาว่าภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายทันหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด ให้แจ้งทาง กผง. ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
กผง.	ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ต้องทราบว่าดำเนินการเบิกจ่ายทันหรือไม่ โดยรายการ งานที่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีหากจะนำไปดำเนินการเป็นงานปีเดียวต้องนำเข้า ครม. ในส่วนของงานผูกพันข้ามปีนำไปดำเนินการเป็นงานผูกพันข้ามปีไม่ต้องเข้า ครม.
ประธาน	ให้แจ้งทาง กผง. ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ กผง. โอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการ รายการที่สำคัญ โดย กผง. จะต้องดำเนินการโอนเงินกลับในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หากแต่ละ สำนัก/กอง ตัดข้อต่ออย่างไรให้แจ้งในที่ประชุม
ลกน.	งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๘.๗๘ ล้านบาท โดยเป็นการดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราว เพื่อเป็นที่ทำงานชั่วคราว และงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด
สมค.	ขอคืนเงินจำนวน ๗.๓๘ ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด
สขป.๑	งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๔๗.๐๘ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ รายการ คาดว่า สามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด
สขป.๒	งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๖๓.๘๓ ล้านบาท โดยเป็นการดำเนินการปรับปรุงอ่างแม่สรวย เงินงบประมาณนี้เป็นเหมือนเงินไม่มิ่งบประมาณ เวลาเบิกเงินงบประมาณต้องนำ payment มาเบิกเนื่องจากเงินงบประมาณนี้ได้นำไปเป็นค่าที่ดินแล้ว
สขป.๓	งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๗๑.๖๓ ล้านบาท ปัจจุบันเหลือเพียง ๓๐ ล้านบาท คาดว่า สามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด
สขป.๔	งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๑๐๕.๕๐ ล้านบาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด

สขป.๕ งบที่ต้อง...

- สชป.๕ งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๕๔.๘๙ ล้านบาท ปัจจุบันเหลือเพียง ๕ รายการ วงเงิน ๔๘ ล้านบาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด
- สชป.๖ งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๑๐๒.๘๖ ล้านบาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้เพียง ๗๑ ล้านบาท แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม - เมษายน และมี ๑ โครงการ ๒๓ ล้านที่กำลังดำเนินการทำบันทึกถึงกรมให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีกลุ่มผู้คัดค้านโครงการ โดยจะขอส่งคืนเงินงบประมาณ ๒๓ ล้านบาท
- สชป.๗ งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๙๖.๗๔ ล้านบาท จำนวน ๒๗ รายการ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด โดยจะเบิกภายในเดือนมีนาคม และอีก ๑๗ รายการ ที่เหลือจะเบิกจ่ายหลังเดือนมีนาคม
- สชป.๘ งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๕๔๔.๙๓ ล้านบาท จำนวน ๕๙ รายการ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสุหนองพลอง เหลือกิจกรรมชุดลอกบริเวณสถานีสูบน้ำ เนื่องจากติด พ.ร.บ. ป่าไม้ฉบับใหม่ซึ่งได้ประชุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ คาดว่าจะอนุมัติเดือนเมษายนและสามารถเข้าดำเนินการได้ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกกสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
- สชป.๙ งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๒๙๔.๑๐ ล้านบาท ขอส่งคืน ๑ รายการ ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ ๑ ปตร.บ้านบางคา เงินงบประมาณ ๑๒.๙ ล้านบาท รายการที่เหลือคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด
- สชป.๑๐ งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๙๑.๗๗ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ โดยมี ๒ รายการที่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายทันภายใน ๓๑ มีนาคม และอีก ๕ รายการสามารถดำเนินการเบิกจ่ายทันภายใน ๓๐ กันยายน
- สชป.๑๑ งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๕๐๘.๐๙ ล้านบาท จำนวน ๑๘ รายการ ทั้งหมดสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ รายการ โดยมี ๑ รายการ งานกำแพงกันดินพร้อมส่วนประกอบอื่นที่อยู่ในระหว่างโอนสิทธิ์ และอีก ๑ รายการ งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ ยังไม่สามารถเข้าทำงานได้เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ความมั่นคง อยู่ระหว่างประสานงาน คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด อยู่ระหว่างประเมินรายการที่จะดำเนินการขอคืน
- สชป.๑๒ งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๗๘.๘๗ ล้านบาท จำนวน ๑๐ รายการ วงเงินงบประมาณ ๖๕ ล้านบาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด
- สชป.๑๓ งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๒.๒๙ ล้านบาท จำนวน ๒๐ รายการ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายครบภายในเดือนมีนาคม
- สชป.๑๔ งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๓๐๐.๘๕ ล้านบาท จำนวน ๓๒ รายการ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายครบภายในเดือนมีนาคม จำนวน ๓๑ รายการ และมี ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๘๕ ล้านบาท มีปัญหาเรื่องคลองผันน้ำต้องดำเนินการแก้ไขแบบเนื่องจากธรณีสันล่างเป็นหิน โดยจะต้องขุดดินเพื่อเปิดดูหน้าหินโดยจะคำนวณงบประมาณแล้วแจ้งทาง กผง. เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายก่อน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
- สชป.๑๕ งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๓๕๐.๘๕ ล้านบาท คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด โดยจะคืน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๕ ล้านบาท และรายการฝายคลองกันพร้อมระบบส่งน้ำคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนดเนื่องจากได้รับอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งส่งเข้าปฏิบัติงานแล้วโดยมีสัญญา ๑๘๐ วัน

- สขป.๑๖                   งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๒๒๑.๒๔ ล้านบาท จำนวน ๗๔ รายการ โดยคาดการณ์ว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม จำนวน ๖๓ รายการ และอีก ๑๑ รายการจะขอขยายและเบิกจ่ายภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
- สขป.๑๗                   งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๑๖๗.๘๕ ล้านบาท จำนวน ๗๔ รายการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๓๕ รายการ รอเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๓๑ รายการ และอีก ๘ รายการจะดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนเมษายน - กันยายน โดยคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด
- สขบ.                       งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๖๒.๐๖ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ โดยแบ่งออกเป็นงานไตรมาส ๔ รายการคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม และอีก ๓ รายการเป็นงานของส่วนปลอดภัยเขื่อนเป็นงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวง ปราณบุรี และน้ำอูน สิ้นสุดสัญญา ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ คาดว่าเบิกจ่ายหลัง ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และสามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด
- สคก.                       งบที่ต้องดำเนินการต่อ ๒๙๓.๑๓ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการ โดยมี ๕ รายการเป็นการซื้อเครื่องจักรแต่เนื่องจากเป็นเครื่องจักรต่างประเทศทำให้เกิดปัญหาโควิด - ๑๙ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรองดค่าปรับ โดยคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด และอีก ๑ รายการงานแก้มลิงหนองบัวของ สขป.๑๕ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายครบตามกำหนด
- ๓.๒ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามสำนัก/กอง สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และสายงานบริหาร ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen - Project วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔**
- ฝ่ายเลขานุการ           ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และสายงานบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ๑) สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๘,๓๙๘ รายการ วงเงิน ๓๑,๘๙๕.๓๐ ล้านบาท และยังไม่ก่อหนี้ จำนวน ๓๑๖ รายการ วงเงิน ๔,๓๓๘.๙๖ ล้านบาท ประกอบด้วย ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๗ รายการ วงเงิน ๒๗๒.๔๔ ล้านบาท อนุมัติแผน จำนวน ๑๐๐ รายการ วงเงิน ๘๗๒ ล้านบาท ประกาศ TOR จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๒๔๙.๕๐ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน ๔๑ รายการ วงเงิน ๑,๑๙๗.๙๕ ล้านบาท เปิดซอง จำนวน ๓๔ รายการ ๕๒๑.๔๓ รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน ๑๐๗ รายการ วงเงิน ๑,๒๒๕.๙๐ ล้านบาท
- ๒) สายงานบริหาร ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๖ รายการ วงเงิน ๓,๖๖๙.๕๙ ล้านบาท และยังไม่ก่อหนี้ จำนวน ๑ รายการวงเงิน ๔๘.๑๒ ล้านบาท ประกอบด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๘.๑๒ ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรอบระยะเวลาดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามที่กรมชลประทาน ได้มีหนังสือให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในส่วนของรายการงานที่อยู่ระหว่างขั้นตอนยังไม่ดำเนินการ อนุมัติแผน และประกาศ TOR อาจจะไม่ทันตามกำหนดเวลา ในส่วนของรายการงานที่อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง และเปิดซอง อาจจะไม่ทันตามกำหนดเวลา ขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการอัปเดตข้อมูล และเร่งรัดตามข้อมูลที่แสดงดังตารางนี้

สำนัก	ก่อนผูกพันแล้ว		ยังไม่ดำเนินการ		อนุมัติแผน		ประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		รวมยังไม่ก่อน		
	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	
รวมสายงาน รบ.	8,398	31,895.30	27	272.44	100	872	7	249.50	41	1,197.95	34	521.43	107	1,225.90	316	4,338.96	
สนบ. 1	316	1,083.56	1	1.00	2	40.00			1	65.00			2	10.90	6	**116.90	
สนบ. 2	356	1,213.88			4	14.01		1	4.50		1	15.00	1	15.00	6	33.95	
สนบ. 3	334	1,966.55	1	0.18											1	0.18	
สนบ. 4	478	1,079.48			11	46.13			2	122.50	2	15.00			15	**183.63	
สนบ. 5	539	2,829.74			4	25.60			2	4.46	1	27.85	3	3.61	10	61.52	
สนบ. 6	672	3,336.57												1	1.00	1	
สนบ. 7	603	2,943.05			1	1.00						8	84.70	3	2.50	12	88.20
สนบ. 8	495	2,288.19			1	100.00					2	4.60	6	38.85	9	**143.45	
สนบ. 9	492	2,202.05	6	33.25	8	149.07			5	106.19			7	159.35	26	**447.85	
สนบ. 10	598	1,251.74	5	3.80	18	96.08	1	45.00	4	8.83	3	27.50	3	12.00	34	**193.21	
สนบ. 11	528	1,228.18							2	568.55	1	5.50	9	215.67	12	**789.72	
สนบ. 12	553	1,987.73	2	47.85	10	40.37	5	200.00	4	13.05			5	28.50	26	**329.77	
สนบ. 13	513	1,497.68	1	6.00	12	49.70			1	3.00	1	9.00	2	44.44	17	**112.16	
สนบ. 14	256	2,404.27			2	2.00			1	1.00	1	0.18	7	182.65	11	**185.83	
สนบ. 15	468	993.86							4	144.72	1	40.00	36	362.58	41	**547.30	
สนบ. 16	521	1,559.74			4	136.00			5	66.44	7	190.10	4	67.80	20	**460.34	
สนบ. 17	207	730.42	11	180.36	14	115.89			8	79.02	2	34.50	8	48.89	43	**458.66	
สนค.	277	989.12			1	10.00							1	2.16	2	12.16	
สนอ.	192	309.52			8	45.90			1	0.20	4	67.50	4	11.03	17	**124.63	
รวมสายงาน รส.	36	3,669.59							1	48.12					1	48.12	
สนค.	36	3,669.59															
สนอ.									1	48.12					1	48.12	

- ประธาน                    ในส่วนของรายการงานที่อยู่ระหว่างจัดซื้อ - จัดจ้าง ขั้นตอนใดที่สามารถผ่อนผันได้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอน ยังไม่ดำเนินการ อนุมัติแผน ประกาศ TOR ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง และเปิดซองสามารถผ่อนผันได้หรือไม่หากยังไม่ก่อนนี้
- กผง.                        ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หากมีการประกาศแล้วจะดำเนินการผ่อนผันให้ แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
- ประธาน                    ในส่วนของรายการงานที่อยู่ระหว่าง ประกาศ TOR ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง เปิดซอง เข้าสู่กระบวนการก่อนผูกพันแล้ว ในส่วนของรายการงานที่อยู่ในขั้นตอนยังไม่ดำเนินการ และอนุมัติแผน จำนวน ๑๒๗ รายการ ให้สำนักชงงานชลประทานชี้แจงรายละเอียด และยืนยันว่าสามารถผ่อนผันผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- สขป.๑                      รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑.๐๐ ล้านบาท เป็นโครงการ ๑ โครงการ ๑ ล้านบาท ข้อมูลสามารถลงในระบบได้ ไม่เกินวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการงานที่อนุมัติแผน จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย เป็นโครงการ ๑ โครงการ ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑.๐๐ ล้านบาท และงานปรับปรุงไหล่เขาเขื่อนแม่งัด จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๙.๐๐ ล้านบาท จะเปิดซอง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยรายการงานทั้ง ๓ รายการ สามารถผ่อนผันผูกพันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- สขป.๒                      รายการงานที่อนุมัติแผน จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑๔.๐๑ ล้านบาท โดยมี ๑ รายการ ที่มีปัญหาการขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจลงหลวง จังหวัดน่าน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ที่จะอนุญาตในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ หากได้รับอนุญาตจะสามารถดำเนินการได้ทัน ซึ่งเป็นงานดำเนินการเอง และอีก ๒ รายการ เป็นโครงการ ๑ โครงการ ๑ ล้านบาท สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาได้ ซึ่งสามารถผ่อนผันผูกพันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ อีก ๑ รายการ หากได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถผ่อนผันผูกพันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

สขป.๓ รายการงาน...

- สขป.๓ รายงานที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๐.๑๘ ล้านบาท เป็นค่าควบคุมงานจ้างเหมาของงานชุดลอกโดยรถชุดจ้างเหมาคลองฝั่งซ้าย เขื่อนวังร่มเกล้า จังหวัดอุทัยธานี ทางส่วนแผนงาน สขป.๓ ได้ประสานงานกับโครงการ พบว่าเป็นงาน สขป.๑๒ ซึ่งขอให้แก่ไขฐานข้อมูล ทั้งนี้ สขป.๓ สามารถดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันแล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- สขป.๔ รายงานที่อนุมัติแผน จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๔๖.๑๓ ล้านบาท ประกอบด้วยงานซ่อมแซมบำรุงรักษา และมี ๓ รายการ ที่ต้องปรับแบบ โดยทั้ง ๑๑ รายการนี้สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- สขป.๕ รายงานที่อนุมัติแผน จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๒๕.๖๐ ล้านบาท ที่แสดงในที่ประชุม เกิดจากการที่ทางโครงการไม่ได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ ซึ่งในความเป็นจริงรายงานที่ยังไม่ก่อนนี้ จำนวน ๑๐ รายการ นั้น อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๘ รายการ อีก ๒ รายการ อยู่ระหว่างพิจารณาราคา โดยรายงานทั้ง ๑๐ รายการ สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- สขป.๖ ไม่มีรายงานที่อยู่ระหว่าง ยังไม่ดำเนินการ และอนุมัติแผน สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- สขป.๗ รายงานที่อนุมัติแผน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑.๐๐ ล้านบาท เป็น ๑ โครงการ ๑ ล้านบาท สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- สขป.๘ รายงานที่อนุมัติแผน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท เป็นอำนาจของกรมงานปรับปรุงถนนบนพังกันน้ำ DIKE ๑๐ ระยะทาง ๑๗.๒๖๐ กิโลเมตร ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง คาดว่าจะสามารถเปิดช่องได้ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยอยู่ระหว่างประกาศ ซึ่งสามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- สขป.๙ รายงานที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๓๓.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการ ๓ รายการ อีก ๓ รายการ ต้องรอให้ สพญ. ส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินงานของโครงการนฤปดินทรจินดา และรายงานที่อนุมัติแผน จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑๔๙.๐๗ ล้านบาท ประกอบด้วย เป็นรายงานที่โอนให้ทหาร จำนวน ๒ รายการ และอยู่ระหว่างเชิญชวนกับเซ็นสัญญา
- สขป.๑๐ รายงานที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๓.๘๐ ล้านบาท เป็น ๑ โครงการ ๑ ล้านบาท อยู่ ๓ รายการ มี ๑ รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว แต่ทาง สขป. ยังไม่ได้ดำเนินการลงระบบ และอีก ๑ รายการ เป็นงานจ้างเหมา ๙๙,๐๐๐ บาท โดยเป็นงานชุดลอกคลอง ซึ่งสามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- สขป.๑๑ สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- สขป.๑๒ รายงานที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๗.๘๕ ล้านบาท ตอนนี้ได้ประกาศ TOR แล้วเสร็จ คาดการณ์ว่าประมาณปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จะได้ผลรับราคา และรายงานที่อนุมัติแผน จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๔๐.๓๗ ล้านบาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๙ รายการ แต่เนื่องจากไม่ได้อัปเดตระบบ และอีก ๑ รายการ เซ็นสัญญาลงนามในสัญญา วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งรายงานทั้ง ๑๒ รายการ สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

- สชป.๑๓ รายงานงานที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖.๐๐ ล้านบาท งานซ่อมแซม ประตูเรือสัญจรในเขื่อนแม่กลอง เป็นงานดำเนินการเอง ซึ่งเป็นงานที่โอนมาจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง สามารถก่องหน้ผูกพันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และ รายงานงานที่อนุมัติแผน จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๔๙.๗๐ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน อนุมัติแผนเหลือ ๗ รายการ ซึ่งเป็นงานที่โอนมาจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ปัจจุบันได้ตั้งแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างก่องหน้ผูกพัน สามารถก่องหน้ผูกพันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- สชป.๑๔ รายงานงานที่ยังไม่ก่องหน้ จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๑๘๕.๘๓ ล้านบาท โดยมี ๔ รายการ เป็นโครงการ ๑ โครงการ ๑ ล้านบาท ไม่มีปัญหาการดำเนินงาน มี ๑ รายการ เป็นค่าควบคุมงาน ไม่มีปัญหาการดำเนินงาน มี ๔ รายการ เป็นของฝ่ายเรือชุด สำนักเครื่องจักรกล วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ และมี ๑ รายการ เป็นสัญญากรรมงานประตुरบายน้ำคลองชุมพรตอนบน ๑๘๐ ล้านบาท ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลงนามได้ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ตรงนี้จะใช้หลักเกณฑ์ที่ท่าน รชบ. แนะนำ โดยจะทำการประเมินและตัดเงินคืน แต่คาดการณ์ว่าไม่ทันภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงขอเลื่อนระยะเวลาออกไป โดยจะคืนเงินประมาณ ๔๐ - ๕๐ ล้านบาท เนื่องจากเข้าฤดูฝนทำให้มีอุปสรรคในการทำงาน ในส่วนที่ท่าน รชบ. แนะนำให้นำเงินงบประมาณส่วนที่ไม่ใช้คืนกลับไปก่อน โดยให้ กผง. ดำเนินการคืนเงินงบประมาณในภายหลัง ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น และในกรณีการทำ PO ไว้ ซึ่งต้องให้ สชป. พิจารณาว่าสามารถใช้เงินงบประมาณได้เท่าใด หากไม่ได้ต้องดำเนินการตัดเงินคืน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับเงินงบประมาณ
- กผง. ในกรณีงานปีเดียวควรกันเงินงบประมาณไว้ หากเป็นงานผูกพันข้ามปีงบประมาณ กผง. จะรับมาดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย และหากเป็นงานปีเดียวเวลาเมื่อนำไปชี้แจงเหตุผลจะดำเนินการได้ยาก
- สชป.๑๕ สามารถก่องหน้ผูกพันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ทุกรายการ
- สชป.๑๖ รายงานงานที่ยังไม่ก่องหน้ จำนวน ๒๐ รายการ วงเงิน ๔๖๐.๓๔ ล้านบาท โดยมี ๑๗ รายการ สามารถก่องหน้ผูกพันได้ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แนนอน และอีก ๑ รายการ ทำเรื่องยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว เหลืออีก ๒ รายการ มีปัญหาคือ ๑ รายการ ได้มีการแก้ไขประมาณการใหม่ ปัจจุบันได้จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ ส่วนเล่มสามารถส่งได้วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นอำนาจกรม เป็นวิธีคัดเลือก
- สมด. หากเป็นวิธีการคัดเลือก จะใช้เวลาดำเนินการ ๒๐ วัน ถึงจะสามารถลงนามในสัญญาได้
- สชป.๑๗ รายงานงานที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๑๘๐.๓๖ ล้านบาท ประกอบด้วย ๑ รายการ เป็นค่าควบคุมงานจ้างเหมา ซึ่งเบิกจ่ายไปแล้ว อีก ๑๐ รายการ มี ๑ รายการ ที่อนุมัติรับราคาแล้ว อีก ๑ รายการ ประกาศจัดหาแล้ว ส่วนอีก ๘ รายการ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม โดยทั้งหมดนี้สามารถก่องหน้ผูกพันได้ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส่วนประเด็นข้อหาหรือเพิ่มเติม เรื่องมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ทั้ง ๑๐ รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ประเด็นคือหากจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ แต่กรมป่าไม้ยังไม่อนุมัติให้เข้าใช้พื้นที่ป่า จะสามารถลงนามในสัญญาได้หรือไม่ หากไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร

- กพด. สามารถลงนามในสัญญาได้ แต่ไม่สามารถส่งเข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อให้สัญญาก่อนนี้ ผูกพันไว้ ในส่วนที่เข้าพื้นที่ไม่ได้ต้องเข้ากระบวนการบริหารสัญญาต่อไป
- สชป.๑๗  
รทบ. ลงนามในสัญญาได้ โดยให้ผู้รับจ้างสงวนสิทธิ์ในการแจ้งอุปสรรค สามารถลงนามในสัญญาได้ แต่ห้ามส่งเข้าดำเนินงาน เพราะอายุสัญญายังไม่เริ่ม จึงไม่ต้องสงวนสิทธิ์
- สชป.๑๗  
กพด. ในกรณีที่ทราบว่ายังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า อาจจะมีปัญหากลับมาในอนาคต ในความเป็นจริงแล้วไม่ควรลงนามในสัญญา แต่เนื่องจากเราต้องการก่อก่อนผูกพัน ซึ่งหลังจากก่อก่อนผูกพันแล้วเสร็จ อายุสัญญาจะนับตั้งแต่วันที่แจ้งเข้าทำงาน รายละเอียดสัญญาจะคล้ายกับงานของสพญ. แต่ต้องมีพื้นที่ส่งมอบบางส่วน ในกรณีของ สชป.๑๗ สามารถส่งมอบพื้นที่บางส่วนได้หรือไม่
- สชป.๑๗ พื้นที่ที่จะดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด หากลงนามในสัญญาไปแล้ว อาจผิดกฎหมาย
- สมต. ที่ กรม. มีมติออกมาเพื่อต้องการให้ได้รับอนุญาตก่อนจึงจะเข้าไปดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งต้องพิจารณาว่าสิ่งใดเกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่างไม่ได้ทำสัญญากับทำสัญญา
- สชป.๑๗  
รทบ. ข้อคิดเห็นของ กพด. และ สมต. ตามที่ประชุมขอให้ยึดเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ ความเห็นของ กพด. คือสามารถดำเนินการลงนามในสัญญา แต่ห้ามส่งเข้าดำเนินงาน และในส่วนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า เป็นยังไงบ้างอย่างไร
- สชป.๑๗ เรื่องการใช้พื้นที่ป่านั้นดำเนินการได้ยาก โดยปัจจุบันได้นัดตรวจพื้นที่แล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าใช้เวลาประมาณ ๖ เดือนในการอนุมัติใช้พื้นที่ป่า แต่หากเป็นข้อสั่งการในที่ประชุมของ รทบ. ว่าให้ลงนามในสัญญาก่อน ก็สามารถดำเนินการได้
- กพด. ขอให้ชะลอการลงนามในสัญญา หากให้บอกเหตุผลการบอกเลิกสัญญา สมมติว่าไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ อยู่ในกฎหมายเหตุบอกเลิกสัญญา ว่าเราไม่พร้อมแต่ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพัน ซึ่งจะเป็นการตกลงเลิก ทำให้เราไม่สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายกับผู้รับจ้างได้ หากถึงตอนนั้นต้องกลับไปพิจารณาว่าคนที่เสนอให้ลงนามในสัญญาคือใคร กระบวนการก็จะย้อนกลับมาที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สชป.๑๗ ขอเสนอให้มีการผ่อนผัน เพราะมันเป็นประเด็นทางข้อกฎหมาย มติ กรม. ให้ทำข้อผูกพันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แต่มติ กรม. เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยแต่เดิมพื้นที่สาธารณะประโยชน์ไม่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่เนื่องจากไม่ใช่พื้นที่ป่า พอมีมติ กรม. เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งงานกรมชลประทานได้ทำการตั้งงบประมาณล่วงหน้า ๑ ปี กระบวนการทำงานต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่ทั้งหมด แต่งานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ล่วงหน้าหมดแล้ว ซึ่งวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่สามารถก่อก่อนผูกพันได้ทัน ขอผ่อนผันได้หรือไม่
- รทบ. สรุป ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยให้ กผง. ทำเรื่องขอผ่อนผัน เนื่องจากการตั้งงบประมาณ ต้องตั้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี ซึ่งมติ กรม. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ออกมาภายหลัง ต้องขอผ่อนผันในรายการงานที่ถูกยึดเงิน
- กผง. จะดำเนินการผ่อนผันให้ แต่ไม่ทราบว่าสำนักงบประมาณจะผ่อนผันให้หรือไม่



- สขป.๑๗                   งบประมาณที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท ไม่สามารถก่อกั้นผู้กผันได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แนนอน ซึ่งต้องรอกกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อน
- ผผง.ชป.๑๗               ตามประเด็นที่ชี้แจง เรื่องมติ ครม. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ซึ่งงบประมาณ ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการของบประมาณและขออนุญาตจากป่าไม้ มีมติ ครม. ให้งานปีเดียวทำข้อผูกพันให้เสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอ ครม. มีมติเห็นชอบ ทั้งหมดมี ๕ ประเด็น แต่ในประเด็นข้อที่ ๔ มีความว่า ห้ามมิให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้โครงการที่ใช้พื้นที่ป่าไม้ ที่ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่
- รชบ.                       ให้ กผง. ร่างเรื่องตามบัญชีทั้งหมดมีที่รายการ ที่ต้องใช้พื้นที่ป่าที่มีปัญหา โดยให้ทุกโครงการที่มีปัญหา ส่งเรื่องมาที่ รชบ. และจะส่งเรื่องให้ กผง. ดำเนินการต่อไป
- สขป.๑                     เรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า ได้ทำเรื่องคืนเงินเรียบร้อยแล้ว
- สขป.๒                     เรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า มี ๑ รายการ ที่ติดพื้นที่อุทยาน ซึ่งประชุมของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ที่จะอนุญาตในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ถ้าสมมุติว่าได้รับอนุญาตจะสามารถดำเนินการได้ทัน เดิมเป็นโครงการร่วม
- สขป.๓                     ไม่มีปัญหาในเรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า
- สขป.๔                     ไม่มีปัญหาในเรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า
- สขป.๕                     ไม่มีปัญหาในเรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า
- สขป.๖                     ไม่มีปัญหาในเรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า
- สขป.๗                     ไม่มีปัญหาในเรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า
- สขป.๘                     ไม่มีปัญหาในเรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า
- สขป.๙                     เรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า มี ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา
- สขป.๑๐                   เรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า มี ๑ รายการ เป็นการขออนุญาตใช้พื้นที่กรมเจ้าท่า คาดว่าทราบผลภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แต่จะดำเนินการทำเรื่องผ่อนผันมาก่อน
- สขป.๑๑                   ไม่มีปัญหาเรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า
- สขป.๑๒                   ไม่มีปัญหาเรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า
- สขป.๑๓                   เรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า ไม่มีปัญหา แต่ติดปัญหาการแก้ไขชื่อ ซึ่งได้ส่งเรื่องแก้ไขชื่อปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณจะส่งเรื่องกลับให้แก้ไข
- สขป.๑๔                   เรื่องโครงการที่ติดปัญหาพื้นที่ป่า โดยมีปัญหาทั้งหมด ๕ รายการ ในกรณีสัญญา ๑ ปี หากดำเนินการแล้ว ใช้เงินที่รับมาไม่หมดจะขอคืนเงินกลับ แล้วให้ กผง. จัดสรรงบประมาณให้ภายหลัง
- สขป.๑๕                   ไม่มีปัญหาเรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า
- สขป.๑๖                   ไม่มีปัญหาเรื่องโครงการที่ติดพื้นที่ป่า
- รชบ.                       โครงการใดที่พิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา ในประเด็นที่ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ให้ดำเนินการส่งเรื่องมาที่ รชบ. ภายในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อแจ้งให้ กผง. ดำเนินการต่อไป

- กพด. ในการลงนามสัญญากรรม ซึ่งท่าน รชบ. จะต้องลงนามในสัญญากรรมทุกฉบับงานที่เสนอให้ท่าน รชบ. ลงนามขออนุญาตให้ทุกสำนัก/กอง ยืนยันการติดปัญหาอุปสรรคเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ เรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไม่ขัดกับมติ ครม.
- รชบ. หากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าไม้ ให้ทำเรื่องขอผ่อนผัน เนื่องจากมติ ครม. ชัดเจนในเรื่องห้ามมิให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้โครงการที่ใช้พื้นที่ป่าไม้ ที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเข้าดำเนินการใช้พื้นที่ โดยให้ กผง. พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งต่อไปนี้รายการที่ตั้งงบประมาณแล้วให้ตรวจสอบความพร้อมก่อนจัดสรรงบประมาณ ขอสรุปภาพรวมดังนี้
- ๑) การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ก่อนนี้ผูกพัน ในขั้นตอนตั้งแต่การประกาศ TOR ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่สามารถขอผ่อนผันได้ จะได้ไม่ตั้งเงินกลับ
- ๒) รายการที่ยังไม่ดำเนินการ และอนุมัติแผน เป็นโครงการที่ติดพื้นที่ป่า ตามมติ ครม. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งคาดว่าโครงการที่ติดปัญหาประมาณ ๑๐ รายการ ให้ทาง กผง. ทำเรื่องขอผ่อนผันให้
- สบอ. มี ๒ รายการ เป็นงานที่ต้องลงพื้นที่สำรวจในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกระบี่ ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายเงินในส่วนที่เป็นค่าแรงได้ก่อน คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ ทัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- สคก. มี ๑ รายการ อยู่ระหว่างแก้ไขชื่องาน งานชุดลอกของโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
- รชบ. ให้ กผง. ดำเนินการเรื่องเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการให้กับ สขป.๙ และดำเนินการแก้ไขชื่องานให้กับ สขป.๙, สขป.๑๓ และ สคก.

**๓.๒ ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการที่จัดซื้อจัดจ้างวงเงินตามอำนาจกรมฯ (ต่อ)**

- ฝ่ายเลขฯ งานผูกพันใหม่ ทั้งหมด ๓๐ รายการ เป็นรายการในสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน ๑ รายการ และสายงานบริหาร จำนวน ๑ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ๑) สายงาน รชบ. ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุพร้อมชุดลอกระยะที่ ๔ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วงเงินทั้งโครงการ จำนวน ๓๖๐ ล้านบาท ปี๒๕๖๔ จำนวน ๗๒ ล้านบาท ของโครงการชลประทานชลบุรี สขป.๙ อยู่ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) สายงาน รร. อาคารชุดพักอาศัย ๘ ชั้น อาคารละ ๘๘ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วงเงินทั้งโครงการ จำนวน ๒๔๐.๖๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๘.๑๒ ล้านบาท ของสำนักงานเลขานุการกรม อยู่ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



- สลก. รายการอาคารชุดพักอาศัย ๘ ชั้น อาคารละ ๙๘ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่างเสนอราคา ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
- สชป.๙ รายการระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุพร้อมชุดลอกกระยะที่ ๔ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อยู่ที่สำนักงบประมาณ อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมของราคา
- กพด. ได้เสนอกระทรวงไปปรับอนุมัติราคา รอพิจารณาความเหมาะสมของราคา ส่งให้กระทรวง ซึ่งได้ทำงานควบคู่กัน การพิจารณาความเหมาะสมของราคา ใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน
- รชบ. ให้ สชป.๙ จัดทำสำเนาเรื่องพิจารณาความเหมาะสมของราคา มาที่ รชบ. เพื่อช่วยเร่งรัดให้ สลก. ดำเนินการในขั้นต่อไปต้องพิจารณาความเหมาะสมของราคา
- กพด. ขอให้ สลก. ดำเนินการเรื่องพิจารณาความเหมาะสมของราคาคงคู่กันไปด้วย
- รชบ. ให้ กพด. เร่งรัดงานผูกพันใหม่ ทั้ง ๒ รายการ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ**

- สชป.๑๔ เรื่องค่าที่ดินคลองชุมพร ที่จัดตั้งงบประมาณมาไม่พอ เนื่องจากการสำรวจมีปัญหา ได้รับเรื่อง สนทช. ในการจ่ายค่าที่ดินโดยใช้เงินกรม จ่ายค่าที่ดินให้หมดภายในปีนี้ ซึ่งทาง วชป.๑๔ ได้ทำหนังสือมาแจ้ง กผง. แล้ว ขอให้กันเงินไว้ประมาณ ๑๐๕ ล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายค่าที่ดิน
- รชบ. ในกรณีเงิน ๑๐๕ ล้านบาท ถ้าสำนัก/กอง ขอคืนเงินมานำมาช่วยในการจ่ายค่าที่ดิน
- สชป.๗ งานที่เกิดจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น จะใช้งบประมาณมาแก้ไขปัญหาความเสียหายหรือไม่
- รชบ. งานอุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้ประสานกับ กผง. จะใช้งบกลาง และงบเงินกู้ และต้องรอความชัดเจนว่าจะได้เงินงบประมาณเท่าไร ในส่วนเงินที่รอจะเปลี่ยนแปลงงบประมาณของเงินเหลือจ่าย คงต้องรอ กผง. ตอบคำถาม
- สชป.๑๕ งานที่เกิดอุทกภัยในตอนสิ้นปี ๒๕๖๓ ที่เกิดขึ้น ขอให้ช่วยจัดหางบประมาณให้ด้วย
- กผง. ในปี ๒๕๖๔ กรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณได้พอดีกับแผนที่ตั้งกับผลที่ได้ ทำให้เงินเหลือจ่ายเหลือน้อย ประกอบกับว่ากรมมีภาระที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการ อีกอย่างคือวิธีของงบประมาณไม่สามารถข้ามผลผลิตได้หรือไม่สามารถข้ามแผนงานได้ ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงินได้สะดวก
- รชบ. ถ้ามีเงินเหลือจ่ายจากเงินกัน จะสามารถเปลี่ยนแปลง จากสำนักงบประมาณได้หรือไม่

กผง. ในการที่...

- กผง. ในการที่เปลี่ยนแปลงเงินกัน ระยะเวลาดำเนินการน้อยมาก แต่ที่ผ่านมา กรม. อนุมัติเงิน และส่งเรื่องให้โครงการทำประมาณการมาให้ ประมาณการที่ส่งมาให้ไม่มีความสมบูรณ์
- รชบ. ในงานที่เป็นอุทกภัย งานในส่วนนี้จำเป็นต้องซ่อมแซม แต่รัฐบาลไม่มีเงินสนับสนุน ซึ่งได้ของบกลางไป แต่การที่นายกลงพื้นที่ที่นครศรีธรรมราช ท่าน นายก มีข้อสั่งการให้เร่งรัดของบประมาณไป แต่ก็ยังไม่ได้งบประมาณ เกิดจากวิกฤต โควิด ในการนี้เงินเหลือจ่ายที่เหลือต้องไปตกลงกับสำนักงบประมาณ ให้ กผง. ทหารเรือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
- กผง. รับทราบ จะดำเนินการนำประเด็นดังกล่าวนี้ไปหารือ
- กพด. ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เกิดปัญหาที่ผู้รับจ้างไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากผู้รับจ้างอุทธรณ์ ในการที่ไปตามเรื่องที่กรมบัญชีกลาง สิ่งที่ทำให้การพิจารณาของกรมบัญชีกลางล่าช้า เนื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมชลประทาน ไม่มีการจัดการทำรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง พิจารณาการอุทธรณ์ของผู้รับจ้างว่าฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้น ในการกลับมาดูเอกสารของกรมชลประทานจะมีแค่รายงานผลของผู้มีอำนาจ แต่ขาดรายการการประชุม ขอให้ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งให้แนบรายการประชุมมาด้วย
- รชบ. มอบหมายให้ กพด. ทำหนังสือทำความเข้าใจกับทุกสำนัก แจ้งเวียนให้เข้าใจตรงกัน ผกคดำเนินการเป็นตัวอย่างในการดำเนินการบันทึกการประชุม
- กพด. อำนาจกรม ที่เป็นอำนาจของสายงาน รชบ. เอกสารที่ กพด. จะต้องนำเรียน รชบ. คำสั่งของกรม สั่งให้รายงานผลของงานดำเนินการเอง ให้ท่าน รชบ. ทราบ ว่าผลในการทำงานเป็นอย่างไร ในส่วนที่เป็นงานจ้างเหมาต้องดำเนินการด้วย ขอให้ทุกสำนักรายงานผลมาด้วย
- รชบ. มอบให้ กพด. ไปทำการซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องงานต่างๆ ที่เป็นสัญญาที่ต้องรายงานให้กรมทราบ ว่าวิธีการรายงานให้กรมทราบ โดยทำรูปแบบตัวอย่าง

### ข้อสั่งการที่ประชุม

๑. เงินกันเหลือปี ในสายงาน รชบ. สชป.๖ สชป.๙ สชป.๑๑ สชป.๑๔ สชป. ๑๕ ที่จะของคืนเงินไม่ต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท โดย สชป.๑๑ และ สชป.๑๔ จะประเมินวงเงินที่จะคืนภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ในสายงาน รชบ. มี สมด. ที่จะคืนเงิน ๗ ล้านบาท ให้แจ้งคืนมาที่ รชบ. และจะส่งเรื่องต่อให้กองแผนงาน
๒. มอบให้ กองแผนงาน นำเงินงบประมาณในส่วนเงินกันเหลือปีที่ได้จากเรื่องแจ้งคืนเปลี่ยนแปลงเป็นเงินค่าที่ดิน ตามนโยบายของกรม เช่น ค่าที่ดินของโครงการคลองชุมพร และถ้ามีเงิน เหลือให้เปลี่ยนแปลงเป็นเงินค่าซ่อมแซมอุทกภัย
๓. เงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทุกสำนักจากการรายงาน สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทั้งหมด ยกเว้นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ตามมติ กรม. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประมาณ ๑๐ กว่ารายการ โดยให้ สชป. แจ้งมาที่ รชบ. ภายในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ทำบัญชีพร้อมวงเงิน และขั้นตอนในการดำเนินงาน อยู่ขั้นตอนใด

๔. มอบให้ กผง. ดำเนินการทำเรื่องขอผ่อนผันไปที่สำนักงบประมาณ โดยการ  
ชี้แจงให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณล่วงหน้า  
๑ ปี ซึ่งดำเนินการก่อน มติ ครม. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ออกมาภายหลัง
๕. มอบให้ กพต. เร่งรัดรายการงานผูกพันใหม่ ๒ รายการ ในเรื่องการพิจารณาความ  
เหมาะสมของราคา

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

นายสิรภพ กิมถ้อง  
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม

นายธนศร์ สมบูรณ์  
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



## ประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และสายงานบริหาร

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

เวลา 15.00 น. ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

## ระเบียบวาระ การประชุม

 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ของสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา
- 2.2 ผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี/กันขยาย พ.ศ. 2563 จำแนกตามสำนัก/กอง ของสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และสายงานบริหาร
- 2.3 ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง ของสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และสายงานบริหาร
- 2.4 ข้อสั่งการของ อธช. ให้เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี/กันขยาย พ.ศ. 2563 ของสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และสายงานบริหาร
- 3.2 ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และสายงานบริหาร

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



## ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ






## ระเบียบวาระที่ 2

### เรื่องเพื่อทราบ

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 *สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา*



ตามหนังสือสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ(ปก) 04/533/2563  
แจ้งให้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2564  
ไม่มีผู้แจ้งแก้ไขรายงานการประชุม





# ระเบียบวาระที่ 2


## เรื่องเพื่อทราบ

### 2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลือมปี/กันขยาย พ.ศ. 2563

#### สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และ สายงานบริหาร



#### ภาพรวมกรม

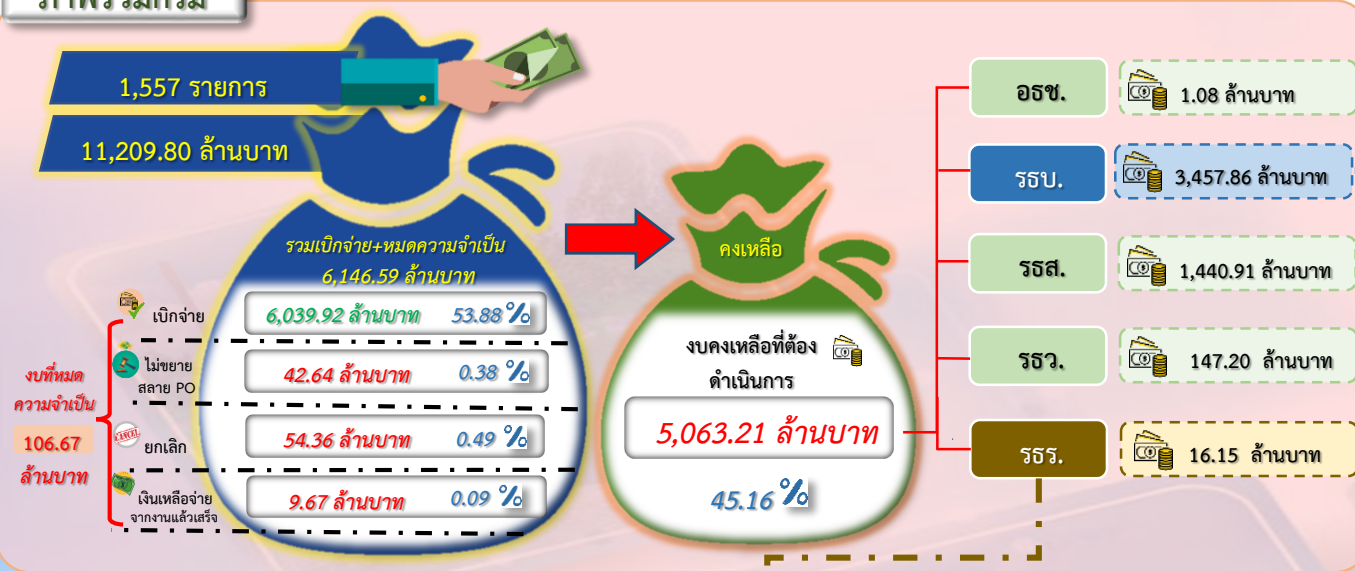

#### งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (สายงานบริหาร)

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)			คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7</b>	<b>23.10</b>	<b>5.24</b>	<b>22.67</b>	<b>16.15</b>
สำนักกฎหมายและที่ดิน	4	7.43	0.06	0.77	7.38
สำนักงานเลขานุการกรม	3	15.67	5.18	33.06	8.78

หมายเหตุ : งบประมาณที่หมดความจำเป็นจากงานแล้วเสร็จ จำนวน 1.71 ล้านบาท



#### งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา)

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>507</b>	<b>5,851.97</b>	<b>2,350.69</b>	<b>40.17</b>	<b>3,457.86</b>
สำนักงานชลประทานที่ 1	13	95.52	48.06	50.32	47.08
สำนักงานชลประทานที่ 2	23	143.30	77.64	54.18	63.83
สำนักงานชลประทานที่ 3	38	143.22	71.59	49.99	71.63
สำนักงานชลประทานที่ 4	43	289.64	184.12	63.57	105.50
สำนักงานชลประทานที่ 5	41	78.22	23.23	29.69	54.99
สำนักงานชลประทานที่ 6	17	135.52	32.66	24.10	102.86
สำนักงานชลประทานที่ 7	27	171.41	74.67	43.56	96.74
สำนักงานชลประทานที่ 8	62	718.88	173.95	24.20	544.93
สำนักงานชลประทานที่ 9	24	482.04	183.11	37.99	294.10
สำนักงานชลประทานที่ 10	7	162.93	71.16	43.67	91.77
สำนักงานชลประทานที่ 11	18	767.38	259.29	33.79	508.09
สำนักงานชลประทานที่ 12	13	108.89	30.02	27.57	78.87
สำนักงานชลประทานที่ 13	21	2.95	0.66	22.46	2.29
สำนักงานชลประทานที่ 14	27	747.70	428.07	57.25	300.85
สำนักงานชลประทานที่ 15	37	537.94	170.49	31.69	350.08
สำนักงานชลประทานที่ 16	25	305.87	84.62	27.67	221.24
สำนักงานชลประทานที่ 17	42	248.11	80.26	32.35	167.85
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	7	99.76	37.53	37.62	62.06
สำนักเครื่องจักรกล	22	612.70	319.58	52.16	293.13

หมายเหตุ : งบประมาณที่หมดความจำเป็นจากงานแล้วเสร็จ และงานยกเลิก จำนวน 43.42 ล้านบาท




# ระเบียบวาระที่ 2

## เรื่องเพื่อทราบ

### 2.3 ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง

สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และสายงานบริหาร ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen - Project วันที่ 25 ก.พ. 64

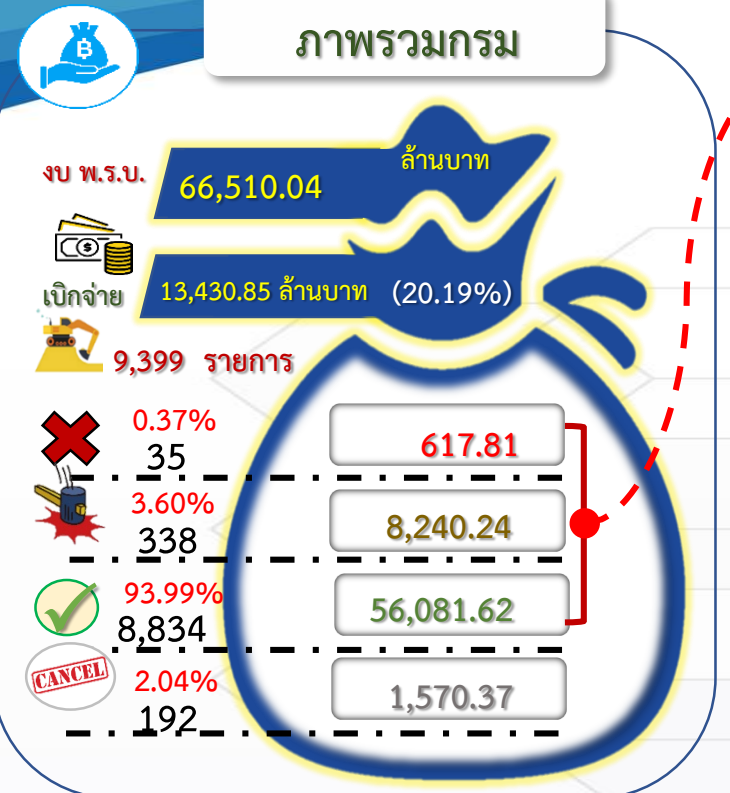


สำนัก	วงเงิน พ.ร.บ. ล้านบาท	เบิกจ่ายสะสม ล้านบาท	ร้อยละ พ.ร.บ.	จำนวน รายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อผูกพัน	
					รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
รวมสายงาน ธรบ.	36,234.27	7,579.78	20.92	8,714	27	272.44	289	4,066.53	8,398	31,895.30
สขป. 1	1,200.46	363.46	30.28	322	1	1.00	5	115.90	316	1,083.56
สขป. 2	1,296.34	350.98	27.07	369			13	82.46	356	1,213.88
สขป. 3	1,966.73	421.53	21.43	335	1	0.18			334	1,966.55
สขป. 4	1,275.11	227.06	17.81	494			15	183.63	478	1,079.48
สขป. 5	2,891.26	767.16	26.53	549			10	61.52	539	2,829.74
สขป. 6	3,337.57	1,245.41	37.32	673			1	1.00	672	3,336.57
สขป. 7	3,031.25	904.69	29.85	615			12	88.20	603	2,943.05
สขป. 8	2,431.64	357.96	14.72	504			9	143.45	495	2,288.19
สขป. 9	2,649.90	432.54	16.32	518	6	33.25	20	414.60	492	2,202.05
สขป. 10	1,444.94	222.37	15.39	632	5	3.80	29	189.41	598	1,251.74
สขป. 11	2,017.89	292.41	14.49	540			12	789.72	528	1,228.18
สขป. 12	2,317.49	452.58	19.53	579	2	47.85	24	281.92	553	1,987.73
สขป. 13	1,609.84	331.59	20.60	530	1	6.00	16	106.16	513	1,497.68
สขป. 14	2,590.09	391.97	15.13	267			11	185.83	256	2,404.27
สขป. 15	1,541.16	136.35	8.85	509			41	547.30	468	993.86
สขป. 16	2,020.08	144.05	7.13	541			20	460.34	521	1,559.74
สขป. 17	1,189.08	89.86	7.56	250	11	180.36	32	278.30	207	730.42
สคก.	1,001.28	392.71	39.22	279			2	12.16	277	989.12
สบอ.	434.15	55.10	12.69	209			17	124.63	192	309.52
รวมสายงาน ธรธ.	3,717.71	1,149.24	30.91	37			1	48.12	36	3,669.59
สมต.	3,669.59	1,149.24	31.32	36					36	3,669.59
สลก.	48.12			1			1	48.12		

หมายเหตุ : 1. รายการงานสายงาน ธรบ. จำนวน 8,714 รายการ วงเงิน 36,234.27 ล้านบาท ไม่รวมยกเลิก 178 รายการ วงเงิน 1,194.81 ล้านบาท  
 2. รายการงานสายงาน ธรธ. จำนวน 37 รายการ วงเงิน 3,717.71 ล้านบาท ไม่รวมยกเลิก 1 รายการ วงเงิน 35.08 ล้านบาท



#### ภาพรวมกรม

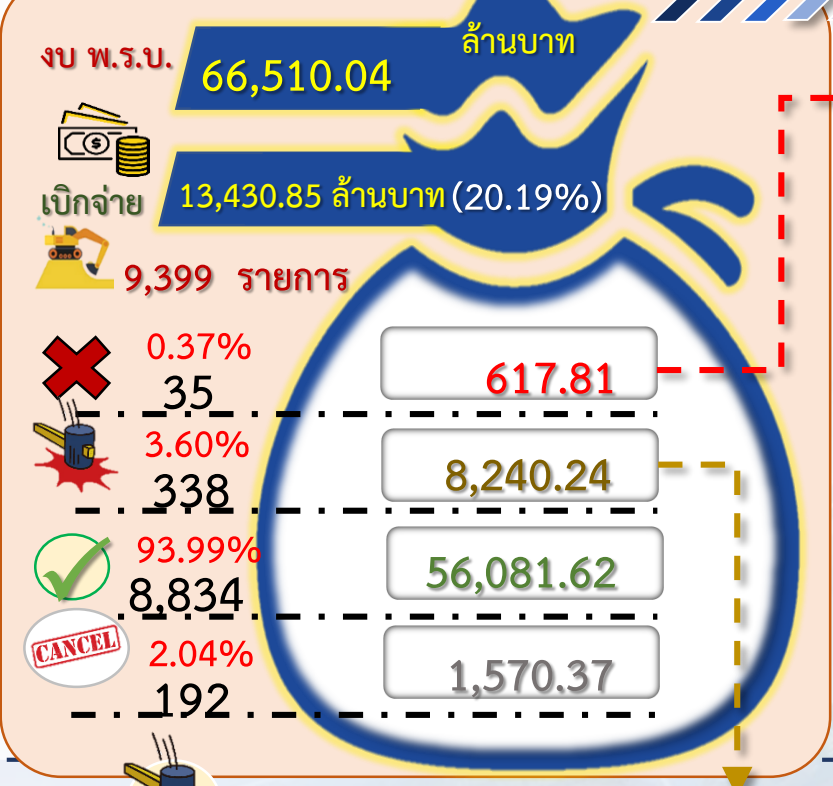

#### สายงาน รชบ. รจร.



ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen - Project วันที่ 25 ก.พ. 64

- หมายเหตุ**
- ค่าควบคุมงาน**  
3 รายการ 0.39 ล้านบาท
- แก้ไขแบบ/ประมาณการ**  
8 รายการ 125.1 ล้านบาท
- ชะลอการปรับแผนการดำเนินงานโครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของ เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน**  
4 รายการ 4 ล้านบาท
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน**  
9 รายการ 121.25 ล้านบาท
- อื่น ๆ เช่นเปลี่ยนวิธีดำเนินการ**  
3 รายการ 21.7 ล้านบาท

	อนุมัติแผน		ประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		รวม	
	รถขุด	ถัง	รถขุด	ถัง	รถขุด	ถัง	รถขุด	ถัง	รถขุด	ถัง	รถขุด	ถัง
<b>รชบ.</b>	100	871.75	7	249.50	41	1,197.95	34	521.43	107	1,225.90	289	4,066.53
<b>รจร.</b>	56	670.48	6	234.50	23	1,029.89	26	435.15	69	661.05	180	3,031.08
	3	74.00	1	15.00	5	64.36	5	83.60	23	477.33	37	714.29
	41	127.26			13	103.70	3	2.68	15	87.51	72	321.16
					1	48.12					1	48.12
					1	48.12					1	48.12

- ผูกพัน
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
- ยังไม่ดำเนินการ
- ยกเลิก
- งานดำเนินการเอง
- งานจ้างเหมา



# ระเบียบวาระที่ 2

## เรื่องเพื่อทราบ

### 2.4 ข้อสั่งการของ อรช.

#### ให้เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถบริหารงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันงบประมาณถูกพับไป ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดและ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

**1** **งบ พ.ร.บ.**

เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 2 **เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4** ทุกรายการ

**2** **งบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี**

หากรายการใดไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด ให้แจ้ง กงบ. ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 **เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4** (หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ งบประมาณจะถูกพับ)

เอกสารสำรองเงินประเภท CX ต้องดำเนินการจัดทำ PO ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2



**3** **งบกลาง**

หากรายการใดไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด ให้แจ้ง กงบ. ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 **เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4** (หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ งบประมาณจะถูกพับ)

**4** ดำเนินการและถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 61 และ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 61 อย่างเคร่งครัด



# ระเบียบวาระที่ 3

## เรื่องเพื่อพิจารณา

### 3.1 ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี

#### แนวทางการดำเนินงานงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ม.43

การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใดให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินได้ทันให้ขยายเวลาขอเบิกเงินได้เฉพาะกรณีที่บได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี การขยายเวลาขอเบิก ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือนของปีงบ เว้นแต่มีความจำเป็น ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาไป**อีกไม่เกินหกเดือน**

แนวทางปฏิบัติในการบริหารเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ตามบันทึก กพง 06/ 778/2563 ลว. 24 พ.ย. 63

1. **หน่วยงานดำเนินการเพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย**  
 - กรณีงานปีเดียว ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564  
 - กรณีงานผูกพัน ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

2. **เอกสารสำรองเงิน**  
 เอกสารสำรองเงินประเภท CX ต้องดำเนินการจัดทำ PO ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

3. **หน่วยงานตรวจสอบรายการงาน**  
 ตรวจสอบรายการงานที่หมดความจำเป็น ยกเลิก ไม่สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนด แจ้งคืนกองแผนงานภายใน ม.ค. 64 เพื่อหารือแนวทางการบริหารงบร่วมกับ สงป. พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย

4. **เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพ.ร.บ. และแนวทาง**  
 ดำเนินการตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

- งานปีเดียวต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
- กรม เสนอ สงป. พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง

คาดการณ์เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ตามบันทึก กพง 06/31/2564 ลว. 12 ม.ค. 63



#### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๕๓ ๖๐๕๘  
 ที่ กพง ๐๖/ ๓๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔  
 เรื่อง ขอให้คาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบ ผู้ย่นการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในส่วนของงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้อสั่งการพร้อมมอบหมายให้สำนัก/กอง คาดการณ์รายการงานที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยให้แจ้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งให้กองแผนงาน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อกองแผนงานจะได้สรุปและนำไปหารือแนวทางการบริหารงบประมาณร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อนำเข้า ครม. พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อไป นั้น

จากข้อมูล CEN PROJECT ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ พบว่า กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๔,๘๐๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๕๘๓,๗๗๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๔ คิดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว ๕,๒๕๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ คงเหลือ ๖,๖๒๐,๗๓๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๖ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้

๑. คาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
๒. รายการใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดให้ระบุวงเงินงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน และระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำบันทึกแจ้งคืนเงินมายังกองแผนงาน และการกองการเงินและบัญชี

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งไฟล์ excel ให้กองแผนงานทาง e-mail : monitoring.plan@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามกำกับยืนยันข้อมูลทุกหน้า เพื่อใช้ในการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหารในด้านการบริหารงบประมาณ ต่อไป  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ พร้อมแนบรายละเอียดรายการงานตามแบบฟอร์มมาด้วยแล้ว

(นายวิชา แก้วมี)  
 ผอ.กพง.

#### ปฏิทินการดำเนินงาน



**30 ก.ย. 64**  
 สำนัก/กอง  
 ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ



# ระเบียบวาระที่ 3

## เรื่องเพื่อพิจารณา

### 3.1 ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ต่อ) สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และ สายงานบริหาร



สถิติงบประมาณที่ถูกพบ ปี 2561 -2562



งบประมาณถูกพบ (ล้านบาท)



งบที่ต้องดำเนินการต่อ

ภาพรวมกรม	ปี 54 - 61		ปี 55 - 62		ปี 63	
	7,798.19	1,725.25	-	-	-	-
<b>รรบ.</b>	5,557.93	702.19	3,457.86			
สขป. 1	152.74	10.96	47.08			
สขป. 2	76.46	0.49	63.83			
สขป. 3	177.44	6.02	71.63			
สขป. 4	38.56	42.80	105.50			
สขป. 5	314.73	120.61	54.99			
สขป. 6	401.60	24.65	102.86			
สขป. 7	441.13	1.21	96.74			
สขป. 8	699.51	32.77	544.93			
สขป. 9	861.44	19.96	294.10			
สขป. 10	171.71	160.34	91.77			
สขป. 11	126.56	119.53	508.09			
สขป. 12	23.16	1.41	78.87			
สขป. 13	106.44	2.20	2.29			
สขป. 14	776.32	28.50	300.85			
สขป. 15	582.09	100.58	350.08			
สขป. 16	115.74	2.77	221.24			
สขป. 17	155.39	25.52	167.85			
สบอ.	4.66	1.40	62.06			
สคก.	332.27	0.47	293.13			
<b>รรธ.</b>	72.59	0.29	16.15			
สมด.	58.60	0.10	7.38			
สลก.	13.98	0.002	8.78			
กงบ.	-	0.19	-			

จากบันทึก กพง 06/31/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ให้สำนัก/กอง ดำเนินการคาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 ซึ่ง สำนัก/กอง ในสายงาน รรบ. และ รรธ. คาดการณ์ว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้ กองแผนงาน วิเคราะห์แล้วพบว่า มีรายการในสายงาน รรบ. ที่มีแนวโน้มที่คาดว่าจะถูกพบไป ตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 10 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ติดปัญหาเรื่องที่ดิน ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ และเป็นงานที่มีวงเงินสูง แต่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 30 ดังนี้

- สขป. 4** ทรบ.คลองชะนาทรบ.คลองชะนาว ต.หนองหัววัว งบที่ต้องดำเนินการต่อ 6.71 ล้านบาท
- สขป. 8**
  - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสูบน้ำหนองพลอง ตำบลจางแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ งบที่ต้องดำเนินการต่อ 3.55 ล้านบาท
  - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก-อ่างพระทองคำ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา งบที่ต้องดำเนินการต่อ 83.83 ล้านบาท
- สขป. 9**
  - ปรับปรุงคอนกรีตควดคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ความยาว 5.100 กม. พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัด นครนายก งบที่ต้องดำเนินการต่อ 42.83 ล้านบาท
  - ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว งบที่ต้องดำเนินการต่อ 38.15 ล้านบาท
- สขป.11**
  - งานกำแพงกันดินพร้อมส่วนประกอบอื่นบริเวณแก้มลิงคลองเปรมประชากร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบที่ต้องดำเนินการต่อ 97.50 ล้านบาท
  - ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพร้อมชุดลอก บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบที่ต้องดำเนินการต่อ 297.48 ล้านบาท
- สขป.14**
  - ประตุระบายน้ำคลองบางจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี งบที่ต้องดำเนินการต่อ 33.83 ล้านบาท
  - คลองผันน้ำ (ชุดใหม่) ความยาว 3,343 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรงบที่ต้องดำเนินการต่อ 84.94 ล้านบาท
- สขป.15** ฝ่ายคลองกัน ยาว 25.00 เมตร สูง 2.30 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 7,300 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลนบพิตา อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบที่ต้องดำเนินการต่อ 34.82 ล้านบาท



งบคงเหลือที่ต้องดำเนินการ

514 รายการ

คงเหลือ รบ.+รร.

3,474.01 ล้านบาท

รบ. 3,457.86 ล้านบาท

รร. 16.15 ล้านบาท



รายการที่ผลการเบิกจ่ายมากกว่าร้อยละ 50.00

จำนวน 210 รายการ  
งบ 2,483.52 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 1,885.02 ล้านบาท (75.90%)  
คงเหลือ 590.77 ล้านบาท



รายการที่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 50.00

จำนวน 304 รายการ  
งบ 3,391.56 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 470.90 ล้านบาท (13.88%)  
คงเหลือ 2,883.25 ล้านบาท



ปัญหา/อุปสรรค

1. แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ

สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	299	3,377.58	470.75	13.94	2,870.81
สำนักงานชลประทานที่ 1	7	59.33	14.19	23.91	45.14
สำนักงานชลประทานที่ 2	8	70.30	23.31	33.16	46.57
สำนักงานชลประทานที่ 3	25	81.38	20.34	24.99	61.04
สำนักงานชลประทานที่ 4	10	68.57	21.61	31.51	46.96
สำนักงานชลประทานที่ 5	21	53.57	1.53	2.86	52.03
สำนักงานชลประทานที่ 6	12	117.14	19.60	16.73	97.54
สำนักงานชลประทานที่ 7	11	60.34	0.34	0.57	60.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	49	548.25	53.39	9.74	494.86
สำนักงานชลประทานที่ 9	15	320.93	78.06	24.32	238.03
สำนักงานชลประทานที่ 10	4	60.94	6.20	10.18	54.73
สำนักงานชลประทานที่ 11	7	417.16	2.46	0.59	414.70
สำนักงานชลประทานที่ 12	8	84.56	10.56	12.49	74.00
สำนักงานชลประทานที่ 13	20	2.23	0.00	0.00	2.23
สำนักงานชลประทานที่ 14	12	330.22	71.33	21.60	245.51
สำนักงานชลประทานที่ 15	26	405.07	46.70	11.53	341.00
สำนักงานชลประทานที่ 16	20	232.81	34.18	14.68	198.62
สำนักงานชลประทานที่ 17	28	196.60	32.19	16.38	164.41
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	6	54.93	15.03	27.36	39.91
สำนักเครื่องจักรกล	10	213.26	19.74	9.26	193.53

สายงานบริหาร

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	5	13.98	0.15	1.05	12.44
สำนักกฎหมายและที่ดิน	4	7.43	0.06	0.77	7.38
สำนักงานเลขานุการกรม	1	6.55	0.09	1.36	5.06





สำนัก	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		ยังไม่ดำเนินการ		อนุมัติแผน		ประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		รวมยังไม่ก่อหนี้	
	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
รวมสายงาน รสบ.	8,398	31,895.30	27	272.44	100	872	7	249.50	41	1,197.95	34	521.43	107	1,225.90	316	4,338.96
สขป. 1	316	1,083.56	1	1.00	2	40.00			1	65.00			2	10.90	6	**116.90
สขป. 2	356	1,213.88			4	14.01	1	4.50	1	15.00	1	15.00	6	33.95	13	82.46
สขป. 3	334	1,966.55	1	0.18											1	0.18
สขป. 4	478	1,079.48			11	46.13			2	122.50	2	15.00			15	**183.63
สขป. 5	539	2,829.74			4	25.60			2	4.46	1	27.85	3	3.61	10	61.52
สขป. 6	672	3,336.57											1	1.00	1	1.00
สขป. 7	603	2,943.05			1	1.00					8	84.70	3	2.50	12	88.20
สขป. 8	495	2,288.19			1	100.00					2	4.60	6	38.85	9	**143.45
สขป. 9	492	2,202.05	6	33.25	8	149.07			5	106.19			7	159.35	26	**447.85
สขป. 10	598	1,251.74	5	3.80	18	96.08	1	45.00	4	8.83	3	27.50	3	12.00	34	**193.21
สขป. 11	528	1,228.18							2	568.55	1	5.50	9	215.67	12	**789.72
สขป. 12	553	1,987.73	2	47.85	10	40.37	5	200.00	4	13.05			5	28.50	26	**329.77
สขป. 13	513	1,497.68	1	6.00	12	49.70			1	3.00	1	9.00	2	44.46	17	**112.16
สขป. 14	256	2,404.27			2	2.00			1	1.00	1	0.18	7	182.65	11	**185.83
สขป. 15	468	993.86							4	144.72	1	40.00	36	362.58	41	**547.30
สขป. 16	521	1,559.74			4	136.00			5	66.44	7	190.10	4	67.80	20	**460.34
สขป. 17	207	730.42	11	180.36	14	115.89			8	79.02	2	34.50	8	48.89	43	**458.66
สคก.	277	989.12			1	10.00							1	2.16	2	12.16
สบอ.	192	309.52			8	45.90			1	0.20	4	67.50	4	11.03	17	**124.63
รวมสายงาน รธร.	36	3,669.59							1	48.12					1	48.12
สมต.	36	3,669.59														
สลก.									1	48.12					1	48.12



รายการที่จัดซื้อจัดจ้างวงเงินตามอำนาจกรมฯ

งานผูกพันใหม่ ทั้งหมด 30 รายการ เป็นรายการในสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน 1 รายการ และสายงานบริหาร จำนวน 1 รายการ

สายงาน รรบ.



ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุ พร้อมชุดลอกระยะที่ 4 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โครงการชลประทานชลบุรี สชป. 9

ขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 64



ทั้งโครงการ จำนวน 360 ล้านบาท

ปี 2564 จำนวน 72 ล้านบาท

สายงาน รรท.



อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


สำนักงานเลขานุการกรม

ขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 64



ทั้งโครงการ จำนวน 240.60 ล้านบาท

ปี 2564 จำนวน 48.12 ล้านบาท



ขอบคุณค่ะ
