



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พ.ล.บอ. 2145/62

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๒๒๕๖

ที่ กพง ๐๖/๕๗๖/๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปรายการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบ พ.ร.บ.)

เรียน อช. สำเนาเรียน รรช. รชว. รชบ. รรช. และผู้อำนวยการสำนัก/กอง

๑๖ 3144

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง อช. ได้เห็นชอบแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมอบหมายให้กองแผนงาน จัดทำสรุปความก้าวหน้า แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๑๕ วัน

กองแผนงาน ขอสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒) โดยกรมชลประทานได้รับงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๘,๕๓๖.๑๙ ล้านบาท จำนวน ๗,๐๒๐ รายการ พบว่ามีรายการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ร้อยละ ๔๕.๐๐) จำนวน ๓,๑๕๓ รายการ งบประมาณ จำนวน ๓๔,๗๒๔.๘๑ ล้านบาท ซึ่งแผนการเบิกจ่าย ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๑๑,๗๔๘.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๓ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗,๗๕๘.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๔ ต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๙

สาเหตุที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่าย ตามที่สำนัก/กอง จัดทำแผน คือ

๑. บางรายการอยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายการงาน

๒. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

๓. ติดปัญหาที่ดิน เนื่องจากต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่ศึกษาวิจัยใหม่ และมีการขยับตำแหน่ง

จุดที่ตั้งห้วงงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการที่ อช. ลงนาม ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง ๐๖/๓๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นควรมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ร้องอธิบดีตามสายงาน พิจารณากำกับ ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายของสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาลกำหนด ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๕.๐๐

๒. สำนัก/กอง เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่วางแผนไว้ และตามเป้าหมายของรัฐบาล

๓. สำนัก/กอง ขอให้ตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้เร่งรัดโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

แจ้งชน ผอ.สช.น., ผอ.ร.พด., ทบ ๑- ๗ มอ.

และ ๑๓๓-มอ. (๑๓-มอ., ๗๗-มอ.)

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.


(นายประยูร เอ็นใจ) ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒

ผจน.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เฉพาะรายการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45.00

ภาพรวมกรม

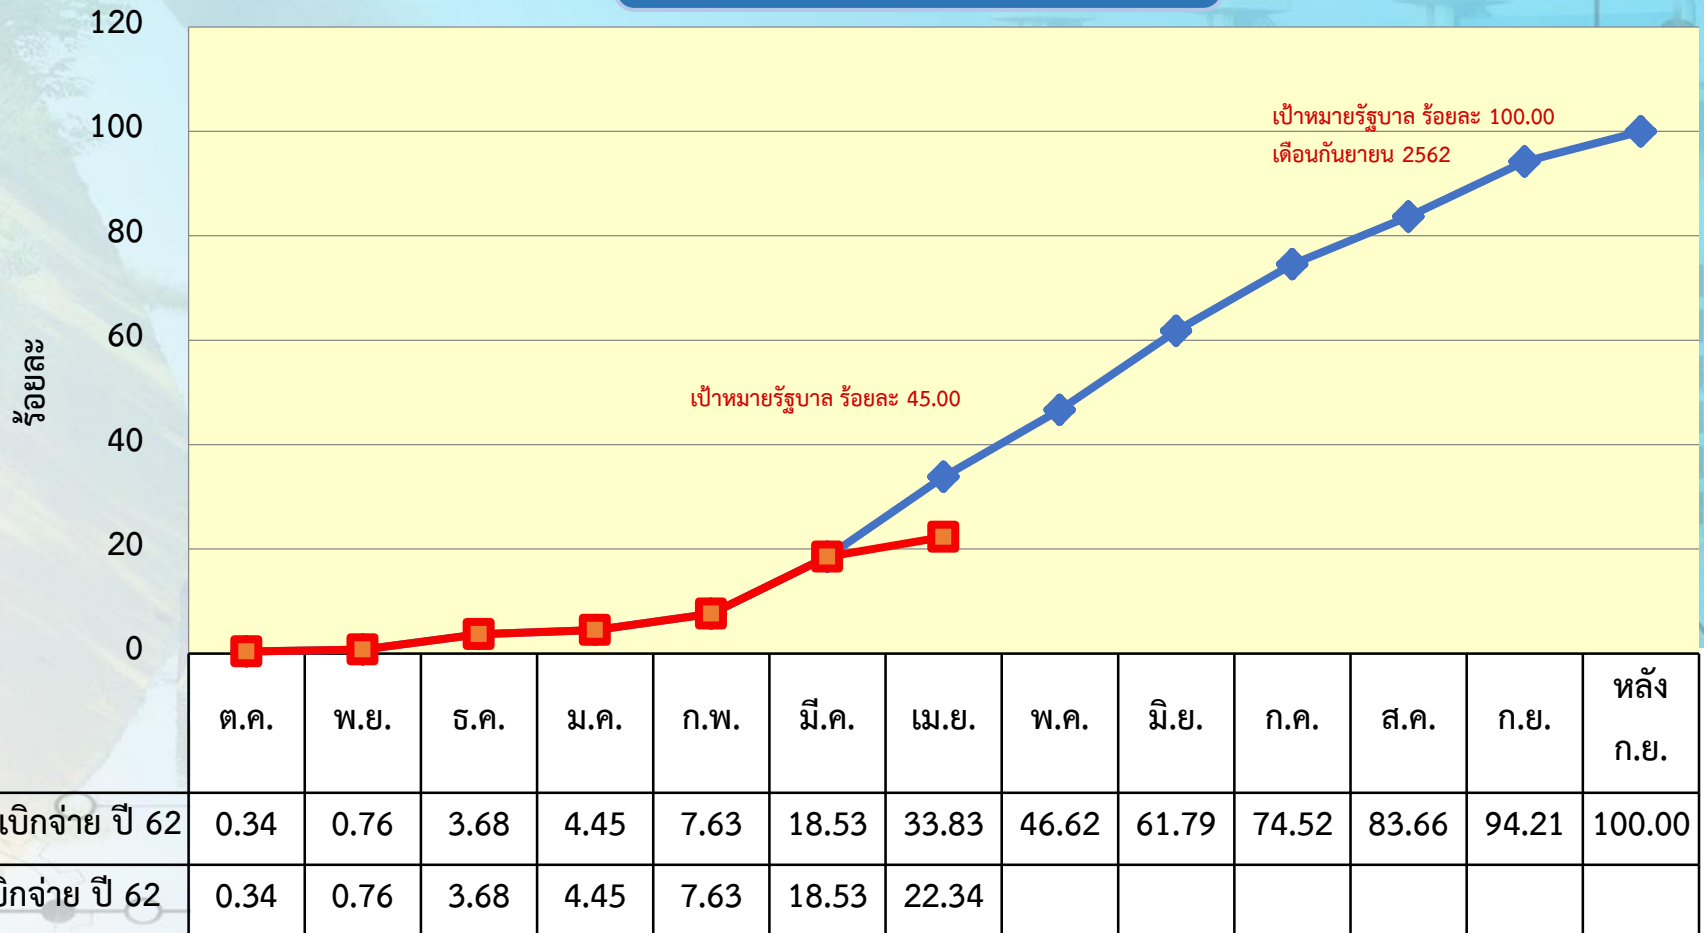

หมายเหตุ : เริ่มจัดทำแผนเดือนเมษายน 2562

ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามสำนัก (ณ 17 เม.ย. 62)

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบประมาณ พ.ร.บ. ปี 2562 (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2562 (ล้านบาท)	แผนเบิกจ่าย เม.ย. 62		ผลเบิกจ่าย จากติดตาม Online ณ 17 เม.ย. 62		สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบประมาณ พ.ร.บ. ปี 2562 (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2562 (ล้านบาท)	แผนเบิกจ่าย เม.ย. 62		ผลเบิกจ่าย จากติดตาม Online ณ 17 เม.ย. 62	
				งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ/งบจัดสรร	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ/งบจัดสรร					งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ/งบจัดสรร	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ/งบจัดสรร
สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา								สายงานก่อสร้าง							
สชป.1	102	717.7248	602.2133	234.8916	39.00	170.7826	28.36	สพญ.	128	7,035.6487	7,153.2105	2,081.0883	29.09	1,126.5287	15.75
สชป.2	141	1,292.3949	1,150.4366	330.5984	28.74	227.9401	19.81	กทท.	107	5,554.0402	5,236.7353	2,545.3586	48.61	1,850.9196	35.34
สชป.3	92	832.5748	581.1803	212.1684	36.51	146.2448	25.16	สายงานวิชาการ							
สชป.4	108	944.6152	725.9814	189.4509	26.10	128.1040	17.65	สสธ.	12	214.3053	144.9166	97.5660	67.33	66.0085	45.55
สชป.5	148	1,374.1132	1,105.2920	475.0880	42.98	361.9795	32.75	สบก	22	487.6987	431.8731	38.9918	9.03	37.3971	8.66
สชป.6	157	1,990.8020	1,473.9367	564.5719	38.30	411.9958	27.95	สอศ.	6	103.6544	103.6544	25.5414	24.64	17.1656	16.56
สชป.7	144	1,638.0833	1,456.5561	602.8576	41.39	508.3749	34.90	สายงานบริหาร							
สชป.8	219	2,544.5568	2,016.3463	534.2183	26.49	282.0421	13.99	สคก.	210	543.9810	527.4580	249.9068	47.38	187.0950	35.47
สชป.9	163	2,167.4012	1,899.3199	430.3334	22.66	243.6280	12.83	สมต.	16	221.4202	221.4202	76.1978	34.41	52.6613	23.78
สชป.10	150	1,559.0496	1,369.2259	405.9827	29.65	207.3971	15.15								
สชป.11	165	1,506.6052	1,297.5751	394.4479	30.40	209.8702	16.17								
สชป.12	165	1,534.6013	1,448.9716	445.9647	30.78	259.3016	17.90								
สชป.13	180	841.0696	666.3981	195.6562	29.36	144.4546	21.68								
สชป.14	117	1,719.5745	1,580.3676	364.4031	23.06	175.1947	11.09								
สชป.15	168	1,229.4760	793.7319	245.2464	30.90	87.6045	11.04								
สชป.16	180	1,738.9138	1,564.8381	638.3081	40.79	480.2786	30.69								
สชป.17	170	1,064.5008	980.9916	306.0460	31.20	342.0780	34.87								
สบอ.	83	192.9716	192.1817	63.5806	33.08	33.1395	17.24								

