



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สบอ (ปลค.) ๐๔/๑๓๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๓ เงินกันเหลือในปี และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ในระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. รายการงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๑ รายการ โดยให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ.

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)
ผส.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

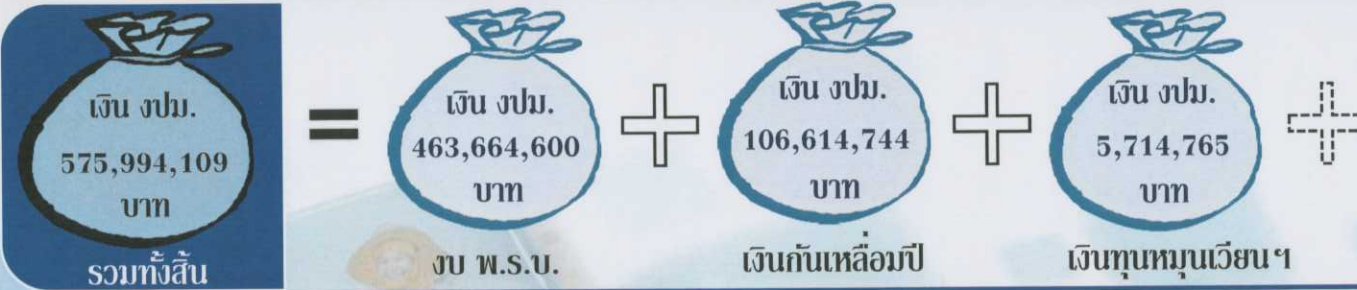

แผนงาน/โครงการเพื่อดำเนินการในภาวะเร่งด่วน
ในการรองรับผลกระทบภัยแล้ง
วงเงิน 319,273,000 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (พ.ร.บ.)



เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 3 ร้อยละ 65

เงินกันเหลือมปี 2555-2562



คาดว่าเบิกเงินได้ทันตามกำหนด 30 กันยายน 2563

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน



แผนงาน/โครงการเพื่อดำเนินการในภาวะเร่งด่วนในการรองรับผลกระทบภัยแล้ง



สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เสนอโครงการปรับปรุงและติดตั้ง เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน จำนวน 41 รายการ วงเงิน 319,273,000 บาท



รายการงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 21 รายการ

หน่วยงาน	จำนวน	หน่วยงาน	จำนวน
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	9	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	4
ส่วนอุทกวิทยา	6	ศอช.ภาคตะวันตก	2

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 29 เมษายน 2563

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 29 เมษายน 2563

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (รวมทุกประเภท)		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	-	6,313,223	6,313,223	0	6,313,223	1,201,602	0	1,201,602	19.03
ฝ่ายบริหารทั่วไป	17	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	7,596,600	7,596,600	0	7,596,600	1,908,820	0	1,908,820	25.13
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	62	250,318,460	137,167,775	81,384,225	55,783,550	68,464,088	49,301,160	19,162,928	49.91
ส่วนอุทกวิทยา	25	91,375,500	57,918,100	24,582,500	33,335,600	9,804,059	0	9,804,059	16.93
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,200,000	8,200,000	1,500,000	6,700,000	2,461,181	1,460,000	1,001,181	30.01
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	21	97,139,584	34,690,284	27,425,484	7,264,800	7,841,236	7,358,064	483,172	22.60
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	22	10,372,297	9,877,877	0	9,877,877	4,142,945	0	4,142,945	41.94
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	6	13,029,220	13,029,220	0	13,029,220	5,043,547	0	5,043,547	38.71
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	6	11,624,710	11,624,710	0	11,624,710	5,174,038	0	5,174,038	44.51
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	14,702,600	14,702,600	0	14,702,600	3,552,147	0	3,552,147	24.16
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	13,062,700	13,062,700	0	13,062,700	2,463,945	0	2,463,945	18.86
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	8	11,057,200	11,057,200	0	11,057,200	4,545,083	0	4,545,083	41.11
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	10	11,746,030	11,746,030	0	11,746,030	3,599,263	0	3,599,263	30.64
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	7	9,232,380	9,232,380	0	9,232,380	625,035	0	625,035	6.77
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	7	13,608,840	13,608,840	0	13,608,840	3,746,942	0	3,746,942	27.53
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	182,905	0	182,905	20.32
รวมทั้งสิ้น	224	575,994,109	366,442,304	134,892,209	231,550,095	130,471,602	58,119,224	72,352,378	35.60

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 29 เมษายน 2563

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2563		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	-	6,313,223	6,313,223	0	6,313,223	1,201,602	0	1,201,602	19.03
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	182,905	0	182,905	20.32
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	7,596,600	7,596,600	0	7,596,600	1,908,820	0	1,908,820	25.13
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	37	183,491,500	70,340,815	31,670,065	38,670,750	2,050,128	0	2,050,128	2.91
ส่วนอุทกวิทยา	24	75,618,000	42,160,600	8,825,000	33,335,600	506,459	0	506,459	1.20
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	4	6,700,000	6,700,000	0	6,700,000	1,001,181	0	1,001,181	14.94
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	16	74,609,300	12,160,000	4,895,200	7,264,800	483,172	0	483,172	3.97
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	22	10372297	9,877,877	0	9,877,877	4,142,945	0	4,142,945	41.94
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	6	13,029,220	13,029,220	0	13,029,220	5,043,547	0	5,043,547	38.71
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	6	11,624,710	11,624,710	0	11,624,710	5,174,038	0	5,174,038	44.51
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	14,702,600	14,702,600	0	14,702,600	3,552,147	0	3,552,147	24.16
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	13,062,700	13,062,700	0	13,062,700	2,463,945	0	2,463,945	18.86
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	8	11,057,200	11,057,200	0	11,057,200	4,545,083	0	4,545,083	41.11
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	10	11,746,030	11,746,030	0	11,746,030	3,599,263	0	3,599,263	30.64
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	7	9,232,380	9,232,380	0	9,232,380	625,035	0	625,035	6.77
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	7	13,608,840	13,608,840	0	13,608,840	3,746,942	0	3,746,942	27.53
รวมทั้งสิ้น	175	463,664,600	254,112,795	45,390,265	208,722,530	40,227,212	0	40,227,212	15.83

หมายเหตุ

ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ 13 รายการ แบ่งเป็น

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

กันส่วนกลาง 5 รายการ วงเงิน 175,703 บาท งานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ 3 สถานี ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของข้าว และปรับปรุงถึงวัดปริมาณการใช้น้ำ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 839,080 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 745,390 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 870,000 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 722,000 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 724,300 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 722,770 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก


กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 633,120 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้


กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 850,860 บาท งานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานความก้าวหน้า 8 รายการ ในส่วนงานดำเนินการสถานีอุทกฯ

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 29 เมษายน 2563

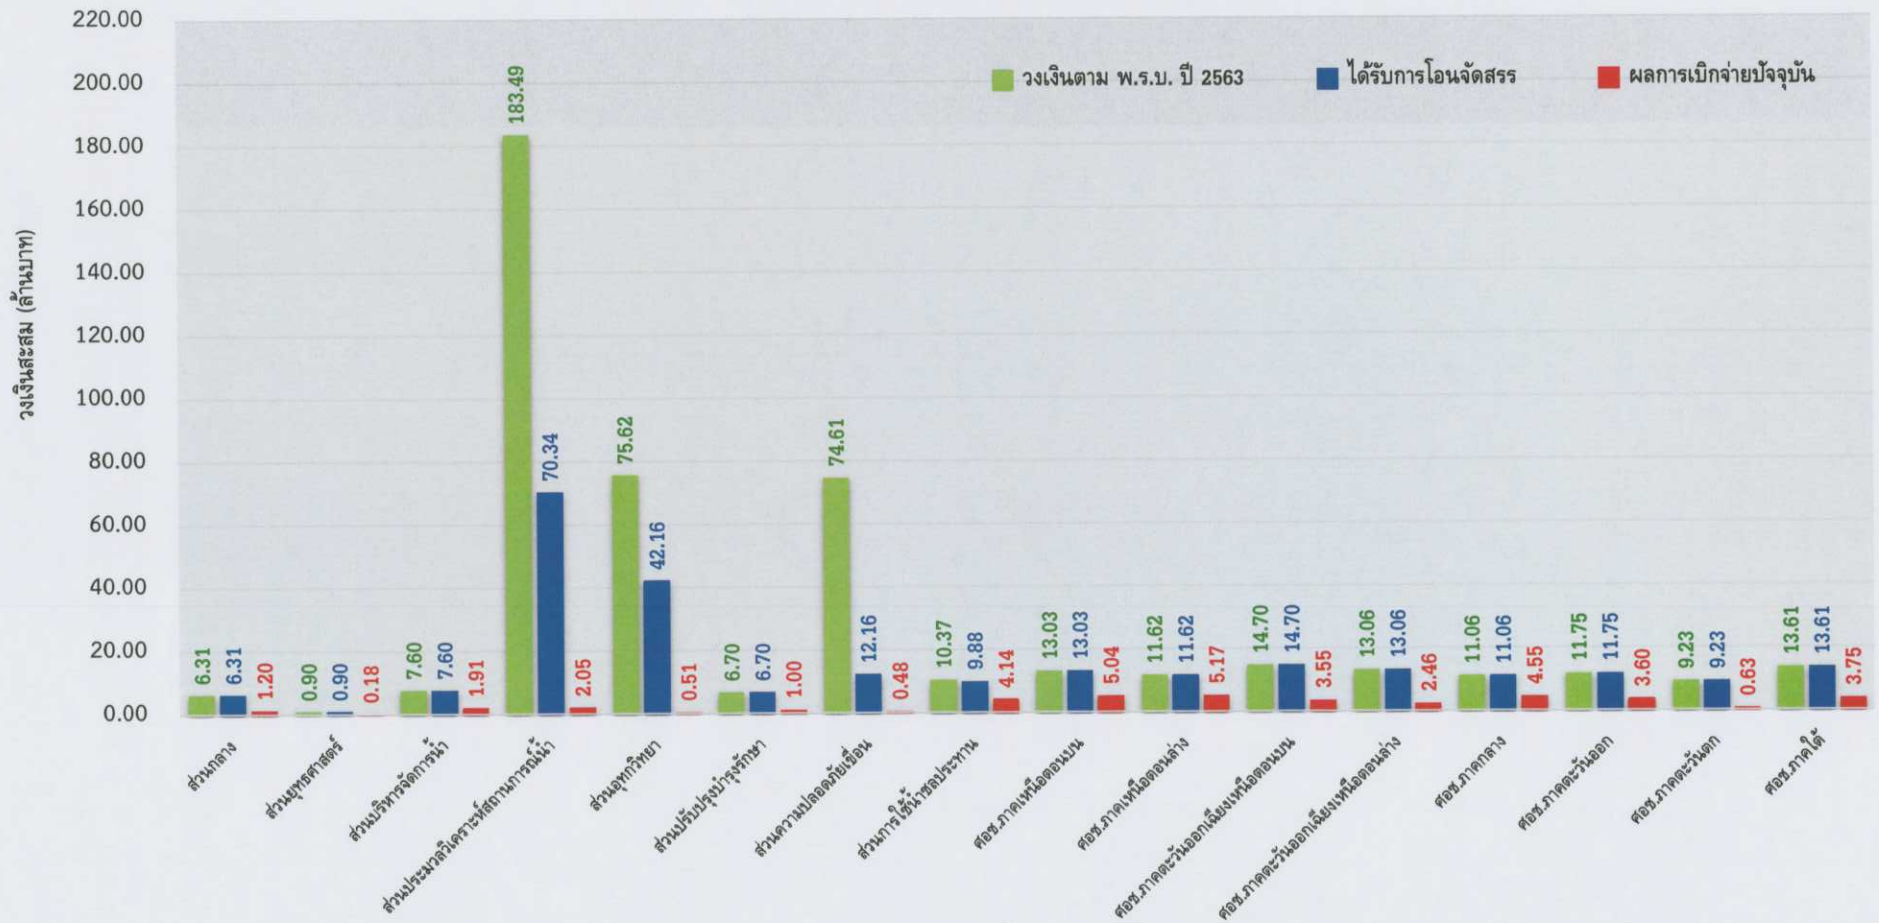

ผลการเบิกจ่ายบรยายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 29 เมษายน 2563

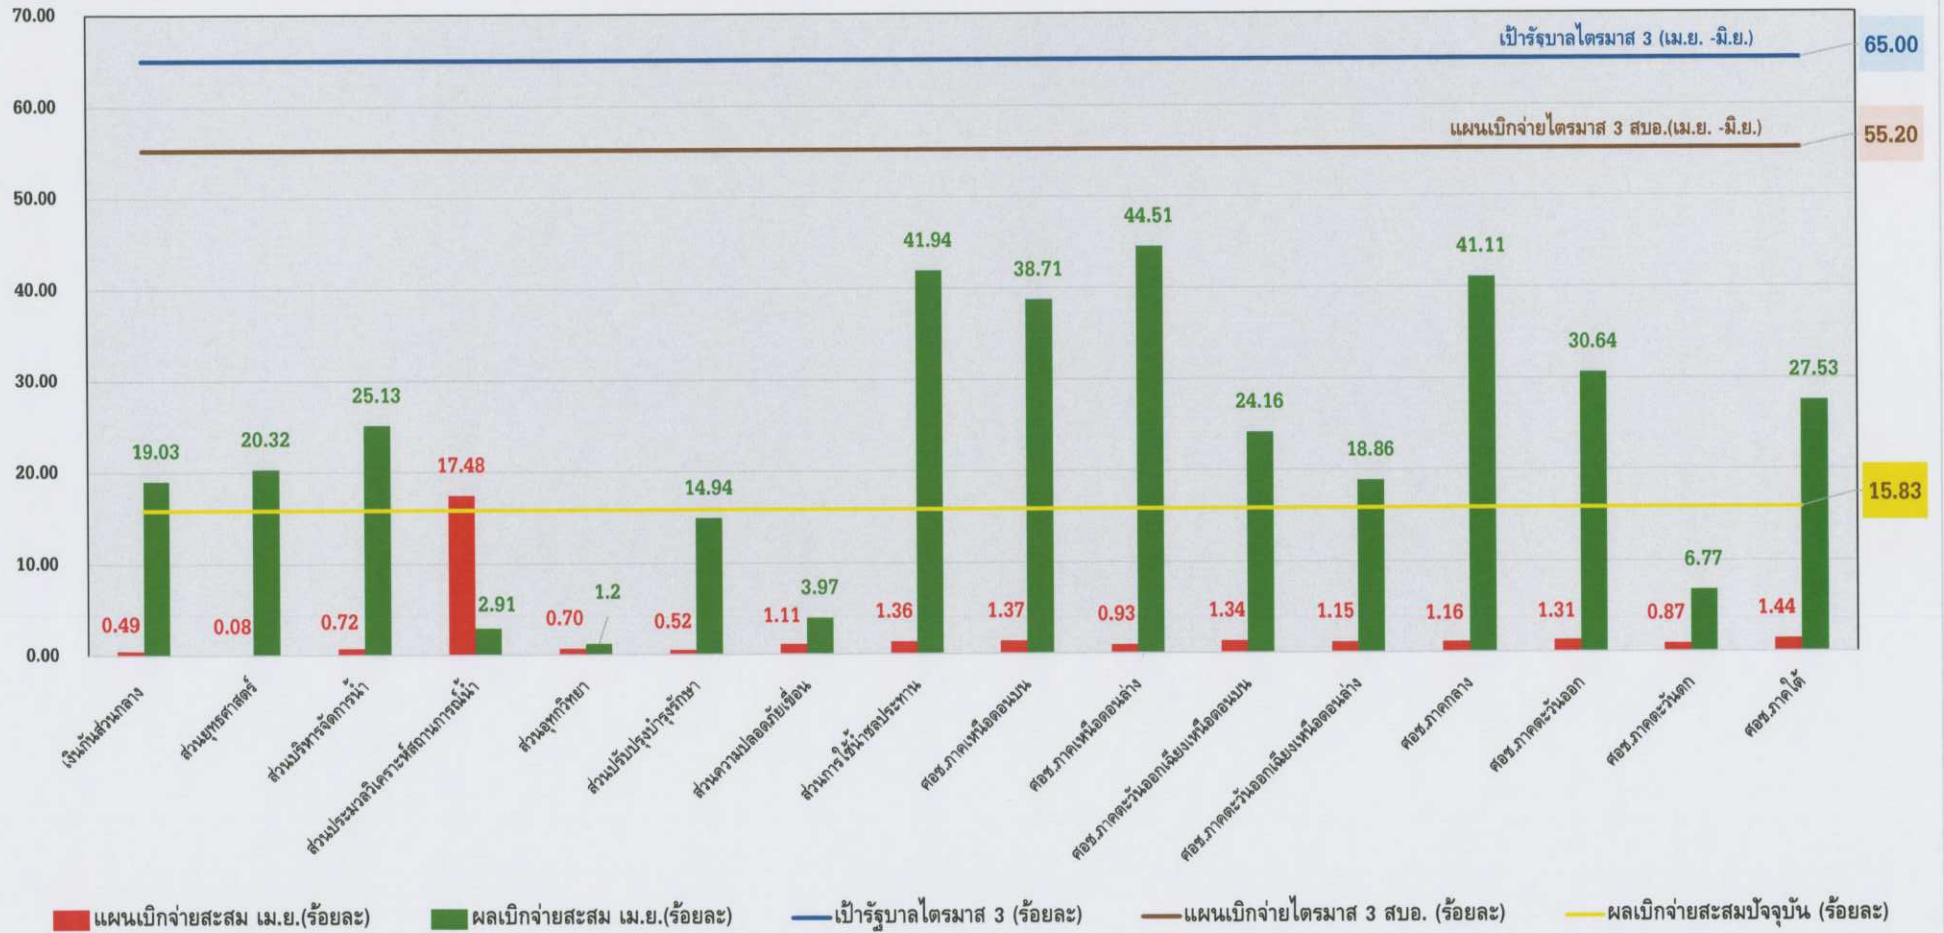

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 29 เมษายน 2563

รายการงบประมาณ : เงินก้อนเลื่อนปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	เงินก้อนเลื่อนปี 2563		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	25	66,826,960	66,826,960	49,714,160	17,112,800	66,413,960	49,301,160	17,112,800	99.38
ส่วนอุทกวิทยา	1	15,757,500	15,757,500	15,757,500	0	9,297,600	0	9,297,600	59.00
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,460,000	1,460,000	0	97.33
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	5	22,530,284	22,530,284	22,530,284	0	7,358,064	7,358,064	0	32.66
รวมทั้งสิ้น	32	106,614,744	106,614,744	89,501,944	17,112,800	84,529,624	58,119,224	26,410,400	79.29

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 29 เมษายน 2563

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563

โครงการ / หน่วยงาน	เงินทุนหมุนเวียนฯ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	17	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	100.00
รวมทั้งสิ้น	17	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	100.00

รายการงานตาม พ.ร.บ.ปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	หน่วยงาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			สถานะปัจจุบัน
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
	รวมทั้งสิ้น 21 รายการ	242,910,200	217,016,300	25,893,900	41,462,700	18,275,200	23,187,500	0	0	0	
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน 9 รายการ	136,110,200	113,634,300	22,475,900	26,119,700	4,555,000	21,564,700	0	0	0	
1	(5) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 ลุ่มน้ำ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	21,564,700		21,564,700	21,564,700		21,564,700				จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ทดแทนที่ชำรุดเพื่อให้สถานีโทรมาตรส่งข้อมูลได้กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 24 เมษายน 2563 กำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 เมษายน 2563
2	(6) ซ่อมแซมและบำรุงรักษากระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	16,585,300	16,585,300		4,555,000	4,555,000					มีผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สขป.17 แล้ว กระบวนการโอนจัดสรรเกิดความคลาดเคลื่อนแจ้งโอนมาให้ สบอ. ซึ่งต้องเสนอแก้ไขใหม่ให้โอนไปให้ สขป.17 ปัจจุบันแก้ไขโอนจัดสรรและโอนไปยัง สขป.17 แล้ว (4,555,000 บ)
3	(1.12) บำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	3,000,000	3,000,000								ใช้วิธี e-bidding ไม่มีผู้ยื่นได้เปลี่ยนเป็นวิธีคัดเลือกแทน ยื่นซอง วันที่ 24 เมษายน 2563 และอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงประเภทเงินจากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์ จะได้รับจ้างภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
4	(1.14) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	5,000,000	5,000,000								ใช้วิธีคัดเลือก ยื่นซอง วันที่ 14 เมษายน 2563 และอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงประเภทเงินจากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์ จะได้รับจ้างในวันที่ 24 เมษายน 2563
5	(19) การปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำอย่างเก็บน้ำขนาดกลาง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000	10,000,000								ใช้วิธีคัดเลือก ยื่นซอง วันที่ 10 เมษายน 2563 และอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงประเภทเงินจากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์ จะได้รับจ้างในวันที่ 24 เมษายน 2563
6	(20) การพัฒนาการคาดการณ์ปริมาณน้ำหลากด้วยปริมาณน้ำฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นชั้นน้ำฝน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000	10,000,000								ใช้วิธีคัดเลือก ยื่นซอง วันที่ 10 เมษายน 2563 และอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงประเภทเงินจากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์ จะได้รับจ้างในวันที่ 24 เมษายน 2563

รายงานการตาม พ.ร.บ.ปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	หน่วยงาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			สถานะปัจจุบัน
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
7	(22) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,400,000	12,400,000								ใช้วิธี e-bidding ยื่นซองวันที่ 24 เมษายน 2563 และอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงประเภทเงินจากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์ จะได้รับจ้างภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
8	(2) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,000,000	12,000,000								รายงานไปโอนลดเพื่อไปดำเนินการตามมติ ครม.10 มีนาคม 2563 covid-19/กัยแล้ง ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ กผง04/2154/2563 ลงท. 20 เมษายน 2563 ขอแจ้งรายงานไปโอนลดเพื่อไปดำเนินการตามมติ ครม.10 มีนาคม 2563 (covid-19 และกัยแล้ง)
9	(115) งานจัดทำโหนดมาตรเครื่องวัดปริมาณน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวม ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	45,560,200	44,649,000	911,200							กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 24 เมษายน 2563 กำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 เมษายน 2563
ส่วนอุทกวิทยา จำนวน 6 รายการ		42,782,000	42,282,000	500,000	9,325,000	8,825,000	500,000	0	0	0	
1	(1.50) โครงการศึกษาอัตราการสะสมตะกอน(Sedimentation Rate) ด้วยวิธีการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclides) ในลุ่มน้ำธรรมชาติที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ส่วนอุทกวิทยา ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	250,000		250,000	250,000		250,000				
2	(1.65) โครงการศึกษาอัตราการสะสมตะกอน(Sedimentation Rate) ด้วยวิธีการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclides) ในลุ่มน้ำธรรมชาติที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ส่วนอุทกวิทยา อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	250,000		250,000	250,000		250,000				
3	(1.28) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ส่วนอุทกวิทยา ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	8,828,000	8,828,000		8,825,000	8,825,000					
4	(5) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง ส่วนอุทกวิทยา ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	10,044,000	10,044,000								เปิดซองประกวดราคา วันที่ 24 เม.ย.2563
5	(26) งานปรับปรุงระบบโทรมาตรขนาดเล็กและโครงการจัดทำระบบฝังกน้ำ พ.ศ. 2563 ส่วนอุทกวิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	13,366,000	13,366,000								เปิดซองประกวดราคา วันที่ 23 เม.ย.2563
6	(66) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำลุ่มน้ำปราจีนบุรี ส่วนอุทกวิทยา ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	10,044,000	10,044,000								เปิดซองประกวดราคา วันที่ 24 เม.ย.2563

รายการงานตาม พ.ร.บ.ปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	หน่วยงาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			สถานะปัจจุบัน
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จำนวน 2 รายการ	1,018,000	0	1,018,000	1,018,000	0	1,018,000	0	0	0	
1	(1.3856) ซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จำนวน 49 สถานี ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	518,000		518,000	518,000		518,000				คาดว่าจะดำเนินการทำผูกพันได้ทัน 10 พ.ค. 2563
2	(1.3860) ซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จำนวน 1 หน่วย ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	500,000		500,000	500,000		500,000				คาดว่าจะดำเนินการทำผูกพันได้ทัน 10 พ.ค. 2563
	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จำนวน 4 รายการ	63,000,000	61,100,000	1,900,000	5,000,000	4,895,200	104,800	0	0	0	
1	(1.66) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	5,000,000	4,900,000	100,000	5,000,000	4,895,200	104,800				โอนจัดสรรให้ สขบ.1 วงเงิน 281,532 บาท
2	(23) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนปราณบุรี ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	19,000,000	18,400,000	600,000							รอเซ็นสัญญา คาดว่าดำเนินการทันกำหนดเวลา 10 พ.ค. 2563
3	(24) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	20,000,000	19,400,000	600,000							รอเซ็นสัญญา คาดว่าดำเนินการทันกำหนดเวลา 10 พ.ค. 2563
4	(25) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุทุมพราร ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	19,000,000	18,400,000	600,000							รอเซ็นสัญญา คาดว่าดำเนินการทันกำหนดเวลา 10 พ.ค. 2563
