



บันทึกข้อความ

ว.ร. ๒๑๐. ๒๕๖๑/๑

ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ✓ กพง ๐๖/ ๒๕๖๑/ ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรบบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ **ร.ม.๑๑๑๒**

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำแนกตามหลักเกณฑ์ ของการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๒ ประเภท รวม ๖ โครงการ แบ่งเป็น ประเภท รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๕ โครงการ และประเภทรายจ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖,๙๗๐.๙๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๕,๑๗๐.๔๕๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๗ จำนวนทั้งสิ้น ๖๙๘ รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอกาชาด จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๔๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๘ และยกเลิก ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ เนื่องจากงบประมาณถูกปรับ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๑ มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. และสำเนาเรียน รองอธิบดี เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

- ทราบ

- เรียน ผอ.สน., ผอ.ช.ภค., ทน.๑-๓ ผอ.

และ ผ.มท.มอ.(ม.มอ., ผด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑


ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบกลาง ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม 6 ครั้ง 6,970.9511 ล้านบาท
จำนวน 698 รายการ

เบิกจ่าย 4,392.9571 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 63.02

ล้านบาท

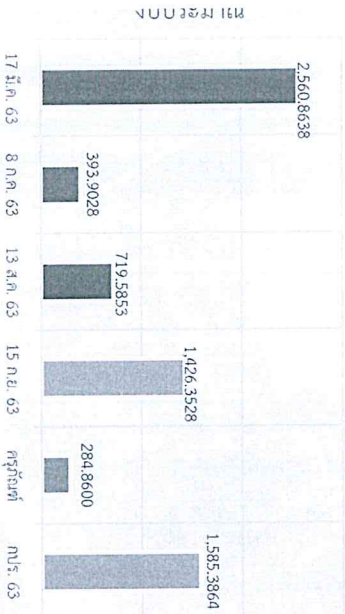

ผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนิน 75 รายการ

การก่อสร้าง

งานแล้วเสร็จ 619 รายการ

ยกเลิก 3 รายการ

ยกเลิก : เนื่องจากงบประมาณถูกพัฒนา พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่ ตัดค่ามรดกคืน

ผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 698 รายการ

ผลการดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้

มติ ครม.
17 ม.ค.

มติ ครม.
8 ก.ค.

มติ ครม.
13 ส.ค.

มติ ครม.
15 ก.ย.

มติ ครม.
15 ก.ย.
ครุภัณฑ์

266 รายการ

222 รายการ

79 รายการ

45 รายการ

8 รายการ

2,560.8638 ล้านบาท

393.9028 ล้านบาท

719.5853 ล้านบาท

1,426.3528 ล้านบาท

284.8600 ล้านบาท

เบิกจ่าย 2,349.5778 ล้านบาท

เบิกจ่าย 390.2096 ล้านบาท

เบิกจ่าย 434.9664 ล้านบาท

เบิกจ่าย 149.7794 ล้านบาท

เบิกจ่าย 14.9800 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 91.67

คิดเป็นร้อยละ 99.06

คิดเป็นร้อยละ 60.45

คิดเป็นร้อยละ 10.50

คิดเป็นร้อยละ 5.26

89.24 %

100 %

88.94 %

65.90 %

45.00 %

• แล้วยเสร็จ

• แล้วยเสร็จ

• แล้วยเสร็จ

• แล้วยเสร็จ

• อยู่ระหว่างดำเนินการ

264 รายการ

222 รายการ

65 รายการ

27 รายการ

8 รายการ

• อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ

• อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 รายการ

• อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ

• ยกเลิก 1 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนิน 75 รายการ

การก่อสร้าง

งานแล้วเสร็จ 619 รายการ

ยกเลิก 3 รายการ

ยกเลิก : เนื่องจากงบประมาณถูกพัฒนา พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่ ตัดค่ามรดกคืน

ผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 698 รายการ

- 1. พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่
- 2. ปริมาณน้ำ 60.82 ล้าน ลบ.ม.
- 3. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่
- 4. ปริมาณพืช 378,145 ไร่
- 5. งบประมาณ 79,624 ล้านบาท

- 1. ปริมาณน้ำ 50.49 ล้าน ลบ.ม.
- 2. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่
- 3. ปริมาณพืช 6,5657 ล้านบาท

- 1. ปริมาณน้ำ 3.16 ล้าน ลบ.ม.
- 2. พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่
- 3. งบประมาณ 7,520 ล้านบาท

- 1. พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่
- 2. ปริมาณน้ำ 6.04 ล้าน ลบ.ม.
- 3. พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่
- 4. งบประมาณ 20,470 ล้านบาท

โครงการสร้างคันเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563

โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 บอกรักษาความเสียหายจากดินแดนน้ำท่วมภาคและบริเวณ

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

โครงการเพื่อเตรียมรับมือ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 256

โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ทีมและบรรณาธิการ



ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำแนกตามหลักเกณฑ์ของการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท 6 โครงการ แบ่งเป็น

- รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 5 โครงการ
- รายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ

โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6,970.9511 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 4,392.5778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.02 จำนวนทั้งสิ้น 698 รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.14 คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการ 75 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.74 ดำเนินการแล้วเสร็จ 619 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.68 และยกเลิก 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.44 เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่ คร้วเรือนรับประโยชน์ 79,624 คร้วเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,560.8638 ล้านบาท จำนวน 266 รายการ และมีแผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน งบประมาณ จำนวน 250.0000 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,349.5778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.75 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 264 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่

1. แก้มลิงหนองนกทา ระยะที่ 1 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 4.7278 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.0381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ผลการดำเนินงานร้อยละ 7.00 เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา โดยผู้รับจ้างรายเดิมได้ขยับยั้งเครื่องจักร-เครื่องมือ ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันกรมได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิม และเริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่อีกครั้ง โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนเมษายน 2564

2. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน งบประมาณ 9.6156 ล้านบาท เบิกจ่าย 2.0378 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ผลการดำเนินงานร้อยละ 30 เนื่องจากปัจจุบันเป็นรอบเวรการส่งน้ำเพื่อการเกษตรก่อน

2. โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี : 8 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

ผลสัมฤทธิ์ : ความจุเพิ่มขึ้น 50.4904 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 8,500 คริวเรือน และปริมาณการกำจัดวัชพืช 8,033,612 ต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 25

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 393.9028 ล้านบาท จำนวน 222 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 390.2096 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.06 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 222 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 186.1678 ล้านบาท เบิกจ่าย 184.0693 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 98.87 ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. โครงการแผนการดำเนินงานขุดลอกคู คลอง ในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 9.2336 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.0312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.81 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ

3. โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 215 รายการ งบประมาณ 198.5014 ล้านบาท เบิกจ่าย 197.1092 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.30 ดำเนินการแล้วเสร็จ 215 รายการ

3. โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะ ฝนทิ้งช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 3.1572 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 7,390 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 719.5853 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ 79 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 434.9664 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.45 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 65 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 รายการ และยกเลิก 1 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการแก้ไขปัญหาลิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 52.9970 ล้านบาท เบิกจ่าย 38.7264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.07 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ
2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 63.2664 ล้านบาท เบิกจ่าย 63.2621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ
3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.0096 ล้านบาท เบิกจ่าย 83.3085 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.80 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ
4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 69 รายการ งบประมาณ 151.2844 ล้านบาท เบิกจ่าย 143.8456 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.08 ดำเนินการแล้วเสร็จ 61 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 128.2364 ล้านบาท เบิกจ่าย 57.7959 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.07 อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 24.5700 ล้านบาท เบิกจ่าย 23.3672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.10 ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหี่ยน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 66.1790 ล้านบาท เบิกจ่าย 10.5152 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.89 อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 96.0425 ล้านบาท เบิกจ่าย 14.1455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.73 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ
ในฤดูฝนปี 2563

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,426.3528 ล้านบาท มีแผนดำเนินการ
จำนวน 3 โครงการ 45 รายการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 153.0981 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.73 โดยอยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 27 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 34 รายการ งบประมาณ 306.8528 ล้านบาท เบิกจ่าย 153.0981 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.89 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 27 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 6 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว - นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97.988 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขแบบโดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนพฤษภาคม 2564

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือชุดใช้งานชลประทาน จำนวน 6 ลำ 6 รายการ งบประมาณ 870.0000 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถชุดแบบโป๊ะเหล็ก จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 249.5000 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ

5. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย
มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรมได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำ รถปั้นจั่น และเรือชุด เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 284.8600 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 14.9800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 ลงนามในสัญญา 8 รายการ

6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,585.3864 ล้านบาท จำนวน 78 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,050.1252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.24 ดำเนินการแล้วเสร็จ 41 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 36 รายการ ยกเลิก 1 รายการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมือง ตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 25.0000 ล้านบาท เนื่องจาก ราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมชลประทานได้รับ จัดสรรงบประมาณ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ เมื่อ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบกลาง
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)						หมายเหตุ	
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวมรายการ ทั้งสิ้น	อยู่ระหว่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง				แล้วเสร็จ		ยกเลิก
						ผลงานร้อยละ 1 - 40	ผลงานร้อยละ 41 - 80	ผลงานร้อยละ 81 - 99	รวม			
รวมทั้งหมด	6,970,951.1	4,392,957.1	63.02	698	1	10	41	24	75	619	3	
1.1 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	2,560,863.8	2,349,577.8	91.75	266		2			2	264		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
1.2 โครงการรณรงค์ในการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความ เสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อ เป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563	393,902.8	390,209.6	99.06	222						222		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดำเนินการ แล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
1.3 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563	719,585.3	434,966.4	60.45	79			7	6	13	65	1	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
1.4 โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ ปรากฏการณ์น้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ กักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,426,352.8	153,098.1	10.73	45	1	2	12	2	16	27	1	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
1.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมและบรรเทาอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	284,860.0	14,980.0	5.26	8			8		8	8		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายภายในเดือนพฤษภาคม 2564
1.6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปรร) ประจำปี 2563	1,585,386.4	1,050,125.2	66.24	78		6	14	16	36	41	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ :

- ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่
 - งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC-2R กม.2+200-2+300 สถานีสูบน้ำ PR-2 จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 0.3238 ล้านบาท เนื่องจากตั้งเงินการดำเนินงานแล้วเสร็จภายในงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
 - เรือชุดชนิดที่ขาดแคลนส่งคืนด้วยข้อ ขงตพที่ส่งคืนไม่เรียบร้อย 14 ขบวนบริกรเรือซึ่งจากที่ 1 ตำบลงวนเหนือ อำเภอထေးစည် จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ลำ งบประมาณ 145,000 ล้านบาท เนื่องจากงบประมาถูกตัดตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - โครงการอ่างเก็บน้ำก้านก้นมอตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปานอง จังหวัดพิจิตร งบประมาณ 25,0000 ล้านบาท เนื่องจากราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จภายในงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
- อยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง 1 รายการ คือ ฝายบ้านนาแก้ว - นาน่ง หรือระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอกะลา จังหวัดสงขลา งบประมาณ 97,988 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขแบบโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2564
- ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ได้แก่
 - ฤดูกาลเพาะปลูก เนื่องจากสถานการณ์ระบบของเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดและการพักรักษาตัวของผู้ที่มีความเสี่ยง มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
 - ฝนตกในพื้นที่ทำนบมีการ เนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อนหลายครั้ง น้ำท่วมจึงมีบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ช้ากว่าแผนที่กำหนด
 - ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา โดยผู้รับจ้างรายเดิมได้ขอย้ายเครื่องจักร-เครื่องมือ ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันกรมได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิม และเริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่อีกครั้ง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จจ้างงานในเดือนเมษายน 2564
