



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ คบอ(ผค.)๐๔/๑๕๑/๒๕๖๓

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.


ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๓ เงินกันเหลือปี และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ในระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. รายการงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๔ รายการ โดยให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๓. ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบติดตาม online ในหัวข้อการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ.






(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.



# ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

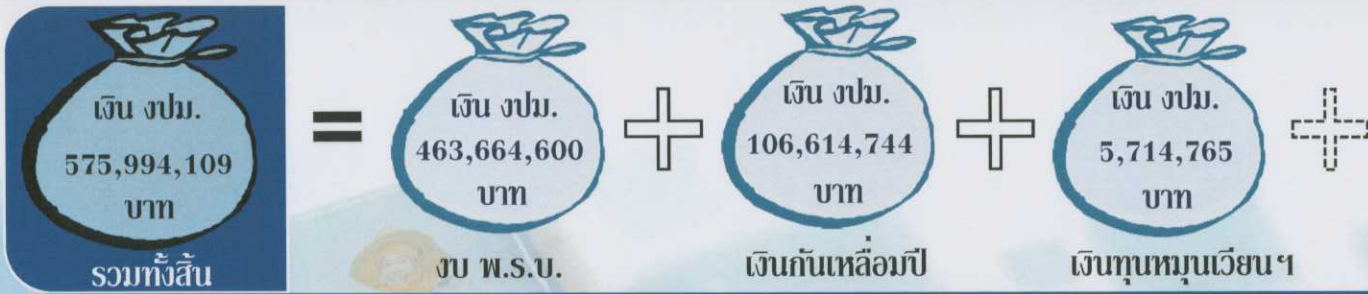

แผนงาน/โครงการเพื่อดำเนินการในภาวะเร่งด่วน  
ในการรองรับผลกระทบภัยแล้ง  
วงเงิน 319,273,000 บาท

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 175 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 274,654,985 บาท (จำนวน 161 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 46,128,976 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 16.80

463,664,600 บาท

เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 3 ร้อยละ 65

## เงินกู้ยืมหลัอมปี 2555-2562

งบประมาณ เงินกู้ยืมหลัอมปี

- จำนวน 32 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 106,614,744 บาท (จำนวน 32 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 84,529,624 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 79.29

106,614,744 บาท

คาดว่าเบิกเงินได้ทันตามกำหนด 30 กันยายน 2563

## เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนฯ

- จำนวน 17 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 5,714,765 บาท
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 5,714,765 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 100

5,714,765 บาท

## แผนงาน/โครงการเพื่อดำเนินการในภาวะเร่งด่วนในการรองรับผลกระทบภัยแล้ง



สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เสนอโครงการปรับปรุงและติดตั้ง เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน จำนวน 41 รายการ  
วงเงิน 319,273,000 บาท



รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 14 รายการ

หน่วยงาน	จำนวน	หน่วยงาน	จำนวน
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	8	ส่วนอุทกวิทยา	6

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2563 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร จำนวน 10 รายการ

หน่วยงาน	จำนวน	หน่วยงาน	จำนวน
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	6	ส่วนอุทกวิทยา	1
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	งานจัดหา 6 รายการ งานจ้างเหมาและดำเนินการ 4 รายการ	

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (รวมทุกประเภท)		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	-	6,313,223	6,313,223	0	6,313,223	1,338,299	0	1,338,299	21.20
ฝ่ายบริหารทั่วไป	17	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	7,596,600	7,596,600	0	7,596,600	1,938,411	0	1,938,411	25.52
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	62	250,318,460	137,167,775	81,384,225	55,783,550	68,840,397	49,301,160	19,539,237	50.19
ส่วนอุทกวิทยา	25	91,375,500	77,980,290	44,644,690	33,335,600	9,949,700	0	9,949,700	12.76
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,200,000	8,200,000	1,500,000	6,700,000	2,578,908	1,460,000	1,118,908	31.45
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	21	97,139,584	34,690,284	27,425,484	7,264,800	7,922,608	7,358,064	564,544	22.84
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	22	10,372,297	10,357,877	480000	9,877,877	4,413,463	0	4,413,463	42.61
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	6	13,029,220	13,029,220	0	13,029,220	5,236,747	0	5,236,747	40.19
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	6	11,624,710	11,624,710	0	11,624,710	5,171,000	0	5,171,000	44.48
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	14,702,600	14,702,600	0	14,702,600	4,594,430	0	4,594,430	31.25
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	13,062,700	13,062,700	0	13,062,700	3,426,229	0	3,426,229	26.23
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	8	11,057,200	11,057,200	0	11,057,200	5,546,612	0	5,546,612	50.16
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	10	11,746,030	11,746,030	0	11,746,030	3,703,603	0	3,703,603	31.53
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	7	9,232,380	9,232,380	0	9,232,380	1,301,565	0	1,301,565	14.10
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	7	13,608,840	13,608,840	0	13,608,840	4,483,878	0	4,483,878	32.95
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	212,750	0	212,750	23.64
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>224</b>	<b>575,994,109</b>	<b>386,984,494</b>	<b>155,434,399</b>	<b>231,550,095</b>	<b>136,373,366</b>	<b>58,119,224</b>	<b>78,254,142</b>	<b>35.24</b>

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2563		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา		ทำเอง
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	-	6,313,223	-	6,313,223	0	6,313,223	-	-	-	-	-	1,338,299	0	1,338,299	21.2
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	-	-	-	-	1	212,750	0	212,750	23.64
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	7,596,600	10	7,596,600	0	7,596,600	-	-	-	-	10	1,938,411	0	1,938,411	25.52
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	37	183,491,500	28	70,340,815	31,670,065	38,670,750	6	85,960,200	85,049,000	911,200	5	2,426,437	0	2,426,437	3.45
ส่วนอุทกวิทยา	24	75,618,000	23	62,222,790	28,887,190	33,335,600	1	13,366,000	13,366,000	0	5	652,100	0	652,100	1.05
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	4	6,700,000	4	6,700,000	0	6,700,000	-	-	-	-	4	1,118,908	0	1,118,908	16.7
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	16	74,609,300	12	12,160,000	4,895,200	7,264,800	3	58,000,000	56,200,000	1,800,000	11	564,544	0	564,544	4.64
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	22	10,372,297	22	10,357,877	480,000	9,877,877	-	-	-	-	22	4,413,463	0	4,413,463	42.61
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	6	13,029,220	6	13,029,220	0	13,029,220	-	-	-	-	6	5,236,747	0	5,236,747	40.19
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	6	11,624,710	6	11,624,710	0	11,624,710	-	-	-	-	6	5,171,000	0	5,171,000	44.48
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	14,702,600	8	14,702,600	0	14,702,600	-	-	-	-	8	4,594,430	0	4,594,430	31.25
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	13,062,700	9	13,062,700	0	13,062,700	-	-	-	-	9	3,426,229	0	3,426,229	26.23
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	8	11,057,200	8	11,057,200	0	11,057,200	-	-	-	-	8	5,546,612	0	5,546,612	50.16
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	10	11,746,030	10	11,746,030	0	11,746,030	-	-	-	-	10	3,703,603	0	3,703,603	31.53
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	7	9,232,380	7	9,232,380	0	9,232,380	-	-	-	-	7	1,301,565	0	1,301,565	14.1
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	7	13,608,840	7	13,608,840	0	13,608,840	-	-	-	-	7	4,483,878	0	4,483,878	32.95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>175</b>	<b>463,664,600</b>	<b>161</b>	<b>274,654,985</b>	<b>65,932,455</b>	<b>208,722,530</b>	<b>10</b>	<b>157,326,200</b>	<b>154,615,000</b>	<b>2,711,200</b>	<b>119</b>	<b>46,128,976</b>	<b>0</b>	<b>46,128,976</b>	<b>16.80</b>

#### หมายเหตุ

ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ 13 รายการ แบ่งเป็น

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

กันส่วนกลาง 5 รายการ วงเงิน 175,703 บาท งานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ 3 สถานี ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของข้าว และปรับปรุงถังวัดปริมาณการใช้น้ำ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 839,080 บาท งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 745,390 บาท งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 870,000 บาท งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 722,000 บาท งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 724,300 บาท งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 722,770 บาท งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 633,120 บาท งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 850,860 บาท งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานความก้าวหน้า 8 รายการ ในส่วนงานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

#### ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

ยกเลิกงาน จำนวน 2 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วงเงิน 1,908,200 บาท

2. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 906,750 บาท

โอนลดเพื่อไปดำเนินการตามมติ ครม.10 มีนาคม 2563 covid-19/ภัยแล้ง จำนวน 1 รายการ


1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาแบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร วงเงิน 12,000,000 บาท


#### ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเขื่อนใหญ่นานาชาติ (ICOLD) วงเงิน 220,800 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

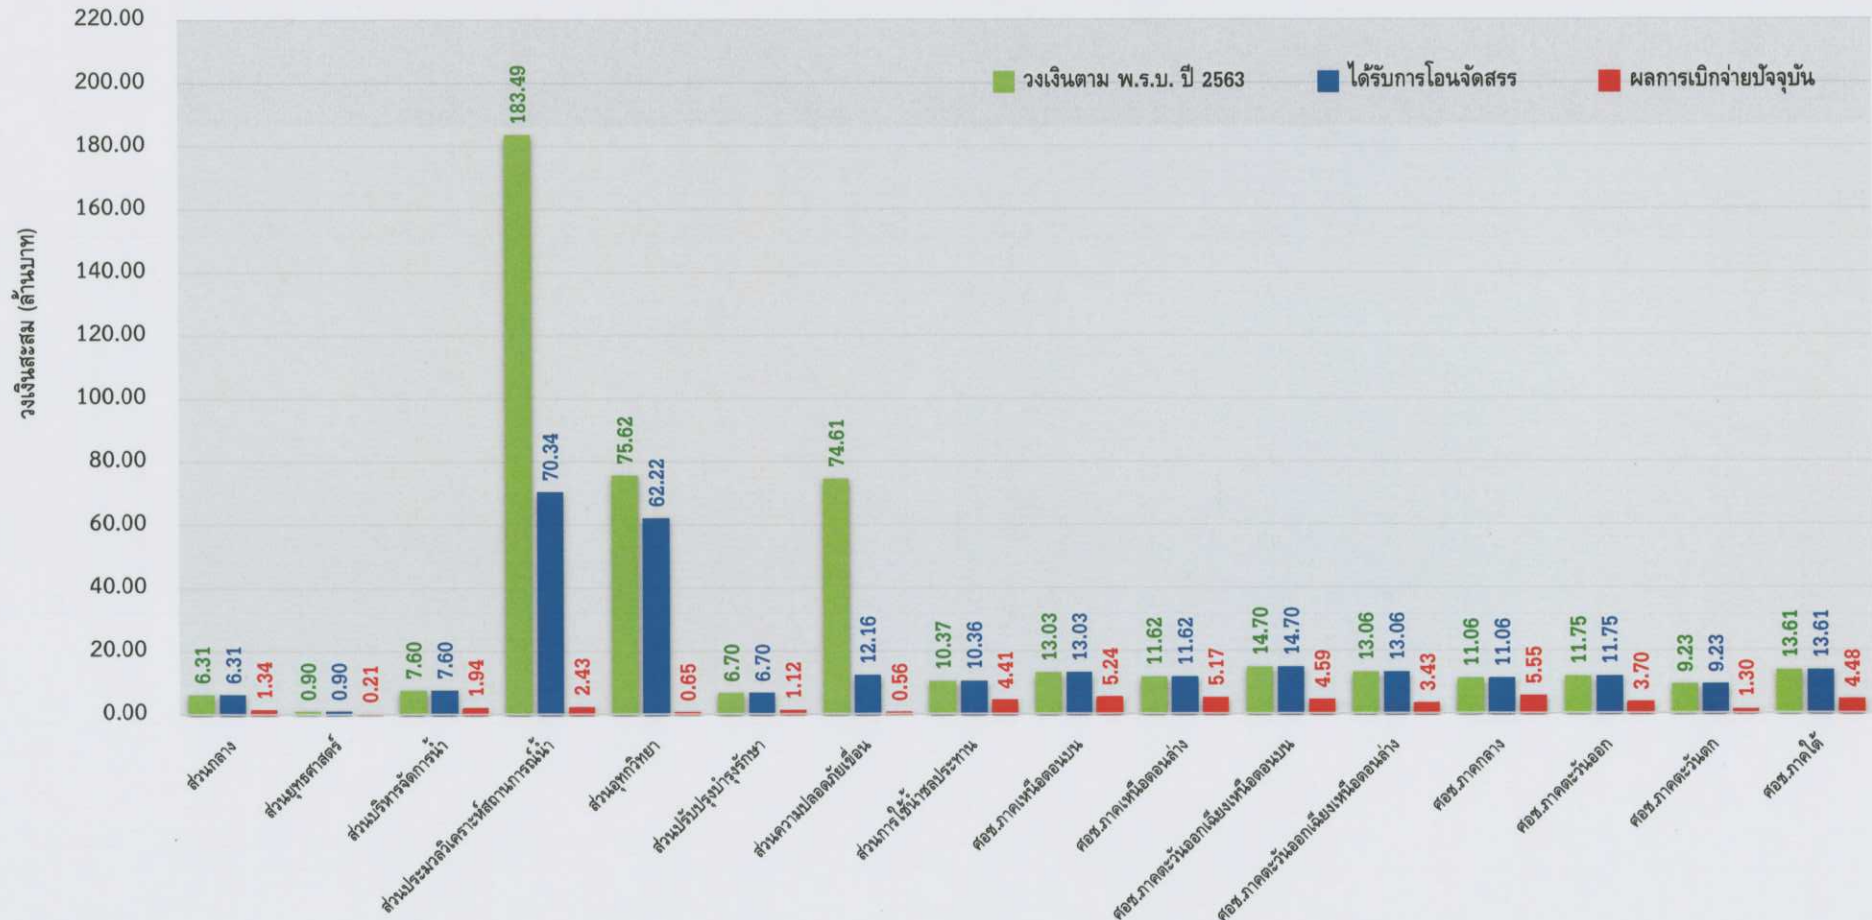

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

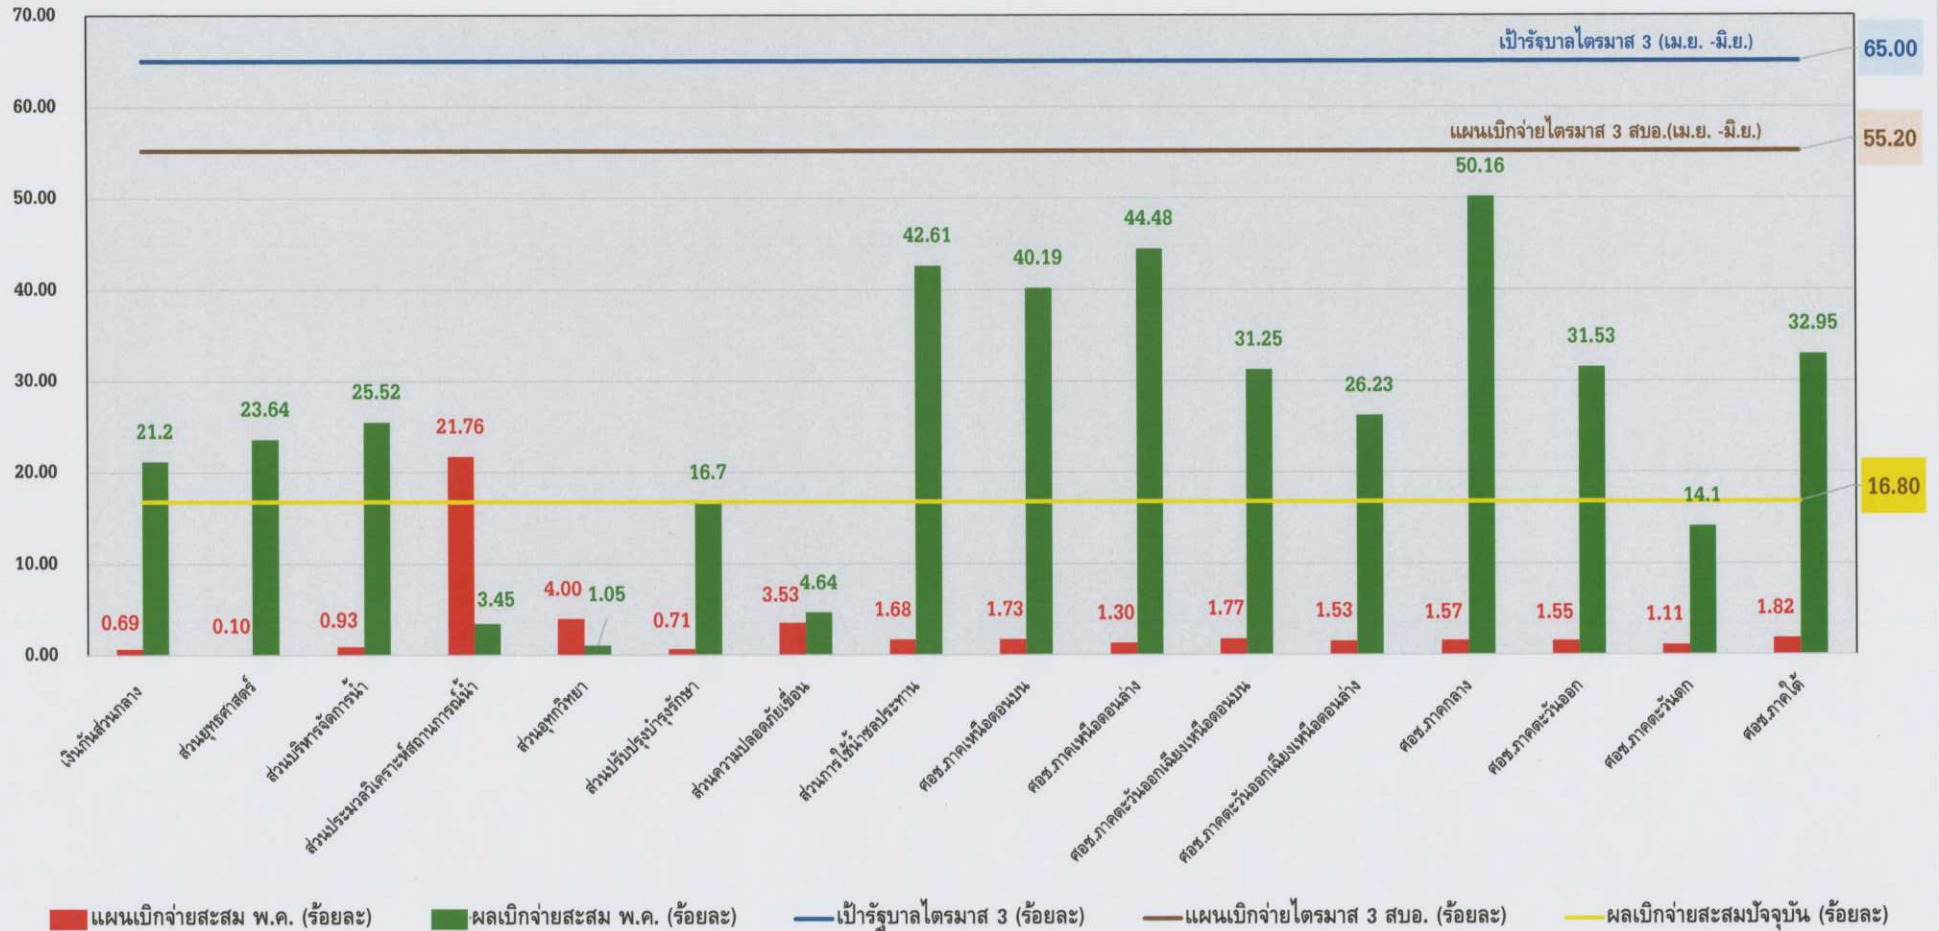

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

รายการงบประมาณ : เงินก้อนเลื่อนปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	เงินก้อนเลื่อนปี 2563		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	25	66,826,960	66,826,960	49,714,160	17,112,800	66,413,960	49,301,160	17,112,800	99.38
ส่วนอุทกวิทยา	1	15,757,500	15,757,500	15,757,500	0	9,297,600	0	9,297,600	59.00
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,460,000	1,460,000	0	97.33
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	5	22,530,284	22,530,284	22,530,284	0	7,358,064	7,358,064	0	32.66
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32</b>	<b>106,614,744</b>	<b>106,614,744</b>	<b>89,501,944</b>	<b>17,112,800</b>	<b>84,529,624</b>	<b>58,119,224</b>	<b>26,410,400</b>	<b>79.29</b>

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563

โครงการ / หน่วยงาน	เงินทุนหมุนเวียนฯ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	17	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	100.00
รวมทั้งสิ้น	17	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	100.00



## รายการงานตาม พ.ร.บ.ปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	หน่วยงาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			สถานะปัจจุบัน
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
	รวมทั้งสิ้น 14 รายการ	166,892,200	143,916,300	22,975,900	55,506,890	33,442,190	22,064,700	0	0	0	
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน 8	124,110,200	101,634,300	22,475,900	26,119,700	4,555,000	21,564,700	0	0	0	
1	(5) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 ลุ่มน้ำ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	21,564,700		21,564,700	21,564,700		21,564,700				เดิมประกาศใน วันที่ 07/04/2563 เนื่องจาก รายละเอียดการพิจารณาใน TOR ไม่ตรงกับ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
2	(6) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่น อื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	16,585,300	16,585,300		4,555,000	4,555,000					ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ทั้งหมด 5 สัญญา เป็นระบบโทรมาตรที่ สขป. มีความต้องการใช้งาน
3	(1.12) บำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	3,000,000	3,000,000								อยู่ในขั้นตอนของการขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน จากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์
4	(1.14) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำ เจ้าพระยา ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	5,000,000	5,000,000								อยู่ในขั้นตอนของการขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน จากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์
5	(19) การปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000	10,000,000								อยู่ในขั้นตอนของการขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน จากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์
6	(20) การพัฒนาการคาดการณ์ปริมาณน้ำหลากด้วยปริมาณน้ำฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นชั้นน้ำฝน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000	10,000,000								อยู่ในขั้นตอนของการขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน จากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์
7	(22) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,400,000	12,400,000								อยู่ในขั้นตอนของการขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน จากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์
8	(115) งานจัดทำโทรมาตรเครื่องวัดปริมาณน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวม ตำบลป่าเลา อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	45,560,200	44,649,000	911,200							เดิมประกาศใน วันที่ 07/04/2563 เนื่องจาก รายละเอียดการพิจารณาใน TOR ไม่ตรงกับ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

## รายการงานตาม พ.ร.บ.ปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	หน่วยงาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			สถานะปัจจุบัน
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
	<b>ส่วนอุทกวิทยา จำนวน 6 รายการ</b>	<b>42,782,000</b>	<b>42,282,000</b>	<b>500,000</b>	<b>29,387,190</b>	<b>28,887,190</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	(1.50) โครงการศึกษาอัตราการสะสมตะกอน (Sedimentation Rate) ด้วยวิธีการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclides) ในลำน้ำธรรมชาติที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ส่วนอุทกวิทยา ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	250,000		250,000	250,000		250,000				ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63 โดยจะส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 1 พ.ค. 63 และเริ่มเบิกจ่าย
2	(1.65) โครงการศึกษาอัตราการสะสมตะกอน (Sedimentation Rate) ด้วยวิธีการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclides) ในลำน้ำธรรมชาติที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ส่วนอุทกวิทยา อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	250,000		250,000	250,000		250,000				ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63 โดยจะส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 1 พ.ค. 63 และเริ่มเบิกจ่าย
3	(1.28) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ส่วนอุทกวิทยา ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	8,828,000	8,828,000		8,825,000	8,825,000					อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา
4	(5) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง ส่วนอุทกวิทยา ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	10,044,000	10,044,000		10,028,200	10,028,200					อยู่ระหว่างส่งรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาให้กองแผนงาน
5	(26) งานปรับปรุงระบบโทรมาตรขนาดเล็กและโครงการจัดทำระบบฝั้งน้ำ พ.ศ. 2563 ส่วนอุทกวิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	13,366,000	13,366,000								อยู่ระหว่างพิจารณาข้อกำหนดทางเทคนิค
6	(66) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำลุ่มน้ำปราจีนบุรี ส่วนอุทกวิทยา ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	10,044,000	10,044,000		10,033,990	10,033,990					อยู่ระหว่างส่งรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาให้กองแผนงาน

## รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2563 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 10 รายการ	157,326,200	154,615,000	2,711,200
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน 6 รายการ	85,960,200	85,049,000	911,200
1	(1.12) บำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	3,000,000	3,000,000	
2	(1.14) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	5,000,000	5,000,000	
3	(19) การปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000	10,000,000	
4	(20) การพัฒนาการคาดการณ์ปริมาณน้ำหลากด้วยปริมาณน้ำฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นชั้นน้ำฝน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000	10,000,000	
5	(22) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,400,000	12,400,000	
6	(115) งานจัดทำโทรมาตรเครื่องวัดปริมาณน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวม ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	45,560,200	44,649,000	911,200
	ส่วนอุทกวิทยา จำนวน 1 รายการ	13,366,000	13,366,000	0
1	(26) งานปรับปรุงระบบโทรมาตรขนาดเล็กและโครงการจัดทำระบบฝั่งน้ำ พ.ศ. 2563 ส่วนอุทกวิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	13,366,000	13,366,000	
	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จำนวน 3 รายการ	58,000,000	56,200,000	1,800,000
1	(23) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนปราณบุรี ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	19,000,000	18,400,000	600,000
2	(24) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	20,000,000	19,400,000	600,000
3	(25) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	19,000,000	18,400,000	600,000

# ระบบติดตาม ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการติดตาม  
และรายงานผลการปฏิบัติงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ

เอกสารแนบ 3

เลือก  
รายการ

หน้าแรก รายงานต่างๆ ↓ คณะทำงานฯ PDF เอกสารแนบในระบบฯ 📍 แผนที่ประมาณการ รายงานสำหรับผู้บริหาร

Logged in: hydrol เพิ่มค่าส่วนราชการ รายการประมาณการ งบประมาณและผลการเบิกจ่าย ระดับหน่วยงาน - รายการประมาณการ Log out

## ระดับบุคคลทั่วไป

### Level1: บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป ผู้ใช้งานจะเป็นใครก็ได้ แต่จะเข้าไปแก้ไขข้อมูลอะไรไม่ได้เลย และสามารถเข้าไปดูในส่วนของ REPORT จากเมนูหลักเท่านั้น

### Level2: ระดับหน่วยงานฯ

ระดับหน่วยงานฯ ผู้ใช้งานเป็นตัวแทนจ  
ระดับสำนักงาน โดยมีหน้าที่ สร้างผลความก้าวหน้า การจดขอจัดจาง งบประมาณ การ , กรอกข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน และแผนการเบิกจ่าย งบประมาณการ และ ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณการ ทั้งนี้กระทำได้เฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ เท่านั้น

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการปฏิบัติงาน

Cash Flow

งาน

หน่วยงาน

Royal  
Irrigation  
Department



ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับระบบติดตามฯ จาก  
Blog RID PBMS..

ดูข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ปีงบประมาณ 2557  
ปีงบประมาณ 2558  
ปีงบประมาณ 2559  
ปีงบประมาณ 2560  
ปีงบประมาณ 2561  
ปีงบประมาณ 2562

...ดูทั้งหมด

รายการ ประมาณการ



# ระบบติดตาม

## ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

หน้าแรก รายงานต่างๆ คัดแต่งงานฯ PDF เอกสารแนบในระบบฯ แผนที่ประมาณการ รายงานสำหรับผู้บริหาร

Logged in: **hydrol** เพิ่มค่าส่วนราชการ รายการประมาณการ งบประมาณและผลการเบิกจ่าย ระดับหน่วยงาน - Log out

### รายการงาน แยกรายประมาณการ

ปีงบประมาณ 2563

สำหรับเจ้าหน้าที่ในระดับ หน่วยงาน / โครงการ

หน่วยงาน / โครงการ : **ส่วนบริหารจัดการน้ำ**

ชื่องาน	ประเภท งบ ประมาณ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เริ่ม ต้น	สิ้น สุด	งบประมาณ			อนุมัติประมาณการ		
							ทั้งหมด	ปี 2563	วันที่	รวม	ค้างเหมาย	ทำเอง
(1.7) โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและการ เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2563 ส่วน บริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร GFMS: null	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พ.ร.บ. 2563	ถนน	เขต ดุสิต	กรุงเทพมหานคร	2563	2563	908,000	908,000	27/12/2562	908,000	0	908,000
(1.8) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการ น้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2563 ส่วน บริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร GFMS: 07003507C0410230	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พ.ร.บ. 2563	ถนน	เขต ดุสิต	กรุงเทพมหานคร	2563	2563	999,000	999,000	27/12/2562	999,000	0	999,000
(1.9) โครงการจัดทำแผนและติดตามการป้องกันและ บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) ปี พ.ศ. 2563 ส่วน บริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร GFMS: 07003507C0410610	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พ.ร.บ. 2563	ถนน	เขต ดุสิต	กรุงเทพมหานคร	2563	2563	996,000	996,000	27/12/2562	996,000	0	996,000

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าแรก รายงานต่างๆ คณະทำงานฯ PDF เอกสารแนะนำระบบฯ แผนที่ประมาณการ รายงานสำหรับผู้บริหาร

Logged in: hydrol เพิ่มค่าอำนาจการ รายการประมาณการ งบประมาณและผลการเบิกจ่าย ระดับหน่วยงาน Log out

## การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบริหารจัดการน้ำ  
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

แบบฟอร์มการรายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง และ ผลการปฏิบัติงาน

ชื่องาน / ประมาณการ

(1.7) โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2563 ส่วนบริหาร  
จัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ค้นหาที่อยู่จากชื่อตำบล

ตำบล ถนนนคร

โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง

กรณีสั่งงานจ้างเหมา

วันอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง 13/01/2563  ลงวันที่

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  ลงวันที่

ราคากลาง 0  บาท

งานจ้างเหมา / จ้างที่ปรึกษา

งานดำเนินการเอง

กรณีสั่งงานดำเนินการเอง

วิธีการจัดหา --กรณาระบบ--

วันประกาศTOR  ลงวันที่

วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ส่งหนังสือเชิญชวน  ลงวันที่
