



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๓๐๖/ ๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ผง.

๓๒๓๒๐๗

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ ออช. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันมาด้วยแล้ว

(นางสาววราภรณ์ ทิตพงษ์ศรีจร)

ผตป.ผง.

เรียน ออช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕

- ทราบ

- เรียน ผอ.ชวน, ผอ.ร.ภค., ทน.๑-๓ผอ.
|| ลว พทท.ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันต์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 7 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 100,640.58 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 44,711.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.43 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 14,479 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 644 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.45 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 823 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.68 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7,984 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.14 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4,876 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.68 และยกเลิก จำนวน 152 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.05 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 77,143.43 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 31,249.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.51 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,215.93 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,922.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.35 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 69,927.50 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 27,327.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.08 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,554 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 23 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.24 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 134 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.40 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7,346 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.89 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,908 รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.97 และยกเลิก จำนวน 143 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.50 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น

2. งบเงินกู้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 6,112.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.17 งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 160.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 107.01 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 53.92 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 5,010.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.40 จำนวน รายการทั้งสิ้น 1,068 รายการ (รายการเงินกู้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 1,067 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 427 รายการ คิดเป็นร้อยละ 39.98 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 638 รายการ คิดเป็นร้อยละ 59.74 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.28 ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เนื่องจากราษฎรบางรายเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ และเกิดข้อพิพาทเรื่องมรดก เนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่ดินได้

3. งบกลาง พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 4,605.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 2,848.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.86 มีจำนวนรายการ 1,188 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 88 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.41 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,098 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.42 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 เนื่องจากมีการแก้ไขสถานที่ดำเนินการจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

4. งบกลาง พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 1,642.31 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 7.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 มีจำนวนรายการ 644 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรร งบประมาณจากสำนักงบประมาณจำนวน 621 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.43 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.24 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.33

5. เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 งบประมาณ จำนวน 4,224.82 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,808.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.15 มีจำนวนรายการ 384 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.95 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 362 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 94.27 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น ดำเนินการแล้ว

6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 806.12 ล้านบาท เบิกจ่าย 150.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.65 มีจำนวนรายการ 1,541 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 681 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.19 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 860 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.81

7. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 533.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.07 มีจำนวนรายการ 100 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 89 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.00 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.00 คือ รายการ จัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ระยะที่ 2 เนื่องจากการก่อสร้างจะมีผลกระทบกับการเพาะปลูกพืชผลทางการ เกษตรของเกษตรกร



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน


ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

รายละเอียดข้อมูล



- 1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)
 - 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - 2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง
 - 2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง
 - 2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลิตภัณฑ์/โครงการ
 - 2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - 2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
 - 2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
 - 2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - 2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565
- 3 งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการเงินฟิวเจอร์ธุรกิจและสังคมของประเทศไทย (เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 6 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณแหล่งงบประมาณ พ.ศ. 2565





รายละเอียดงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)				หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
รวมทั้งสิ้น	100,640.58	44,714.02	44.43	14,479	644	823	7,984	4,876
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (กรมบัญชีกลาง)	77,143.43	31,249.63	40.51	9,554	23	134	7,346	1,908
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,215.93	3,922.08	54.35	9,554	23	134	7,346	1,908
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	69,927.50	27,327.55	39.08	1,068			427	638
2. งบเงินกู้ยืมเงินเพื่อปี พ.ศ. 2565	11,283.76	6,112.06	54.17					
3. งบกลาง พ.ศ. 2564	4,605.14	2,848.96	61.86	1,188			88	1,098
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	3,419.87	1,940.27	56.74	1,117			65	1,050
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับบริการแก้ไขปัญหายุทธภัยและภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	426.47			24			24	
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183.31	390.96	33.04	44			31	13
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564	1,562.30	1,483.98	94.99	1,046			7	1,037
- โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานางบาล	94.70	0.10	0.11	1			1	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9 พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร จังหวัดเพชรบุรี	83.09	35.32	42.51	1			1	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	70.00	29.91	42.73	1			1	
3.2 โครงการอื่นนอกเหนือจากพระราชดำริ (งบปร.) ประจำปี พ.ศ. 2564	1,185.27	908.69	76.67	71			23	48
4. งบกลาง พ.ศ. 2565	1,642.31	7.72	0.47	644	621	8	15	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565	1,162.04			621	621			
- โครงการอื่นนอกเหนือจากพระราชดำริ (งบปร.) ประจำปี 2565	480.27	7.72	1.61	23			15	
5. เงินกู้ ประจำปี พ.ศ. 2564	4,224.82	3,808.76	90.15	384			19	362
6. เงินหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565	806.12	150.32	18.65	1,541		681		860
7. จีทูบีที่ต้น ประจำปี พ.ศ. 2565	935.00	533.57	57.07	100			89	10



หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายยังเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณทำให้ระบบ New GFMS Thai ยังไม่เสถียร

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

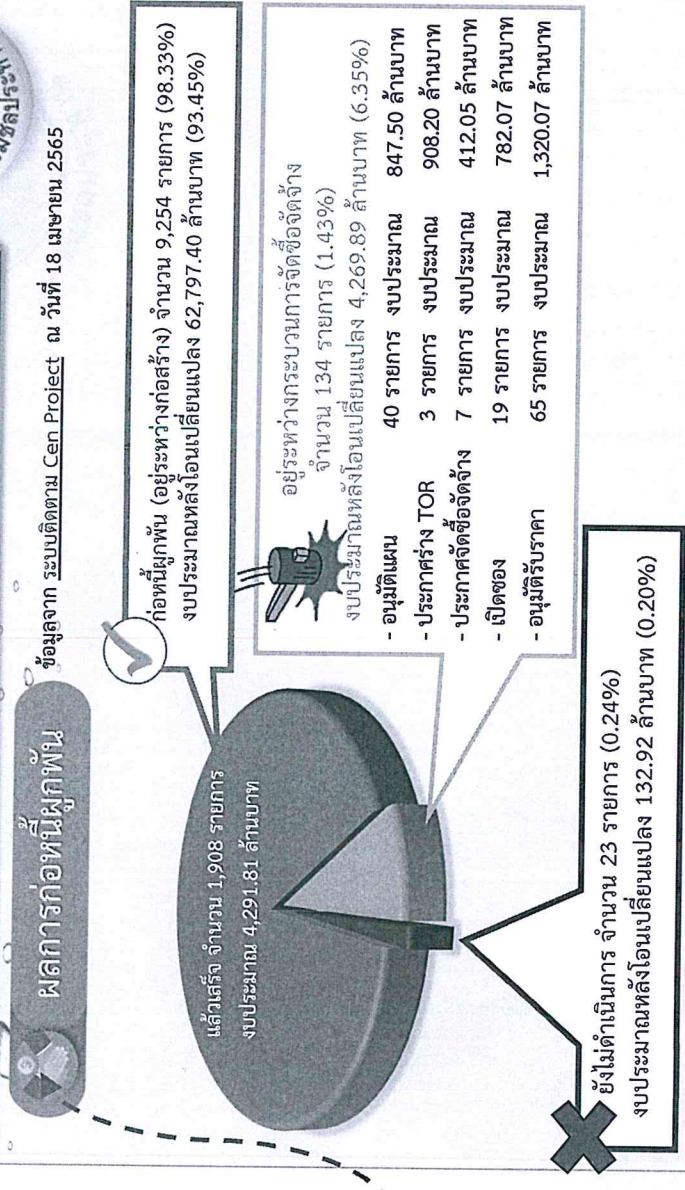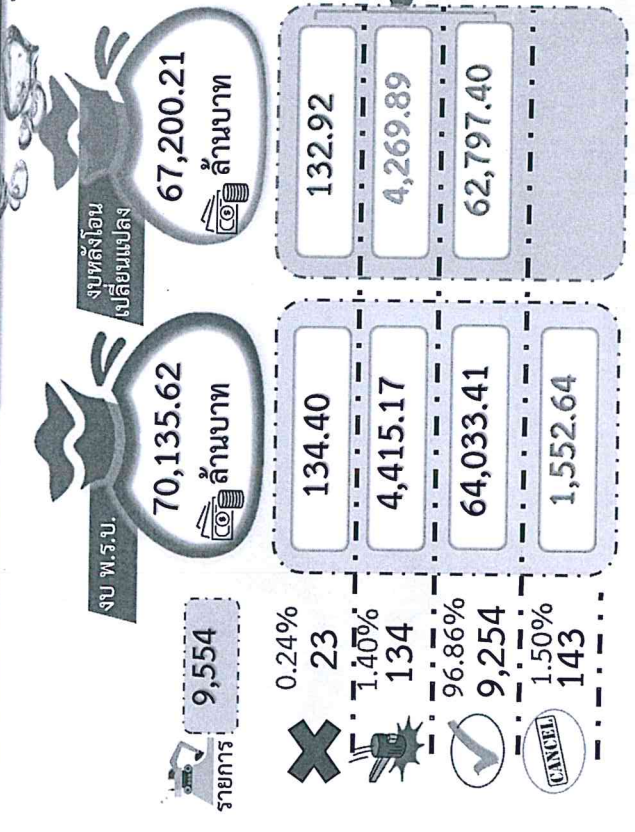

ยังไม่ดำเนินการ
✓ ก่อหนี้ผูกพัน
CANCEL ยกเลิก

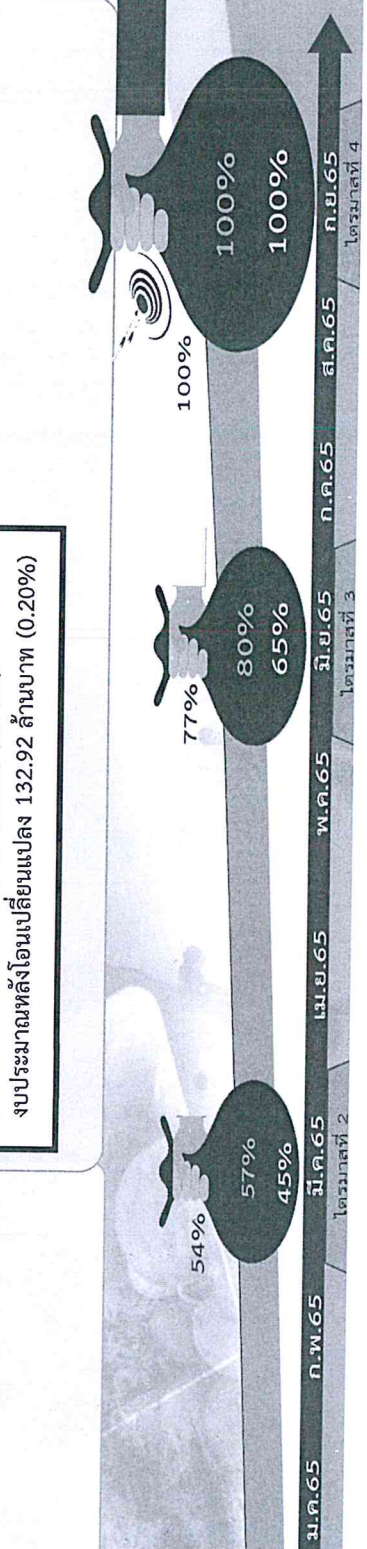

กรมชลประทาน

ข้อมูลจาก ระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

สรุปผลการก่อสร้างผู้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามลำน้ำ/กอง

2.2


งบลงทุน

ประเภทงบลงทุน	ยังไม่ส่งงบฯ		ส่งงบฯแล้ว		งบลงทุน		งบลงทุน		งบลงทุน		รวม	
	จำนวนรายการ	มูลค่า	จำนวนรายการ	มูลค่า	จำนวนรายการ	มูลค่า	จำนวนรายการ	มูลค่า	จำนวนรายการ	มูลค่า		
สบข. 1	1		2	3.04	361	1,900.95	363	1,593.98			363	1,593.98
สบข. 2					460	1,836.59	460	1,836.59			460	1,836.59
สบข. 3			2	41.00	340	2,276.07	342	2,317.07			342	2,317.07
สบข. 4	4	19.97			487	1,026.90	493	1,057.16			493	1,057.16
สบข. 5					601	2,691.24	601	2,691.24			601	2,691.24
สบข. 6					514	2,580.80	514	2,580.80			514	2,580.80
สบข. 7					503	2,208.59	503	2,208.59			503	2,208.59
สบข. 8			4	283.47	557	3,673.54	561	3,957.01			561	3,957.01
สบข. 9			3	55.00	674	2,276.68	677	2,331.68			677	2,331.68
สบข. 10	9	6.35	20	149.69	563	1,174.31	592	1,330.34			592	1,330.34
สบข. 11	1	0.11	9	410.50	545	1,092.04	555	1,502.65			555	1,502.65
สบข. 12			6	255.90	635	2,063.73	641	2,319.63			641	2,319.63
สบข. 13			6	18.90	628	2,070.49	634	2,089.40			634	2,089.40
สบข. 14			18	112.53	278	3,150.12	296	3,262.65			296	3,262.65
สบข. 15	1	0.32	14	282.70	429	1,508.93	444	1,791.94			444	1,791.94
สบข. 16			9	342.35	582	2,654.32	591	2,996.67			591	2,996.67
สบข. 17			2	16.50	225	628.33	227	644.83			227	644.83
สบข. รวม	7	106.06	5	601.33	161	10,954.79	173	11,662.19			173	11,662.19
รวม			10	1,259.00	162	10,896.60	167	12,156.60			167	12,156.60
งบลงทุน	1	0.12	10	224.11	194	468.07	205	692.30			205	692.30
งบลงทุน			210	734.19	42	528.08	42	528.08			42	528.08
งบลงทุน			6	69.00	27	490.33	33	559.33			33	559.33
งบลงทุน			3	54.00	7	322.65	10	376.65			10	376.65
งบลงทุน			2	47.58	38	137.54	38	137.54			38	137.54
งบลงทุน			2	47.58	3	4.71	4	82.68			4	82.68
งบลงทุน			6	33.01	33	3,372.69	39	3,405.70			39	3,405.70
รวม			23	132.92	134	4,269.89	141	4,679.40			141	4,679.40
Lump Sum												
รวม			23	132.92	134	4,269.89	141	4,679.40			141	4,679.40



- ก่อสร้างผู้ผูกพัน 9,254 รายการ
- อนุมัติรับราคา 65 รายการ
- เปิดซอง 19 รายการ
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ
- ประกาศจ้าง TOR 3 รายการ
- อนุมัติแผน 40 รายการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 23 รายการ

ยังไม่ก่อสร้าง ผู้ผูกพัน 157 รายการ



สบข. 1 สบข. 2 สบข. 3 สบข. 4 สบข. 5 สบข. 6 สบข. 7 สบข. 8 สบข. 9 สบข. 10 สบข. 11 สบข. 12 สบข. 13 สบข. 14 สบข. 15 สบข. 16 สบข. 17 กทข. สบอ. สดก. สดข. สดค. สดก. สดค. สดพ. งบลงทุน

2.3


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบสิ้นปีโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		จำนวนรายการ	งบสิ้นปีโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	ทำข้อมูลทัน					
						จำนวนรายการ	งบสิ้นปีโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบสิ้นปีโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)			อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
												0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,582.98	67,200.21	25,499.78	37.95	9,411	23	132.92	134	4,269.89	9,254	62,797.40	2,493	1,014	1,179	1,071	1,589	1,908
สพข. 1	1,606.92	1,593.98	828.58	51.98	363			2	3.04	361	1,590.95	22	32	35	62	121	89
สพข. 2	1,890.25	1,836.59	819.13	44.60	450					450	1,836.59	99	75	101	33	84	58
สพข. 3	2,334.81	2,317.07	688.59	29.72	342			2	41.00	340	2,276.07	106	44	35	41	64	50
สพข. 4	1,074.89	1,057.16	501.48	47.44	493	4	19.97	2	10.28	487	1,026.90	158	59	58	41	107	64
สพข. 5	2,640.61	2,691.24	1,211.59	45.02	601					601	2,691.24	140	59	66	71	91	174
สพข. 6	2,646.30	2,580.80	1,490.26	57.74	514					514	2,580.80	25	26	32	82	163	186
สพข. 7	2,349.87	2,308.59	1,819.55	78.82	503					503	2,308.59	11	15	42	92	141	207
สพข. 8	4,016.81	3,957.01	970.65	24.53	561	4		4	283.47	557	3,673.54	113	70	70	58	109	137
สพข. 9	2,437.91	2,331.68	990.53	42.48	677	3		3	55.00	674	2,276.68	78	87	95	138	153	123
สพข. 10	1,342.10	1,330.34	359.63	27.03	592	9	6.35	20	149.69	563	1,174.31	234	79	98	47	65	40
สพข. 11	1,572.05	1,502.65	351.85	23.41	555	1	0.11	9	410.50	545	1,092.04	332	33	27	31	69	53
สพข. 12	2,416.48	2,319.63	742.65	32.02	641	6		6	255.90	635	2,063.73	139	81	77	80	115	143
สพข. 13	2,130.91	2,089.40	708.84	33.93	634	6		6	18.90	628	2,070.49	183	109	95	62	114	65
สพข. 14	3,273.65	3,262.65	1,028.64	31.53	296	18		18	112.53	278	3,150.12	72	43	42	42	27	52
สพข. 15	1,887.06	1,791.94	409.02	22.83	444	1	0.32	14	282.70	429	1,508.93	258	26	50	23	38	34
สพข. 16	3,057.93	2,996.67	386.98	12.91	591			9	342.35	582	2,654.32	193	57	70	47	42	173
สพข. 17	682.65	644.83	194.15	30.11	227			2	16.50	225	628.33	28	24	42	45	24	62
กพท.	12,176.70	11,662.19	4,721.62	40.49	173	7	106.06	5	601.33	161	10,954.79	99	19	19	8	4	12
สพอ.	12,143.33	12,155.60	3,887.90	31.98	167			5	1,259.00	162	10,896.60	110	26	7	5	3	11
สทบ.	695.81	692.30	83.17	12.01	205	1	0.12	10	224.11	194	468.07	16	27	88	34	20	9
สศก.	742.05	734.19	423.16	57.64	210					210	734.19	20	10	12	6	19	143
สธธ.	531.51	528.08	210.72	39.90	42			6	69.00	42	528.08	15	5	12	6	2	2
สธส.	549.48	559.33	90.15	16.12	33			3	54.00	27	490.33	24	1			3	3
สธส.	376.65	376.65	101.01	26.82	10					7	322.65	4	2	4	11	6	15
สจต.	138.22	137.54	92.31	67.11	38			2	47.58	38	137.54	2	35.10				
สศท.	82.68	82.68	0.56	0.67	4					2	82.68	3	4.71				
สพท.	4.71	4.71	2.36	50.02	3					3	4.71	3					
สมค.	3,531.61	3,405.70	2,377.33	69.80	39			6	33.01	33	3,372.69	6	5	2	6	8	6
Lump Sum	249.00	249.00	7.37	2.96	3					3	249.00	3					

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 143 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,552.64 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจัดซื้อ เงินเพื่อจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 มีการเปลี่ยนแปลงที่งบประมาณทำให้ระบบ New GFMS Thai ยังไม่เสร็จ



2.4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 18 เมษายน 2565


หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดจ้าง		ทำสัญญาแล้ว							
						จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)							
										จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,582.98	67,200.21	25,499.78	37.95	9,411	23	132.92	134	4,269.89	9,254	62,797.40	2,493	1,014	1,179	1,071	1,589	1,908
โครงการเขื่อนน้ำผาง จ.พิจิตร	809.00	789.57	370.14	46.88	10					10	790	2	7			1	
โครงการลงขันน้ำตกบางบาล - บางโพธิ์ จ.พิจิตร	2,561.63	2,561.63	919.05	35.88	14			1	676.20	13	1,885.43	11					2
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน	27,126.69	26,457.34	11,015.75	41.64	615	3	5.79	24	894.35	588	25,557.20	261	97	78	88	42	22
โครงการรกรากกัญชงเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	499.74	494.74	123.89	25.04	9	1	79.78			8	414.96	7					1
โครงการรกรากกัญชงเมืองนครราชสีมาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา	789.37	1,095.37	221.83	20.25	13					13	1,095.37	9	3	1			
โครงการรกรากกัญชงอำเภอทาดใหญ่ (ระยะที่2) จังหวัดสงขลา	141.06	141.06	0.00	0.00	1					1	141.06	1					
โครงการบูรณะเขื่อนบ้านกุ่มหรือระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	99.56	43.96	40.36	91.81	3					3	43.96	2					1
โครงการบูรณะเขื่อนบ้านกุ่มน้ำท่ากุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	312.00	312.00	49.45	15.85	4					4	312.00	3	1				
โครงการบูรณะเขื่อนน้ำศรีสองพันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย	72.00	91.19	37.75	41.40	4					4	91.19	2	1				1
โครงการปรับปรุงคลองขุม - บ้าน จังหวัดสุโขทัย	275.66	275.66	5.68	2.06	6					6	275.66	4	2				
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,373.96	6,154.47	1,474.66	23.96	369			18	422.47	351	5,732.00	128	67	57	53	31	15
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	10,918.65	10,743.38	2,961.39	27.56	295	2	17.49	8	836.40	285	9,889.49	137	61	35	25	18	9
โครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	1,033.27	1,201.23	173.70	14.46	14			1	228.00	13	973.23	8	2	2	1		
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	1,298.06	859.54	510.63	59.41	12					12	859.54	8	2	1			1
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,193.40	2,163.41	916.35	42.36	745			5	257.35	740	1,906.06	140	72	108	71	155	194
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและงานชลประทาน	10,516.90	10,313.45	5,272.77	51.13	6,707	15	26.74	69	794.23	6,623	9,492.47	1,614	644	858	757	1,232	1,518
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดปราจีนบุรี	167.77	237.64	11.35	4.78	5					5	237.64	3	1				
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	108.00	108.00	0.02	0.02	2			1	100.00	1	8.00	1					
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	104.14	117.34	50.02	42.63	6					6	117.34	5			1		
โครงการอ่างเก็บน้ำคันนาคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	348.02	348.02	29.12	8.37	7					7	348.02	7					
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	637.62	637.62	490.45	76.92	5					5	637.62	4				1	
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	388.00	388.00	84.08	21.67	3	1	3.00	2		2	385.00	2					
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอกลี้น จังหวัดะเชิงเทรา	525.00	404.98	130.05	32.11	3					3	404.98	1	2				
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยร่อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	313.78	295.71	201.84	68.26	6					6	295.71	1					1
ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	969.71	964.92	409.42	42.43	553	1	0.12	7	60.88	545	905.92	132	52	38	72	108	143

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 143 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,552.64 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น
 หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายยังเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 มีการเปลี่ยนแปลงทั้งงบประมาณทำให้รวม New GFMIS Thai ยังไม่เสร็จ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.5

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

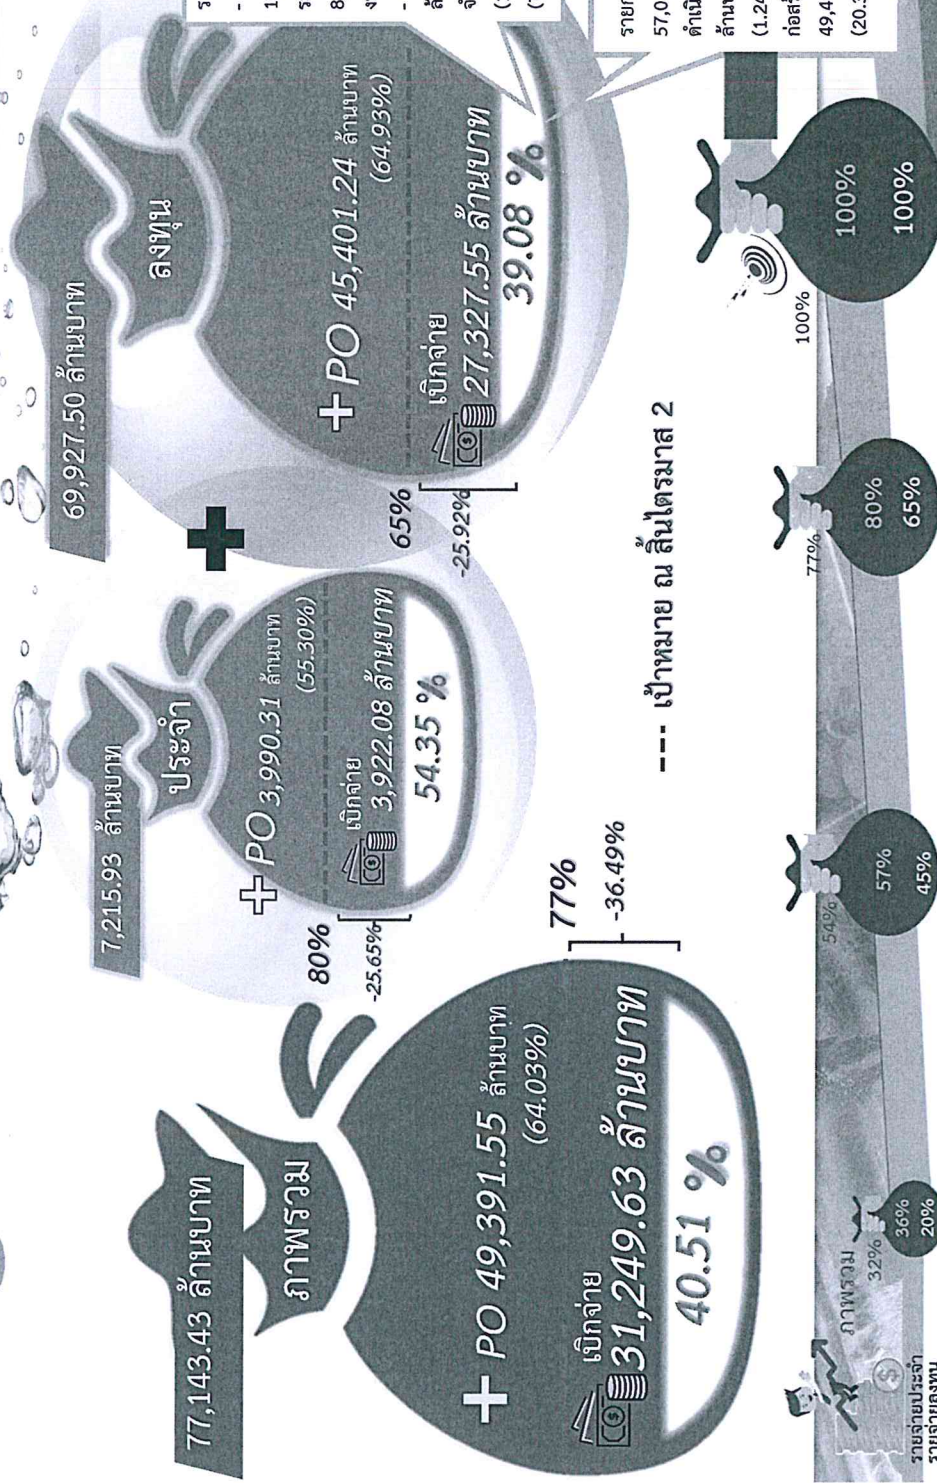


รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

- ผูกพันเดิม จำนวนทั้งสิ้น 110 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 10,701.98 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,983.38 ล้านบาท (37.22%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 87 รายการ (79.09%) แล้วเสร็จ จำนวน 23 รายการ (20.91%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,887.24 ล้านบาท (17.63%)
- ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,178.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 45.75 ล้านบาท (2.10%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (24.00%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 248.00 ล้านบาท (11.39%) โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 19 รายการ (76.00) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,930.07 ล้านบาท (88.61%)

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 9,276 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 57,047.45 ล้านบาท เบิกจ่าย 23,298.42 ล้านบาท (40.84%) โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 23 รายการ (0.25%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 132.92 ล้านบาท (0.23%) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 115 รายการ (1.24%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,339.82 ล้านบาท (4.10%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 7,253 รายการ (78.19%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 49,442.73 ล้านบาท (86.67%) และแล้วเสร็จ จำนวน 1,885 รายการ (20.32%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 5,131.98 ล้านบาท (9.00%)

--- เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 2



2.6

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 เมษายน 2565


77,143.43 ล้านบาท

ภาพรวม

เบิกจ่าย

31,249.63 ล้านบาท

40.51%

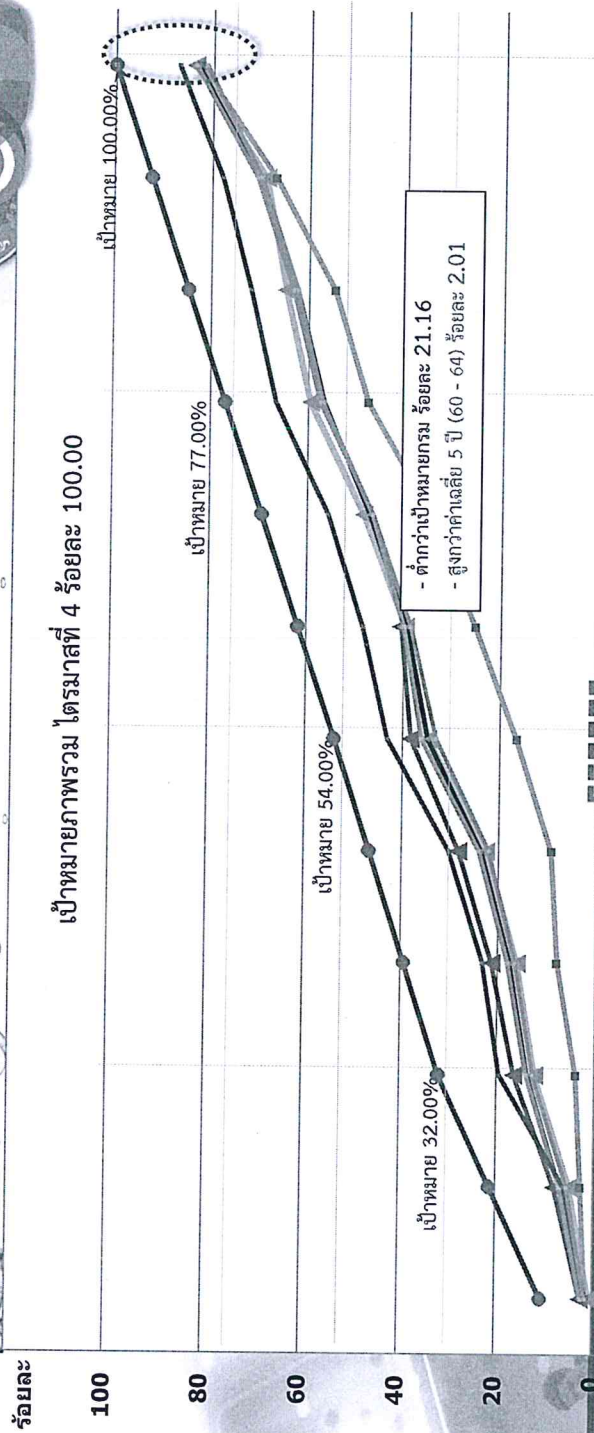

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
➔ เป้าหมายกรม ปี 65	10.67	21.34	32.00	39.33	46.66	54.00	61.67	69.34	77.00	84.67	92.34	100.00
— ผลปี 65 (77,143.43)	2.45	7.97	16.49	21.25	28.37	38.31	40.51					
— ผลปี 64 (74,106.98)	0.66	4.91	12.24	16.05	22.61	34.76	39.61	48.38	59.48	64.67	68.91	83.67
— ผลปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	7.84	9.23	16.56	25.26	34.54	47.70	54.68	66.97	82.54
— ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	83.17
— ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
— ผลปี 60 (47,004.27)	1.50	5.94	19.46	23.11	30.30	43.12	48.35	55.72	66.56	71.83	77.86	86.95
— เฉลี่ย 5 ปี (60-64)	1.46	5.43	12.62	16.50	21.98	33.08	38.50	46.47	57.49	63.16	70.82	83.54


กองแผนงาน

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

2.7

สถิติการเบิกจ่ายบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

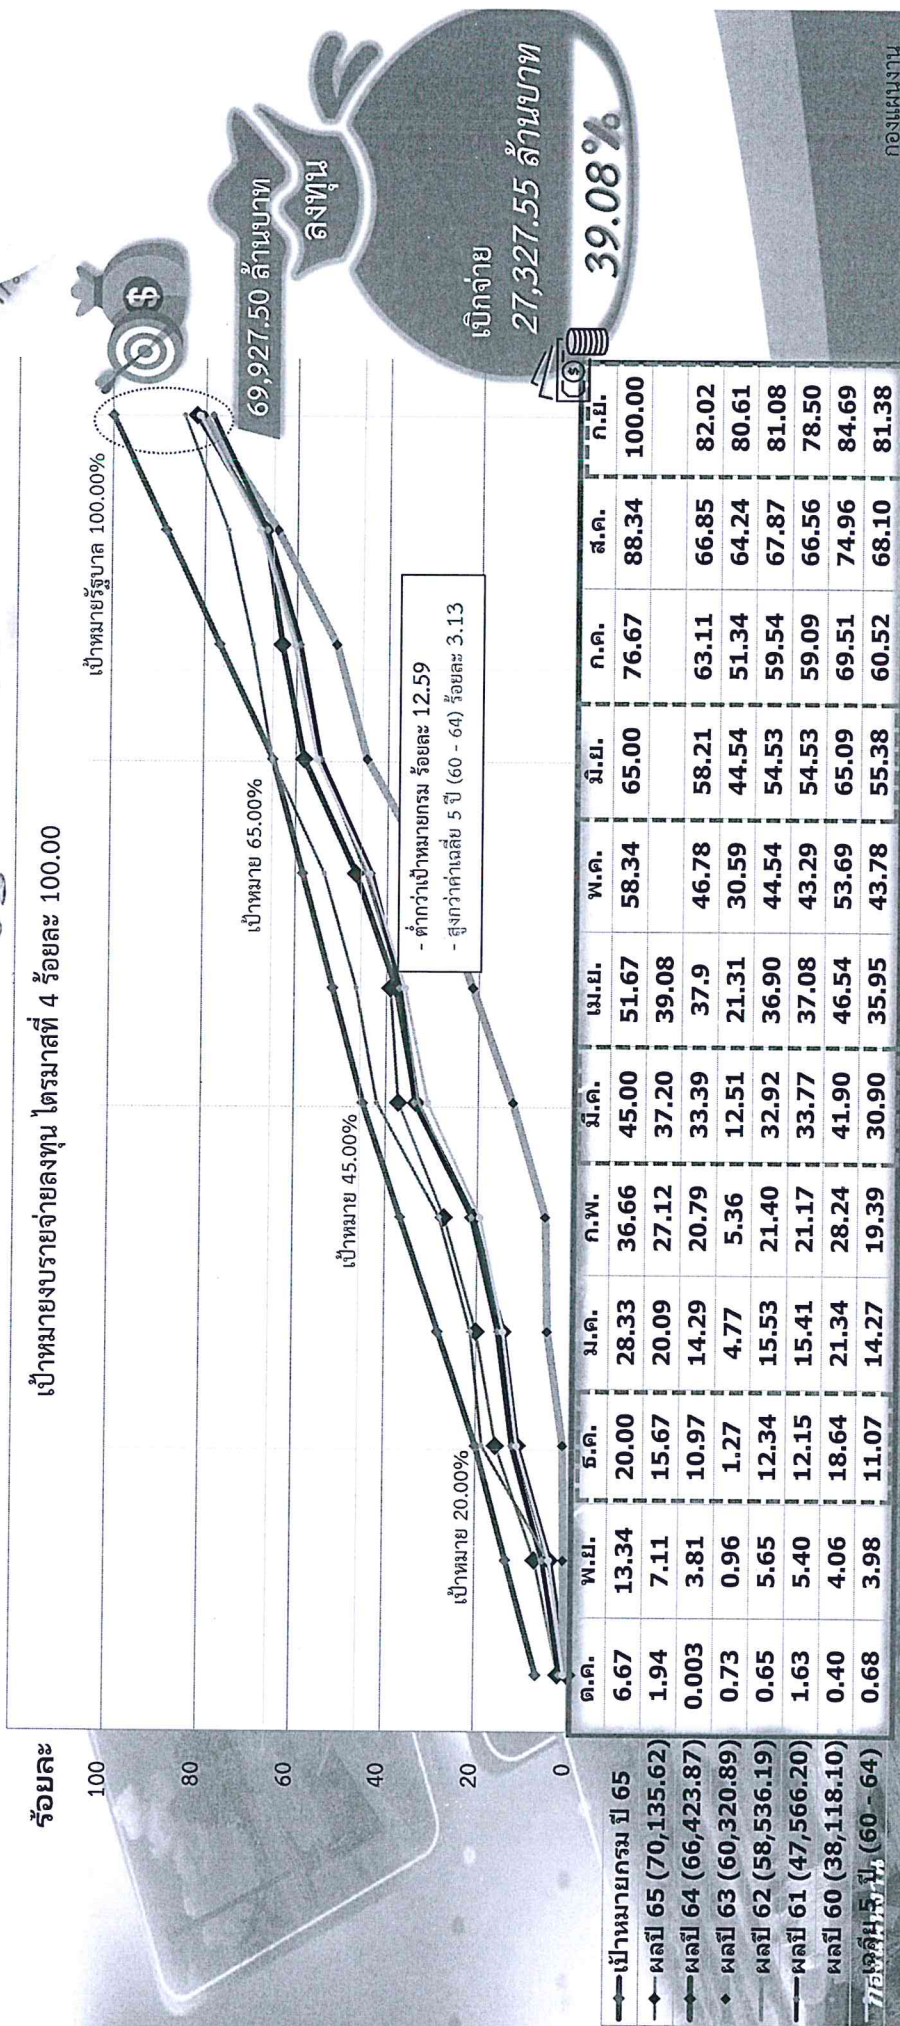

ปีงบประมาณ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายกรม ปี 65	6.67	13.34	20.00	28.33	36.66	45.00	51.67	58.34	65.00	76.67	88.34	100.00
ผลปี 65 (70,135.62)	1.94	7.11	15.67	20.09	27.12	37.20	39.08					
ผลปี 64 (66,423.87)	0.003	3.81	10.97	14.29	20.79	33.39	37.9	46.78	58.21	63.11	66.85	82.02
ผลปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	4.77	5.36	12.51	21.31	30.59	44.54	51.34	64.24	80.61
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
ผลปี 61 (47,566.20)	1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
ผลปี 60 (38,118.10)	0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69
เฉลี่ย 5 ปี (60 - 64)	0.68	3.98	11.07	14.27	19.39	30.90	35.95	43.78	55.38	60.52	68.10	81.38

2.9

ผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคูเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)							
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	75,345.36	29,170.96	38.72	72,339.58	25,851.99	35.74	2.98
2	กระทรวงคมนาคม	161,344.10	58,324.23	36.15	177,404.20	50,636.30	28.54	7.61
3	กระทรวงมหาดไทย	75,863.83	18,899.71	24.91	80,657.02	14,191.45	17.59	7.32
	ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมพัฒนาที่ดิน	1,954.56	834.52	42.70	2,140.33	1,079.33	50.43	-7.73
2	กรมชลประทาน	69,927.50	27,327.55	39.08	66,305.29	23,290.52	35.12	3.96
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,276.11	202.02	15.83	1,159.16	500.01	43.14	-27.31
	ระดับกรม (คูเทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)							
1	กรมชลประทาน	69,927.50	27,327.55	39.08	66,308.35	23,290.52	35.12	3.96
2	กรมทางหลวงชนบท	44,285.58	17,099.97	38.61	47,151.29	8,857.54	18.79	19.82
3	กรมทางหลวง	107,805.06	39,391.56	36.54	120,129.57	40,064.08	33.35	3.19
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	29,841.10	7,519.58	25.20	27,512.17	8,941.62	32.50	-7.30

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 15 เมษายน 2565

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 36.50%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (45 หน่วยงาน) เฉลี่ย 35.06%





3

งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

1,068 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายเชิงเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประมาณทำใหระบบ New GFMS Thai ยังไม่เสถียร

งบประมาณทั้งหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้
รวม 160.93 ล้านบาท 1.43 %

ผลการเบิกจ่าย

6,112.06 ล้านบาท 54.17 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

107.01 ล้านบาท 0.95 %

เหลือจ่าย/ยกเลิก

53.92 ล้านบาท 0.48 %

ภาพรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

สถานการณ์ดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,068 รายการ
(เงินกัน 1,067 รายการ โอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ

638 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

427 รายการ

ยกเลิกรายการ

3 รายการ

หมายเหตุ: รายการโอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการคือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)



คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

5,010.77 ล้านบาท

44.40 %

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก๊ซแบบ แก๊ซสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน



แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

เดือน	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม
แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95	11,283.76
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	1,330.56	866.19							6,112.06
ผลต่าง	-	-428.49	-1,221.49	-3.28	-580.67							

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย 100%

ลองแผนงาน



ผลการดำเนินงาน

มีมติ คร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี 65
รวม 2 ครั้ง จำนวน 644 รายการ

งบประมาณ 1,642.31 ล้านบาท เบิก 7.72 ล้านบาท 0.47%

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบ
กับ สบป. 621 ล้านบาท 96.43%

จัดซื้อ-จัดจ้าง
8 รายการ 1.24%

ดำเนินการก่อสร้าง
15 รายการ 2.33%

ตัวชี้วัดของโครงการ

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.
ครัวเรือน 130,288 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = - ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 1,661,922 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่

กปร.

ปี 2565

มติ ครม.
29 มี.ค. 65

กปร.

ปี 2565

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

รายการ 621 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณ

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 1,661,922 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 130,288 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำแล้งและน้ำท่วม ปี 2565

รายการ 23 ล้านบาท

เบิกจ่าย 7.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.61

1.00 %

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 15 รายการ
- จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 รายการ

ดำเนินการก่อสร้างอาคารสหระทาน จัดหาแหล่ง
น้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ
โครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ประจำปี 2565



5

เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการเงินฟูเครษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



กรมชลประทาน
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณ 4,224.82 ล้านบาท

- เบิกจ่าย 3,808.76 ล้านบาท 90.15%
- คงเหลือ 233.27 ล้านบาท 5.52%
- เหลือจ่าย 184.07 ล้านบาท 4.33%

สถานะการดำเนินงาน จำนวน 384 รายการ


- ดำเนินการ 19 รายการ = 4.95%
- แล้วเสร็จ 362 รายการ = 94.27%
- ยกเลิก 3 รายการ = 0.78%

เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่นเพื่อดำเนินการแล้ว

ตัวชี้วัดของโครงการ

- พื้นที่ชลประทาน 19,667 ไร่ = 18,667 ไร่ 94.92%
- ปริมาณน้ำ 26.98 ล้าน ลบ.ม. = 16.36 ล้าน ลบ.ม. 60.64%
- พื้นที่รับประโยชน์ 209,653 ไร่ = 185,538 ไร่ 88.50%
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 64,952 ครัวเรือน = 58,607 ครัวเรือน 90.23%
- การจัดจ้างแรงงาน 9,716 คน = 9,716 คน 100%

ผลการดำเนินงานจำแนกตามสำนัก/กอง

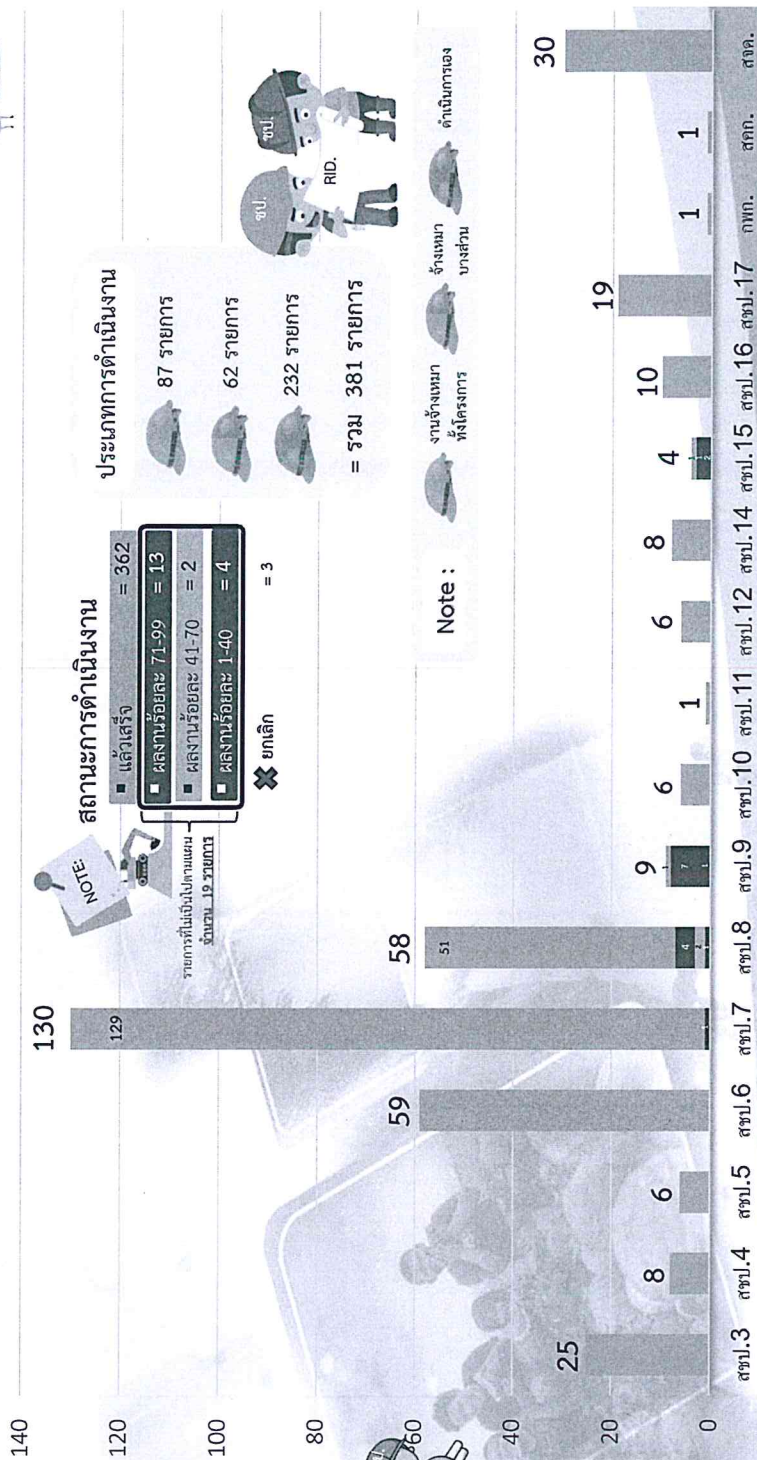

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่ สชป.6 = 2 รายการ และสชป.7 = 1 รายการ
 2. งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 184.0674 ล้านบาท เนื่องจากมีการดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว



6

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565




กรมชลประทาน


รายละเอียดผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 18 เมษายน 2565)


จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร



งานกองทุน
จัดรูปที่ดิน



ภาพรวม

งบประมาณ 935.00 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 533.57 ล้านบาท
57.07 %

ผลการดำเนินงาน : 100 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 89 รายการ
แล้วเสร็จ 10 รายการ
ยกเลิก 1 รายการ

เนื่องจากภารกิจเร่งด่วนมีผลกระทบต่อความเร่งด่วน
ให้ผลทางด้านการเกษตรของเกษตรกร

ผลสัมฤทธิ์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

- พื้นที่เกษตรกรรม 62,756 ไร่
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 5,603 ครัวเรือน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ 806.12 ล้านบาท
งบจัดสรร 668.90 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 150.32 ล้านบาท 18.65%

ผลการดำเนินงาน : 1,541 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 681 รายการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 860 รายการ

เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน



กองแผนงาน



รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณ ทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2565 (บาท)	สถานะดำเนินการ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 157 รายการ			12,269,858,600	4,549,570,600	
1	กพท.	(1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง) - [9550]	โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	งานปีเดียว	79,780,000	79,780,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
2	กพท.	(1.1) คำสำรวจออกแบบ - [9533]	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
3	กพท.	(230) ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบโครงการประตุ ระบายน้ำคลองกลายบ้านนาถุน ตำบลสระแก้วอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9490]	โครงการป้องกันและบรรเทา ภัยจากน้ำ	งานผูกพันใหม่	688,000,000	137,600,000	5.เปิดซอง
4	กพท.	(229) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไม่ ตำบลแดน สงวนอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - [9489]	โครงการป้องกันและบรรเทา ภัยจากน้ำ	งานผูกพันใหม่	350,000,000	70,000,000	6.อนุมัติรับราคา
5	กพท.	(228) ประตุระบายน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรั้ว อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา - [9488]	โครงการป้องกันและบรรเทา ภัยจากน้ำ	งานผูกพันใหม่	510,900,000	102,180,000	6.อนุมัติรับราคา
6	กพท.	(202) อาคารประกอบคลองระบายน้ำ โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเลียง(ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง - [9462]	โครงการป้องกันและบรรเทา ภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	15,900,000	15,900,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
7	กพท.	(1.12) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองระบายน้ำคลองห้วยพร้อม อาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบล คลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา - [9232]	โครงการป้องกันและบรรเทา ภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	1,588,900	1,588,900	1.ยังไม่ดำเนินการ
8	กพท.	(367) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บ น้ำยะรม จังหวัดยะลา - [9013]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	687,750,000	137,550,000	5.เปิดซอง
9	กพท.	(365) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน (ระยะที่ 2) ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [9011]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	770,000,000	154,000,000	6.อนุมัติรับราคา
10	กพท.	(1.21) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพรวัว จังหวัดตราด - [8628]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,575,000	1,575,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
11	กพท.	(1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด - [8626]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	2,521,700	2,521,700	1.ยังไม่ดำเนินการ
12	กพท.	(1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 28.380 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์ - [8625]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,695,700	1,695,700	1.ยังไม่ดำเนินการ
13	สมค.	(22) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัด สระแก้ว - [8600]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	99,695,200	99,695,200	2.อนุมัติแผน
14	สมค.	(11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัด จันทบุรี - [8589]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	62,292,400	62,292,400	2.อนุมัติแผน
15	สมค.	(1.12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัด อ่างทอง - [8560]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	598,500	598,500	2.อนุมัติแผน
16	สมค.	(1.8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัด มุกดาหาร - [8556]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	5,477,200	5,477,200	2.อนุมัติแผน
17	สมค.	(1.5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัด นครราชสีมา - [8553]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	6,160,000	6,160,000	2.อนุมัติแผน
18	สมค.	(1.2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัด ฉะเชิงเทรา - [8550]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	2.อนุมัติแผน
19	สขป. 1	(1.1537) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของ เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [3729]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
20	สขป. 1	(1.1434) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำไผ่อย่าง โครงการ ชลประทานลำพูน ปริมาณดิน 35,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทาบลา ดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน - [3626]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,035,000	2,035,000	6.อนุมัติรับราคา
21	สขป. 10	(19) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(วังแฉม) ปริมาณดิน 691,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสะเมิง จังหวัดลพบุรี - [8459]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	28,060,900	28,060,900	2.อนุมัติแผน

ที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณ ทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2565 (บาท)	สถานะดำเนินการ
22	สขป. 10	(1.6092) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [8284]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
23	สขป. 10	(1.4260) ซ่อมแซมโครงการชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเล้า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [6452]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
24	สขป. 10	(1.4253) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสระบุรี จังหวัดสระบุรี - [6445]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	2.อนุมัติแผน
25	สขป. 10	(1.4196) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี - [6388]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	2.อนุมัติแผน
26	สขป. 10	(1.4180) ซ่อมแซมตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ข.ส.6 กม.2+500-กม.4+000 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [6372]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,680,000	2,680,000	6.อนุมัติรับราคา
27	สขป. 10	(1.4179) ซ่อมแซมตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ข.ส.6 กม.0+300-กม.1+560 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [6371]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,620,000	2,620,000	6.อนุมัติรับราคา
28	สขป. 10	(1.4178) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ส.4 ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ กม.0+070-5+420 ความยาว 5.350 กิโลเมตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [6370]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,400,000	3,400,000	6.อนุมัติรับราคา
29	สขป. 10	(1.4097) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ จังหวัดสระบุรี - [6289]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
30	สขป. 10	(1.4094) ซ่อมแซมคันดินคลองส่งน้ำ 2 ขวา กม.3+000 ถึง กม.5+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลหนองนก้า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [6286]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
31	สขป. 10	(1.4093) ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบาย ประตูคลองหัวขี้ผึ้ง ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [6285]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000	2,500,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
32	สขป. 10	(1.4085) ซ่อมแซมคันคลองทวารสายบน ฝั่งขวา กม.7+000 ถึง กม.9+000 (เป็นช่วงๆ) จังหวัดสระบุรี - [6277]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	940,000	940,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
33	สขป. 10	(1.4076) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [6268]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	5.เปิดซอง
34	สขป. 10	(1.4067) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ฝั่งขวา กม.12+856 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [6259]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	280,000	280,000	2.อนุมัติแผน
35	สขป. 10	(1.4065) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา ฝั่งซ้าย กม.2+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - [6257]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	280,000	280,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
36	สขป. 10	(1.4063) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา ฝั่งขวา กม.2+335 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - [6255]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	280,000	280,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
37	สขป. 10	(1.4005) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี - [6197]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
38	สขป. 10	(1.3979) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเชิงราง จังหวัดสระบุรี - [6171]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	2.อนุมัติแผน
39	สขป. 10	(1.3923) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ - [6115]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	2.อนุมัติแผน

ที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณ ทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2565 (บาท)	สถานะดำเนินการ
40	สขป. 10	(1.3883) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท - [6075]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
41	สขป. 10	(1.1263) ขุดลอกตะกอนดินจั้งเหมา ฝ่ายศรีจันทร์ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ปริมาณดิน 90,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าอัญญา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ - [3455]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	6.อนุมัติรับราคา
42	สขป. 10	(1.1259) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจั้งเหมาคลองส่งน้ำสาย 5 กม. 0+000-กม. - 1+500 ปริมาณดิน 7,300 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี - [3451]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	360,000	360,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
43	สขป. 10	(34) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-4R-MC ฝ่ายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลลานป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 3.965 กิโลเมตร - [2163]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	10,949,000	10,949,000	6.อนุมัติรับราคา
44	สขป. 10	(33) ปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณหัวงาน โครงการอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร ตำบลกุดตาเพชร อำเภอสำราญ จังหวัดลพบุรี - [2162]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	13,000,000	13,000,000	2.อนุมัติแผน
45	สขป. 10	(32) ซ่อมแซมถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย ความยาว 4.487 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลพุทไธยา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [2161]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	21,000,000	21,000,000	6.อนุมัติรับราคา
46	สขป. 10	(31) ปรับปรุงถนนลาดยางทางฝั่งน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงราก ความยาว 9.600 กม. ตำบลสีนํ้าราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [2160]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	6.อนุมัติรับราคา
47	สขป. 10	(1.37) ซ่อมแซมถนนลาดยางคันโอป ปตร.บางแก้ว ความยาว 0.48 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง - [2098]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,700,000	1,700,000	6.อนุมัติรับราคา
48	สขป. 10	(1.159) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชัยนาท-อยุธยา กม.7+000 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลลุดลูก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [1915]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	6.อนุมัติรับราคา
49	สขป. 11	(121) ก่อสร้าง ปตร.และสถานีสูบน้ำบางเตย ตำบลหรรณวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม - [9381]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	90,000,000	90,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50	สขป. 11	(1.4295) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [6487]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	2.อนุมัติแผน
51	สขป. 11	(1.4293) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ - [6485]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	2.อนุมัติแผน
52	สขป. 11	(1.4292) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - [6484]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
53	สขป. 11	(1.164) ปรับปรุงก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางแก กม.7+700 ของคันกั้นน้ำสายบางไทร-เสนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [1920]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,500,000	4,500,000	2.อนุมัติแผน
54	สขป. 11	(1.163) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากคลอง 14 (สายกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - [1919]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	7,000,000	7,000,000	2.อนุมัติแผน
55	สขป. 11	(33) เชื้อนป้องกันคั้งและขุดลอกคลองลัดโพธิ์ ทั้ง 2 ฝั่งระยะทาง 100 เมตร ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ - [1660]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	220,000,000	220,000,000	2.อนุมัติแผน
56	สขป. 11	(22) ปรับปรุง ปตร.คลองจระเข้ข้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองประเวศ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [928]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	21,000,000	21,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57	สขป. 11	(58) ก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางภูมิ โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [774]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	65,000,000	65,000,000	2.อนุมัติแผน

ที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณ ทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2565 (บาท)	สถานะดำเนินการ
58	สขป. 12	(141) อาคารป้องกันตลิ่งคลองโพ ระยะทาง 8.00 กิโลเมตร ตำบลไม้เขียวอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี - [9401]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	100,000,000	100,000,000	6.อนุมัติรับราคา
59	สขป. 12	(82) แก้มลิงตอนใหญ่ ปริมาตรเก็บกักไม่น้อยกว่า 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - [9146]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	6.อนุมัติรับราคา
60	สขป. 12	(293) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ บ้านเขาอน้อย ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี - [8939]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	6.อนุมัติรับราคา
61	สขป. 12	(1.5049) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - [7241]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
62	สขป. 12	(37) ปรับปรุงผิวจราจรแถมลิงเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี - [2166]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	6.อนุมัติรับราคา
63	สขป. 12	(37) ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำท่ากวย ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - [1664]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	6.อนุมัติรับราคา
64	สขป. 13	(1.171) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง ค-ส-ร. 11ซ้าย-ท่าสาร-บางปลา กม.2+400 ขนาด 6.00 x 27.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม - [1927]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000	3,500,000	2.อนุมัติแผน
65	สขป. 13	(1.102) บำรุงรักษาทางลัดใหญ่ คลอง 1R-3L-1R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สขป.13 ระยะทาง 8.400 กม. ตำบลเขาสวนลือภัย อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี - [1858]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	902,200	902,200	6.อนุมัติรับราคา
66	สขป. 13	(1.521) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเทียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 67,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี - [1461]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	6.อนุมัติรับราคา
67	สขป. 13	(1.94) ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 4ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี - [662]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	2.อนุมัติแผน
68	สขป. 13	(1.93) ปรับปรุงท่อลอดถนน ค-ส-ร.1ขวา-นครชัยศรี กม.5+500 ของคันกันน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี - [661]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	2.อนุมัติแผน
69	สขป. 13	(1.92) ปรับปรุงท่อรับน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายน้ำสายใหญ่ ท่าสาร-บางปลา กม.8+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม - [660]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	2.อนุมัติแผน
70	สขป. 14	(183) โครงการเขื่อนป้องกันกัดเซาะตลิ่งคลองหลังสวนฝั่งซ้าย และฝั่งขวา(ชุมชนบ้านพะเนียด) ม.3 ตำบลหินเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร - [9443]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	56,620,000	56,620,000	2.อนุมัติแผน
71	สขป. 14	(31) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจำเริญ อ่างเก็บน้ำปริมาณ 501,000ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จุดที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [8471]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000	20,000,000	6.อนุมัติรับราคา
72	สขป. 14	(1.5549) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [7741]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
73	สขป. 14	(1.5460) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [7652]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	970,000	970,000	6.อนุมัติรับราคา
74	สขป. 14	(1.56) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 60ซ้าย และ 61ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.370 กม. - [2117]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,860,000	1,860,000	6.อนุมัติรับราคา
75	สขป. 14	(1.55) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 44ซ้าย-4ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลลาดชะโด อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.520 กม. - [2116]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,100,000	2,100,000	6.อนุมัติรับราคา

ที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณ ทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2565 (บาท)	สถานะดำเนินการ
76	สขป. 14	(1.54) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 41ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.655 กม. - [2115]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,270,000	2,270,000	6.อนุมัติรับราคา
77	สขป. 14	(1.53) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 34 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระชาย อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. - [2114]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,080,000	2,080,000	6.อนุมัติรับราคา
78	สขป. 14	(1.52) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 22ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.120 กม. - [2113]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,950,000	1,950,000	6.อนุมัติรับราคา
79	สขป. 14	(1.51) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-5ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.480 กม. - [2112]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000	2,500,000	6.อนุมัติรับราคา
80	สขป. 14	(1.50) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-4ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. - [2111]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,540,000	2,540,000	6.อนุมัติรับราคา
81	สขป. 14	(1.49) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-2ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.700 กม. - [2110]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,850,000	2,850,000	6.อนุมัติรับราคา
82	สขป. 14	(1.46) ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณทางานอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม ความยาว 1,200 ม. โครงการชลประทานประจวบประจวบคีรีขันธ์ ตำบลเขาถ้ำ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [2107]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	2.อนุมัติแผน
83	สขป. 14	(1.45) ซ่อมแซมถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 420 เมตร ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [2106]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	2.อนุมัติแผน
84	สขป. 14	(1.110) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 8ขวา พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำอ่างหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [678]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	2.อนุมัติแผน
85	สขป. 14	(1.109) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 7ขวา พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำอ่างหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [677]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,500,000	4,500,000	2.อนุมัติแผน
86	สขป. 15	(113) แก้มลิงคลองบ่อใต้ ปริมาณเก็บกัก 0.450 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [9177]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	6.อนุมัติรับราคา
87	สขป. 15	(70) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน ความจุ 8.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9134]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	90,000,000	90,000,000	6.อนุมัติรับราคา
88	สขป. 15	(234) ฝ่ายคลองคูหาสวรรค์พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 1,085 ไร่ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [8880]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	51,095,000	51,095,000	6.อนุมัติรับราคา
89	สขป. 15	(162) อ่างเก็บน้ำสำนักสงฆ์ร่มไทร ปริมาณเก็บกัก 0.020 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลประแสง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [8808]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	18,000,000	18,000,000	6.อนุมัติรับราคา
90	สขป. 15	(1.5690) อาคารบังคับน้ำเหมืองนายปลัด ขนาด 2.00x2.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน จังหวัดนครศรีธรรมราช - [7882]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,200,000	3,200,000	6.อนุมัติรับราคา
91	สขป. 15	(1.5597) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [7789]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	2.อนุมัติแผน
92	สขป. 15	(1.5596) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทาน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [7788]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	2.อนุมัติแผน

ที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณ ตั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2565 (บาท)	สถานะดำเนินการ
93	สขป. 15	(1.1333) โครงการขุดลอกคลองชักน้ำสาย 1 ด้วยรถขุดข้างเขมา ปริมาณดินขุด 280,710 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [3525]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	7,500,000	7,500,000	2.อนุมัติแผน
94	สขป. 15	(45) ปรับปรุงผิวจราจรถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย RMC ฝ่ายคลองไม้เสียบระยะทาง 9.165 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเกาะขันธุ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [2174]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000	50,000,000	6.อนุมัติรับราคา
95	สขป. 15	(1.127) อาคารป้องกันการกัดเซาะท้าย ปตร.คลองชะอวด-แพรง เมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [695]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000	1,200,000	6.อนุมัติรับราคา
96	สขป. 15	(1.125) ปรับปรุงท่อลอดถนน MD1 กม.6+120 - กม. 6+840 ไม้เสียบขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [693]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	6.อนุมัติรับราคา
97	สขป. 15	(1.124) อาคารบังคับน้ำเหมืองนียงทั้ง ขนาด 2.00x2.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [692]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,200,000	3,200,000	6.อนุมัติรับราคา
98	สขป. 15	(1.453) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ พื้นที่ MC2 กม. 0+000 ถึง 4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [541]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,500,000	8,500,000	6.อนุมัติรับราคา
99	สขป. 15	(1.288) อาคารที่ทำการส่วนแผนงาน ภายในที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [376]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000	4,000,000	3.ประกาศสร้าง TOR
100	สขป. 16	(195) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำฝายคลองหลักสาม และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [9455]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	100,000,000	100,000,000	2.อนุมัติแผน
101	สขป. 16	(305) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ บ้านทุ่งตำเสา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - [8951]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000	35,000,000	6.อนุมัติรับราคา
102	สขป. 16	(53) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองหลักสาม โครงการชลประทานพัทลุงระยะทาง 3.000 กม. ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - [2182]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	26,000,000	26,000,000	6.อนุมัติรับราคา
103	สขป. 16	(52) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ LMC1 (พญาไย) และ 1L-LMC1 (พญาไย) โครงการชลประทานพัทลุง ระยะทาง 6.400 กม. อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - [2181]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	6.อนุมัติรับราคา
104	สขป. 16	(51) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ 1R-1R-RMC (ควนกุฎิ) โครงการชลประทานพัทลุง ระยะทาง 6.200 กม. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [2180]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	6.อนุมัติรับราคา
105	สขป. 16	(50) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ 1R-RMC (ควนกุฎิ) โครงการชลประทานพัทลุง ระยะทาง 8.000 กม. อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [2179]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	48,000,000	48,000,000	6.อนุมัติรับราคา
106	สขป. 16	(49) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ LMC (ควนกุฎิ) โครงการชลประทานพัทลุง ระยะทาง 8.200 กม. อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [2178]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	49,000,000	49,000,000	6.อนุมัติรับราคา
107	สขป. 16	(1.43) ปรับปรุงระบบ Mecchtronics operate โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำเริญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา - [983]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	1,950,000	1,950,000	6.อนุมัติรับราคา
108	สขป. 16	(1.41) ปรับปรุงระบบ Mecchtronics operate โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา - [981]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	2,400,000	2,400,000	6.อนุมัติรับราคา

ที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณ ทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2565 (บาท)	สถานะดำเนินการ
109	สขป. 17	(1.186) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ คลองระบายน้ำ D1-11.3R กม. 8+347 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี - [1942]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,500,000	4,500,000	6.อนุมัติรับราคา
110	สขป. 17	(32) อาคารบังคับน้ำบ้านควนกะลาทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี - [938]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000	12,000,000	5.เปิดซอง
111	สขป. 3	(23) แก้มลิงบังมาย ระยะที่ 1 ปริมาตรเก็บกัก 0.99 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลคานแม่คำมัน อำเภอปลวกแดง จังหวัดอุตรดิตถ์ - [9087]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000	40,000,000	5.เปิดซอง
112	สขป. 3	(1.1875) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ - [4067]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
113	สขป. 4	(1.1122) ขุดลอกตะกอนทราย โดยรถขุดดำเนินการเอง หน้าฝายตื้นใหญ่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ปริมาณดิน 117,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร - [3314]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
114	สขป. 4	(1.1121) ขุดลอกตะกอนทราย โดยรถขุดดำเนินการเอง หน้า ประตูหินชะลอก โครงการชลประทานกำแพงเพชร ปริมาณดิน 117,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร - [3313]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
115	สขป. 4	(1.1120) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสายซอย 1R-MCหนองขวัญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวิียง-หนองขวัญ ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - [3312]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,570,000	1,570,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
116	สขป. 4	(1.1119) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสายใหญ่ MC หนองขวัญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวิียง-หนองขวัญ ปริมาณดิน 185,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - [3311]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,400,000	8,400,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
117	สขป. 4	(1.9) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC (Para Asphalt Concrete) อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ระยะทาง 1.328 กิโลเมตร ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก - [2070]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,530,000	3,530,000	2.อนุมัติแผน
118	สขป. 4	(1.8) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC (Para Asphalt Concrete) อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ระยะทาง 2.535 กิโลเมตร ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก - [2069]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	7,710,000	7,710,000	2.อนุมัติแผน
119	สขป. 10	(1.1484) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดลพบุรี - [3676]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	460,800	460,800	1.ยังไม่ดำเนินการ
120	สขป. 14	(1.1477) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเพชรบุรี - [3669]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	49,100	49,100	2.อนุมัติแผน
121	สขป. 11	(1.1471) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดปทุมธานี - [3663]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	111,600	111,600	1.ยังไม่ดำเนินการ
122	สขป. 15	(1.1468) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [3660]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	315,000	315,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
123	สขป. 14	(1.1463) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดชุมพร - [3655]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	240,000	240,000	2.อนุมัติแผน
124	สขป. 8	(109) แก้มลิงบ้านไผ่น้อยพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.183 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ - [9173]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	6.อนุมัติรับราคา
125	สขป. 8	(1.3292) ซ่อมแซมถนนเข้าห้วยงานฝายนางงาโท ระยะทาง 1.80 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา - [5484]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	950,000	950,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณ ทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2565 (บาท)	สถานะดำเนินการ
126	สขป. 8	(144) ปรับปรุงฝายยางบ้านขัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา มูลกลาง ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - [860]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	115,519,300	115,519,300	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
127	สขป. 8	(32) ปรับปรุงฝายยางบ้านตระแสง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา มูลกลางตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ - [748]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	137,000,000	137,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
128	สขป. 9	(224) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ Spillway อ่างเก็บน้ำดอกกราย พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ตำบลแม่ไม้คู อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - [8870]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000	30,000,000	5.เปิดซอง
129	สขป. 9	(1.3701) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของ เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง - [5893]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
130	สขป. 9	(28) ซ่อมสร้างฝายทางเข้าห้วยงานโครงการ ระยะทาง 2.74 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [2157]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	24,000,000	24,000,000	5.เปิดซอง
131	สสก.	(10) อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [557]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	233,710,000	46,742,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
132	สสก.	(1.460) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [548]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	842,200	842,200	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
133	สบก.	(34) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจาง จังหวัดเพชรบูรณ์ - [9050]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	35,000,000	7,000,000	6.อนุมัติรับราคา
134	สบก.	(33) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 (ระบบส่งน้ำ) จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ - [9049]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	125,000,000	25,000,000	5.เปิดซอง
135	สบก.	(11) โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงระบบชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม - [568]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	90,000,000	18,000,000	6.อนุมัติรับราคา
136	สบก.	(10) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน จังหวัดนครราชสีมา - [567]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	30,000,000	6,000,000	6.อนุมัติรับราคา
137	สบก.	(8) โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี - [565]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	35,000,000	7,000,000	6.อนุมัติรับราคา
138	สบก.	(7) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ - [564]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	30,000,000	6,000,000	5.เปิดซอง
139	สบอ.	(54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8494]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	160,193,000	160,193,000	2.อนุมัติแผน
140	สบอ.	(52) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8492]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	16,585,300	16,585,300	5.เปิดซอง
141	สบอ.	(4) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 ลุ่มน้ำ ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8444]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	27,000,000	27,000,000	5.เปิดซอง
142	สบอ.	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8250]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	2.อนุมัติแผน
143	สบอ.	(1.82) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2033]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	5.เปิดซอง

ที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณ ทั้งโครงการ (บาท)	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2565 (บาท)	สถานะดำเนินการ
144	สบอ.	(1.81) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก ส่วน ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2032]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	5,000,000	5.เปิดซอง
145	สบอ.	(1.146) ปรับปรุงสถานีหลักระบบโทรมาตร ฝายติดตามและ พยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [714]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	6,551,000	6,551,000	5.เปิดซอง
146	สบอ.	(1.441) ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทก วิทยาชลประทานภาคตะวันตก จำนวน 1 หน่วย ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [529]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	500,000	6.อนุมัติรับราคา
147	สบอ.	(1.379) ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 สถานี ศูนย์ อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [467]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	260,000	260,000	2.อนุมัติแผน
148	สบอ.	(1.370) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี - [458]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	117,000	117,000	1.ยังไม่ดำเนินการ
149	สบอ.	(1.367) ค่าจัดทำเสาสถิติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [455]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	37,600	37,600	6.อนุมัติรับราคา
150	สพญ.	(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารั้วย้ายในการจัดหาที่ดิน - [9565]	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโหล จังหวัดระยอง	งานปีเดียว	100,000,000	100,000,000	2.อนุมัติแผน
151	สพญ.	(8) งานชุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 - [9528]	โครงการคลองระบายน้ำ หลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานผูกพันใหม่	3,381,000,000	676,200,000	3.ประกาศร่าง TOR
152	สพญ.	(6) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง - [9514]	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วย หลวงตอนล่าง จังหวัด หนองคาย	งานผูกพันใหม่	1,140,000,000	228,000,000	3.ประกาศร่าง TOR
153	สพญ.	(227) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำพระเอกาทรศร ตำบลชลสิทธิ์ อำเภอหนอง แคจังหวัดสระบุรี - [9487]	โครงการป้องกันและบรรเทา ภัยจากน้ำ	งานผูกพันใหม่	900,000,000	180,000,000	5.เปิดซอง
154	สพญ.	(364) สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำชุมแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลชุมแสง อำเภอ วังจันทร์ จังหวัดระยอง พื้นที่ชลประทาน 7,450 ไร่ - [9010]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	374,000,000	74,800,000	5.เปิดซอง
155	สอส.	(31) ค่าจ้างสำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบน จังหวัดสุพรรณบุรี - [9047]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	25,000,000	5,000,000	5.เปิดซอง
156	สอส.	(30) ค่าจ้างสำรวจออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่าง เก็บน้ำห้วยแม่เคียน อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ บอม (แม่คู้ย) อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำแม่ป่าน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง - [9046]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	45,000,000	9,000,000	5.เปิดซอง
157	สอส.	(29) ค่าจ้างสำรวจออกแบบโครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าว ไทย ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [9045]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	200,000,000	40,000,000	5.เปิดซอง
