



## ความที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๓๓๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุบบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  
เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำแนกตามหลักเกณฑ์ ของการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๒ ประเภท รวม ๖ โครงการ แบ่งเป็น ประเภท รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๕ โครงการ และประเภทรายจ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖,๙๗๐.๙๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๕,๒๕๕.๐๑๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๘ จำนวนทั้งสิ้น ๖๙๘ รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๕๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๑ และยกเลิก ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ เนื่องจากงบประมาณถูกปรับ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๓ มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อช. และสำเนาเรียน รองอธิบดี เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสาววารรัตน์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง  
เพื่อโปรดทราบ

- ทราชม

- ๒๕๖๔ ผอ.ชวน, ผอ.ภค, ทน. ๑-๗ มอ.

และ ผ.มท.มอ. (ง.ม.มอ., พด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

= ผส.บอ.

= ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

# ผลการดำเนินงาน


# งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบกลาง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม 6 ครั้ง  
จำนวน 698 รายการ

เบิกจ่าย 5,255,0103 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 75.38

ส่วนบาท

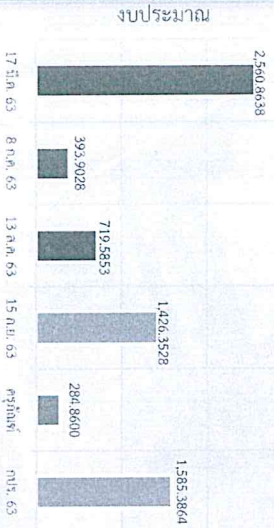

## ผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	รายการ
อัยการ	1 รายการ
อัยการระหว่างคดี	42 รายการ
การก่อสร้าง	652 รายการ
งานแปลเอกสาร	3 รายการ

ยกเลิก : เนื่องจากงบประมาณถูกปรับตาม พรบ. มาตรการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ได้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และรายชื่อพื้นที่ที่  
ตัดรายการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 698 รายการ

## ผลการดำเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้

<p>มติ ครม. 17 มี.ค.</p> <p>266 รายการ</p> <p>2,560,8638 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 2,326,4187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.85</p> <p>89.24 %</p> <p>• แล่นเสร็จ 264 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ</p>	<p>มติ ครม. 8 ก.ค.</p> <p>222 รายการ</p> <p>393,9028 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 390,6331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17</p> <p>100 %</p> <p>• แล่นเสร็จ 222 รายการ</p>	<p>มติ ครม. 13 ส.ค.</p> <p>79 รายการ</p> <p>719,5853 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 496,7178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.03</p> <p>91.26 %</p> <p>• แล่นเสร็จ 69 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ</p> <p>• ยกเลิก 1 รายการ</p>	<p>มติ ครม. 15 ก.ย.</p> <p>45 รายการ</p> <p>1,426,3528 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 881,0979 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.77</p> <p>68.08 %</p> <p>• แล่นเสร็จ 34 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างคดี-ฟ้อง 1 รายการ</p> <p>• ยกเลิก 1 รายการ</p>	<p>มติ ครม. 15 ก.ย. ครุภัณฑ์</p> <p>8 รายการ</p> <p>284,8600 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 14,9800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.26</p> <p>60.00 %</p> <p>• แล่นเสร็จ 2 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 รายการ</p>	<p>กปร. ปี 2563</p> <p>78 รายการ</p> <p>1,585,3864 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 1,145,1628 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.23</p> <p>73.91 %</p> <p>• แล่นเสร็จ 61 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 รายการ</p> <p>• ยกเลิก 1 รายการ</p>
---	--	---	---	---	--

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 31 พ.ค. 64)

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบกลาง  
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชัฏฐก ๓ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)							หมายเหตุ	
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวมรายการ ทั้งสิ้น	อยู่ระหว่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง				แล้วเสร็จ		ยกเลิก
						ผลงานร้อยละ 1 - 40	ผลงานร้อยละ 41 - 80	ผลงานร้อยละ 81 - 99	รวม			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,970,951.1</b>	<b>5,255,010.3</b>	<b>75.38</b>	<b>698</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>652</b>	<b>3</b>	
1.1 โครงการระดมทุนเพื่อซื้อเรือผลักดันน้ำในเขตชลประทาน ปี 2563 และโครงการ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เขื่อนลพ) ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	2,560,863.8	2,326,418.7	90.85	266		1			2	264		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ 2564
1.2 โครงการเรือผลักดันน้ำกรมชลประทานปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสำนักงาน เลขาธิการชลประทานได้ทำอุปโภคและบริโภค ทั้งจะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบ เป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563	393,902.8	390,033.1	99.17	222						222		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดำเนินการ แล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
1.3 โครงการรกร้างปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563	719,585.3	496,717.8	69.03	79		3		6	9	69	1	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ 2564
1.4 โครงการเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก น้ำในฤดูแล้งปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,426,352.8	881,097.9	61.77	45	1	1	8		9	34	1	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ 2564
1.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการสืบสวนความพร้อมทางและบรรเทาอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	284,860.0	14,380.0	5.26	8				6	6	2		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ 2564
1.6 โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2563	1,585,386.4	1,145,162.8	72.23	78		1	8	7	16	61	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ 2564

หมายเหตุ :

- ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่
  - งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC-2R กม.2+200-2+300 สดก.ต.อุบลราชธานี งบประมาณ 0.3238 ล้านบาท เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายในงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
  - เรือชุดอเนกประสงค์ลพบุรีเขื่อนลพบุรีของ นายชาติณรงค์สโรจน์มีอายุ 14 ปี ส่วนรายการเรือจักรกลที่ 1 ตำบลลพบุรีมีอายุ 15 ปี งบประมาณ 145,000 ล้านบาท เนื่องจากงบประมาณถูกตัดรายการงบประมาณ พ.ศ. 2561
  - โครงการอำนวยการขุดลอกเขื่อนลพบุรีจากกรมชลประทาน งบประมาณ 25,000 ล้านบาท เนื่องจากรายการนี้ไม่เข้ารายการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงาน
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คือ หอเขื่อนลพบุรี - นนทบุรี หรือระบบส่งน้ำ ตำบลนบพิตำ อำเภอท่าเสา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97,988 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 2564
- บัญชีอุปสรรคการดำเนินงาน ได้แก่
  - อุทกการบริหารลพบุรี เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดและการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยง มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
  - ฝนตกในพื้นที่ลำน้ำลำปาว เนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อนเขื่อนลพบุรี น้ำท่วมสูงในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
  - ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา โดยผู้รับจ้างรวมเดิมไม่ส่งบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างรายเดิม และเริ่มกระบวนการจัดการผู้รับจ้างรายใหม่อีกครั้ง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 2564

## ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำแนกตามหลักเกณฑ์ของการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท 6 โครงการ แบ่งเป็น

- รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 5 โครงการ
- รายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ

โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6,970.9511 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 5,255.0103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.38 จำนวนทั้งสิ้น 698 รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.14 คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการ 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.02 ดำเนินการแล้วเสร็จ 652 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.41 และยกเลิก 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 79,624 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,560.8638 ล้านบาท จำนวน 266 รายการ และมีแผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน งบประมาณ จำนวน 250.0000 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,326.4187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.85 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 264 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่

1. แก้มลิงหนองนกทา ระยะที่ 1 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 4.7278 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.0381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ผลการดำเนินงานร้อยละ 7.00 เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ปัจจุบันเลิกสัญญา และเริ่มกระบวนการจัดหาใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

2. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแห้ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน งบประมาณ 9.6156 ล้านบาท เบิกจ่าย 3.3790 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.14 ผลการดำเนินงานร้อยละ 65.00 เนื่องจากระยะที่ผ่านมาเป็นรอบเวรการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัจจุบันสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

## 2. โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี : 8 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

ผลสัมฤทธิ์ : ความจุเพิ่มขึ้น 50.4904 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 8,500 คริวเรือน และปริมาณการกำจัดวัชพืช 8,033,612 ต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 393.9028 ล้านบาท จำนวน 222 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 390.6331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 222 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 186.1678 ล้านบาท เบิกจ่าย 184.0693 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.87 ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. โครงการแผนการดำเนินงานขุดลอกคู คลอง ในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 9.2336 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.1731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.35 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ

3. โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 215 รายการ งบประมาณ 198.5014 ล้านบาท เบิกจ่าย 197.3907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.44 ดำเนินการแล้วเสร็จ 215 รายการ

## 3. โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากภาวะฝนทิ้งช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาระเบิดน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 3.1572 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 7,390 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 719.5853 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ 79 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 496.7178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.03 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 69 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ และยกเลิก 1 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการแก้ไขปัญหาลิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 52.9970 ล้านบาท เบิกจ่าย 38.7264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.07 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 63.2664 ล้านบาท เบิกจ่าย 63.2621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ

3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.0096 ล้านบาท เบิกจ่าย 101.0353 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.74 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ

4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 69 รายการ งบประมาณ 151.2844 ล้านบาท เบิกจ่าย 147.6050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.57 ดำเนินการแล้วเสร็จ 63 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว

5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 128.2364 ล้านบาท เบิกจ่าย 59.2400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.20 อยู่ระหว่างดำเนินการ

6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 24.5700 ล้านบาท เบิกจ่าย 23.3672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.10 ดำเนินการแล้วเสร็จ

7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหี่ยน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 66.1790 ล้านบาท เบิกจ่าย 26.7747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.46 อยู่ระหว่างดำเนินการ

8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 96.0425 ล้านบาท เบิกจ่าย 36.7070 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.22 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 20,470 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,426.3528 ล้านบาท มีแผนดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 45 รายการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 881.0979 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.77 โดยอยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 34 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 34 รายการ งบประมาณ 306.8528 ล้านบาท เบิกจ่าย 156.8479 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.12 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 29 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว - นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97.988 ล้านบาท ปัจจุบันได้รับจ้างแล้วซึ่งอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา โดยคาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ภายใน มิถุนายน 2564 และจะเริ่มดำเนินการทันที คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือชุดใช้งานชลประทาน จำนวน 6 ลำ 6 รายการ งบประมาณ 870.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย 724.2500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.25 ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถชุดแบบโป๊ะเหล็ก จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 249.5000 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ

#### 5. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรม ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไข และบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำ รถปั้นจั่น และเรือชุด เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไข และบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 284.8600 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 14.9800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 ลงนามในสัญญา 6 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ

6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,585.3864 ล้านบาท จำนวน 78 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,145.1628 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.23 ดำเนินการแล้วเสร็จ 61 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 16 รายการ ยกเลิก 1 รายการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมือง ตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 25.0000 ล้านบาท เนื่องจากราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

\*\*\*\*\*
