



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๖๐. 3496/62

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๒๘

ที่ กพง ๐๖/ ๘๐๕/๒๕๖๒ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย รง 4940
ที่รัฐบาลกำหนด

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สำเนาเรียน อธช. และรองอธิบดี

ด้วยกองแผนงาน ได้จัดทำสรุปผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของงบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online) เสนอผู้บริหารทุก ๑๕ วัน ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส ๓ พบว่ากรมชลประทานมีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๕๘,๑๓๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๑,๗๐๑.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส ๓ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๖๕.๐๐) ร้อยละ ๑๐.๔๗ และรายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส ๓ จำนวน ๒,๐๖๓ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๗,๗๔๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๔

ในการนี้ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการที่ อธช. ลงนาม ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง ๐๖/๗๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่วางแผนไว้ และตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๓. บันทึกผลความก้าวหน้าในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หากรายการงานใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ระบุในระบบติดตาม online ให้ชัดเจนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบสรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง ๐๖/๗๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เขียน นอ-สอน-ฯ อธช.ทค

เพื่อโปรดพิจารณา


ดำเนินการ

(นายอดิศร จำปาทอง) - ๔ ก.ค. ๒๕๖๒
ผอ.ท.ปอ.รักษาราชการแทน ผส.บอ.

(นางธำปณีย์ จิรานิธิตาสตร์)
ผตป.ผง.รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

แผนและผลประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามสำนัก (ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 62)

สำนัก	งบประมา	งบประมา	งบประมา	งบประมา	งบประมา	งบประมา	งบประมา	งบประมา	งบประมา
สำนัก 1	1,242.68	922.62	74.24	846.10	1,530.58	1,020.08	64.84		
สำนัก 2	1,297.65	836.90	64.49	846.11	1,498.44	819.05	54.81		
สำนัก 3	874.22	536.09	91.09	846.12	1,638.09	926.87	80.34		
สำนัก 4	964.89	628.48	65.14	846.13	1,195.56	748.56	62.61		
สำนัก 5	1,814.09	1,291.60	71.20	846.14	1,962.43	826.83	42.15		
สำนัก 6	2,037.48	1,415.89	69.49	846.15	986.67	684.19	69.34		
สำนัก 7	2,187.00	2,290.43	77.50	846.16	1,786.66	1,207.02	67.56		
สำนัก 8	2,260.38	1,751.88	43.67	846.17	1,143.18	503.41	44.04		
สำนัก 9	2,240.38	955.10	56.12	846.18	1,053.54	849.67	80.65		
สำนัก 10	7,432.14	4,170.73	32.75	846.19	387.58	352.69	91.00		
สำนัก 11	6,400.07	5,425.41	44.94	846.20	10.95	7.23	7.23		
สำนัก 12	187.55	108.08	87.63	846.21	2,836.61	2,721.04	95.93		
สำนัก 13	508.48	113.91	22.40	846.22	11.59	0.22	1.94		
สำนัก 14	104.94	48.56	46.27	846.23	47,764.71	30,084.41	62.99		

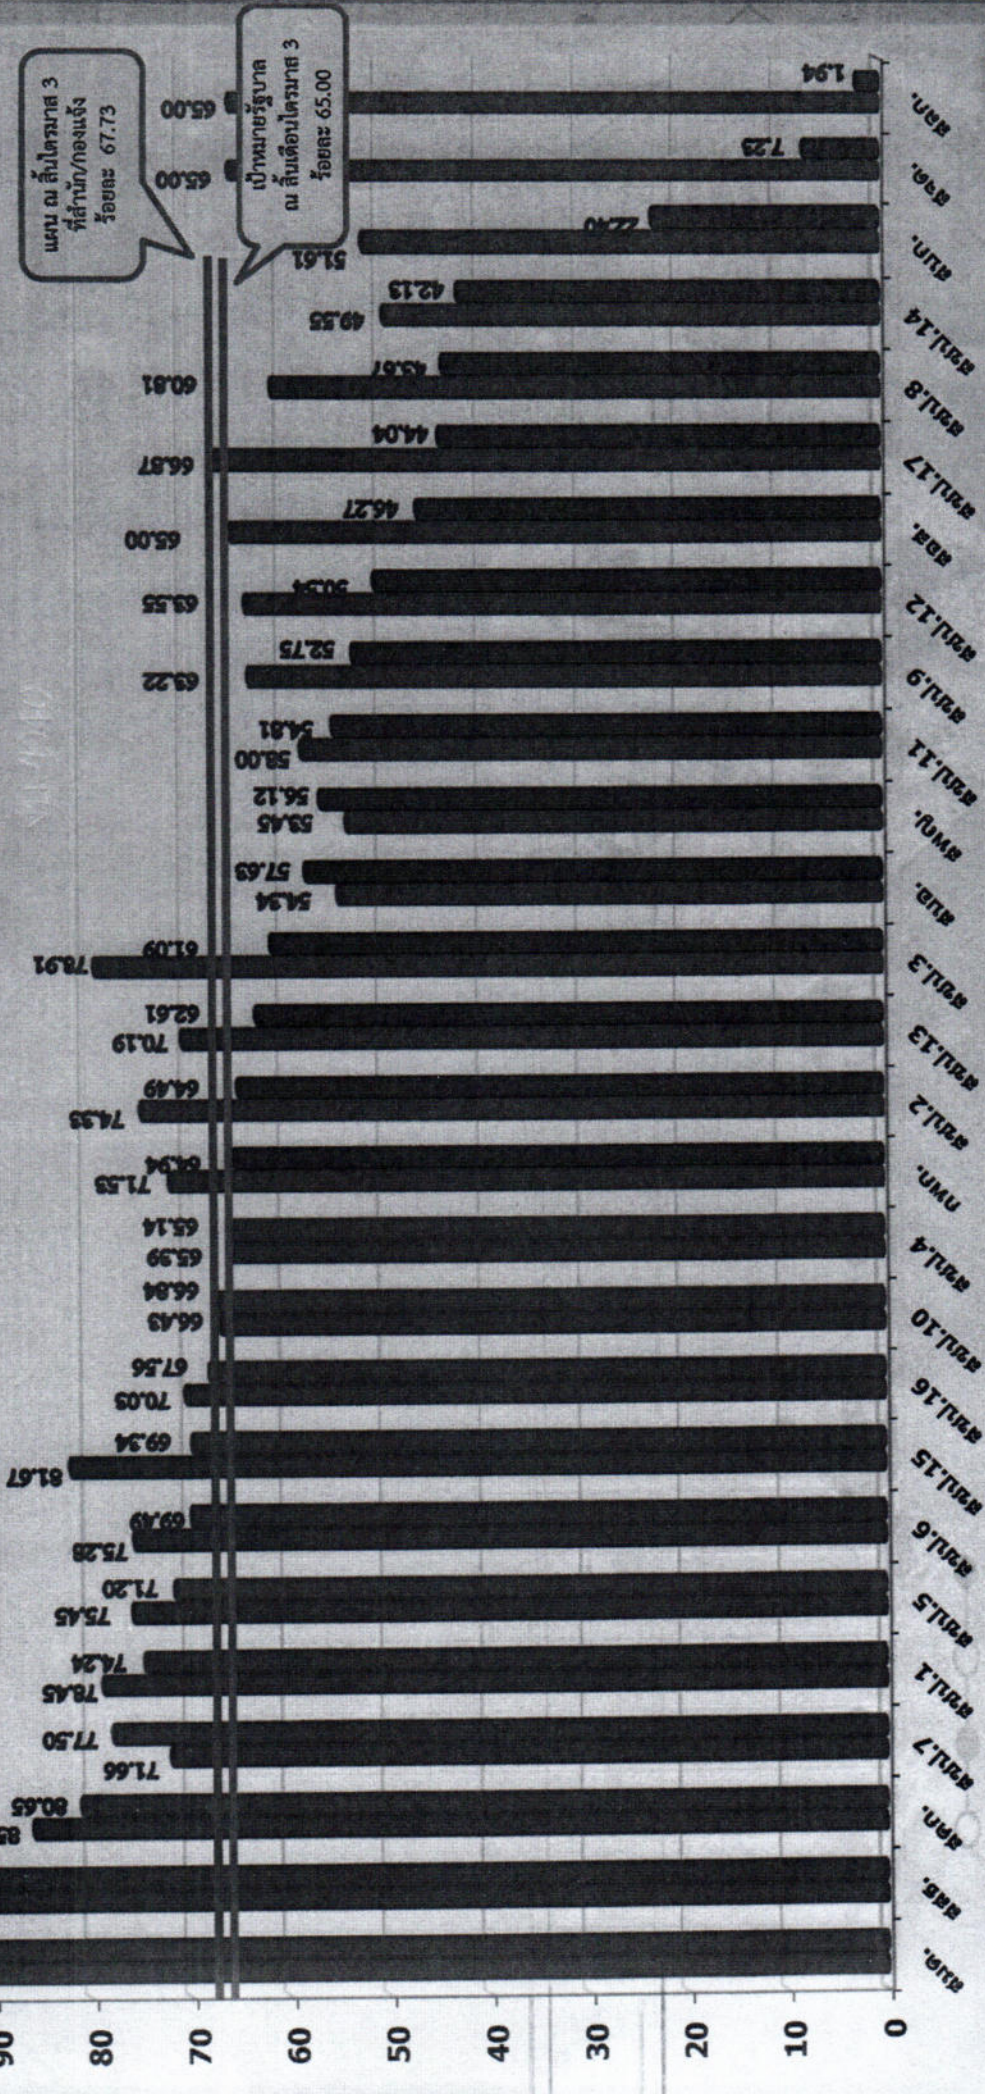

หมายเหตุ : รายการที่มาจากกรอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเล็ก มากำเป็นการ จำนวน 745 รายการ งบประมาณ 2,433.02 ล้านบาท

■ แผนการเบิกจ่ายรายสำนัก ณ สิ้นไตรมาส 3

■ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

■ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

ปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

กรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๕๘,๑๓๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๑,๗๐๑.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส ๓ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๖๕.๐๐) ร้อยละ ๑๐.๔๗ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กองปรับแผน ณ สิ้นไตรมาส ๓ (แผนสำนัก/กอง ร้อยละ ๖๗.๗๓) ร้อยละ ๑๓.๒๐ รายละเอียดดังนี้

๑. สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส ๓ จำนวน ๑๑ สำนัก ได้แก่ สมต. สสธ. สศก. สขป. ๗ สขป. ๑ สขป. ๕ สขป. ๖ สขป. ๑๕ สขป. ๑๖ สขป. ๑๐ สขป. ๔

๒. สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส ๓ จำนวน ๑๖ สำนัก ได้แก่ กพก. สขป. ๒ สขป. ๑๓ สขป. ๓ สบอ. สพญ. สขป. ๑๑ สขป. ๙ สขป. ๑๒ สอส. สขป. ๑๗ สขป. ๘ สขป. ๑๔ สบก. สจต. สลก.

๓. รายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส ๓ จำนวน ๒,๐๖๓ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๗,๗๔๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๔ โดยจำแนกตามประเภทรายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ดังนี้

- งานปรับปรุง ร้อยละ ๒๙.๑๓
- งาน양พารา ร้อยละ ๒๑.๗๗
- งานก่อสร้าง เช่น ฝ่าย สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และแก้มลิง เป็นต้น ร้อยละ ๑๗.๕๐
- งานโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๑๖.๔๓
- งานขุดลอกลำน้ำ ร้อยละ ๖.๐๖
- อื่นๆ เช่น งานโครงการศึกษา สำรองออกแบบ เป็นต้น ร้อยละ ๙.๑๑

๔. จากการตรวจสอบ พบว่ารายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนดดังกล่าว สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องได้ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินในระบบติดตามออนไลน์เพียง ๔๕๕ รายการ ดังนี้

- แก้มแบบ/แก้มสัญญา/แก้มประมาณการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป/มีการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน/ เพื่อลดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น ร้อยละ ๗.๖๙
- ผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ ๗.๒๕
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน ต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าศึกษาจากกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ กระทบต่อการเข้าศึกษาในแต่ละช่วงฤดู เป็นต้น ร้อยละ ๖.๓๗
- ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคารายเดียวหรือไม่มีผู้รับจ้างมายื่นเอกสารประกวดราคา ร้อยละ ๓.๓๐
- ผนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ร้อยละ ๒.๔๒
- อื่นๆ เช่น เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรก่อน เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ จึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ งานสัญญาดำเนินการล่าช้ากว่าแผน งานจ้างเหมา มีเงื่อนไขและระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญาไม่สามารถเร่งแผนเบิกจ่ายได้ รอหมดฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรตามข้อตกลง และไม่ได้ระบุปัญหาที่ชัดเจน เป็นต้น ร้อยละ ๗๒.๙๗



บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๒๒๘๖
ที่ กษ.๐๖/ ๗๕๐/๗๕๖๖ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผส.ขบ. ๑ - ๑๗ ผส.พญ. ผส.อส. ผส.มต. ผส.คก. ผส.จต. ผส.บอ. ผส.สร. ผส.บก. ผอ.ทส.
ลก. และ ผอ.พท. สำเนา อชช. และ รองอธิบดี

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชารทิพย์ ชั้น ๔ อาคาร ๔๔ ปี ม.ล.ชุชาติ กำภู โดยมีอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในที่ประชุม นั้น

จากมติที่ประชุม มอบหมายให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. กรณีงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมาบางส่วน ที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมติดตามเร่งรัด ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. กรณีงานจ้างเหมาหากไม่สามารถก่อนนี้ได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ให้แจ้งยกเลิก รายการงานภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลการยกเลิกรายการดังกล่าว

กรณี ๑ และ ๒ การยกเลิกรายการงานให้คำนึงถึงผลกระทบต่อ ตัวชี้วัดในภาพรวมของ กรมเป็นสำคัญ โดยกองแผนงานจะนำงบประมาณที่ยกเลิกมาโอนเปลี่ยนแปลงให้รายการงานที่สามารถ ดำเนินการได้ทันที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของกรม

๓. หน่วยงานที่แจ้งยกเลิกรายการงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การบริหารงบประมาณของกรม จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๓ ตามศักยภาพของหน่วยงานนั้นๆ

๔. กรณีงานดำเนินการเองที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว มีเงินเหลือจ่าย ให้แจ้ง โอนงบประมาณเหลือจ่ายกลับกองแผนงานภายใน ๗ วันทำการ

๕. กองแผนงานติดตามความก้าวหน้า แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จากสำนัก/กอง ทุก ๗ วัน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๑๕ วัน

ทั้งนี้ ขอให้แต่ละสำนัก/กอง แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ตามมติที่ประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
ผอ.ผง.



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน สำนัคดีตามและประเมินผล โทร ๒๒๕๖

ที่ กสจ ๐๖/๒๕๖๒๑๒๑๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผอ.ส.ป.๑ - ๑๓ ผอ.ส.ท.ผ. ผอ.พท. ผอ.ยส. ผอ.มค. ผอ.คท. ผอ.จค. ลบก. ผอ.บอ. ผอ.สธ. ผอ.สก. และ ผอ.อส.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น ๕ อาคาร ๕๕ ปิมล. ซุชาติ ก้าว โดยมีอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในที่ประชุม นั้น

มติที่ประชุม มอบหมายให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. งานดำเนินการเองให้ดำเนินการกอหนีผูกพันภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒. ให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข รายการที่เบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมาย งบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๕.๐๐ (ไตรมาสที่ ๒) ให้ผู้อำนวยการโครงการลงนามรับรองข้อมูลทุกหน้า และจัดส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ทาง E-mail : monitoring.plan@gmail.com

๓. กองแผนงานสรุปความก้าวหน้า แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๑๕ วัน

๔. สำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า/ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เห็นควรเสนอ อธช. ที่จรรยาการโอนจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายให้หน่วยงานอื่นๆ แล้วแต่กรณี

๕. สำหรับ สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายได้ความแผนหรือเร็วกว่าแผน เห็นควรให้สนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเพิ่มค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดให้กับกรม

๖. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีผลต่อการพิจารณาขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ขอให้แต่ละสำนัก/กอง แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายทองเปลว กองจันทร์)
อธิบดีกรมชลประทาน
