



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในรูปของ E-mail 06/.....

พ.ศ. ๒๐๑ ๑๔๗๙/๖๒

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๗๘๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบ พ.ร.บ.) ๑๒๔๘๔๖

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำแนกตามสายงาน และสำนัก/กอง

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบรายงานที่ยังไม่ดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ และได้อัปเดตข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เร่งดำเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งบันทึกผลความก้าวหน้าในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หากรายงานใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ระบุในระบบติดตาม online ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางรूपนีย์ จิรานนิตศาสตร์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

๕๒ ก.ค. ๒๕๖๒

- ทรวน

- เรียน ผอ. ส.๒๖., ผอ.๕๓๑

เพื่อโปรดทราบ

(นายอดิศร จำปาทอง)

๕ ก.ค. ๒๕๖๒

ผอท.บอ.รักษาราชการแทน ผส.บอ.



ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.)


จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562



## รายละเอียดข้อมูล



### ประกอบด้วย

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสายงาน
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562
4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562
5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562
6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน
7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง
8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคูเทียม  
ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พบ พ.ร.บ. ปังงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนตามสภายงาน (ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562)

รายงาน/สำนัก/กอง	งบประมาณ (ล้านบาท)			จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ (รายการ)			อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)			อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)								
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับชำระ	เบิกจ่าย		จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ทำสัญญาแล้ว (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%	
รวมทั้งสิ้น	53,419.16	47,794.71	30,084.41	688	112	780.91	421	3,097.95	7,211	49,540.30	567	329	476	878	1,668	3,293			
บริหาร	3,935.67	3,901.74	3,570.93	688	8	-	17	12.55	663	3,923.11	52	13	40	48	77	433			
สมต.	3,303.00	2,836.61	2,721.04	46	-	-	-	-	46	3,303.00	12	3	6	6	12	7			
สทก.	632.67	1,053.54	849.67	634	2	-	17	12.55	615	620.12	40	10	34	42	65	424			
สศก.	-	11.59	0.22	8	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2			
สำนักงานเลขาธิการสภา	30,099.20	27,048.79	16,371.40	6,583	67	201.28	350	1,667.27	6,166	28,230.65	446	262	374	746	1,523	2,815			
สขป.1	1,251.01	1,242.68	922.62	378	1	-	22	131.88	355	1,119.14	12	1	22	93	87	140			
สขป.2	1,531.40	1,297.65	836.90	327	1	16.30	42	367.55	284	1,147.55	20	2	17	32	103	110			
สขป.3	1,047.89	874.22	534.09	240	3	0.02	4	1.80	233	1,046.07	6	4	10	41	66	106			
สขป.4	1,216.43	964.89	628.48	299	18	64.15	2	4.77	279	1,147.52	34	15	22	35	70	103			
สขป.5	2,040.97	1,814.09	1,291.60	429	1	-	11	1.11	417	2,039.86	41	12	25	38	77	224			
สขป.6	2,470.12	2,037.48	1,415.89	440	4	7.48	8	61.86	428	2,400.78	18	25	37	43	81	224			
สขป.7	2,895.87	2,260.43	1,751.88	383	1	-	18	153.14	364	2,742.74	21	10	16	45	79	193			
สขป.8	2,867.48	2,187.00	955.10	512	10	0.75	34	395.58	468	2,471.15	68	20	18	49	99	214			
สขป.9	2,554.43	2,240.38	1,181.74	463	2	3.64	16	121.78	445	2,429.01	11	14	33	33	104	250			
สขป.10	1,662.13	1,539.58	1,029.08	415	4	0.95	9	49.56	402	1,611.61	33	25	27	31	120	166			
สขป.11	1,580.12	1,494.44	819.05	462	2	0.80	29	23.05	431	1,556.27	18	39	21	40	172	141			
สขป.12	1,723.46	1,834.09	926.87	419	-	-	11	11.53	408	1,711.93	45	24	31	43	82	183			
สขป.13	951.97	1,195.56	748.56	486	3	36.00	14	9.04	469	906.94	21	19	32	87	175	135			
สขป.14	1,944.39	1,962.43	826.83	259	1	-	4	46.75	254	1,897.63	37	14	18	28	29	128			
สขป.15	1,511.84	986.67	684.19	340	-	-	21	98.68	319	1,413.16	22	14	11	36	89	147			
สขป.16	1,586.84	1,786.46	1,207.02	351	3	1.99	1	0.03	347	1,584.83	6	6	14	28	52	241			
สขป.17	1,009.63	1,143.18	503.41	240	8	49.46	9	31.70	223	928.48	23	16	18	36	27	103			
สขป.	253.21	187.55	108.08	140	5	19.75	95	157.46	40	75.99	10	2	2	8	11	7			
ก่อสร้าง	18,257.35	15,843.18	9,626.93	379	22	212.13	42	1,348.33	315	16,696.90	63	53	54	73	47	25			
กพท.	8,167.61	8,400.07	5,455.41	179	-	-	11	81.78	168	8,085.82	27	22	31	47	29	12			
สพท.	10,087.62	7,432.16	4,170.73	190	17	212.13	29	1,265.35	144	8,610.14	34	31	23	26	17	13			
สจท.	2.13	10.95	0.79	10	5	-	2	1.20	3	0.93	2	-	-	-	1	-			
วิชาการ	1,010.94	1,001.00	515.15	91	12	251.50	12	69.80	67	689.64	6	1	8	11	21	20			
สทก.	506.79	508.48	113.91	29	11	251.50	3	22.00	15	233.29	-	1	2	7	-	5			
สตร.	431.64	387.58	352.69	44	1	-	3	44.80	40	386.84	-	-	-	4	21	15			
สอธ.	69.52	104.94	48.56	6	-	-	-	-	6	69.52	-	-	6	-	-	-			
สพท.	3.00	-	-	7	-	-	1	3.00	6	-	6	-	-	-	-	-			
สจท.	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
หมายเหตุ : งบค่าเช่า	116.00	-	-	3	3	116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

หมายเหตุ : 1. รายการที่ยังไม่ดำเนินการอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มิอาจดำเนินการได้เนื่องจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก ภาครัฐ/เปลี่ยนการ จำนวน 745 รายการ งบประมาณ 2,433.02 ล้านบาท

2. งบประมาณ (พ.ร.บ. งบประมาณ) รวมรายการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก ภาครัฐ/เปลี่ยนการ

## 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามผลิตภัณฑ์

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562)

โครงการ/ผลิตภัณฑ์	งบประมาณ (ล้านบาท)				งบประมาณ (ล้านบาท)				งบประมาณ (ล้านบาท)				งบประมาณ (ล้านบาท)				งบประมาณ (ล้านบาท)			
	งบประมาณ	งบประมาณที่สั่งจัดจ้าง	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		งบประมาณ (ล้านบาท)		งบประมาณ (ล้านบาท)		งบประมาณ (ล้านบาท)		งบประมาณ (ล้านบาท)		งบประมาณ (ล้านบาท)			
							จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		
รวม	53,419.16	47,794.71	30,084.41	62.95	7,744	112	780.91	421	3,097.95	7,211	49,540.30	567	329	476	878	1,668	3,293			
ผลผลิตการจัดทำข้อตกลง	1,507.37	1,385.88	926.32	66.84	1,230	9	14.75	83	160.47	1,138	1,332.16	38	57	139	253	222	429			
โครงการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากพระราชดำริ	1,326.26	1,480.95	896.98	60.57	532	10	7.48	15	60.42	507	1,258.36	22	19	25	89	69	263			
โครงการส่งเสริมการใช้ภายในหน่วยงานภาครัฐ	6,040.44	3,900.97	1,036.85	26.58	610	21	122.93	77	798.23	512	5,119.28	188	23	24	22	81	174			
แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค	6,578.68	6,368.49	3,513.11	55.16	322	17	7.91	22	22.36	283	6,548.42	40	25	35	56	58	69			
โครงการปรับปรุงงานขอประทาน	9,399.71	8,929.89	6,413.48	71.82	4,118	26	255.24	161	275.39	3,931	8,869.08	150	118	148	285	1,029	2,201			
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน	14,896.14	14,206.99	10,949.43	77.07	449	10	147.17	23	438.73	416	14,310.24	46	41	68	114	115	32			
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	5,269.85	5,213.58	2,724.69	52.26	243	6	125.95	7	142.78	230	5,001.12	53	24	21	39	39	54			
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	170.52	171.33	53.38	31.16	96	-	-	3	4.50	93	166.02	7	1	2	4	41	38			
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พนมดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	174.93	175.64	146.33	83.31	6	1	3.00	-	-	5	171.93	-	-	-	2	3	-			
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	120.00	96.00	44.24	46.08	2	-	-	-	-	2	120.00	-	-	-	2	-	-			
โครงการอ่างเก็บน้ำลำละพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	200.08	318.13	189.57	59.59	2	-	-	-	-	2	200.08	-	-	-	1	-	1			
โครงการพัฒนาระบบน้ำในอ่างเก็บน้ำเชื่อมแมลงอุตสาหกรรม จังหวัด	1,656.97	1,472.83	784.05	53.23	23	-	-	5	21.00	18	1,635.97	5	8	1	2	1	1			
โครงการลดงบประมาณน้ำหกลก บางกกลบใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	351.92	351.92	157.09	44.64	4	1	0.78	-	-	3	351.15	1	1	-	-	1	-			
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	233.98	233.98	231.78	99.06	2	-	-	-	-	2	233.98	-	-	1	-	-	1			
โครงการเขื่อนทดน้ำห้วยจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	693.75	915.42	520.85	56.90	19	-	-	12	321.95	7	371.81	2	2	-	-	1	2			
โครงการอ่างเก็บน้ำปาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	410.51	118.02	80.75	68.41	9	-	-	-	-	9	410.51	1	3	3	1	-	1			
โครงการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	413.13	450.65	175.07	38.85	15	-	-	-	-	15	413.13	3	1	6	-	-	3			
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	189.87	98.94	52.26	52.82	9	3	41.17	3	43.99	3	104.72	1	1	1	-	-	-			
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	888.94	130.58	114.57	87.74	13	7	46.28	4	657.66	2	185.00	-	2	-	-	-	-			
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	1,511.29	753.00	300.46	39.90	14	1	8.27	5	141.48	8	1,361.53	1	2	1	4	-	-			
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	701.82	564.01	468.32	83.03	16	-	-	-	-	16	701.82	5	-	1	3	4	3			
โครงการปรับระบบขบศิรีอ้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขียงคาบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	647.99	435.31	301.66	69.30	8	-	-	-	-	8	647.99	4	-	-	1	1	2			
โครงการอ่างเก็บน้ำลำปาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	35.00	22.19	3.16	14.24	2	-	-	1	9.00	1	26.00	-	1	-	-	-	-			

หมายเหตุ : 1. รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ จำนวน 745 รายการ งบประมาณ 2,433.82 ล้านบาท

2. งบประมาณ (พ.ร.บ.) รวมรายการที่มีรายการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ

### 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562)

งบประมาณ (พ.ร.บ.)  
66,472.19 ล้านบาท

-----> เป้าหมาย ไตรมาส 3 = 77.00%

งบประมาณ (พ.ร.บ.)  
8,335.39 ล้านบาท


-----> เป้าหมาย ไตรมาส 3 = 80.00 %

เบิกจ่าย  
37,730.38 ล้านบาท  
56.76%



ภาพรวม

เบิกจ่าย  
6,028.72 ล้านบาท  
72.33%



รายจ่ายประจำ

งบประมาณ (พ.ร.บ.)  
58,136.80 ล้านบาท

-----> เป้าหมาย ไตรมาส 3 = 65.00%

- รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ
- ผู้ผูกพันเดิม จำนวนทั้งสิ้น 101 รายการ งบประมาณ 8,054.24 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 100 รายการ (99.01%) งบประมาณ 7,824.24 ล้านบาท (97.14%) และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (0.99%) งบประมาณ 230.00 ล้านบาท (2.86%) คือ โครงการพัฒนาหมู่บ้านช่วยเหลือหลังตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
  - ผู้ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ งบประมาณ 2,078.06 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 20 รายการ (95.24%) งบประมาณ 2,028.06 ล้านบาท (97.59%) และปีปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 1 รายการ คือ อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สถานีสู่ง 11 ซึ่งพื้นที่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


-----> เป้าหมาย ไตรมาส 3 = 80.00 %

31,701.66 ล้านบาท  
54.53%

รายจ่ายลงทุน

#### 4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562


ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562

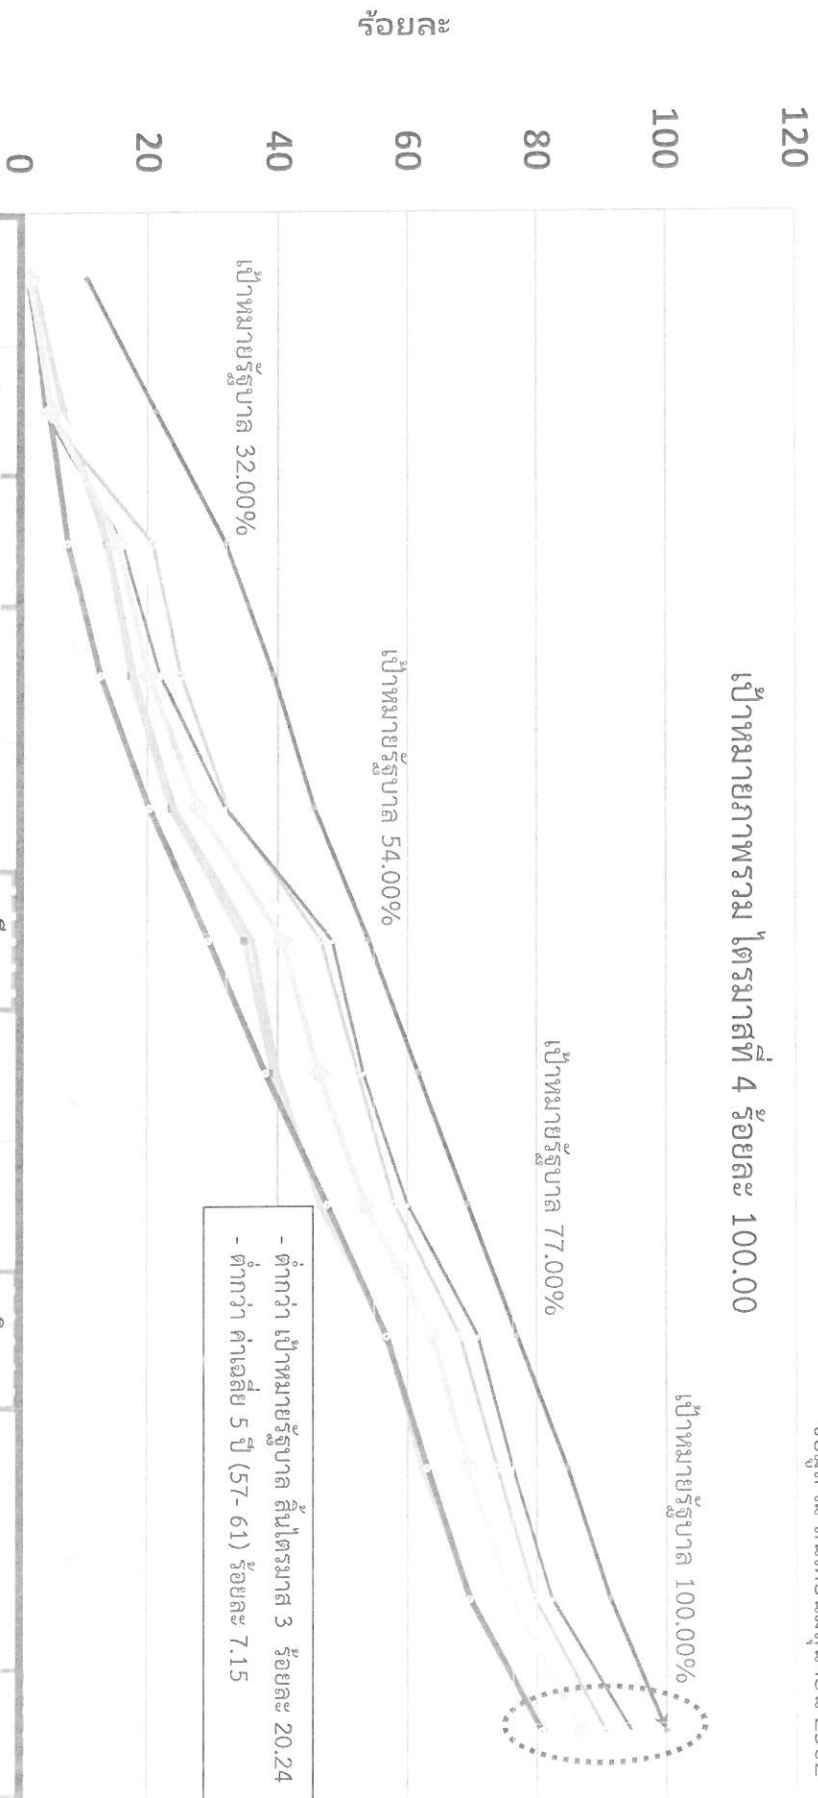

ปีงบประมาณ	รวม
แผนปี 62	
ผลปี 62	(66,472.19)
ผลปี 61	(55,620.32)
ผลปี 60	(47,004.27)
ผลปี 59	(46,708.92)
ผลปี 58	(43,054.76)
ผลปี 57	(40,094.61)
เฉลี่ย 5 ปี (57-61)	

ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10.66	21.33	32.00	39.33	45.66	54.00	61.66	69.32	77.00	84.66	91.32	100.00
1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76			
2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
1.50	5.94	19.46	23.11	30.30	43.12	48.35	55.72	66.56	71.83	77.86	86.95
2.04	3.91	20.86	25.19	32.46	46.68	52.40	58.02	68.24	73.86	79.68	90.69
1.76	4.21	16.07	22.04	31.89	48.43	53.28	60.04	71.00	76.28	82.33	94.64
1.54	4.73	7.67	12.82	20.33	29.41	38.14	47.74	56.80	63.13	69.69	80.86
1.84	5.14	15.60	20.23	27.81	40.75	46.43	53.62	63.91	69.48	75.89	86.91

## 5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562

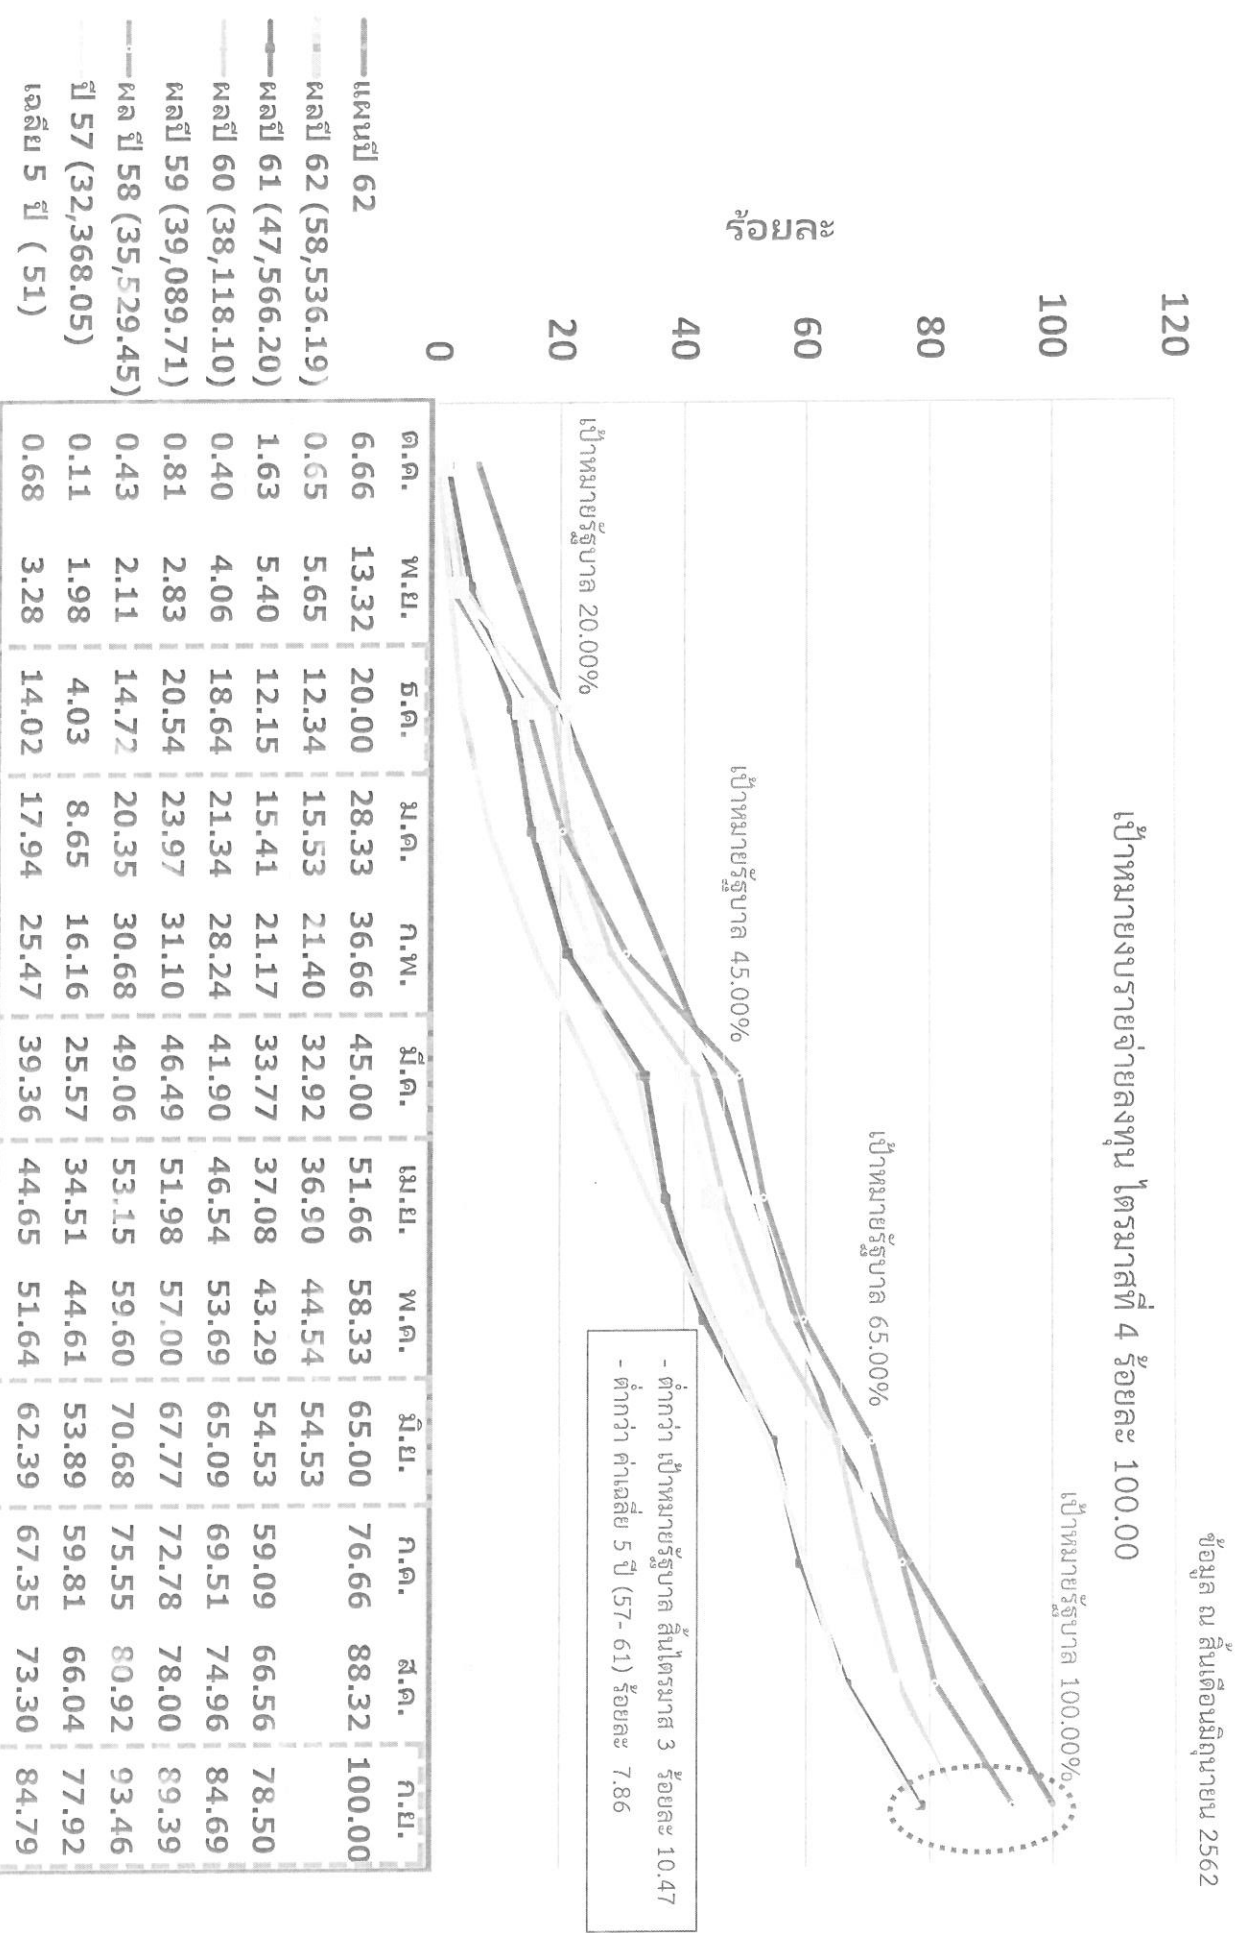


ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6.66	13.32	20.00	28.33	36.66	45.00	51.66	58.33	65.00	76.66	88.32	100.00
0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53			
1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69
0.81	2.83	20.54	23.97	31.10	46.49	51.98	57.00	67.77	72.78	78.00	89.39
0.43	2.11	14.72	20.35	30.68	49.06	53.15	59.60	70.68	75.55	80.92	93.46
0.11	1.98	4.03	8.65	16.16	25.57	34.51	44.61	53.89	59.81	66.04	77.92
0.68	3.28	14.02	17.94	25.47	39.36	44.65	51.64	62.39	67.35	73.30	84.79



## 6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562)

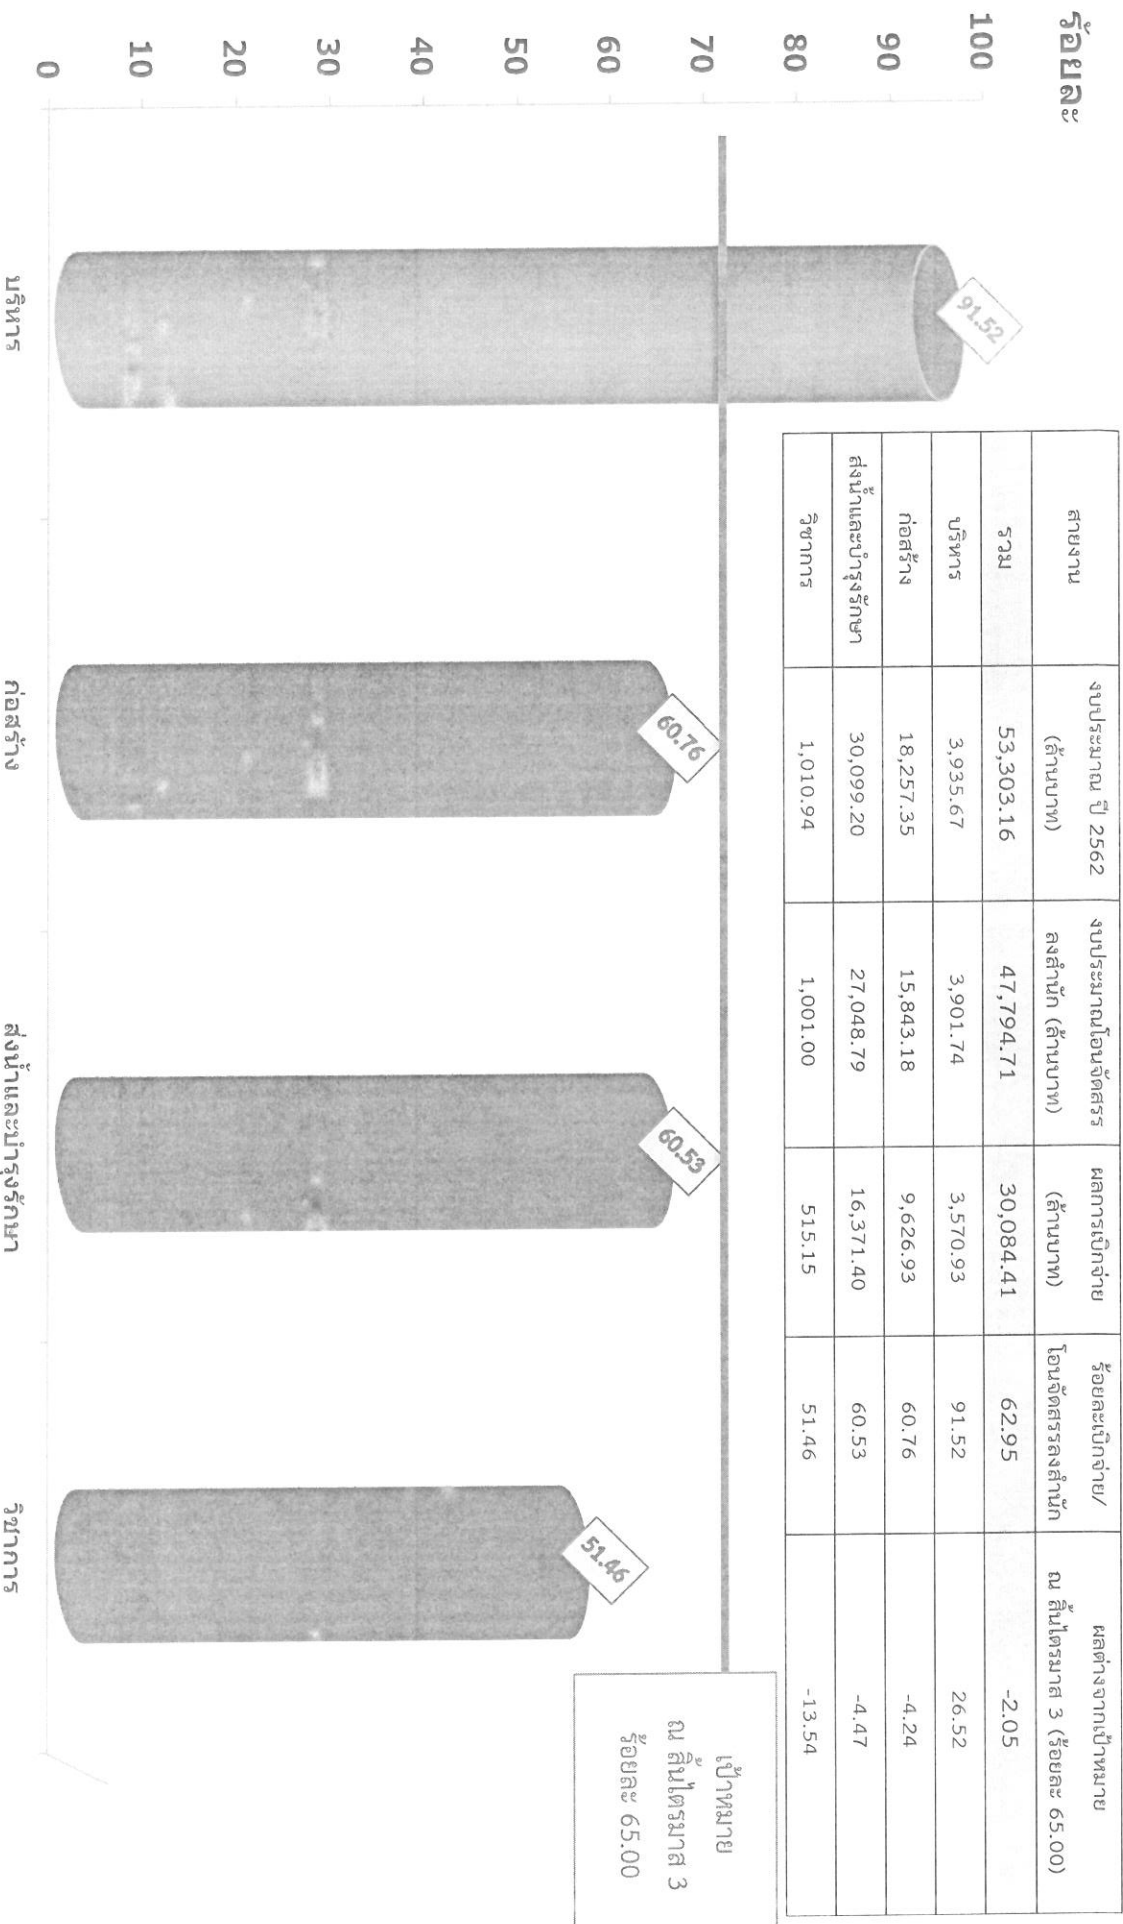

เป้าหมาย  
ณ สิ้นไตรมาส 3  
ร้อยละ 65.00

ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล


ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2562 ยังไม่รวมงบล่าช้า จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 116.00 ล้านบาท



## 8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562)

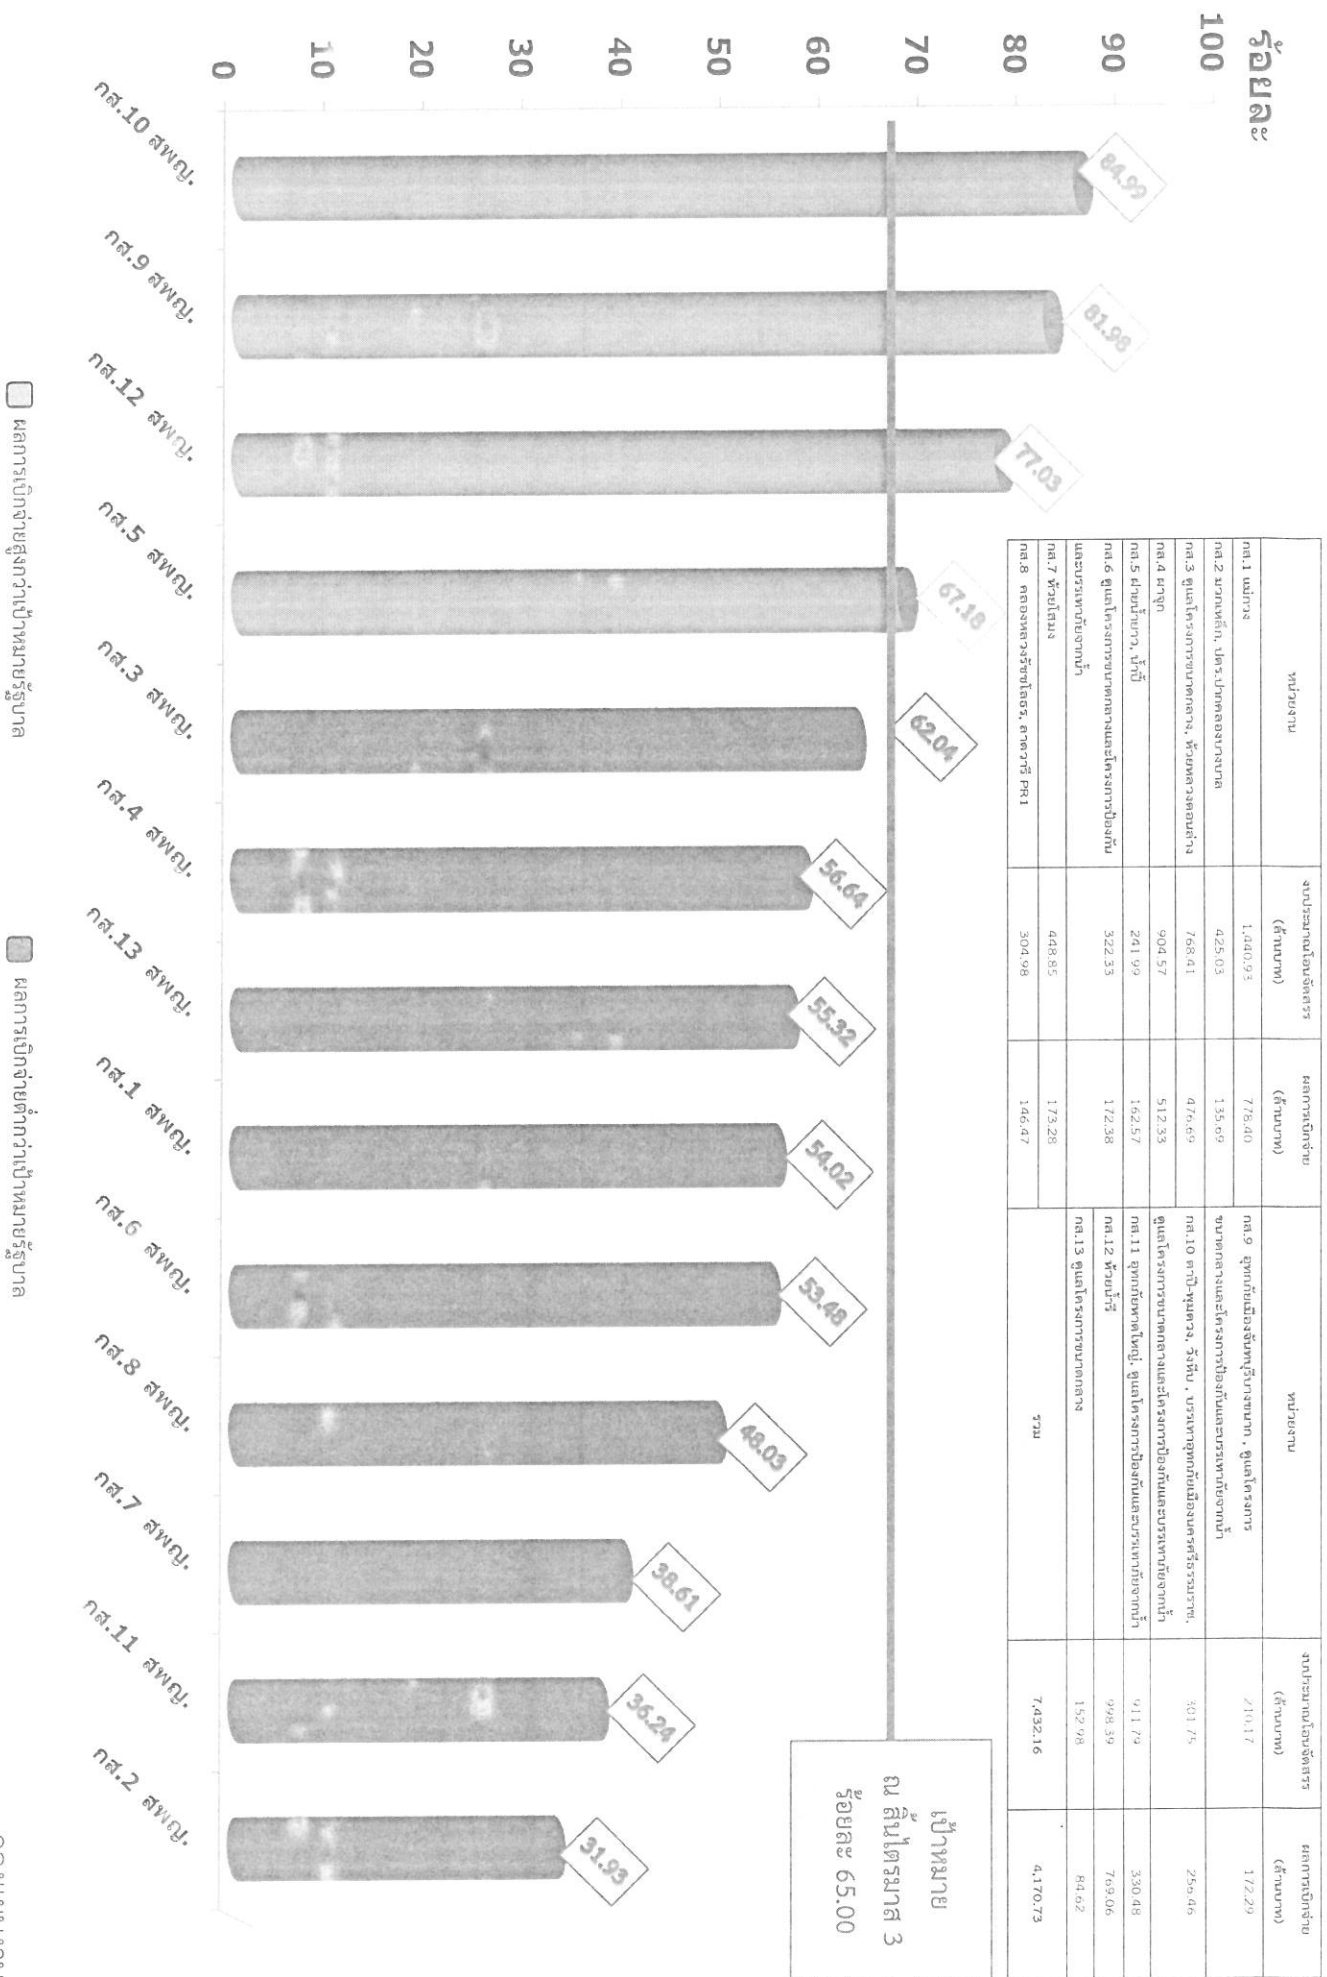


ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

กองแผนงาน

# 9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562)

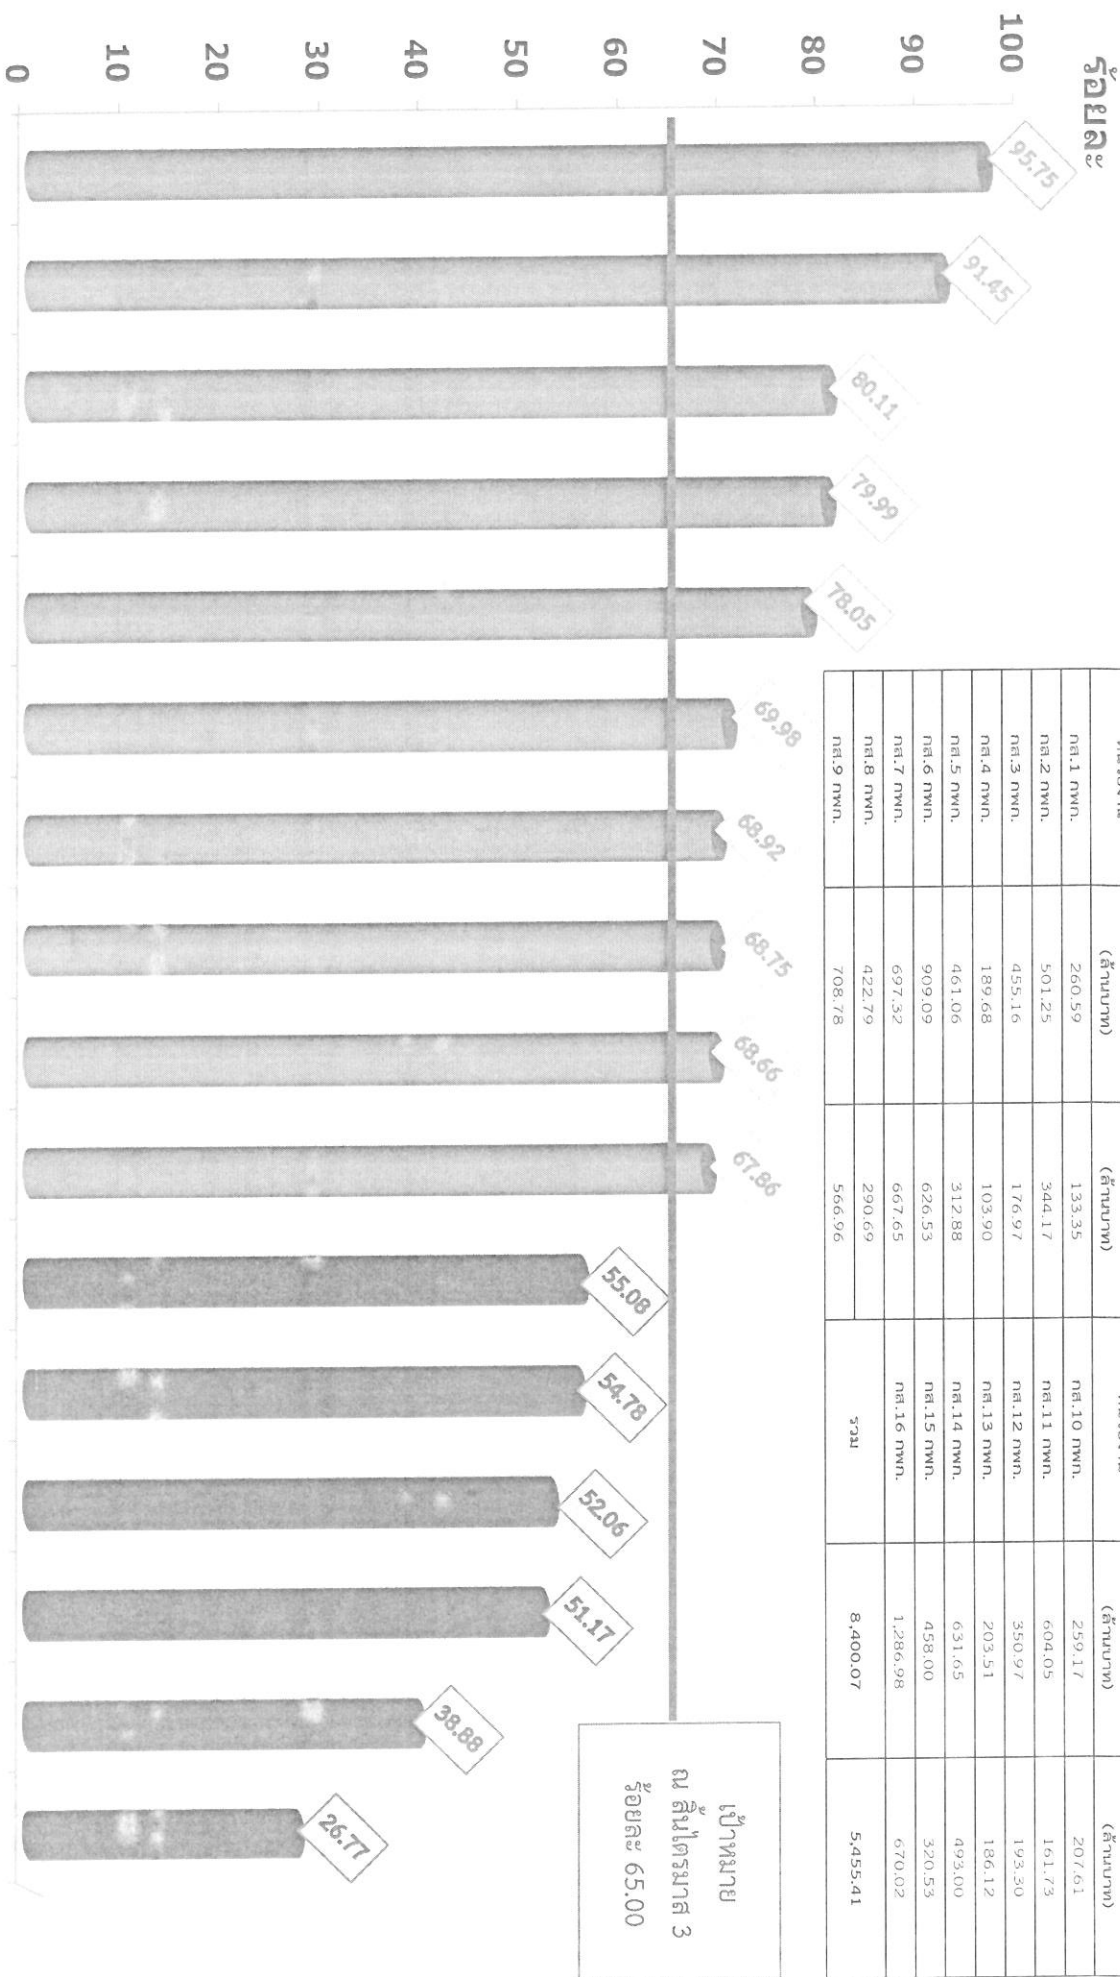

☐ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

■ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

# 10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
<u>ระดับกระทรวง (ที่ใช้งบเกิน 10,000 ล้านบาท)</u>				
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	65,609.77	36,032.91	54.92
2	กระทรวงคมนาคม	166,898.61	90,872.76	54.45
3	กระทรวงมหาดไทย	66,468.77	22,853.40	34.38
<u>ระดับกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</u>				
1	กรมพัฒนาที่ดิน	2,978.20	1,921.50	64.52
2	กรมชลประทาน	58,136.80	31,701.66	54.53
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,409.74	523.05	37.10
<u>ระดับกรม (คู่เทียบ)</u>				
1	กรมทางหลวงชนบท	45,066.06	29,249.43	64.90
2	กรมชลประทาน	58,136.80	31,701.66	54.53
3	กรมทางหลวง	111,218.91	58,283.90	52.40
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	24,487.59	10,634.11	43.43

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 48.13%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (44 หน่วยงาน) เฉลี่ย 47.00%

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
77	5. Elgato Cam Link อุปกรณ์ที่ช่วยให้การ Live ไร้ร่อง Facebook Youtube live, Twitch TV จำนวน 1 อัน (รายการเพิ่มเติม3) - [ 174884 ]	สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	6,000
78	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รายการเพิ่มเติม3) - [ 174886 ]	สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	8,667,000
	<b>สบก. มีจำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ</b>			-	-	<b>299,850,000</b>
79	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174869 ]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 4	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	9,800,000
80	โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัช2) - [ 174542 ]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	17,970,000
81	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174868 ]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	980,000
82	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174870 ]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	9,800,000
83	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ลุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174871 ]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	9,800,000
84	(19) คำดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร - [ 163158 ]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	220,000,000
85	(5) คำดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [ 167272 ]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	20,000,000
86	(7.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 167279 ]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	งานผูกพันใหม่	จ้างเหมาทั้งโครงการ	6,000,000
87	(1.2) คำสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [ 167268 ]	สำนักบริหารโครงการ	ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	1,500,000
88	(7.3) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - [ 167280 ]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	งานผูกพันใหม่	จ้างเหมาทั้งโครงการ	3,000,000
89	(1.1) คำดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [ 167267 ]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	1,000,000
	<b>สบอ. มีจำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ</b>			-	-	<b>29,547,700</b>
90	(1.4.4) บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161640 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	13,163,700
91	(1.4.6) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดสรรน้ำโดยความร่วมมือไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161642 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	144,000

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
92	(1.4.8) บำรุงรักษาโทรมาตรน้ำนอง 120 สถานี ฝายติดตามและพวยกรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161644 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,440,000
93	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แว่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพิบ) - [ 172925 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา		งานปีเดียว		9,800,000
94	(1.3) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [ 163073 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	5,000,000
	<b>สพญ. มีจำนวนรายการทั้งหมด 17 รายการ</b>			-	-	<b>218,557,900</b>
95	ปรับปรุงที่ทำการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อาคารวิชาการ ชั้น 4) กรมชลประทาน สามเสน (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพิบ2) - [ 174631 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		งานปีเดียว		7,140,000
96	ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5.46 กม. และอาคารประกอบโครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพิบ2) - [ 174690 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		งานปีเดียว		80,000,000
97	ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพิบ2) - [ 174743 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		งานปีเดียว		776,000
98	อาคารป้องกันตลิ่งคลองนาทวีฝั่งขวา โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จระนะ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพิบ2) - [ 174745 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		งานปีเดียว		24,717,000
99	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง) - [ 173435 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	2,776,000
100	ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง) - [ 173436 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	776,000
101	(4) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ - [ 163013 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	40,000,000
102	งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 3 (โอนเปลี่ยนแปลง) - [ 173439 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	309,000
103	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา (โอนเปลี่ยนแปลง) - [ 173440 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	858,200
104	(1.1) โครงการพัฒนากลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าสำรวจออกแบบ) - [ 162986 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	3,000,000
105	(1.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 163061 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	3,655,400
106	(2.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 163063 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	5,233,100
107	(3.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 163065 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	5,943,600
108	(1.2) งานระบบประปา - [ 163068 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	1,500,000
