



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐ พ.ร.บ. 7342

ที่ E สบอ(ปก.ว๐๔/๔๒๗/๒๕๖๗) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ สบอ ๖214/15 ส.ค. 2567

เรื่อง สรุบบ้างสั่งการจากการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ งบ 2351

เรียน ผส.บอ.

ตามบันทึกกองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล ที่ กพง ๐๖/๔๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยประชุมวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน โดยมีท่านรองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ขอสรุบบ้างสั่งการจากการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ในกรณีงบประมาณเงินกันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เบิกจ่ายไม่ทัน และ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำข้อผูกพันไม่ทัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ถือว่าผิดวินัยการเงินการคลัง

๒. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการที่ทำข้อผูกพันไม่ทัน และเบิกจ่ายไม่ทัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ให้แจ้งคืนเงินภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๓. ขอให้สำนัก/โครงการ ในส่วนภูมิภาคที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายที่ไม่สามารถบันทึกขอเบิกเงินค่างานที่มีเงินประกันผลงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดการถอนเงินคืนเงินประกันผลงานให้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารในการขอเบิกจ่ายมาที่กองการเงินภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามบันทึกกองการเงิน ที่ ๖๒๓๔๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และในส่วนกลางขอให้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ สัญญาพิมพ์เงิน การเบิกจ่าย และใบสำคัญต่าง ๆ ส่งให้กองการเงินภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. รายการงานที่เป็นอำนาจกรมขอให้ดำเนินการตามแนวทางของกองพัสดุรายละเอียด ดังนี้

- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
- จัดส่งรายงานความต้องการพัสดุ และเอกสารซื้อจ้าง ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
- ประกาศร่าง TOR ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗
- ประกาศเชิญชวน ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

๕. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอให้ดำเนินการประกาศร่าง TOR/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเชิญชวน ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ตามนโยบายของท่าน อธช. และตามบันทึกแจ้งเวียนของกองพัสดุ ตามบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด ๙๕๙๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

/๖. ขอให้ทุก...

๖. ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนรายการ ประเภท งบประมาณ ชื่อรายการงาน วงเงิน และสถานที่ดำเนินการให้ถูกต้องชัดเจน ในระบบ PMS รวมถึงเร่งดำเนินการจัดทำแผนในระบบ PMS ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๗. ขอให้ทุกหน่วยที่เสนอของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ผู้เสนอราคายื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการ



(นายชวลิต ฉลอม)

ผปบ.บอ.

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.1-9 บอ.

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการ



(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘
ที่ กผง ๐๖/๕๓๕/๒๕๖๗ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๕๒๐๗๖๓๗/๖๙๑๑.๖๗
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ นก.๗๐.๖๘๙
๔๒๒๒๓๒

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๗๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ธารทิพย์ ๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน โดยขอให้คณะกรรมการฯ
ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง สำหรับคณะกรรมการฯ
ส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยใช้ Meeting ID : ๙๘๒ ๒๘๔๒ ๕๔๑๓
Passcode : ๒๐๑๗๖๓ พร้อมนี้ได้แนบระเบียบวาระการประชุมมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

- ทบ/คทว

- ๙๙ ๙๙๖.๑๐ ๙๙๖๓.๑๐

๑๐๙๖๓๐๙๙ ๙๙๖๓.๑๐

๑๐๙๖๓๐๙๙ ๙๙๖๓.๑๐

(นายธนทร์ สมบูรณ์)
ผส.บอ.

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
และแบบถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนัก/กอง ชี้แจง)

๔.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กินไว้

เบิกเหลือในปี

๔.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑.๓ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๔ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘ (กพด.)

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 14 สิงหาคม 2567

เวลา 09.30 - 12.00 น. ห้องประชุมประชุมธารทิพย์ ชั้น 4
อาคาร 99 ปี มถ.ชวชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ลำดับ/กอง ชัดแจ้ง)

4.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือเป็น

4.1.2 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1.3 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1.4 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.2 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กพต.)

ONE FOR ALL

ระเบียบวาระที่ 5


เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)





ระเบียบวารสารที่ 1

เรื่องที่ประธานแม่ข่ายให้ที่ประชุมทราบ

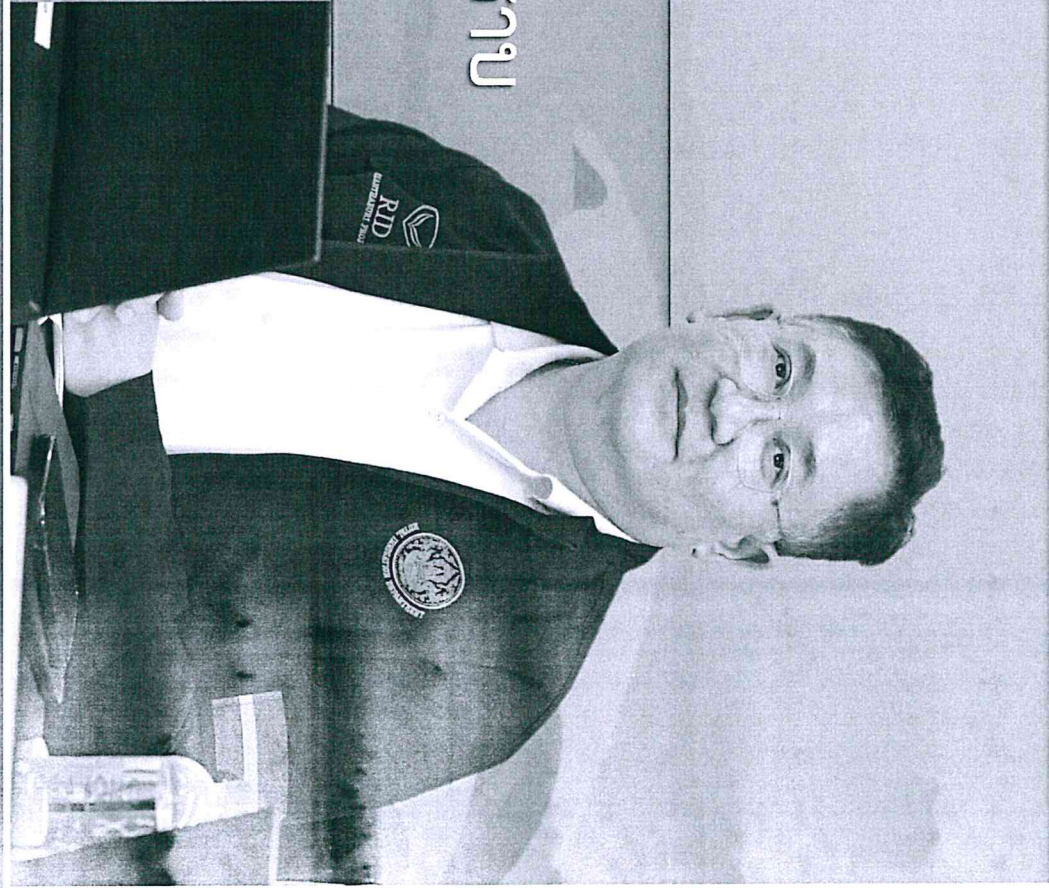

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

ตามบันทึกกองแผนงานที่ กพง 06/337/2567 ลว 19 มิถุนายน 2567

แจ้งให้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2567

ไม่มีผู้แจ้งแก้ไขรายงานการประชุม





ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
งบประมาณ	81,118.28 ลบ.
เบิกจ่าย	42,676.99 ลบ.น.
ใช้จ่าย	59,831.21 ลบ.
ใช้จ่าย	73.76 %
งบประมาณ	7,196.14 ลบ.
เบิกจ่าย	6,214.87 ลบ.
ใช้จ่าย	6,296.10 ลบ.
ใช้จ่าย	87.49 %
งบประมาณ	73,922.14 ลบ.
เบิกจ่าย	36,462.12 ลบ.
ใช้จ่าย	49.33 %
ใช้จ่าย	53.535.11 ลบ.
	72.42 %

ผลการดำเนินงาน	
ผลสำเร็จ	1,264 รายการ
ดำเนินการก่อสร้าง	8,886 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	94 รายการ
ยังไม่ดำเนินการ	127 รายการ
ยกเลิก	194 รายการ

หมายเหตุ

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง
- ไม่ทราบผลยึดจัดจ้างตามลักษณะ
- การดำเนินการโอนเงินจัดสรร (รายการเปลี่ยนแปลง)

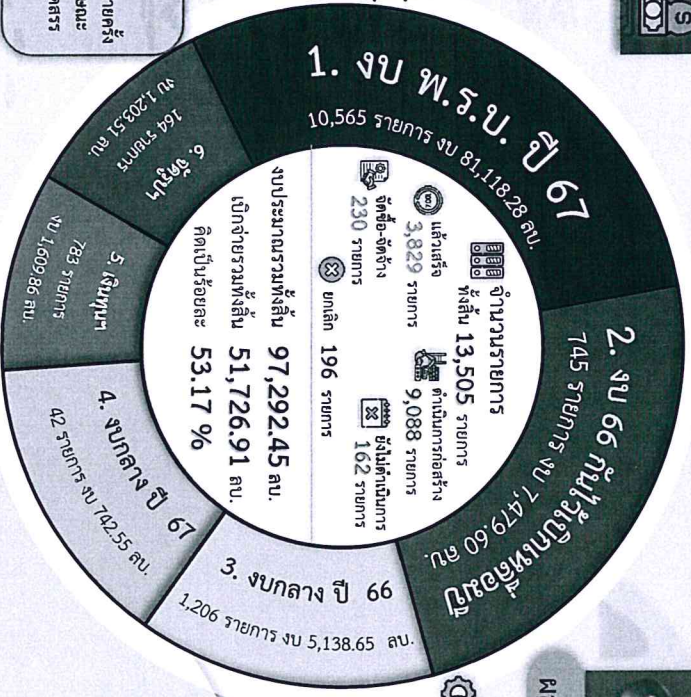

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินใช้เบิกเหลือปี



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
งบประมาณ	7,479.60 ลบ.
เบิกจ่าย	6,577.84 ลบ.
คงเหลือ	901.76 ลบ.
ยกเลิก	1 รายการ
ดำเนินการก่อสร้าง	83 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	11 รายการ
ยกเลิก	1 รายการ

3. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน	
ผลสำเร็จ	1,206 รายการ
ดำเนินการก่อสร้าง	1,194 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	11 รายการ
ยังไม่ดำเนินการ	1 รายการ
ยกเลิก	1 รายการ

4. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2567



ผลการดำเนินงาน	
ผลสำเร็จ	42 รายการ
ดำเนินการก่อสร้าง	28 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	4 รายการ

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน



ผลการดำเนินงาน	
ผลสำเร็จ	783 รายการ
ดำเนินการก่อสร้าง	641 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	107 รายการ
ยังไม่ดำเนินการ	35 รายการ

6. งานกองทุนจัดรูปที่ดิน



ผลการดำเนินงาน	
ผลสำเร็จ	164 รายการ
ดำเนินการก่อสร้าง	80 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	25 รายการ



งบประมาณ 1,203.51 ลบ.	
เบิกจ่าย	801.04 ลบ.
ดำเนินการก่อสร้าง	80 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	25 รายการ
ยังไม่ดำเนินการ	66.56 %

งบประมาณ 1,609.86 ลบ.	
เบิกจ่าย	486.42 ลบ.
ดำเนินการก่อสร้าง	80 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง	25 รายการ
ยังไม่ดำเนินการ	30.22 %

ระเบียบวารสารที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 4.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไม่เบิกเหลือเงิน





ทุกสำนัก/กอง จะต้องเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไม่เบิกเหลือเงิน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2567 เพื่อป้องกันงบประมาณถูกปิดโดยผลของกฎหมาย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 34 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สำนัก/กอง	งบประมาณงบสิ้นปี หลังโอนเปลี่ยนแปลง	סהเบיקจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย/ เบิกจ่ายไม่ทัน/ยกเลิก	งบประมาณที่ ค้างดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	7,479.60	6,577.84	87.94	901.76	132.02	769.74
สขบ. 1	76.76	71.55	93.21	5.21	4.51	0.70
สขบ. 2	35.83	34.95	97.54	0.88	0.02	0.86
สขบ. 3	122.31	118.87	97.19	3.44	3.44	
สขบ. 4	167.43	81.72	48.81	85.71	0.24	85.47
สขบ. 5	99.00	92.85	93.79	6.15	0.24	5.91
สขบ. 6	170.55	147.45	86.46	23.10	0.29	22.81
สขบ. 7	399.80	399.37	99.89	0.43	0.43	
สขบ. 8	514.44	451.84	87.83	62.60	0.38	62.22
สขบ. 9	383.32	362.84	94.66	20.48	0.95	19.53
สขบ. 10	99.36	93.78	94.38	5.58	0.01	5.57
สขบ. 11	250.04	235.34	94.12	14.70	5.22	9.48
สขบ. 12	111.98	111.98	100.00			
สขบ. 13	307.60	272.13	88.47	35.47	1.16	34.31
สขบ. 14	332.20	303.61	91.39	28.59	2.77	25.82
สขบ. 15	110.15	108.76	98.74	1.39	1.39	
สขบ. 16	563.57	514.21	91.24	49.36	4.72	44.64
สขบ. 17	231.31	211.35	91.37	19.96	8.49	11.47
สขบ. 18	115.28	115.28	100.00			
กทท.	1,174.96	1,061.79	90.37	113.17	24.39	88.78
กทท.	3.97	3.97	100.00			
กทท.	0.15	0.15	100.00			
สพท.	3.61	3.07	85.04	0.54	0.54	
สธค.	147.32	143.65	97.51	3.67	3.67	3.67
สคค.	15.53	15.50	99.81	0.03	0.03	
สจค.	31.60	31.58	99.94	0.02	0.01	0.01
สคก.	54.68	53.74	98.28	0.94	0.94	0.94
สขท.	162.71	100.98	62.06	61.73	1.08	60.65
สพท.	1,514.13	1,168.82	77.19	345.31	71.71	273.60
สวท.	0.19	0.19	100.00			
สอธ.	56.69	47.67	84.09	9.02		9.02
กทส.	2.15	2.15	100.00			
กทส.	3.96	3.96	100.00			
Lump Sum	217.02	212.74	98.03	4.28		4.28

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและภาษีใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567
4.1.2 ผลการเบิกจ่ายและภาษีใช้จ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพรวมงบกลาง 2566

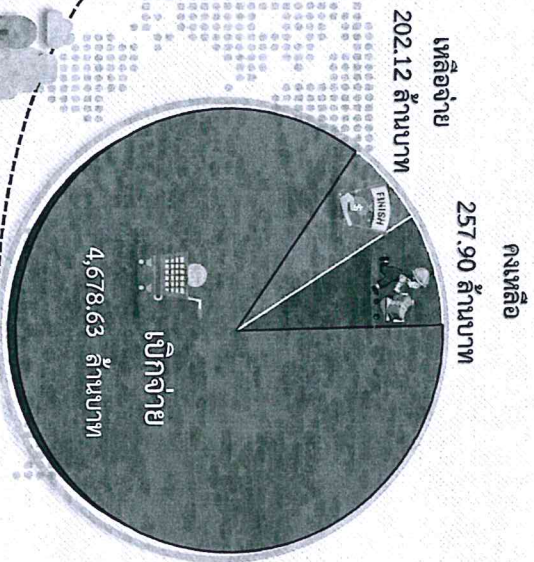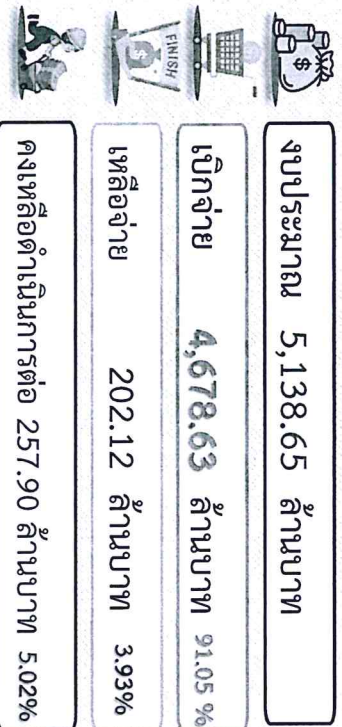

สำนัก ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

สำนัก	จำนวนรายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	11	526.19	268.29	50.99	257.90
โครงการฝ่ายชั่วคราวกินเงินเดือน (โครงการหนองขี้ฉี่)					
ศพ.4	1	300.00	90.74	30.25	209.26
รวม	10	226.19	177.55	78.49	48.65
ศพ.1	4	37.10	29.00	78.17	8.10
ศพ.2	1	28.82	25.88	89.78	2.94
ศพ.5	1	21.01	9.06	43.09	11.96
ศพ.9	2	43.24	34.06	78.76	9.18
ศพ.14	1	48.00	42.29	88.11	5.71
ศพ.15	1	48.01	37.26	77.61	10.75

สำนัก/กอง เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2567
เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามรังวัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4.1.3 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลจาก กนง. ณ วันที่ 9 ส.ค. 67
งบรายจ่ายลงทุน

งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
73,922.14 ล้านบาท

เบิกจ่าย
36,462.12 ล้านบาท
← 49.33 %

ใช้จ่าย
53,535.11 ล้านบาท
← 72.42 %


สำนัก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
กทท.	12,205.18	7,981.49	65.39	9,583.00	78.52
สพญ.	10,396.15	5,912.64	56.87	8,169.46	78.58
สผด.	5,004.82	3,472.12	69.38	3,474.67	69.43
สคก.	2,333.15	473.59	20.30	613.58	26.30
สพอ.	638.53	239.23	37.47	551.22	86.33
สพค.	597.34	226.92	37.99	405.31	67.85
สสร.	498.72	307.03	61.56	388.82	77.96
สอฝ.	510.34	251.95	49.37	390.75	76.57
สจค.	264.53	124.04	46.89	187.99	71.07
สลก.	43.00	13.76	32.00	14.28	33.21
สจพ.	8.26	3.93	47.58	4.55	55.08

สำนัก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
กนง.	0.03	0.02	66.67	0.02	66.67
สพช.	0.62	0.31	50.00	0.41	66.13
ศทล.	43.51	6.42	14.76	36.22	83.25
กงบ.	1.43	1.23	86.01	1.23	86.01
กพค.	0.01	0.01	100.00	0.01	100.00
กสช.	1.09	0.51	46.79	0.51	46.79
สพค.	0.02	0.02	100.00	0.02	100.00
กปพ.	0.0039	0.0025	64.10	0.0025	64.10
กตม.	0.0034	0.0017	50.00	0.0017	50.00
กพร.	0.0072	0.0035	48.61	0.0035	48.61
เบิกแทน	581.81	191.95	32.99	271.28	46.61

ร้อยละ %

ข้อมูลเมื่อ

เร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณให้เริ่มไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยเป้าหมายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นปีงบประมาณ 100% และ เบิกจ่าย 75%

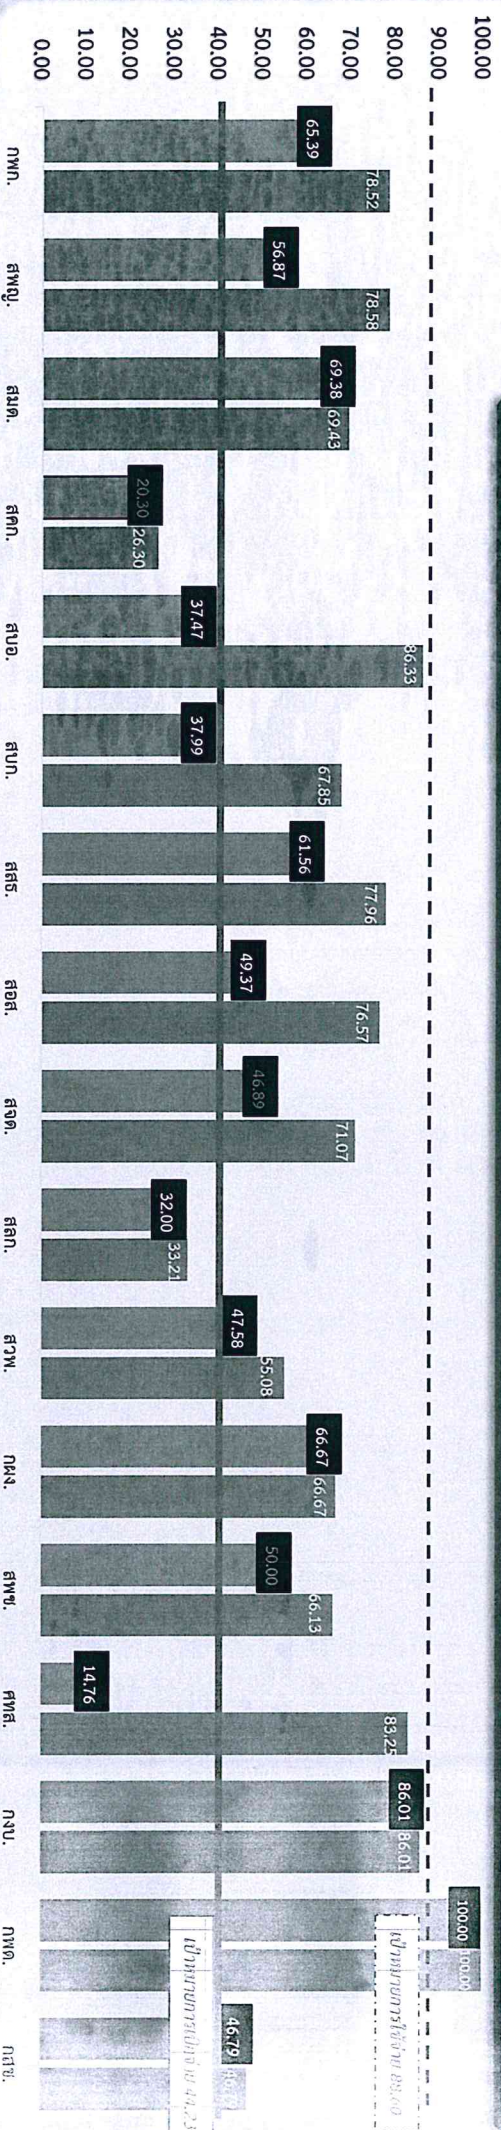

เป้าหมายการใช้จ่าย 89.60

เป้าหมายการใช้จ่าย 44.23

เป้าหมายการใช้จ่าย 44.23


ระเบียบวารสารที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4.1.3 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส่วนภูมิภาค)

สำนัก	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
สชป. 1	1,570.76	649.45	41.35	1,058.24	67.37
สชป. 2	2,306.02	905.69	39.28	1,450.01	62.88
สชป. 3	2,014.30	898.80	44.62	1,391.08	69.06
สชป. 4	1,789.80	912.62	50.99	1,298.87	72.57
สชป. 5	3,435.65	1,858.37	54.09	2,634.86	76.69
สชป. 6	3,384.83	1,660.02	49.04	2,402.42	70.98
สชป. 7	4,580.15	2,578.62	56.30	3,677.78	80.30
สชป. 8	3,773.73	1,693.02	44.86	2,683.20	71.10
สชป. 9	2,307.70	1,103.16	47.80	1,718.17	74.45
สชป. 10	2,111.81	602.53	28.53	1,295.21	61.33
สชป. 11	1,547.34	435.90	28.17	757.98	48.99
สชป. 12	2,174.28	870.78	40.05	1,818.51	83.64
สชป. 13	1,882.68	900.51	47.83	1,387.98	73.72
สชป. 14	2,531.85	932.79	36.84	1,541.78	60.89
สชป. 15	1,403.13	536.80	38.26	958.84	68.34
สชป. 16	2,513.67	447.38	17.80	2,037.02	81.04
สชป. 17	1,465.89	268.51	18.32	1,329.88	90.72

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567

ร้อยละ %

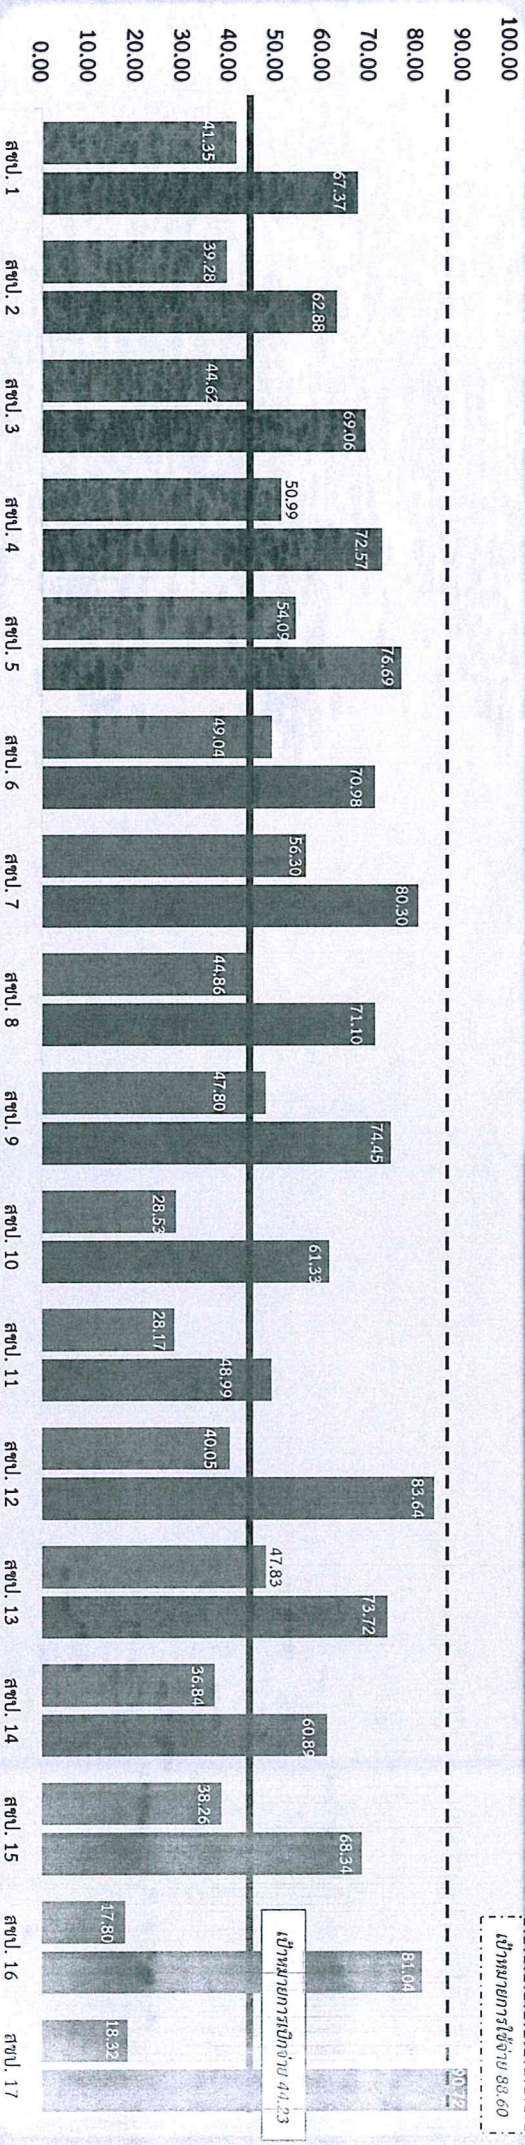

เป้าหมายการใช้จ่าย 88.60

เป้าหมายการเบิกจ่าย 71.23

เร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณให้ขึ้นไปตามเป้าหมายที่รัฐบอกกำหนด โดยเป้าหมายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย 100% และ เบิกจ่าย 75%

ข้อเสนอ

วาระที่ 4.2



การดำเนินการเลือกตั้งผู้เลือกตั้งสภาสำหรับงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผู้นำเสนอ : กองพัสดุ

รายงานความก้าวหน้าหน้าการวัดผลผู้วัดต่าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 12.00 น.

รายงานความก้าวหน้าการลดข้อขัดข้องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานความก้าวหน้าการลดข้อขัดข้อง งบประมาณ 2567
ข้อมูลจากระบบ PMS ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 12:46 น.

(1)	วงเงินจัดสรรทั้งหมด	48,605,320,899.15	100.00%
(2)	ดำเนินการลดงบแล้ว	44,501,586,664.69	91.56%
(3)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4,103,734,234.46	8.44%
	(3.1) e-bid/คัดเลือก	992,608,864.14	2.04%
	(3.2) เปรียง	3,111,125,370.32	6.40%
(4)	วงเงินจัดสรรที่ยังไม่ได้ลดงบแล้ว	35,989,166,990.17	74.04%
(5)	งบกลาง (งบจัดสรร)	33,054,158,046.70	68.01%
(6)	งบส่วนราชการ/งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน/งบจัดซื้อจัดจ้าง	8,512,419,674.52	17.51%
(7)	วงเงินจัดสรรงบดำเนินงาน/งบอุดหนุน	32,269,113,512.56	66.39%
(8)	งบกลาง (งบจัดสรร) (งบอุดหนุน)	29,607,000,760.26	60.91%
(9)	วงเงินจัดสรรงบดำเนินงาน/งบอุดหนุน	3,720,053,477.61	7.65%
(10)	รวมงบอุดหนุน (งบอุดหนุน)	3,447,157,286.44	7.09%

รายงานข้อมูลการลดข้อขัดข้อง วิธี e-bidding และวิธีคัดเลือก
ข้อมูลจากระบบ PMS ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 12:46 น.

สำนัก/กอง	ยังไม่ประกาศ TOR/เชิญชวน		ประกาศ TOR/เชิญชวน/พิจารณา		อนุมัติ/ประกาศผู้ชนะ		ทำสัญญา		รวมทั้งหมด	
	ผ.	วงเงินจัดสรร	ผ.	วงเงินจัดสรร	ผ.	วงเงินจัดสรร	ผ.	วงเงินจัดสรร	ผ.	วงเงินจัดสรร
ตพต.	0	0.00	0	0.00	1	7,000,000.00	2	33,000,000.00	3	40,000,000.00
ตถก.	6	24,944,192.51	1	2,260,000.00	0	0.00	0	0.00	7	27,204,192.51
กวก.	0	0.00	6	2,057,261,100.00	10	1,359,887,288.37	292	2,636,606,652.04	308	6,053,755,040.41
ตถก.	4	913,281,200.00	11	681,315,866.00	5	273,673,636.13	96	175,006,153.21	116	2,043,276,855.34
ตจต.	0	0.00	0	0.00	3	4,631,989.71	38	107,227,711.28	41	111,859,700.99
ตพญ.	1	2,633,000.00	7	4,298,368,400.00	5	26,059,500.00	112	1,296,470,798.21	125	5,623,531,638.21
ตขป.1	1	2,320,000.00	6	17,358,241.46	11	33,731,379.16	121	493,821,416.28	139	547,231,036.90
ตขป.2	0	0.00	3	128,408,266.37	6	18,003,560.64	162	623,031,938.82	171	769,443,765.93
ตขป.3	0	0.00	0	0.00	2	2,401,000.00	169	683,738,625.58	171	686,139,625.58
ตขป.4	0	0.00	2	5,738,468.00	6	25,423,157.30	200	728,765,860.94	208	759,927,486.24
ตขป.5	1	589,900.00	0	0.00	14	89,353,275.78	313	1,595,155,643.12	328	1,685,096,818.90
ตขป.6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	276	1,471,465,160.32	276	1,471,465,160.32
ตขป.7	1	596,000.00	1	16,707,700.00	32	222,066,782.78	381	2,376,029,336.97	415	2,615,399,819.75
ตขป.8	2	1,675,502.00	5	6,469,063.85	8	76,323,547.74	437	1,673,367,676.81	452	1,757,835,790.40
ตขป.9	1	6,866,700.00	6	50,386,633.96	31	126,673,948.85	226	812,724,579.46	264	956,651,862.27
ตขป.10	5	21,958,181.63	4	287,654,760.00	16	99,254,185.13	138	1,016,399,148.78	163	1,425,266,275.54
ตขป.11	0	0.00	0	0.00	10	161,625,034.26	78	557,146,131.77	88	718,771,166.03
ตขป.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	152	1,270,421,065.18	152	1,270,421,065.18
ตขป.13	0	0.00	8	38,177,695.00	10	18,735,320.00	116	772,437,251.59	134	829,350,286.59
ตขป.14	1	3,784,188.00	13	145,290,770.58	19	123,660,232.41	255	1,087,349,570.97	288	1,350,084,751.96
ตขป.15	0	0.00	0	0.00	6	125,097,354.75	82	696,467,342.23	88	821,564,686.98
ตขป.16	1	13,960,000.00	1	38,050,000.00	12	159,913,050.05	161	1,763,086,658.59	175	1,975,009,708.64
ตขป.17	0	0.00	0	0.00	3	123,760,780.38	198	1,169,168,771.92	201	1,292,929,552.30
ตปอ.	0	0.00	0	0.00	1	12,107,900.00	28	291,958,500.00	29	304,066,400.00
ตปท.	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	546,500,000.00	15	546,500,000.00
ตสธ.	0	0.00	0	0.00	1	15,000,000.00	4	75,620,000.00	5	90,620,000.00
ตสอ.	0	0.00	5	635,000,000.00	3	85,000,000.00	0	0.00	8	720,000,000.00
กรรวม	24	992,608,864.14	79	8,408,446,965.22	215	3,189,382,923.44	4052	23,952,963,994.07	4370	36,543,402,746.87

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 (ปีรวมงบประมาณก่อน) - พักรัง
ข้อมูลจากระบบ PMS ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 12:46 น.

ส่วนงาน	(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(16)+(18)	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน			
สำนัก/กอง	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่จ่ายแล้ว (ตามใบ)	วงเงินที่อนุมัติสัญญา (ตามใบ)	ผลการอนุมัติสัญญา (ตามใบ)	AI0-อนุมัติสัญญา (วงเงินที่จ่าย)	ผลการอนุมัติสัญญา (ตามใบ)	AI1-อนุมัติสัญญา (ตามใบ)	ชำระ (%)	ชำระ (%)	ชำระ (%)	ชำระ (%)	ชำระ (%)	ชำระ (%)			
สำนักงาน	12,375	31,518,974,848.49	53,969	29,153,619,655.20	53,431	28,351,297,665.42	25,865,031,174.89	50.501	26,469,871,850.15	24,125,562,225.14	20,222,561,635.04	92.53	89.95	83.98	88.82	1
1 สำนัก.12	881	1,696,625,530.24	3,462	1,650,820,793.11	3,455	1,650,323,906.90	1,500,485,101.05	3,314	1,632,809,654.19	1,482,982,489.51	1,463,702,399.42	97.30	97.27	96.24	96.94	สำนัก.12
2 สบอ.	81	325,292,487.10	88	322,552,852.00	86	314,952,852.00	313,257,923.10	82	302,187,525.00	300,551,486.10	98,136,019.00	99.16	96.82	92.90	96.29	สบอ.
3 สำนัก.17	439	1,337,664,797.96	722	1,328,801,530.04	720	1,328,627,530.04	1,312,747,952.51	696	1,204,506,544.64	1,190,876,400.01	1,181,404,438.01	99.34	99.32	90.05	96.24	สำนัก.17
4 สำนัก.15	721	1,000,568,067.32	1,884	980,546,302.82	1,878	980,327,067.82	828,923,914.85	1,840	851,198,945.74	721,650,290.94	720,939,748.20	98.00	97.98	85.07	93.68	สำนัก.15
5 สำนัก.16	677	2,322,709,993.40	1,777	2,242,680,956.65	1,756	2,202,065,858.72	1,994,149,439.97	1,653	2,029,244,412.42	1,824,765,993.12	1,777,557,530.63	96.55	94.81	87.37	92.91	สำนัก.16
6 สำนัก.5	805	2,469,628,791.08	4,261	2,310,956,157.11	4,242	2,306,085,884.93	2,075,451,584.64	4,123	2,192,404,987.18	1,964,602,751.45	1,772,477,072.47	93.58	93.38	88.77	91.91	สำนัก.5
7 สำนัก.7	881	3,854,767,386.58	5,047	3,587,172,327.74	5,036	3,568,675,056.57	3,306,257,052.27	4,796	3,308,375,575.47	3,068,179,987.77	1,759,882,827.11	93.06	92.58	85.83	90.49	สำนัก.7
8 สำนัก.13	929	1,371,540,625.31	3,926	1,234,218,659.10	3,899	1,193,864,801.10	1,130,100,117.47	3,723	1,149,373,435.27	1,092,028,070.08	855,823,450.20	93.39	90.34	86.97	90.23	สำนัก.13
9 สำนัก.11	438	1,052,873,652.24	2,310	1,013,110,043.86	2,303	1,012,943,666.86	928,471,488.02	2,216	823,191,394.05	750,605,521.97	538,819,937.80	96.22	96.21	78.19	90.21	สำนัก.11
10 สำนัก.3	456	1,180,321,950.91	2,434	1,051,640,291.36	2,420	1,050,833,558.04	936,580,358.28	2,350	1,039,577,718.08	925,838,408.08	888,389,821.45	89.10	89.03	88.08	88.73	สำนัก.3
11 สำนัก.9	1,122	1,626,684,244.35	4,320	1,535,257,248.40	4,277	1,482,485,681.72	1,388,054,244.97	3,860	1,293,302,011.22	1,211,467,341.49	1,019,775,365.46	94.38	91.14	79.51	88.34	สำนัก.9
12 สำนัก.6	773	2,617,588,540.03	4,441	2,331,536,480.67	4,402	2,326,419,785.12	2,133,164,416.75	4,099	2,257,989,657.50	2,065,054,467.77	1,622,608,747.36	89.07	88.88	86.26	88.07	สำนัก.6
13 สำนัก.4	744	1,275,272,429.17	3,077	1,133,504,135.17	2,996	1,128,056,848.16	1,006,084,153.29	2,830	1,080,412,540.90	961,668,815.85	872,725,610.68	90.45	88.46	84.72	87.88	สำนัก.4
14 สำนัก.1	702	1,076,816,866.60	2,794	980,758,245.09	2,734	956,296,693.25	871,148,926.68	2,507	892,525,872.01	818,229,885.48	656,302,087.76	91.08	88.81	82.89	87.59	สำนัก.1
15 สำนัก.8	1,102	3,066,489,582.40	5,382	2,714,186,552.27	5,321	2,698,783,150.25	2,407,309,563.62	5,164	2,590,409,664.06	2,313,876,744.83	2,194,702,865.54	88.51	88.01	84.47	87.00	สำนัก.8
16 สำนัก.14	373	1,920,272,945.57	1,941	1,729,740,110.25	1,883	1,579,464,950.74	1,423,239,602.41	1,618	1,419,621,914.09	1,278,288,997.67	1,044,539,658.63	90.08	82.25	73.93	82.09	สำนัก.14
17 สำนัก.2	408	1,499,117,993.83	3,200	1,286,406,136.52	3,140	1,150,903,493.92	1,066,882,515.86	3,010	1,112,176,169.20	1,030,486,100.86	1,018,225,028.87	85.81	76.77	74.15	78.92	สำนัก.2
18 สำนัก.10	843	1,874,738,964.40	2,903	1,709,728,843.04	2,883	1,420,186,879.28	1,240,722,819.15	2,620	1,290,563,829.13	1,124,408,462.16	736,549,026.45	91.20	75.75	68.84	78.60	สำนัก.10
สำนักงบฯ	4	72,260,000.00	7	42,829,019.75	6	40,569,019.75	38,710,866.89	5	33,569,019.75	33,290,373.15	33,290,373.15	59.27	56.14	46.46	53.96	สำนัก.10
1 สำนัก.1	1	40,000,000.00	3	40,000,000.00	3	40,000,000.00	38,142,903.74	2	33,000,000.00	32,722,410.00	32,722,410.00	100.00	100.00	82.50	94.17	สำนัก.1
2 สำนัก.3	3	32,260,000.00	4	2,829,019.75	3	569,019.75	567,963.15	3	569,019.75	567,963.15	567,963.15	8.77	1.76	1.76	4.10	สำนัก.3
สำนักงบฯ	42	1,364,747,112.00	62	1,360,050,911.97	57	725,050,911.97	718,324,888.51	53	625,050,911.97	619,978,824.97	159,184,436.17	99.66	53.13	45.80	66.19	สำนัก.1
1 สำนัก.15	15	546,500,000.00	15	546,500,000.00	15	546,500,000.00	542,366,649.10	15	546,500,000.00	542,366,649.10	81,975,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	สำนัก.15
2 สำนัก.17	10	498,000.00	17	497,883.00	17	497,883.00	497,883.00	17	497,883.00	497,883.00	254,751.30	99.98	99.98	99.98	99.98	สำนัก.17
3 สำนัก.5	9	97,749,112.00	22	93,053,028.97	22	93,053,028.97	92,054,292.87	21	78,053,028.97	77,114,292.87	76,954,684.87	95.20	95.20	79.85	90.08	สำนัก.5
4 สำนัก.8	8	720,000,000.00	8	720,000,000.00	3	85,000,000.00	83,406,073.54	0	0.00	0.00	0.00	100.00	11.81	0.00	37.27	สำนัก.8
สำนักงบฯ	665	15,649,338,938.66	3,736	13,995,087,067.77	3,633	6,872,249,393.03	6,434,091,106.41	3,365	5,140,621,730.69	4,828,169,337.00	3,328,951,398.05	89.05	43.91	32.85	55.27	สำนัก.1
1 สำนัก.6	50	179,255,638.73	301	170,097,745.32	301	170,097,745.32	160,179,560.87	293	164,831,035.61	157,078,445.89	66,884,200.32	94.89	94.89	91.95	93.91	สำนัก.6
2 สำนัก.1	141	6,684,879,862.44	1,398	6,406,674,036.63	1,362	4,339,058,845.63	4,029,495,113.78	1,259	2,954,310,145.86	2,759,655,269.12	2,171,389,513.21	95.84	64.91	44.19	68.31	สำนัก.1
3 สำนัก.1	90	5,906,543,413.06	521	5,750,221,182.74	503	1,450,784,524.30	1,357,084,925.77	472	1,418,412,851.00	1,330,557,797.80	698,357,153.57	97.35	24.56	24.01	48.64	สำนัก.1
4 สำนัก.1	384	2,878,660,024.43	1,516	1,608,094,103.08	1,467	912,308,277.78	887,331,505.99	1,341	603,067,698.22	580,897,824.19	392,320,530.95	55.86	31.69	20.95	36.17	สำนัก.1
สำนักงบฯ	13,086	48,605,320,899.15	57,774	44,501,586,664.69	57,127	35,989,166,990.17	33,054,158,046.70	53,924	32,269,113,512.56	29,607,000,760.26	23,743,987,842.41	91.56	74.04	66.39	77.33	สำนัก.1

รายงานงบประมาณปี 2567 ที่ยังไม่ประกาศเชิญชวน (วิธี e-bidding / วิธีคัดเลือก)

สำนัก/กอง	หน่วยงาน	รหัสแผน (ผ)	ชื่อโครงการ	หน่วยจัดทา	จำนวน ผย	วงเงิน
ศคก.	ศคก.	P67014058	เครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิคส่งระยะไกล ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิคส่งระยะไกลแบบปรับอัตราการไหลตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี 30 เครื่อง	กองพัสดุ	1	360,000,000.00
	ศคก.	P67019953	รถบดล้อหนามชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร 3 คัน	หน่วยงานเจ้าของงาน	1	7,500,000.00
	ศคก.	P67022002	ประตูระบายน้ำปลาคลองระบายน 1 ซวา สุพรรณ 3 พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	หน่วยงานเจ้าของงาน	1	18,314,000.00
	ศคก.	P67022399	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี จำนวน 52 เครื่อง	กองพัสดุ	1	527,467,200.00
ศชป.1	คป.ลำพูน	P67012727	ปรับปรุงอาคารคลังน้ำมันและอาคารประกอบ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	หน่วยงานเจ้าของงาน	1	2,320,000.00
ศชป.5	คป.หนองบัวลำภู	P67020935	(290) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งเห็ด ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ยกเลิก)	หน่วยงานเจ้าของงาน	1	589,900.00
ศชป.7	คป.น่าน	P67009898	ปรับปรุงคันดินและอาคารรับน้ำบึงจอก ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	หน่วยงานเจ้าของงาน	1	596,000.00
ศชป.8	คป.ลำปางลายมาศ	P67012902	ซ่อมแซมเขมคลองส่งน้ำ RMC ฝ่ายปะคำ กม. 12+000 - ปลายคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปางลายมาศ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	หน่วยงานเจ้าของงาน	1	669,600.00
	คป.ศรีสะเกษ	P67017723	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำข้างเขมก อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม (ระยะที่ 3) โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ยกเลิก)	หน่วยงานเจ้าของงาน	1	1,005,902.00
ศชป.9	คป.บางพลาง	P67020722	(103) ประตูระบายน้ำบ้านแม่หลมทราย ตำบลบางแตง อำเภอป่าสัก จังหวัดปราจีนบุรี	หน่วยงานเจ้าของงาน	1	6,866,700.00
ศชป.10	คป.ป่าสักชลสิทธิ์	P67014596	ปรับปรุงท่อส่งน้ำ 2L-1R-MP ความยาว 1.490 กิโลเมตร โครงการจัดหาท่อเพื่อการเกษตรจังหวัดคพบุรี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์	หน่วยงานเจ้าของงาน	2	7,205,715.16
	คป.ป่าสักชลสิทธิ์	P67014667	ปรับปรุงท่อส่งน้ำ 2R-1R-MP ความยาว 1.310 กิโลเมตร โครงการจัดหาท่อเพื่อการเกษตรจังหวัดคพบุรี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์	หน่วยงานเจ้าของงาน	2	6,528,666.47
	คป.ป่าสักชลสิทธิ์	P67019426	ปรับปรุงท่อส่งน้ำ 1R-MP ระยะที่ 2 ความยาว 1.550 กิโลเมตร โครงการจัดหาท่อเพื่อการเกษตรจังหวัดคพบุรี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์	หน่วยงานเจ้าของงาน	1	8,223,800.00

รายงานงบประมาณปี 2567 ที่ยังไม่ประกาศเชิญชวน (วิธี e-bidding / วิธีคัดเลือก)

สำนัก/กอง	หน่วยงาน	รหัสแผน (ผ)	ชื่อโครงการ	หน่วยจัดท	จำนวน	ผย	วงเงิน
สขบ.14	คบ.ปราบปราม	P67020900	ผยคตลงน้อยพริ้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หน่วยงานเจ้าของงาน	1		3,784,188.00
สขบ.16	คส.ขบ.16	P67023569	โครงการปรับปรุงฝายบ้านตุ้มโฮ๊ะ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	สำนัก/กอง	1		13,960,000.00
สพญ.	สพญ.7	P67007086	ระบบท่อส่งน้ำส่งขวาส่งมายบ้านตุ้มโฮ๊ะ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	หน่วยงานเจ้าของงาน	1		2,633,000.00
สคก.	สคก.	P67018667	น้ำส่งขวาสถานีสูบน้ำลาดวารี่ PR-1 จังหวัดอุบลราชธานี	หน่วยงานเจ้าของงาน	5		19,944,192.51
	สคก.	P67019008	ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ภายในพื้นที่กรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	หน่วยงานเจ้าของงาน	1		5,000,000.00
ผลรวม			ตุ้มโฮ๊ะ กรุงเทพมหานคร		24		992,608,864.14

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วาระที่ 1

ส.ส. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ ปี 2567

19 - 20
มิ.ย. 67

วาระที่ 2

ส.ส. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ ปี 2568 งบประมาณ ปี 2568

วุฒิสภา

4 - 5
ก.ย. 67

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกรายการ (25 ส.ค. 67)

9 - 10
ก.ย. 67

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกรายการ (6 ก.ย. 67)

17 กันยายน 2567
สสค. นำร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณปี 2568
ขึ้นสู่สภาต่างๆ

บันทึกกองพัสดุ
ที่ กพด 9594/2567
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2567
เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างและการเร่งรัดการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณปี
พ.ศ.2568

กรกฎาคม - สิงหาคม 2567

หน่วยปฏิบัติ

- ตรวจฉ้อโกง/พบทวงเงิน/ปรับปรุงแบบ
รายการ/Spec.
- ปรับปรุงงบประมาณ
- จัดทำแผนจัดซื้อจ้างในระบบ pmms
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- จัดทำเอกสาร TOR / ราคาากลาง

สิงหาคม 2567

หน่วยปฏิบัติ

- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทุก
รายการภายใน 25 ส.ค. 67
- เผยแพร่ร่าง TOR
- เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ

กันยายน 2567

หน่วยปฏิบัติ

- ประกาศ TOR / จัดซื้อจัดจ้าง / เชิญชวน
(ทุกรายการภายใน 6 ก.ย. 67)
- ส่ง สงป. พิจารณาความเหมาะสมราคา
(งานผูกพันงบประมาณ ภายใน ก.ย. 67)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลงนามในสัญญาทันที
เมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

■ กวจ. ชုံมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 428 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567)

1. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อยู่ระหว่างการศึกษาของวุฒิสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐราชการ จึงขอให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบของเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 11 หมายความว่า เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2

2. กรณีไม่ค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 414 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561

กรณีใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/9699 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 “เมื่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานอนุมัติแผนการดำเนินงาน ประจำปีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ถือว่าเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานได้รับทราบเห็นชอบของเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 วรรคหนึ่ง กรมชลประทานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน จนถึงขั้นตอนที่ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างและเมื่อกระทรวงการคลังอนุมัติการใช้จ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทานจึงสามารถทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้”

■ การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน (กรณีจ้างต่อเนื่อง)

- งานรักษาความปลอดภัย
- งานรักษาความสะอาด
- งานบริการงานตู้แลลิฟท์
- งานบริการงานบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆ
- งานบริการงานตู้แลลิฟท์ไม่และสวนหย่อม
- พนักงานขับรถและนายท้ายเรือ ขับเรือยนต์ราชการ
- คนทำสวน
- งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- งานป้องกันและกำจัดปลวก

2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (กรณีจ้างต่อเนื่อง)

ดำเนินการจัดหาพัสดุ

- หนังสือต่อต้านที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
- เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้เช่าหรือการจ้างที่จะต้องทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันที ผลย้อนหลัง
- หนังสือต่อต้านที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
- เรื่อง การเช่าและจ้างเหมาบริการที่มี ความจำเป็นต่อเนื่อง

■ การอนุมัติยกเว้นให้การเข้าหรือการจ้างที่จะต้องทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันที ผลย้อนหลัง

ตามหนังสือที่สศท ที่ กต (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560

1. ให้การทำสัญญาเช่าหรือสัญญาจ้าง ที่หน่วยงานของรัฐต่างๆ มีความจำเป็นต่องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลงกับผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ แล้วแต่กรณี ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดหาไว้แล้ว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีในวันที่ 1 ตุลาคม หรือวันแรกของปีงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม หรือวันอื่นอันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ หรือวันที่มีการเข้าหรือการจ้างจริง แล้วแต่กรณี

2. ในการดำเนินการจัดหาของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในหลักเกณฑ์การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามบัญชี 1 จะต้องปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐตัวผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้าง ที่จะลงนามเป็นคู่สัญญาและผู้มีอำนาจอนุมัติให้เช่าหรือจ้างรายที่จัดหาไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนที่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม หรือวันอื่นอันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณเท่านั้น

หมายเหตุ: การจ้างหรือเช่าที่จะต้องทำต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2568 จะต้องจัดหาพัสดุและรัฐตัวผู้รับจ้างหรือผู้ให้เช่า

อนุมัติสั่งซื้อส่งจ้าง และประกาศผลผู้ชนะ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

- การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีผลความจำเป็นต่อเนื่อง (เช่าหรือจ้างรายเดือน)
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560

กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเช่าพัสดุจากผู้ให้เช่ารายเดือน หรือจ้างผู้ให้บริการรายเดือนต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการ จัดเช่าหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 78 (ค)

หมายเหตุ : ระเบียบฯ ข้อ 78 (ค) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดือนตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อให้การจัดเช่าหรือจัดจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ำกว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขเดิมหรือเงื่อนไขที่ต่ำกว่าเดิม โดยคำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

รายงานหน้าเข้าข้อมูลงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 12.00 น.

R0001_ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แยกตามสายงาน และระดับสำนัก)

แหล่งงบประมาณ: งบกรม (รายจ่ายประจำปี), สถานะแผน: ทุกสถานะ

ข้อมูลจากระบบ PMS ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 12:00 น.

สำนัก/กอง	รายการงาน/โครงการ				แผนค่าจัดซื้อจัดจ้าง			อำนาจโครงการ			อำนาจสำนัก		อำนาจกรม	
	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำ แผน	เห็นชอบ แผน	จำนวน ค.ม.	วงเงิน งบประมาณ	จำนวน ค.ม.	วงเงิน งบประมาณ	จำนวน ค.ม.	วงเงิน งบประมาณ	จำนวน ค.ม.	วงเงิน งบประมาณ	จำนวน ค.ม.	วงเงิน งบประมาณ
กพท.	155	17,386,722,412.00	45	2	171	4,466,696,973.39	160	1,131,423,436.69	3	95,822,935.70	8	3,239,458,601.00		
ศทค.	55	1,989,269,726.00	24	0	120	1,826,332,400.00	107	46,244,400.00	2	52,000,000.00	11	1,728,098,000.00		
ศจร.	59	389,811,100.00	10	8	43	59,000,000.00	43	59,000,000.00	0	0.00	0	0.00		
ศพญ.	179	15,562,428,400.00	64	0	175	3,453,572,299.00	169	982,732,299.00	1	47,100,000.00	5	2,423,740,000.00		
รวม:	448	35,328,231,638.00	143	10	509	9,805,601,672.39	479	2,219,400,135.69	6	194,922,935.70	24	7,391,278,601.00		
ฝายงานบริหาร														
กนบ.	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
กตบ.	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
กปบ.	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
กบร.	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
กพด.	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
กพท.	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
กพท.	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
กตท.	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
กพท.	1	40,000,000.00	1	0	5	40,000,000.00	0	0.00	5	40,000,000.00	0	0.00		
กปค.	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
กบค.	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
กตค.	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
กตท.	2	252,855.00	1	0	1	171,855.00	0	0.00	1	171,855.00	0	0.00		
รวม:	3	40,252,855.00	2	0	6	40,171,855.00	0	0.00	6	40,171,855.00	0	0.00		
ฝายงานบริหารรักษา														
กพด.	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
ศทป.1	533	1,724,557,725.20	173	83	857	493,682,463.19	825	489,192,494.19	32	4,489,969.00	0	0.00		
ศทป.2	527	2,277,836,100.00	380	62	2,105	1,036,516,677.77	2,105	1,036,516,677.77	0	0.00	0	0.00		
ศทป.3	430	1,989,114,776.00	111	18	211	219,478,876.27	197	156,346,576.27	13	3,634,300.00	1	59,498,000.00		
ศทป.4	595	2,480,063,322.00	95	0	364	495,757,072.37	363	102,636,072.37	0	0.00	1	393,121,000.00		

R0001_ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แยกตามสายงาน และระดับสำนัก)

แหล่งงบประมาณ: งบกรม (รายจ่ายประจำปี), สถานะแผน: ทุกสถานะ


ข้อมูลจากระบบ PMS ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 12:00 น.

สำนัก/กอง	รายการงาน/โครงการ				แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง		จำนวนโครงการ		อำนาจสำนัก		อำนาจกรม	
	จำนวน	วงเงินงบประมาณ	จัดทำแผน	เพิ่มขอบแผน	จำนวนผ.	วงเงินงบประมาณ	จำนวนผ.	วงเงินงบประมาณ	จำนวนผ.	วงเงินงบประมาณ	จำนวนผ.	วงเงินงบประมาณ
สทบ.5	532	3,439,699,100.00	151	4	738	1,118,395,665.05	738	1,118,395,665.05	0	0.00	0	0.00
สทบ.6	719	3,882,656,300.00	139	36	599	348,076,560.31	584	297,817,560.31	15	50,259,000.00	0	0.00
สทบ.7	552	3,639,402,340.00	19	0	83	152,516,875.44	83	152,516,875.44	0	0.00	0	0.00
สทบ.8	741	3,620,462,700.00	92	0	316	162,254,767.99	291	160,226,869.67	25	2,027,898.32	0	0.00
สทบ.9	869	2,397,337,065.40	73	15	267	254,146,865.40	249	125,219,345.40	17	52,229,000.00	1	76,698,500.00
สทบ.10	817	1,807,052,000.00	93	1	139	57,835,000.00	139	57,835,000.00	0	0.00	0	0.00
สทบ.11	760	1,720,787,800.00	104	4	230	47,825,328.00	220	47,518,028.00	10	307,300.00	0	0.00
สทบ.12	1,251	2,392,046,310.00	253	75	765	341,303,510.00	711	265,850,191.00	54	75,453,319.00	0	0.00
สทบ.13	808	1,536,491,700.00	209	19	916	407,813,249.46	886	405,208,087.46	30	2,605,162.00	0	0.00
สทบ.14	370	2,340,158,400.00	11	4	40	14,751,000.00	26	14,433,900.00	14	317,100.00	0	0.00
สทบ.15	666	1,751,157,460.00	241	18	996	765,598,449.92	982	404,823,469.26	14	360,774,980.66	0	0.00
สทบ.16	488	2,583,984,900.00	111	0	233	148,105,622.39	232	144,586,622.39	1	3,519,000.00	0	0.00
สทบ.17	363	1,385,234,640.00	147	0	514	734,209,654.00	502	514,511,404.00	12	219,698,250.00	0	0.00
สทบ.	179	588,239,401.00	119	40	213	434,731,901.00	112	157,041,786.00	93	183,640,115.00	8	94,050,000.00
รวม:	11,200	41,556,282,039.60	2,521	379	9,586	7,232,999,538.56	9,245	5,650,676,644.58	330	958,955,393.98	11	623,367,500.00
ฝ่ายงานวิชาการ												
สทบ.	27	929,288,000.00	21	0	21	678,800,000.00	0	0.00	10	330,000,000.00	11	346,800,000.00
สพท.	4	7,196,000.00	4	4	11	7,196,000.00	11	7,196,000.00	0	0.00	0	0.00
สทว.	24	9,040,000.00	24	0	112	9,000,000.00	112	9,000,000.00	0	0.00	0	0.00
สทธ.	39	709,312,000.00	14	0	22	131,136,000.00	11	30,300,000.00	11	100,836,000.00	0	0.00
สทศ.	12	583,484,900.00	10	0	10	543,000,000.00	0	0.00	0	0.00	10	543,000,000.00
รวม:	106	2,238,320,900.00	73	4	176	1,369,132,000.00	134	46,496,000.00	21	430,836,000.00	21	891,800,000.00
รวมทั้งหมด	11,757	79,163,087,432.60	2,739	393	10,277	18,447,905,065.95	9,858	7,916,572,780.27	363	1,624,886,184.68	56	8,906,446,101.00



ระบอบการคลัง
5 เรื่องสั้นๆ (ถ้ามี)
(เล่มนี้)

COME FOR ALL





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ և
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ
ՄԱՐԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

THANK YOU

