



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E วอ.วอ. 1339/2560

พ.ศ. ๖๐. ๕๕๖/๖๐

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖  
 ที่ ผตป.ผง. ๑๓๓๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  
 เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 (ทุกแหล่งงบประมาณ)

งน. 6726

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้  
 ใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  
 เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อธช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)  
ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง  
เพื่อโปรดทราบ

- ททบ

- เวล ๑๐.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐ น.

เพื่อโปรด ททบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐

(นายประยูร เอ็นใจ)

ผจน.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.

25 ก.ย. 2560

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 7 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 95,292.44 ล้านบาท ปริมาณงาน 14,282 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ปริมาณงาน 6,747 รายการ งบประมาณ 38,618.91 ล้านบาท เบิกจ่าย 30,385.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.68

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 36 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.53 ( ส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง )
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 59 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.88
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,560 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.12
- แล้วเสร็จ 5,092 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75.47

2. งบกลาง ปริมาณงาน 4,650 รายการ งบประมาณ 12,436.90 ล้านบาท เบิกจ่าย 9,131.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.42

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.41
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 124 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.67
- แล้วเสร็จ 4,507 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.92

3. เงินกู้ โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม 2558-2559) ปริมาณงาน 757 รายการ งบประมาณ 22,744.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 18,810.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.70

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 104 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.74
- แล้วเสร็จ 652 รายการ คิดเป็นร้อยละ 86.13

4. เงินกัณฑ์ปี พ.ศ. 2554-2559 ปริมาณงาน 545 รายการ งบประมาณ 6,016.39 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,861.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.18

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 238 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.67
- แล้วเสร็จ 307 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.33

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 844 รายการ งบประมาณ 230.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 151.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.91

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 106 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.56
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 81 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.60
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 75 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.89
- แล้วเสร็จ 582 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.96

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 716.76 ล้านบาท เบิกจ่าย 667.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.15

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 30 รายการ คิดเป็นร้อยละ 51.72
- แล้วเสร็จ 28 รายการ คิดเป็นร้อยละ 48.28

7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(60 เพิ่มเติม) ปริมาณงาน 733 รายการ(ยกเลิก 8 รายการและให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ) งบประมาณ 14,528.47 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,015.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.76


- อยู่ระหว่างเตรียมการ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.88
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.18
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 601 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.25
- แล้วเสร็จ 66 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.69

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560  
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>14,282</b>	<b>148</b>	<b>168</b>	<b>2,732</b>	<b>11,234</b>	<b>95,292.44</b>	<b>66,023.10</b>	<b>69.28</b>	
<b>1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)</b>	<b>6,747</b>	<b>36</b>	<b>59</b>	<b>1,560</b>	<b>5,092</b>	<b>38,618.91</b>	<b>30,385.34</b>	<b>78.68</b>	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 รายจ่ายลงทุน วงเงินรวมทั้งสิ้น 288,846,300 บาท
<b>2. งบกลาง</b>	<b>4,650</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>124</b>	<b>4,507</b>	<b>12,436.90</b>	<b>9,131.24</b>	<b>73.42</b>	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	3	2	583.00	92.39	15.85	ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้วเสร็จ 84 รายการ เบิกจ่าย 1,619.50 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 583.00 ล้านบาท
2.2 งบกลาง กปร.58	10	-	-	2	8	252.91	200.55	79.30	ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.87 ล้านบาท แล้วเสร็จ 91 รายการ เบิกจ่าย 147.01 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.59	66	-	-	12	54	1,312.05	1,133.49	86.39	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้วเสร็จ 39 รายการ เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05 ล้านบาท
2.4 งบกลาง กปร.60	58	-	19	38	2	1,279.42	250.27	19.56	ปริมาณงาน 63 รายการ งบประมาณ 1,342.79 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 58 รายการ เป็นเงิน 1,274.32 ล้านบาท
2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศไทยตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง และอุทกภัย	998	-	-	68	929	5,735.35	4,345.70	75.77	ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 3 รายการ งบประมาณ 8.94 ล้านบาท คงเหลือ 1,047 รายการ งบประมาณ 5,765.53 ล้านบาท แล้วเสร็จ 49 รายการ ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 998 รายการ งบประมาณ 5,735.35 ล้านบาท
2.6 งบกลาง โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี 2559	2,672	-	-	-	2,672	2,376.54	2,316.97	97.49	ปริมาณงาน 2,677 รายการ งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท ยกเลิก 5 รายการ งบประมาณ 7.07 ล้านบาท คงเหลือ 2,672 รายการ งบประมาณ 2,376.54 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.7 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ(กำจัดวัชพืช)	283	-	-	-	283	57.69	56.62	98.15	ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท ยกเลิก 12 รายการ งบประมาณ 3.21 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเข้าซ้อนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 283 รายการ งบประมาณ 57.69 ล้านบาท (โครงการปิด 31 มีนาคม พ.ศ.2560)
2.8 งบกลาง แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/2560	558	-	-	1	557	839.94	735.26	87.54	
<b>3. เงินกู้</b>	<b>757</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>104</b>	<b>652</b>	<b>22,744.87</b>	<b>18,810.00</b>	<b>82.70</b>	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	722	-	1	77	644	21,367.40	18,001.42	84.25	ปริมาณงาน 722 รายการ ยอดจัดสรร 22,416.82 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้จริง 21,367.40 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 643 รายการ คงเหลือ 79 รายการ ยกเลิก 3 รายการ
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	35	-	-	27	8	1,377.47	808.58	58.70	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอนจัดสรร 1,377.47 ล้านบาท
<b>4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559</b>	<b>545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>238</b>	<b>307</b>	<b>6,016.39</b>	<b>3,861.33</b>	<b>64.18</b>	ปริมาณงาน 621 รายการ งบประมาณ 6,113.99 ล้านบาท เงินทับ/หมดความจำเป็น จำนวน 76 รายการ งบประมาณ 97.60 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 545 รายการ งบประมาณ 6,016.39 ล้านบาท
<b>5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560</b>	<b>844</b>	<b>106</b>	<b>81</b>	<b>75</b>	<b>582</b>	<b>230.15</b>	<b>151.69</b>	<b>65.91</b>	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 23 รายการ งบประมาณ 57.28 ล้านบาท และเพิ่มรายการ 13 รายการ งบประมาณ 372.79 ล้านบาท
<b>6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>716.76</b>	<b>667.69</b>	<b>93.15</b>	
<b>7 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ (60 เพิ่มเติม)</b>	<b>681</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>601</b>	<b>66</b>	<b>14,528.47</b>	<b>3,015.80</b>	<b>20.76</b>	
ส่วนราชการ	195	-	1	178	16	5,174.40	1,367.03	26.42	ปริมาณงาน 239 รายการ ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ
จังหวัด	40	6	7	423	11	9,300.00	1,600.00	17.00	ปีงบประมาณ 2560 รายจ่ายลงทุน

## 1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

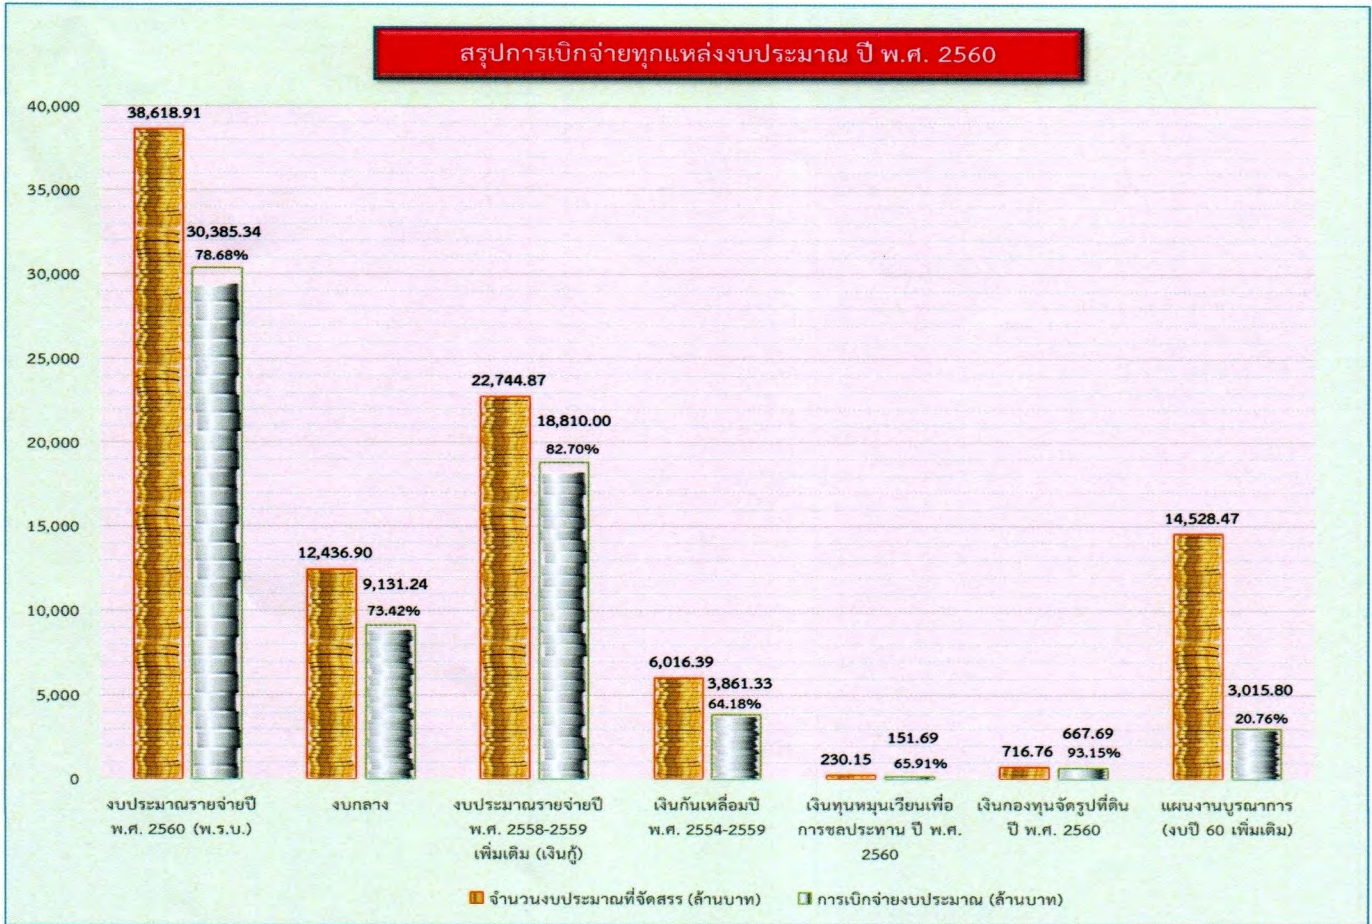

## 2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

