



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวางอุดมธारा อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ที่...สชป ๑.๑๑/  /๒๕๖๔ วันที่  ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานอุตุ-อุทกวิทยา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผอท.บอ. สำเนา ผจบ.ชป.๑ , ผอช. ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวางอุดมธारा ขอส่งรายงานอุตุ - อุทกวิทยา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจัดเก็บเป็นสถิติ และข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป ซึ่งได้แนบรายละเอียดมาแล้ว ดังนี้

๑. รายงานอุตุ - อุทกวิทยา
๒. รายงานปริมาณน้ำฝนรายเดือน
๓. สถิติน้ำฝนรายวัน
๔. กราฟแสดงปริมาณน้ำเก็บกักเขื่อนแม่กวางอุดมธारा

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายอัยยา อรรถนพเพ็ชร)  
ผคบ.แม่กวางอุดมธारा


- สำเนา

เรียน ผอช. ภาคเหนือตอนบน

เพื่อโปรดทราบ



(นายอัยยา อรรถนพเพ็ชร)  
ผคบ.แม่กวางอุดมธारा

ยุทธนา/ร่าง  
ยุทธนา/พิมพ์  
ตรวจ

รายงาน อุต - อุทกวิทยา ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้วอุดมธारा

ประจำเดือนกันยายน 2564

ว.ด.ป.	ระดับน้ำ		พื้นที่ผิวน้ำ		ค่าการระเหย		(7) (4)*(6) ลบ.ม.	(8) (ปัจจุบัน) ล้านลบ.ม.	(9) (ปัจจุบัน-เดิม) ลบ.ม.	ปริมาณ (10) น้ำที่ส่งออก	ปริมาณน้ำ ไหลเข้าอ่างฯ (7)+(9)+(10) ลบ.ม.	ปริมาณน้ำ ไหลเข้าอ่างฯ ทั้งสิ้น ลบ.ม.	ปริมาณน้ำฝน	
	(1) (ปัจจุบัน) ม.(รทก.)	(2) (เฉลี่ย) ม.(รทก.)	(3) จาก Curve ตร.กม.	(4) (3)*1,000,000	(5) มม.	(6) (5)*0.001 ม.							รายงาน	สะสม
1 ก.ย.64	358.494	358.527	4.976	4,975,940	4.293	0.004	21,362	45,372	290,000	38,685	358,506	358,506	0.00	773.30
2 ก.ย.64	358.560	358.603	4.993	4,992,660	4.293	0.004	21,433	45,662	378,000	40,131	448,052	448,052	2.50	775.80
3 ก.ย.64	358.646	358.699	5.014	5,013,780	4.293	0.004	21,524	46,040	467,000	40,340	537,388	537,388	11.00	786.80
4 ก.ย.64	358.752	358.777	5.031	5,030,830	4.293	0.004	21,597	46,507	215,000	438,077	683,227	683,227	8.80	795.60
5 ก.ย.64	358.801	358.812	5.039	5,038,530	4.293	0.004	21,630	46,722	93,000	426,781	549,977	549,977	0.50	796.10
6 ก.ย.64	358.822	358.867	5.051	5,050,740	4.293	0.004	21,683	46,815	396,000	414,417	840,686	840,686	9.10	805.20
7 ก.ย.64	358.912	358.919	5.062	5,062,180	4.293	0.004	21,732	47,211	61,000	583,911	675,249	675,249	12.20	817.40
8 ก.ย.64	358.926	358.930	5.064	5,064,490	4.293	0.004	21,742	47,272	31,000	453,031	514,382	514,382	6.10	823.50
9 ก.ย.64	358.933	358.984	5.076	5,076,370	4.293	0.004	21,793	47,303	442,000	379,492	851,915	851,915	27.80	851.30
10 ก.ย.64	359.034	359.092	5.100	5,100,240	4.293	0.004	21,895	47,745	510,000	174,760	715,326	715,326	1.00	852.30
11 ก.ย.64	359.150	359.238	5.132	5,132,250	4.293	0.004	22,033	48,255	770,000	52,425	853,183	853,183	0.00	852.30
12 ก.ย.64	359.325	359.398	5.167	5,167,450	4.293	0.004	22,184	49,025	638,000	41,618	710,587	710,587	0.00	852.30
13 ก.ย.64	359.470	359.525	5.196	5,195,500	4.293	0.004	22,304	49,663	484,000	40,602	555,739	555,739	10.50	862.80
14 ก.ย.64	359.580	359.655	5.226	5,226,300	4.293	0.004	22,437	50,147	747,000	37,353	815,674	815,674	21.50	884.30
15 ก.ย.64	359.750	359.840	5.265	5,264,800	4.293	0.004	22,602	50,894	792,000	39,545	863,097	863,097	0.00	884.30
16 ก.ย.64	359.930	360.000	5.300	5,300,000	4.293	0.004	22,753	51,686	699,000	39,903	771,196	771,196	5.00	889.30
17 ก.ย.64	360.070	360.138	5.333	5,333,120	4.293	0.004	22,895	52,385	748,000	39,202	819,697	819,697	7.00	896.30
18 ก.ย.64	360.206	360.253	5.361	5,360,720	4.293	0.004	23,014	53,133	517,000	41,398	591,061	591,061	0.00	896.30
19 ก.ย.64	360.300	360.336	5.381	5,380,640	4.293	0.004	23,099	53,650	396,000	43,618	472,402	472,402	0.00	896.30
20 ก.ย.64	360.372	360.431	5.403	5,403,320	4.293	0.004	23,196	54,046	644,000	41,485	718,407	718,407	0.70	897.00
21 ก.ย.64	360.489	360.536	5.429	5,428,640	4.293	0.004	23,305	54,690	516,000	40,155	589,232	589,232	6.90	903.90
22 ก.ย.64	360.583	360.629	5.451	5,450,960	4.293	0.004	23,401	55,206	506,000	39,055	578,268	578,268	0.70	904.60
23 ก.ย.64	360.675	360.719	5.473	5,472,560	4.293	0.004	23,494	55,712	485,000	40,600	558,944	558,944	20.00	924.60
24 ก.ย.64	360.763	360.812	5.495	5,494,760	4.293	0.004	23,589	56,197	533,000	41,294	607,774	607,774	6.60	931.20
25 ก.ย.64	360.860	360.900	5.516	5,516,000	4.293	0.004	23,680	56,730	440,000	39,523	513,132	513,132	12.00	943.20
26 ก.ย.64	360.940	360.988	5.537	5,537,000	4.293	0.004	23,770	57,170	523,000	39,705	596,442	596,442	1.50	944.70
27 ก.ย.64	361.035	361.103	5.565	5,564,600	4.293	0.004	23,889	57,693	742,000	39,737	815,642	815,642	3.50	948.20
28 ก.ย.64	361.170	361.225	5.594	5,594,000	4.293	0.004	24,015	58,435	605,000	40,650	679,734	679,734	0.00	948.20
29 ก.ย.64	361.280	361.350	5.624	5,624,000	4.293	0.004	24,144	59,040	770,000	39,582	843,849	843,849	0.00	948.20
30 ก.ย.64	361.420	361.473	5.654	5,653,520	4.293	0.004	24,271	59,810	583,000	41,330	658,777	658,777	0.00	948.20
							<b>680,466</b>				<b>19,787,545</b>	<b>19,787,545</b>	<b>174.9</b>	



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวองอุดมธรา

สถิติน้ำฝนรายวัน สถานีต่างๆ ในเขตโครงการ


ประจำเดือน กันยายน 2564

วันที่	สถานีต่างๆ ในเขตโครงการ					ค่าเฉลี่ย
	ห้วยงาน	แม่ฮ่องฮัก	แม่โป่ง	บ้านร่องวัวแดง	บ้านศรีบัวบาน	
1	-	-	-	-	-	
2	2.5	5.2	30.0	-	-	
3	11.0	56.2	54.4	-	-	
4	8.8	14.3	-	-	-	
5	0.5	-	1.1	1.5	-	
6	9.1	2.5	3.0	1.8	1.1	
7	12.2	22.5	15.5	7.5	6.8	
8	6.1	10.3	14.2	-	0.7	
9	27.8	27.2	42.8	25.1	5.7	
10	1.0	2.3	0.5	1.3	2.0	
11	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	
13	10.5	22.3	32.8	45.9	9.7	
14	21.5	25.5	17.6	21.2	6.2	
15	-	-	3.5	-	-	
16	5.0	14.2	13.9	6.4	1.4	
17	7.0	2.2	-	2.5	2.3	
18	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	
20	0.7	-	0.2	0.5	0.1	
21	6.9	10.7	16.2	10.2	4.6	
22	0.7	2.1	7.6	5.4	6.3	
23	20.0	3.3	0.9	21.7	1.6	
24	6.6	-	1.2	0.6	4.5	
25	12.0	15.6	20.5	19.8	10.3	
26	1.5	3.5	11.6	9.6	15.3	
27	3.5	2.4	1.2	5.6	8.5	
28	-	-	-	-	5.2	
29	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	
<b>รวม</b>	<b>174.9</b>	<b>242.3</b>	<b>288.7</b>	<b>186.6</b>	<b>92.3</b>	<b>197.0</b>

# โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งอุทุมพร

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) วันที่ 1 ตุลาคม 2564

สถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งอุทุมพร ปี 2564

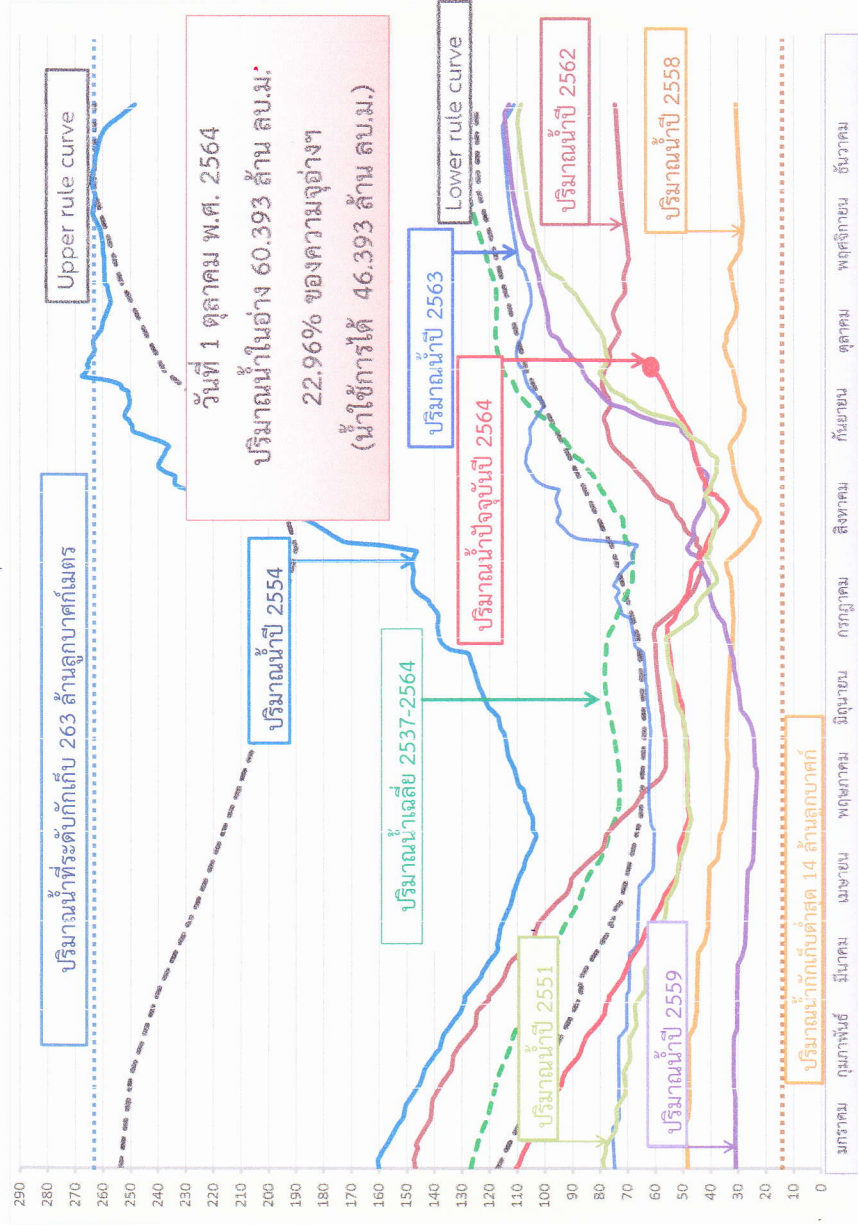

ข้อมูลโครงการและกิจกรรมการใช้น้ำ		พื้นที่เพาะปลูกปี 2564 (ไร่)	
พื้นที่รับน้ำฝน	ตร.กม.	แผน(ฤดูเร่ง)	ผล(ฤดูฝน)
ปริมาณฝนตกลงเฉลี่ยปีละ	1,158 มม.	40,000	120,133
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเฉลี่ยปีละ	190 ล้าน ลบ.ม.	8,000	936
ปริมาณน้ำที่ระเหยกลับเก็บกัก	263 ล้าน ลบ.ม.	25,055	25,055
ปริมาณน้ำที่ระเหยกลับต่ำสุด	14 ล้าน ลบ.ม.	3,212	3,212
สถิติปริมาณน้ำต่ำสุด (15 ส.ค. 2541)	20 ล้าน ลบ.ม.	-	-
สถิติปริมาณน้ำสูงสุด (29 ก.ย. 2554)	267 ล้าน ลบ.ม.	76,267	69,815
พื้นที่โครงการ	295,000 ไร่		
พื้นที่ชลประทาน	148,400 ไร่		
รวม			148,400

■ แผน/คาดการณ์  
■ จริง

แผนการปลูกพืชฤดูฝน ปี 2564

มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวม
ช.ค.	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
9,004	4,121	3,437	7,319	9,874	17,505	38,300	44,255	25,830	13,556	8,860	183,312
5,101	1,759	3,013	4,496	8,056	11,384	16,132	19,788	28,762	14,396	6,603	124,005
5,367	18,901	17,480	19,948	13,948	25,635	22,067	13,271	9,746	0,000	0,000	140,997
5,475	18,349	16,557	18,474	13,001	22,795	10,573	2,597				102,400
1,240	1,317	1,202	1,329	1,254	1,266	1,281	1,212				11,421
1,266	1,256	1,578	1,364	1,279	0,944	0,828	0,958				10,441
125,657	111,333	92,510	50,661	42,613	50,217	37,677	51,710	80,494	94,378	105,734	
113,317	110,437	93,591	47,863	49,782	55,542	41,921	45,372	60,393			
369,350	368,950	366,610	364,202	361,065	360,644	357,710	358,494	361,526	366,718	368,297	
รวม										35,965	107,875

71,910
