



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สขบ.๑ โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๕๔๑๘
ที่ สขบ.๑๔/๑๖๑ / ๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปผลการติดตามสถานการณ์น้ำรอบเวรที่ ๑๖ และพิจารณาการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ
สนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๖๘ รอบเวรที่ ๑๗

เรียน ผส.ขบ.๑, รอง ผส.ขบ.๑, ผคป.เชียงใหม่, ผคป.ลำพูน, ผคป.แม่แฝก - แม่จัดฯ และ ผอช.ภาคเหนือตอนบน

ตามที่ได้มีการประชุมสรุปผลการติดตามสถานการณ์น้ำรอบเวรที่ ๑๖ และพิจารณาการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ สนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๖๘ รอบเวรที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและพิจารณาการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ โดยผลการประชุมฯ มีรายละเอียดดังนี้

๑. สถานการณ์ปริมาณน้ำ

- ลำน้ำสาขาแม่น้ำปิงที่ไหลลงแม่น้ำปิงช่วงตั้งแต่ท้ายน้ำฝายแม่แฝกจนถึงฝายพญาอุต (๒ สาขา น้ำแม่แตงท้ายฝาย และแม่มริม) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ มีปริมาณน้ำรวม ๖.๐ ลบ.ม./วินาที มากกว่าปีที่แล้ว สถานี P.๑๐๓ มีปริมาณน้ำ ๓๑.๐ ลบ.ม./วินาที มากกว่าปีที่แล้ว และลำน้ำสาขาแม่น้ำปิงที่ไหลลงแม่น้ำปิงช่วงตั้งแต่ท้ายน้ำฝายพญาอุต จนถึงสบน้ำแม่แจ่ม (๕ สาขาน้ำแม่กวง แม่ทา แม่ขาน แม่กลาง และแม่ลี) มีปริมาณน้ำรวม ๑๔.๙ ลบ.ม./วินาที น้อยกว่าปีที่แล้ว ตามเอกสารแนบ ๑

- ลำน้ำแม่แจ่ม วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ มีปริมาณน้ำในลำน้ำ ๑๗.๐ ลบ.ม./วินาที มากกว่าปีที่แล้ว ตามเอกสารแนบ ๑ พื้นที่เพาะปลูกตั้งแต่สบน้ำแม่แจ่มถึงเขื่อนภูมิพล ได้รับน้ำเพียงพอ

๒. ผลการตรวจสอบการส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ สนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง รอบเวรที่ ๑๖ ดังนี้

๒.๑ สถานการณ์น้ำฝน สะสม ๗ วัน

- มีฝนตกในพื้นที่เล็กน้อยถึงปานกลาง

๒.๒ สถานการณ์น้ำท่า

- ฝายแม่แฝก ยังคงมีน้ำไหลเข้าและระบายลงท้ายน้ำ มีเพียงพอกับความต้องการ

- ปตร.ท่าวังตาล จนถึง ปตร.แม่สอย ปัจจุบันระดับน้ำหน้าฝาย/ปตร. มีเพียงพอกับ

ความต้องการใช้น้ำ

ภาพรวมปริมาณน้ำในลำน้ำปิงตั้งแต่ ฝายแม่แฝกจนถึง ปตร.แม่สอย มีแนวโน้มทรงตัว และเพียงพอสำหรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่

๒.๓ ปริมาณน้ำที่ส่งน้ำรอบเวรที่ ๑๖ แผนการส่งน้ำโดยให้ส่งน้ำจำนวน ๖ วัน อัตราการส่งน้ำ ๑๒ ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำรวมรอบละ ๖.๒๒ ล้าน ลบ.ม.

๒.๔ ปัจจุบันปริมาณน้ำหน้าฝาย/ปตร. ๕ แห่ง (ปตร.ท่าวังตาลถึงฝายพญาอุต) ต่ำกว่าระดับเก็บกัก ๐.๑๖๑ ล้าน ลบ.ม.

๓. การพิจารณาแนวทางการส่งน้ำรอบเวอร์ที่ ๑๗ ดังนี้

๓.๑ พิจารณาให้ส่งน้ำรอบเวอร์ที่ ๑๗ โดยให้ส่งน้ำจำนวน ๕ วัน อัตราการส่งน้ำ ๑๐ ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำรวม ๔.๓๒ ล้าน ลบ.ม.

ภาพรวมผลส่งน้ำฯ สะสมรอบเวอร์ที่ ๑-๑๗ ส่งน้ำส่งน้ำ ๗๔.๑๓ ล้าน ลบ.ม. โคเวตาคงเหลือ ๑๗.๒๘ ล้าน ลบ.ม. ตามเอกสารแนบ ๒

๓.๒ ให้ผู้ควบคุมฝ่าย/ปตร. บริหารจัดการน้ำ ในรอบเวอร์ที่ ๑๗ โดยปฏิบัติดังนี้

- ให้ผู้ควบคุมฝ่าย/ปตร. ทุกแห่งในลำน้ำปิง ตรวจสอบการเปิด-ปิด ปตร. ปากคลองส่งน้ำอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งถ่ายรูป และรายงาน/สื่อสาร การบริหารจัดการน้ำผ่านกลุ่มไลน์ติดตามการส่งน้ำ เพื่อติดตามสถานการณ์

- ให้ผู้ควบคุมฝ่าย/ปตร. ทุกแห่งในลำน้ำปิง ตรวจสอบ ติดตามแผนและผลการส่งน้ำ และรายงานผลการติดตามผลการส่งน้ำในการประชุมครั้งถัดไป

๓.๓ การรายงานระดับน้ำด้านเหนือหน้า ปริมาณน้ำไหลผ่านฝ่าย /ปตร./ ปตร.ทราย /คลองส่งน้ำ ให้รายงาน วันละ ๓ ช่วงเวลา ณ เวลา ๐๗.๐๐ น. ,๑๒.๐๐ น. ,๑๘.๐๐ น. และ ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำทุกครั้ง (เช่น รายงานเพิ่ม ณ เวลา ๐๙.๐๐ น. กรณีเปิดประตูปากคลองส่งน้ำและหลังเปิดประตูปากคลองส่งน้ำแล้ว ๑ ชั่วโมง ให้รายงาน ณ เวลา ๑๐.๐๐ น. ด้วย)

ทั้งนี้ตามมติที่ประชุม ข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ ให้ จน.คบ.แม่แฝก-แม่จัตฯ, จน.คบ.เชียงใหม่ และ จน.คบ.ลำพูน เป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด

๔. สรุปมติ / ข้อสั่งการอื่น ๆ ในที่ประชุม

๔.๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการปรับเพิ่มแผนการระบายน้ำจากเขื่อนแม่จัตฯ ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ จากเดิมมีแผน ๘๕ ล้าน ลบ.ม. เป็น ๙๑ ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากปี ๒๕๖๘ มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมากกว่าสถิติปีที่ผ่านมา และเป็นการรักษาปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อนแม่จัตฯ ให้อยู่เกณฑ์ควบคุม (Rule Curve)

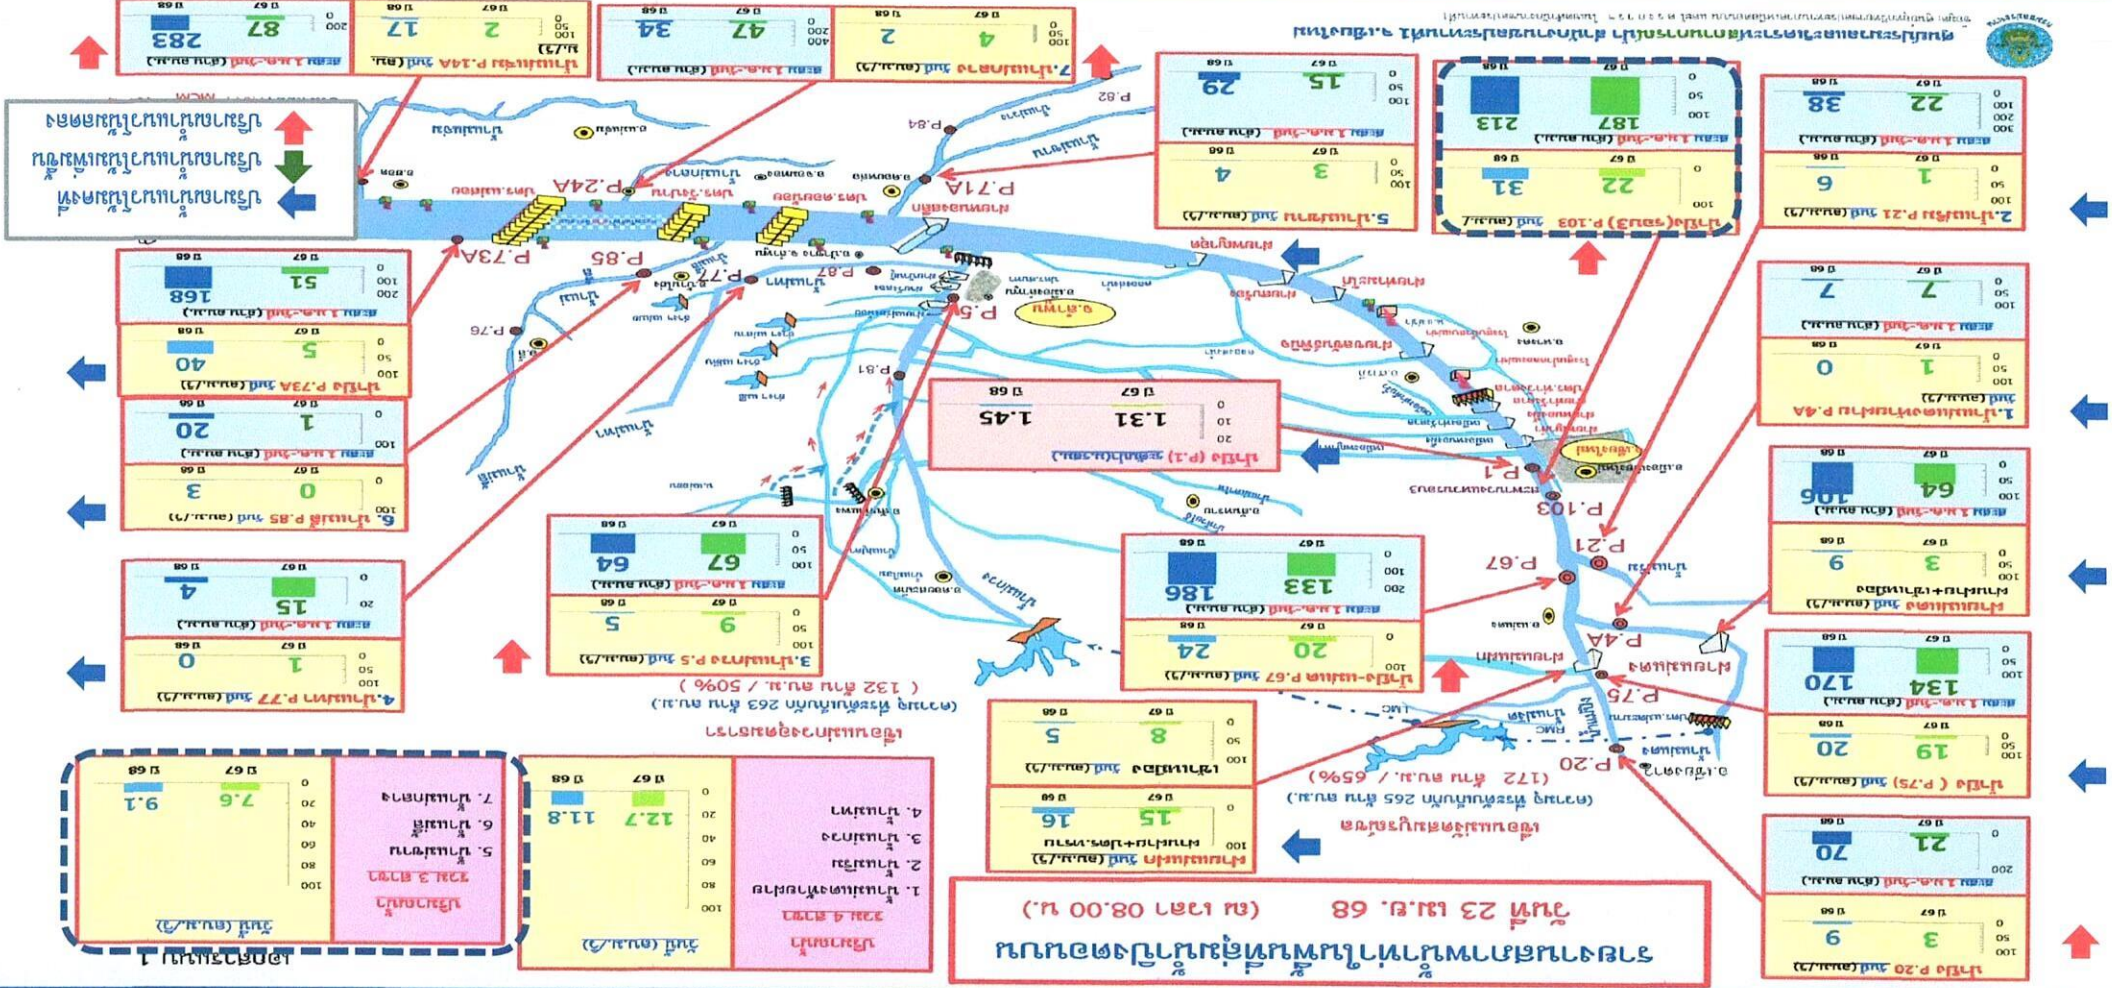
๔.๒ ให้ฝ่ายเลขาจัดทำบันทึกแจ้งสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ เข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุง คันกันน้ำ ประตูระบายน้ำแม่สอย และฝ่ายสปรองพร้อมระบบส่งน้ำให้เรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายจิรัชย์ พัฒนพงศา)

ผจบ.ชป.๑

[illegible][illegible]



แผน/ผล การส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ สนับสนุนพื้นที่ **ลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ฤดูแล้งปี 2568**

รอบวันที่ 17

เอกสารแนบ 2

รอบ ที่	วันที่		แผนการส่งน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)		วันที่ส่งจากเขื่อนแม่งัดฯ (ลบ.ม./วินาที)								ผลการส่งน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)		โควต้า คงเหลือ ล้าน ลบ.ม.	หมายเหตุ
	เริ่มต้น รอบวัน	สิ้นสุด รอบวัน			พฤษห	ศุกร	เสาร์	อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ					
			สัปดาห์	สะสม	ตั้งแต่ 18.00 น.	ตั้งแต่ 18.00 น.	ตั้งแต่ 18.00 น.	ตั้งแต่ 18.00 น.	ตั้งแต่ 18.00 น.	ตั้งแต่ 18.00 น.	ตั้งแต่ 18.00 น.	สัปดาห์	สะสม			
1	2 ม.ค. 68	8 ม.ค. 68	1.38	1.38	0	0						0.00	0.00	85.19	ใช้น้ำบริหารจัดการ	
2	9 ม.ค. 68	15 ม.ค. 68	1.38	2.76	0	0						0.00	0.00	85.19	ใช้น้ำบริหารจัดการ	
3	16 ม.ค. 68	22 ม.ค. 68	1.73	4.49	8	8						1.38	1.38	83.81		
4	23 ม.ค. 68	29 ม.ค. 68	2.42	6.91	10	10	8					2.42	3.80	81.39		
5	30 ม.ค. 68	5 ก.พ. 68	2.59	9.50	10	10	10					2.59	6.39	78.80		
6	6 ก.พ. 68	12 ก.พ. 68	2.94	12.44	10	8	8	8				2.94	9.33	75.86		
7	13 ก.พ. 68	19 ก.พ. 68	2.94	15.38	10	8	8	8				2.94	12.27	72.92		
8	20 ก.พ. 68	26 ก.พ. 68	3.97	19.35	12	12	12	10	10			4.84	17.11	68.08		
9	27 ก.พ. 68	5 มี.ค. 68	4.84	24.19	12	12	12	10	10	10		5.70	22.81	62.38		
10	6 มี.ค. 68	12 มี.ค. 68	5.18	29.38	10	10	10	10	10	10		5.18	27.99	57.20		
11	13 มี.ค. 68	19 มี.ค. 68	5.18	34.56	12	12	12	12	12	12		6.22	34.21	50.98		
12	20 มี.ค. 68	26 มี.ค. 68	6.05	40.61	14	14	14	14	14	14		7.26	41.47	43.72		
13	27 มี.ค. 68	2 เม.ย. 68	6.05	46.66	14	14	14	14	14	14		7.26	48.73	36.46		
14	3 เม.ย. 68	9 เม.ย. 68	6.05	52.70	14	14	15	15	15	15		7.60	56.33	28.86		
15	10 เม.ย. 68	16 เม.ย. 68	7.08	59.79	14	14	14	12	11	9	10	7.26	63.59	21.60	ประเพณีสงกรานต์	
16	17 เม.ย. 68	23 เม.ย. 68	5.18	64.97	12	12	12	12	12	12		6.22	69.81	15.38		
17	24 เม.ย. 68	30 เม.ย. 68	3.63	68.60	10	10	10	10	10			4.32	74.13	11.06		
18	1 พ.ค. 68	7 พ.ค. 68	2.42	71.02	10	10	10	10	10	10		5.18	79.32			
19	8 พ.ค. 68	14 พ.ค. 68	1.56	72.58	10	10	10	10	10	10		5.18	84.50			
20	15 พ.ค. 68	21 พ.ค. 68	1.56	74.13	8	8	8	8	8			3.46	87.96			
21	22 พ.ค. 68	28 พ.ค. 68	0.86	75.00	8	8	8	8	8			3.46	91.41			
รวม			75.0										91.41			

*หมายเหตุ - กำหนดการ และปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามปริมาณน้ำต้นทุนของแม่น้ำปิง

และความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วนสองฝั่งลำน้ำปิงในแต่ละช่วงเวลา
